



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL SANGLAUDOS FONDO (ISPA) PROJEKTO NR. 2001/LT/16/P/PE/008 „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“

2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. FA-P-70-2-78
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant
Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento
direktorės Vilijos Stirbienės
2009-01-22 pavedimą Nr. P-70-2

Auditą atliko:
Žaneta Rozenbergaitė – vyriausioji valstybinė auditorė (grupės vadovė)
Jonas Akelis – UAB „Ernst & Young Baltic“ auditorius, partneris
Asta Štreimikienė – UAB „Ernst & Young Baltic“ auditorė (projekto vadovė)
Marius Pulkauninkas – UAB „Ernst & Young Baltic“ auditoriaus padėjėjas (darbo grupės vadovas)

UAB „Ernst & Young Baltic“ pavedimu atliko:
Julius Stalmokas – UAB „Ernst & Young Baltic“ auditoriaus padėjėjas
Rita Jankūnaitė – UAB „Ernst & Young Baltic“ auditoriaus padėjėja
Rolandas Valskis – UAB „Ernst & Young Baltic“ auditoriaus padėjėjas

Auditas pradėtas 2009-01-23
Auditas baigtas 2009-09-16

TURINYS

Santrauka	3
1. Įžanga	3
2. Nustatytų pastebėjimų pobūdis	4
2.1. Didelės svarbos pastebėjimai	5
2.2. Vidutinės ir nedidelės svarbos pastebėjimai	5
2.3. Išvados dėl atitikties Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 ir Finansinio memorandumo (EK sprendimo) reikalavimams	7
3. Rekomendacijos	7
Audito apimtis ir metodai	8
4. Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančios institucijos	8
5. Bendroji informacija apie projektą	8
6. Reikšmingumo ir patikimumo lygis	13
7. Audito metodai	14
Pastebėjimai, išvados, rekomendacijos	27
8. Pažeidimai	27
9. Patikrinimai	28
9.1. VI patikrinimai	28
9.2. MI patikrinimai	28
9.3. APVA patikrinimai	29
10. Viešieji pirkimai	31
11. Išlaidų tinkamumas finansuoti ir atlikti darbai	37
12. Audito seka ir apskaitos sistemos	39
13. Viešinimo priemonės	41
14. Projekto galutinė ataskaita	42
15. Projekto galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška	45
16. Klaidų vertinimas	47
PRIEDAI	48

SANTRAUKA

1. Įžanga

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu¹ Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ [12] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti baigiamąjį audito deklaraciją dėl Sanglaudos fondo projektų rengiančios institucijos funkcijų pagal 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1386/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisyklės dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos.

Pagal 1995 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą² Nr. I-907 [10], Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija, nepriklausoma nuo mokėjimo, vadovaujančios, tarpinės ir įgyvendinančios institucijų.

Pagal Europos Sąjungos sanglaudos fondo projektų audito paslaugų teikimo 2008 m. gruodžio 18 d. sutartį Nr. 2008/12-30/FAS, sudarytą tarp UAB „Ernst & Young Baltic“ ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, UAB „Ernst & Young Baltic“ įsipareigojo teikti audito paslaugas pagal Tarptautinės apskaitininkų federacijos patvirtintus Tarptautinius audito standartus, Tarybos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 projektų užbaigimo deklaracijai nustatytus reikalavimus, EK rekomendacijas dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 14 straipsnį ir III priedą. Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktorės Vilijos Stirbienės 2009 m. sausio 22 d. pavedimu Nr. P-70-2 UAB „Ernst & Young Baltic“ atliko Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (toliau – Projektas) sutartas audito procedūras, o mes, valstybiniai auditoriai, – kitas, mums privalomas, audito procedūras. Pagal teisės aktų reikalavimus prie Projekto galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos pridedama deklaracija baigus teikti paramą (toliau – Deklaracija), parengta pagal Finansinio memorandumo [6] III.4.C priede ir Komisijos reglamento [2] III priede pateiktą formą.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais [16], Finansinio audito vadovu, pripažintais Tarptautiniais audito standartais (toliau – TAS) ir 2005 m. balandžio 15 d. EK rekomendacijomis „Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą“ [5] (toliau – EK rekomendacijos), 2008 m. balandžio 23 d. Sanglaudos fondo ir ex-ISPA 2000–2006 m.

¹ Lietuvos Respublikos Seimo 2007-10-11 nutarimu Nr. X-1295 priimta nauja nutarimo redakcija.

² Su vėlesniais pakeitimais.

uždarymo gairėmis [8]. Kaip numatyta Komisijos Reglamento [2] (EB) Nr. 1386/2002 14 straipsnio 1 dalyje, Deklaracija parengta atsižvelgiant į valdymo ir kontrolės sistemų apžiūrą, jau atliktų patikrinimų išvadas ir į papildomą atrankinį operacijų patikrinimą, galutinę ataskaitą, parengtą pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 [1] II priedo F straipsnio 4 dalį.

Auditas suplanuotas ir atliktas siekiant įsitikinti, kad galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje Bendrijos paramos likučiui gauti nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal sprendimo sąlygas ir nustatytus tikslus. Audito metu surinkome visus reikalingus paklausimus, siekdami užtikrinti, kad išlaidų ataskaitos yra teisingos, pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingai atliktos, o projektas įgyvendintas laikantis sprendimo skirti paramą sąlygų ir projekto tikslų.

Mes turėjome pareikšti nuomonę, ar galutinėje išlaidų ataskaitoje pateikta informacija visais svarbiais aspektais yra teisinga, išlaidos padarytos pagal reglamentus, sprendimo dėl projekto reikalavimus ir jo tikslus, o paraiška Komisijai gauti Bendrijos paramos likutį yra pagrįsta. Ši nuomonė reiškia atskirai pateikiamoje Deklaracijoje.

Audito ataskaita parengta remiantis kitų auditorių ir mūsų atliktu darbu, kurį pradėjome 2009 m. sausio 23 d., gavę pavedimą atlikti Projekto baigiamąjį auditą. Audito ataskaita ir Deklaracija pagrįsta iki 2009 m. rugsėjo 16 d. surinktais audito įrodymais.

Ataskaitos 1 priede pateikiamas ataskaitoje vartojamų santrumpų sąrašas.

2. Nustatytų pastebėjimų pobūdis

Audito metu nustatėme ir aprašėme pastebėjimus, kuriuos suskirstėme į kategorijas pagal svarbumo lygį, kuris, mūsų įsitikinimu, turi būti jiems priskirtas:

- *Didelės svarbos pastebėjimai* – dalykai, susiję su Projekto įgyvendinimu ir turį įtakos galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos tikslumui ir teisingumui, į kuriuos aukščiausiojo lygio VI, MI, TI, ir II vadovai turi nedelsdami atkreipti dėmesį ir imtis atitinkamų priemonių.
- *Vidutinės svarbos pastebėjimai* – dalykai, susiję su Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos sektoriaus projektus administruojančių institucijų vidaus kontrolės sistema, į kuriuos nedelsiant turėtų būti atkreiptas šių institucijų atitinkamo lygio vadovų dėmesys.
- *Nedidelės svarbos pastebėjimai* – dalykai, kurie neprieštarauja Komisijos Reglamentams ir Finansiniam memorandumui / Komisijos sprendimams [6, 7] ir yra susiję su vidaus kontrolės nedideliais trūkumais, kuriuos reikia pašalinti, siekiant užtikrinti visapusę atitiktį nacionaliniams teisės aktams.

2.1. Didelės svarbos pastebėjimai

Toliau pateikiami audito metu nustatyti didelės svarbos pastebėjimai:

- **15 845,51 EUR (54 711,40 Lt)** išlaidos, susijusios su techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimu, yra netinkamos finansuoti, rangos sutartyje buvo numatyta, kad rangovas savo lėšomis turi aprūpinti inžinierių (žr. (23) pastebėjimą);
- **7 076,62 EUR (24 434,17 Lt)** išlaidos, susijusios su atsarginių dalių, techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos, vartojimo reikmenų įsigijimu, yra netinkamos finansuoti (žr. (22) pastebėjimą);
- valdymo ir kontrolės sistemos institucijos neužtikrino, kad kokybiškai ir laiku būtų parengta Projekto galutinė ataskaita (žr. (27) pastebėjimą);
- perkančioji organizacija (APVA) atlikdama pirkimą Nr. 36891 (Sutarties Nr. 2006/7/A/PT/LT) neskelbiamų derybų būdu nesilaikė VPI 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir VPI 25 straipsnio 2 dalies nuostatų (žr. (6) pastebėjimą);
- apskaityti ne visi įsipareigojimai bei gautinos sumos MI, II ir galutinio paramos gavėjo apskaitos sistemose (žr. (24) pastebėjimą):
 - ▶ MI savo apskaitos sistemoje apskaitė ne visas pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidas pagal nustatytus pažeidimus ir neparodė įsiskolinimo valstybės biudžetui. Neapskaitytų išlaidų suma – 2 352,75 EUR;
 - ▶ II savo apskaitos sistemoje apskaitė ne visas pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidas pagal nustatytus pažeidimus ir neparodė įsiskolinimo valstybės biudžetui. Neapskaitytų išlaidų suma – 12 414,41 EUR;
 - ▶ kadangi II pagal nustatytus pažeidimus neinformavo apie rastas netinkamas finansuoti išlaidas galutinio paramos gavėjo (ŠRATC), ši savo apskaitos sistemoje neparodė įsiskolinimo valstybės biudžetui. Neapskaitytų išlaidų suma – 64 411,18 EUR.

2.2. Vidutinės ir nedidelės svarbos pastebėjimai

Pagal savo pobūdį vidutinės ir nedidelės svarbos pastebėjimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Vidutinės ir nedidelės svarbos pastebėjimai

Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančios institucijos pavadinimas	Ataskaitos dalis	Pastebėjimų santrauka, nuorodos į pastebėjimus
Vidutinės svarbos pastebėjimai		
VI	9.1	Sistemos veikimo priežiūra numatant ir atliekant patikras buvo atliekama nereguliariai (žr. (1) pastebėjimą).
MI	9.2	Nesilaikyta NFD procedūrų vadove nustatyto atliktų patikrų ataskaitų parengimo termino (žr. (2) pastebėjimą).
APVA	9.3	Patikros vietoje ataskaitos parengtos nesilaikant APVA procedūrų vadove nurodyto termino (žr. (3) pastebėjimą).
APVA	9.3	Nesilaikyta APVA procedūrų vadovo nuostatos dėl patikrų vietoje atlikimo tvarkos (tikrinti kiekvieną darbų sutartį mažiausiai po vieną kartą per metus) (žr. (4) pastebėjimą).
APVA	10	Nesilaikyta APVA procedūrų vadove numatytų procedūrų dėl patikros lapų, susijusių su viešaisiais pirkimais (neužpildyti patikros lapai) (žr. (7) pastebėjimą).
APVA	14	Projekto galutinėje ataskaitoje pateikta informacija neišsami, netiksli ir kai kuriais atvejais neatitinka informacijos, pateiktos kartu su išlaidas pateisinančiais ir apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais (žr. (28) pastebėjimą).
Nedidelės svarbos pastebėjimai		
APVA	9.3	Nesilaikyta APVA procedūrų vadovo nuostatos dėl patikros vietoje atlikimo komisijos sudėties (komisijos veikloje nedalyvavo procedūrų kontrolierius) (žr. (5) pastebėjimą).
APVA	10	Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos (pirkimų Nr. 34231 ir 37830 atveju (sutartis Nr. A/2006/Š13) išsiųstos perkančiosios organizacijos (APVA) Viešųjų pirkimų tarnybai nesilaikant nustatyto termino (žr. (8) pastebėjimą).
APVA	10	Viešųjų pirkimų komisijos protokoluose individualios komisijos narių nuomonės nepateiktos, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme (žr. (9) pastebėjimą).
APVA	10	Viešųjų pirkimų komisijos protokoluose nenurodyta, kad komisija priėmė sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme (žr. (10) pastebėjimą).
APVA	10	APVA, vykdydama savo funkcijas, netinkamai seka vidinių teisės aktų atnaujinimus ir pakeitimus (žr. (11) pastebėjimą).
APVA	10	Perkančioji organizacija (ŠRATC) dėl pirkimo Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240) neišsiuntė pranešimo apie pirkimo sutarties sudarymą kitiems konkurso dalyviams, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme (žr. (12) pastebėjimą).
APVA	10	Perkančioji organizacija (ŠRATC) dėl pirkimo Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240) raštu nepakvietė tiekėjo sudaryti sutartį, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme (žr. (13) pastebėjimą).
APVA	10	Perkančioji organizacija (ŠRATC), priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą Nr. 34231, pradėjęs 5 darbo dienų terminą, per kurį pagal Viešųjų pirkimų įstatymą privalo pranešti kandidatams ir dalyviams apie savo sprendimą (žr. (14) pastebėjimą).
APVA	10	Nesilaikyta APVA procedūrų vadove numatytų procedūrų dėl patikros lapų, susijusių su viešaisiais pirkimais, pildymo (žr. (15) pastebėjimą).
APVA	10	Netinkamai (neišsamiai) pildomos vertinimo lentelės (pirkimas Nr. 33089 (sutartis Nr. A/2006/Š10); pirkimas Nr. 34231/37830 (sutartis Nr. A/2006/Š13); pirkimas Nr. 43757 (sutartis Nr. 2006/17/A/PT/LT); pirkimas Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240)) ir neužtikrinamas tinkamas jų naudojimas (pirkimas Nr. 43757 (sutartis Nr. 2006/17/A/PT/LT); pirkimas Nr. 36891 (sutartis Nr. 2006/7/A/PT/LT)) (žr. (16) pastebėjimą).
APVA	10	Nurodyta viešojo pirkimo komisijos vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros protokolo data yra klaidinga (žr. (17) pastebėjimą).

APVA	10	Įsakymo dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo forma neatitinka APVA procedūrų vadovo prieduose pateiktos formos (žr. (18) pastebėjimą).
APVA	10	Nebuvo laikomasi PRAG 3.3.9.3 straipsnio reikalavimų, pagal kuriuos visi prašymai dėl paaiškinimų turi būti pasirašyti komisijos pirmininko ir komisijos sekretoriaus (žr. (19) pastebėjimą).
APVA	10	Nebuvo laikomasi PRAG 3.3.10.2 straipsnio nuostatos, pagal kurią gautuose pasiūlymuose turi būti įrašyti komisijos pirmininko ir sekretoriaus inicialai (žr. (20) pastebėjimą).
APVA	10	Nebuvo laikomasi PRAG 3.3.10.2 straipsnio nuostatos, pagal kurią gavus vokus su finansiniais pasiūlymais komisijos pirmininkas ir sekretorius turi skersai voko užklajavimo linijos užrašyti savo inicialus (žr. (21) pastebėjimą).
APVA	12	Nebuvo laikomasi Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307, kuriomis remiantis pažeidimo tyrimai turi būti atlikti per 10 darbo dienų nuo jų nustatymo datos (žr. (25) pastebėjimą).
APVA	13	Auditoriumi nepateikti įrodymai dėl 20 ir 15 informacinių stendų įrengimo atitinkamai pagal šias sutartis: Nr. A/2005/S04 ir Nr. A/2005/Š10 (žr. (26) pastebėjimą).
VI	15	Projekto galutinėje mokėjimo paraiškoje pateikta informacija, susijusi su Projekto fiziniu įgyvendinimu, netiksli ir kai kuriais atvejais neatitinka informacijos, pateiktos kartu su išlaidas pateisinančiais ir apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais (žr. (29) pastebėjimą).

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

2.3. Išvados dėl atitikties Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 ir Finansinio memorandum (EK sprendimo) reikalavimams

Mūsų nuomone, valdymo ir kontrolės sistema Projekto atžvilgiu tenkina Komisijos reglamento [2] ir Finansinio memorandum [6] reikalavimus, išskyrus kai kuriuos pastebėjimus, pateiktus šios ataskaitos 9 – 15 dalyse.

Projekto galutinė ataskaita parengta pagal Komisijos reglamento [1] reikalavimus, joje Projektui nustatyti tikslai atskleisti, išskyrus kai kuriuos pastebėjimus.

Projekto galutinė išlaidų ataskaita ir galutinė mokėjimo paraiška visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo padarytas išlaidas.

3. Rekomendacijos

Valdymo ir kontrolės sistemai tobulinti pateiktos 4 rekomendacijos. Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas ataskaitos 3 priede.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

4. Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančios institucijos

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Sanglaudos fondo administravimui taikomi Europos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentai. Komisijos reglamente [2] valstybei, gaunančiai Sanglaudos fondo lėšas, nustatyti reikalavimai dėl valdymo ir kontrolės sistemos.

Vykdydama minėtą reglamentą Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 [13] patvirtino Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės, kuriose nustatė institucijų funkcijas ir teises. Šiuo metu visus Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus aplinkos apsaugos projektus (projektus, pradėtus įgyvendinti pagal ISPA programą ir tęsiamus iš Sanglaudos fondo lėšų) administruojančios institucijos yra šios:

LR finansų ministerija	– vadovaujančioji institucija;
	– auditą koordinuojanti institucija;
	– mokėjimo institucija;
LR aplinkos ministerija	– tarpinė institucija;
	– atrankinius patikrinimus atliekanti institucija;
Aplinkos projektų valdymo agentūra	– įgyvendinančioji institucija;
Europos Komisijos, vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovai	– SF priežiūros komitetas;
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	– galutinis paramos gavėjas.

5. Bendroji informacija apie projektą

Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ buvo patvirtintas Finansiniu memorandumu [6], kurį 2001 m. gruodžio 21 d. pasirašė Europos Komisija, o 2002 m. liepos 2 d. – Lietuvos Respublika. Finansinis memorandumas pakeistas³ 2006 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2006) 5294 [7].

³ 2006 m. spalio 27 d. pakeitimas nekeičia EK paramos dydžio, bet yra susijęs su projekto pabaigos datos pratęsimu ir projekto fizinių apimčių pakeitimu, tačiau išlaikant projekto pagrindinius tikslus.

Pagrindiniai Projekto tikslai:

- regioninės atliekų tvarkymo įmonės, kuri būtų atsakinga už atliekų tvarkymą ir šalinimą bei už pagalbos savivaldybėms teikimą atliekų tvarkymo srityje, steigimas;
- atliekų surinkimo paslaugų tobulinimas ir išplėtimas, kad jos apimtų 95 proc. gyventojų;
- konteinerinių aikštelių bendruomenėms įrengimas, nerenkant atliekų iš kiekvieno namo atskirai;
- 116 regioninių mažųjų neatitinkančių reikalavimų sąvartynų uždarymas;
- Šiaulių miesto Kairių sąvartyno uždarymas (1 etapas);
- ekologinių atliekų surinkimo aikštelių, kur gyventojai galėtų atnešti perdirbti tinkamas medžiagas, pavojingas atliekas ir kur būtų kompostuojamos žaliosios atliekos, įrengimas;
- naujo sąvartyno statyba pagal naujausias technologijas;
- duomenų apie atliekų kiekį ir sudėtį rinkimas.

2 lentelėje pateikiama informacija apie Finansiniu memorandumu Projektui patvirtintas išlaidas ir jų tinkamumo laikotarpį.

2 lentelė. Finansiniu memorandumu Projektui patvirtintos išlaidos

Finansiniu memorandumu projektui patvirtintos išlaidos	EUR	%
Iš viso projekto išlaidos (su PVM)	11 094 360	
Netinkamos finansuoti projekto išlaidos (PVM)	(1 692 360)	
Tinkamos finansuoti projekto išlaidos, patvirtintos Finansiniu memorandumu	9 402 000	
Lietuvos valstybės paramos dydis nuo tinkamų finansuoti Projekto išlaidų:	4 316 880	44
iš kurių EIB paskolos lėšos	2 080 000	22
Tinkamų finansuoti Projekto išlaidų periodai		
Darbams, patvirtintiems Finansiniu memorandumu	2001-12-21 – 2006-12-31	
Išlaidoms, susijusioms su Projekto pakeitimais, patvirtintoms		
Komisijos sprendimu Nr. K(2006) 5294	2005-09-09 – 2008-12-31	

Šaltiniai: Finansinis memorandumas / Komisijos sprendimas [6, 7]

Finansiniame memorandume [6] patvirtinti Projekto darbai:

- paslaugų sutartis dėl techninės pagalbos institucinei plėtrai, projekto rengimui ir projektavimui;
- darbų sutartis dėl vietos parengimo (ekologinės atliekų surinkimo aikštelės, surinkimo aikštelės);
- darbų sutartis dėl sąvartynų valdymo (miesto sąvartynų rekonstrukcija, mažų sąvartynų uždarymas);
- darbų sutartis dėl Kairių sąvartyno uždarymo;
- prekių sutartis dėl sąvartynų autotransporto priemonių;
- darbų sutartis dėl naujo sąvartyno (sąvartyno statyba, privažiavimo kelio pagerinimas, kiti darbai);
- paslaugų sutartis dėl projekto priežiūros ir techninės pagalbos.

Komisijos sprendimu [7] Finansiniame memorandume patvirtinti Projekto darbai buvo pakeisti ir išdėstyti taip:

- paslaugų sutartis dėl techninio projekto;
- darbų sutartis dėl regioninio sąvartyno ir jo pagalbinių dalių statybos;
- darbų sutartis dėl privažiavimo kelio iki sąvartyno tiesimo;
- darbų sutartis dėl mažųjų sąvartyno uždarymo ir atliekų priėmimo punktų statybos;
- darbų sutartis dėl atliekų surinkimo aikštelių statybos;
- darbų sutartis dėl Kairių sąvartyno uždarymo (1 etapas);
- darbų sutartis dėl žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės statybos Kairių sąvartyne;
- tiekimo sutartis dėl sąvartyno įrangos;
- paslaugų sutartis dėl techninės pagalbos regioniniam atliekų tvarkymo centrui;
- paslaugų sutartis dėl statybos darbų techninės priežiūros.

Finansiniame memorandume [6] ir jį pakeitusiame / papildžiusiame Komisijos sprendime [7] numatyti patvirtintų Projekto darbų fiziniai indikatoriai pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. Finansiniu memorandumu / Komisijos sprendimais patvirtinti fiziniai indikatoriai

Fizinis indikatorius	Matavimo vnt.	Kiekis Komisijos sprendimas K(2006) 5294
Naujo sąvartyno statyba		
Atliekų priėmimo punktas, įrengimai ir pastatai	skaičius	1
Žemės darbai	m ²	70 000
Dugno sluoksnio įrengimas	m ²	41 000
Filtrato surinkimas ir šalinimo sistema	kiekis	1
Privažiavimo kelias	m ²	2050
Kilnojamoji įranga ir mašinos:		
*Tankintuvas	vienetai	1
* Sunkvežimis	vienetai	1
* Ekskavatorius	vienetai	1
* Daugjafunkcinis traktorius	vienetai	1
* Mobilus komposto smulkintuvas	vienetai	1
* Komposto vartytuvas	vienetai	1
* 30 m ³ talpos konteineriai	vienetai	6
Kairių sąvartyno uždarymas ir rekultivavimas (1 etapas)		
Filtrato surinkimo ir šalinimo sistema	vienetai	1
Kaimyninių ir kaimo vietovių sąvartynai/sąvartos vietos		
Sąvartynų uždarymas	skaičius	116
Sąvartyno teritorijos uždengimas	ha	134,5
Atliekų priėmimo punktai		
Regioniniai punktai	skaičius	6
Aplinkinės teritorijos	skaičius	28
Konteinerių aikštelės		
A rūšis - tik atliekos	skaičius	165
B rūšis - atliekos ir perdirbamos atliekos	skaičius	82

Šaltiniai – Finansinis memorandumas / Komisijos sprendimas [6, 7]

Projekto įgyvendinimo metu pasirašytos šešios rangos darbų ir trys paslaugų sutartys, septynios įrangos tiekimo sutartys. Informacija apie Projekto rangos darbų ir paslaugų sutartis ir atliktus mokėjimus pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Projekto įgyvendinimo statybos darbų rangos, paslaugų ir įrangos tiekimo sutartys

Sutarties pasirašymo data	Sutarties Nr.	Rangovas / paslaugų teikėjas	Sutarties objektas	Sutarties suma be PVM, EUR	EK deklaruotų išlaidų suma, EUR
Statybos darbų rangos sutartys					
2004-07-14	A/2004/S02	UAB „Šiaulių kelias“	Kompostavimo aikštelės įrengimas	299 790,00	299 790,00
2005-07-08	A/2005/S04	VĮ „Šiaulių regiono keliai“	Atliekų priėmimo punktų statyba	1 074 193,99	1 074 193,53
2005-07-08	A/2005/S05	AS „Merko Ehitus“	Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba	2 740 848,01	2 663 476,34
2006-05-04	A/2006/Š13	UAB „Šiaulių plentas“	Kairių sąvartyno uždarymo I etapas	1 933 438,37	1 903 740,76
2005-12-15	A/2005/Š10	UAB „NCC titanas“	Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas	1 914 765,41	1 842 665,82
2006-09-11	A/2006/Š/15	UAB „Kamesta“	Privažiavimo kelio į naują Aukštrakių sąvartyną statyba	554 204,86	554 204,86
Paslaugų sutartys					
2003-09-08	EuropeAid/11427 7/D/SV/LT	WSP International Sweden AB	Techninės ir konkursinės dokumentacijos parengimas	594 000,00	594 000,00
2004-06-30	ISPA/12/SV/LT	VšĮ „Projektų vadybos grupė“	Techninė pagalba VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui (ŠRATC)	198 610,00	189 256,21
2004-09-16	EuropeAid/11650 7/D/SV/LT	M&S Umwelprojekt GmbH	Techninė priežiūra	289 950,00	289 950,00
Įrangos tiekimo sutartys					
2006-03-28	2006/5/A/PT/LT	UAB „Oksata“	Atliekų tankintuvo įsigijimas	220 090,94	220 090,94
2006-06-22	2006/9/A/PT/LT	UAB „Silberauto“	Sunkvežimio su priekaba įsigijimas	118 418,14	118 418,14
2006-05-31	2006/7/A/PT/LT	UAB „Intrac Lietuva“	Daugiafunkcinio traktoriaus įsigijimas	66 610,80	66 610,80
2006-12-28	2006/17/A/PT/LT	UAB „Balžuva“	Kompostuojamų atliekų smulkintuvas JENZ AZ 30	90 969,65	90 969,65
2007-06-20	A/2007/S/27	UAB „Kelių mašinos“	Komposto vartytuvas-kaušas (ALLU SC2-20)	28 151,07	28 151,07
2006-03-28	2006/6/A/PT/LT	UAB „ARGO ekspresas“	Konteinerių įsigijimas	18 414,62	18 414,62
2008-09-08	S-08-240	UAB „Mecro Technikonas“	Ekskavatoriaus pirkimas	97 022,70	97 022,70
Iš viso				10 239 478,56	10 050 955,44

Šaltinis – APVA, MI

6. Reikšmingumo ir patikimumo lygis

Auditas buvo suplanuotas taip, kad atitiktų Komisijos reglamento [2] reikalavimus ir būtų atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Finansinio audito vadovą ir Tarptautinius audito standartus, patvirtintus Tarptautinės apskaitininkų federacijos.

Projekto baigiamojo audito reikšmingumą nustatėme remdamiesi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009 m. gegužės 11 d. raštu Nr. (18.27.8-01)-6K-0904922 mums vertinti pateikta galutine išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška. Projekto baigiamajam auditui taikytas reikšmingumo lygis – 2 proc. visų EK deklaruotų Projekto tinkamų išlaidų, t.y. 10 050 955,44 EUR. Atliekamo audito reikšmingumo suma (201 019,11 EUR) – didžiausia priimtina klaidų suma, leistina paklaida (100 509,55 EUR) – 1 proc. visų EK deklaruotų Projekto tinkamų išlaidų.

Pagal reikšmingumo lygį nustatoma, ar pastebėtos pavienės klaidos, praleisti ar netinkamai pateikti duomenys arba jų visuma rodo, kad EK pateikiama galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška Bendrijos paramos likučiui gauti visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo padarytas išlaidas.

Auditą suplanavome ir atlikome taip, kad būtume 95 proc. tikri pareikšdami nuomonę dėl galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Bendrijos paramos likučiui gauti teisingumo ir pagrįstumo. 95 proc. patikimumo lygį pasiekėme:

- vertindami Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistemą ir vykdomų kontrolės priemonių veikimą;
- atlikę detalius testus.

Audito metu pasiekėme 95 proc. patikimumo lygį, atsižvelgę į šiuos dalykus:

- išsamią rizikos analizę, atliktą audito planavimo stadijoje, kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;
- rašytinių procedūrų (pakeitimų) peržiūrą ir nuoseklios peržiūros testus;
- rašytinių procedūrų laikymosi patikrinimą (kontrolės testai), įskaitant patikras vietoje;
- savarankiškas audito procedūras (detalius testus);
- Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų patikrų vietoje / patikrinimų rezultatų peržiūrą;
- išorės auditorių ataskaitų peržiūrą;
- auditų Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektus administruojančiose institucijose patirtį;
- teigiamą Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų požiūrį į auditą.

7. Audito metodai

Atsižvelgiant į audito tikslus ir siekiant gauti pakankamų patikimų ir tinkamų audito įrodymų, audito procedūras pagal Europos Sąjungos sanglaudos fondo projektų audito paslaugų teikimo 2008-12-18 sutartį Nr. 2008/12-30/FAS, sudarytą tarp UAB „Ernst & Young Baltic“ ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, taikydami 600 TAS, atliko valstybiniai auditoriai (toliau – pagrindinis auditorius) ir UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – kitas auditorius).

Pagrindinis auditorius, planuodamas panaudoti kito auditoriaus darbą, įvertino kito auditoriaus darbą pagal:

- Europos Komisijos (EK) Gaires dėl pasitikėjimo kito auditoriaus darbu (angl. *Guidance note on the concept of reliance on the work of other auditors*);
- Tarptautinės apskaitininkų federacijos Valstybinio sektoriaus komiteto parengtą 4 studiją „Kito auditoriaus darbo naudojimas: taikymas valstybiniame sektoriuje“.
- Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) parengtų audito standartų įgyvendinimo Europoje 25 gairę;
- Valstybinio audito 12 reikalavimą;
- Specialistų (ekspertų) ir kitų išorės auditorių pasitelkimo ir jų darbo panaudojimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2008-07-17 įsakymu Nr. V-161.

Šio darbo metu buvo įvertinta kito auditoriaus organizacinė struktūra, nepriklausomumas, profesinė kompetencija ir gebėjimai.

Kitas auditorius atliko Valstybinio audito reikalavimuose ir 500 TAS numatytas audito procedūras:

- įrašų ir dokumentų tikrinimą;
- ilgalaikio materialiojo turto tikrinimą (patikros vietoje metu);
- paklausimus (auditorių pateiktus klausimus, atsakymų vertinimus);
- perskaičiavimą (dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio tikslumo tikrinimas);
- analitinės procedūras.

Audito tikslams atskleisti buvo parengtos trys audito programos:

- valdymo ir kontrolės sistemos veikimui įvertinti;
- projekto tikslų atskleidimui galutinėje ataskaitoje įvertinti;
- galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje nurodytoms išlaidoms, pagrindinių operacijų atlikimui įvertinti.

Vienas iš audito tikslų – atlikti valdymo ir kontrolės sistemos vertinimą projekto atžvilgiu, todėl audito metu Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų vidaus kontrolės veikimui įvertinti skirtas atitinkamas dėmesys. Siekdamas įsitikinti, kad

vidaus kontrolės egzistuoja ir praktikoje veikia pakankamai, kitas auditorius, atlikdamas audito procedūras, vertino tam tikrų kontrolės grupių – veiklos kontrolės, patikrų vietoje / patikrinimų, apskaitos ir mokėjimų kontrolės – veikimą praktikoje, atlikimą laiku, taikymą visiems atvejams ir gebėjimą nustatyti ir taisyti klaidas. Šiems tikslams pasiekti buvo parengta audito programa.

Kitas auditorius audito metu vertino šias Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų taikomas kontrolės priemones:

- APVA kontrolės priemonės, taikomas apmokėjimo sąskaitai (mokėjimo prašymui) vertinti;
- APVA, MI, VI kontrolės priemonės, susijusias su patikromis vietoje / patikrinimais, viešaisiais pirkimais, mokėjimo procedūromis, apskaita ir kt.

Vidaus kontrolę kitas auditorius testavo šiais audito metodais:

- nuoseklios peržiūros testais ir pokalbiais su darbuotojais, norėdami įsitikinti kontrolės priemonių buvimu;
- kontrolės testais;
- patikromis vietoje / patikrinimais, ataskaitų peržiūra (kur tinkama);
- išorės audito ataskaitų peržiūra (kur tinkama).

Norėdamas įsitikinti, ar Sanglaudos fondo aplinkos sektoriaus projektus administruojančiose institucijose sukurta valdymo ir kontrolės sistema atitinka Komisijos reglamente [2] ir Finansiniame memorandume [6] nustatytus reikalavimus, kitas auditorius vertino:

- likutinę riziką, susijusią su valdymo ir kontrolės sistema;
- viešuosius pirkimus;
- Projekto administracinį techninį valdymą ir įgyvendinimą;
- MI, APVA atliktas Projekto patikras vietose.

Kitas auditorius, vertindamas viešųjų pirkimų sistemą, peržiūrėjo:

- EK misijų Nr. 2006/LT/REGIO/13/488/1 (tyrimas: 2006/SF/Viešieji pirkimai 10 ES valstybių narių) ir Nr. 2005/LT/REGIO/I3/235/1 (tyrimas: 2005/SF/Viešieji pirkimai 10 naujų ES valstybių narių) audito ataskaitų pastebėjimus;
- pirkimo dokumentus;
- visas sudarytas sutartis ir jų pakeitimus;
- visus pakeitimų orderius, kuriais buvo įforminami darbų pakeitimai / papildymai.

Siekdamas įvertinti viešųjų pirkimų sistemą, kitas auditorius patikrino penkias statybos darbų rangos, tris įrangos tiekimo ir tris paslaugų sutartis⁴.

⁴ Sutartys Nr. A/2004/S02, Nr. A/2005/S04, Nr. A/2005/S05, Nr. A/2006/Š/13, Nr. A/2005/Š10, Nr. 2006/7/A/PT/LT, Nr. 2006/17/A/PT/LT, Nr. S-08-240, Nr. Europe Aid/11427/7/D/SV/LT, Nr. ISPA/12/SV/LT, Nr. Europe Aid/11650/7/D/SV/LT.

Audito metu vertindamas, ar viešieji pirkimai buvo vykdomi *pagal PRAG procedūras*, kitas auditorius atliko kontrolės (atitikimo) testus, kuriuose išskyrė klausimų grupes pagal šias viešųjų pirkimų sritis:

- pranešimo apie viešuosius pirkimus paskelbimas;
- konkurso dokumentai;
- pasiūlymų konkursui teikimas;
- vertinimo komitetas;
- pasiūlymų vertinimas (techninių ir finansinių pasiūlymų vertinimas);
- sutarties sudarymas ir informacijos apie sudarytą sutartį paskelbimas.

Tikrindamas, ar viešieji pirkimai buvo vykdomi *pagal Viešųjų pirkimų įstatymą*, kitas auditorius atliko kontrolės (atitikimo) testus, kuriuose išskyrė klausimų grupes pagal šias viešųjų pirkimų sritis:

- konfidencialumo reikalavimas;
- pirkimo būdas;
- pirkimo vertės skaičiavimas;
- viešojo pirkimo komisija, pirkimų ataskaitos;
- viešųjų pirkimų skelbimai;
- pirkimo dokumentai, pirkimo dokumentų teikimas tiekėjams;
- paraiškų ir pasiūlymų pateikimas, vokų su pasiūlymais atplėšimas;
- tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas;
- pasiūlymų vertinimas ir palyginimas;
- pirkimo nutraukimo procedūra / pirkimo sutarties sudarymas ir informacijos apie sudarytą sutartį paskelbimas.

Kitas auditorius atliko Sanglaudos fondo projektus administruojančių institucijų atliktų patikrų vietose / patikrinimų rezultatų ir jų įforminimo vertinimą.

Kitas auditorius vertino Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnybos (AM VAT) atliktą darbą, susijusį su Projekto atrankiniais patikrinimais – ar atliktas pagal Komisijos reglamentą [2] ir LR teisės aktus. Patikrino deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimų planavimą, planų vykdymą ir vidaus auditorių atliekamų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimų kokybę.

Vertindamas Projekto administracinį techninį valdymą ir įgyvendinimą, kitas auditorius:

- peržiūrėjo rangos darbų ir paslaugų sutartis, jų pakeitimus / papildymus, pagal FIDIC Raudonąją knygą pasirašytų sutarčių kiekio žiniaraščius, pagal FIDIC Geltonąją knygą pasirašytų sutarčių suvestines sumų lenteles;
- peržiūrėjo Projekto techninio prižiūrėtojo parengtus dokumentus: pradinę ataskaitą, tarpines darbų pažangos ir galutinės techninės priežiūros ataskaitas;

- teikė paklausimus galutiniam paramos gavėjui, APVA atsakingiems darbuotojams;
- testais patikrino, ar:
 - ▶ visi darbai (statiniai), nurodyti rangos darbų sutartyse, buvo pripažinti tinkami naudoti, ar statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktai parengti laikantis nacionalinių teisės aktų;
 - ▶ faktiškai atlikti darbai atitinka Finansiniame memorandume / Komisijos sprendime [6, 7] patvirtintus Projekto fizinius indikatorius;
 - ▶ išlaidos visiems darbams, kurie numatyti Finansiniame memorandume / Komisijos sprendime [6, 7], buvo patirtos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu;
 - ▶ visas už paramos lėšas įsigytas turtas nurodytas Galutinio paramos gavėjo apskaitoje;
 - ▶ darbų pakeitimo mastas, atlikus visų 33 pakeitimų orderių peržiūrą, turėjo įtakos sutartyse numatytų techninių užduočių pakeitimui;
 - ▶ audito išankstinio planavimo metu nustatė riziką, kad pagal visas rangos sutartis galėjo būti finansuotos išlaidos, susijusios su techninės priežiūros inžinieriaus aptarnavimu, įvertino šių išlaidų pobūdį ir tinkamumą finansuoti.

Vertindamas, ar Projekto audito seka yra tinkama, kitas auditorius atliko Projekto galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje nurodytų visų EK deklaruotų tinkamų išlaidų bendros sumos sutikrinimus su visais APVA pateiktais:

- išlaidas pateisinančiais dokumentais⁵;
- išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais⁶;
- apmokėjimo sąskaitų duomenimis.

Kad įsitikintų, ar Projekto galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška visais reikšmingais atžvilgiais tinkamai nurodo padarytas išlaidas, kitas auditorius parengė Projekto galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos audito programą.

Didžioji dalis įrodymų dėl audito patikimumo turi būti gauta atlikus detalius testus, taigi kitas auditorius atliko ir išlaidų pakankamos apimties savarankiškas procedūras.

Atsižvelgiant į tai, kad tarpinėse ir galutinėje išlaidų ataskaitose ir mokėjimo paraiškose EK tinkamos finansuoti išlaidos deklaruotos remiantis apmokėtomis sąskaitomis, siekiant tam tikrų Projekto baigiamąją deklaraciją rengiančiai institucijai iškeltų tikslų ir sprendžiant atitinkamus uždavinius, audito metu buvo atliekamas šis pagrindinis darbas:

- kontrolės (atitikimo) testavimas, t.y. buvo atlikti apmokėjimo sąskaitų administravimo kontrolės testai;
- apmokėtų apmokėjimo sąskaitų detalus testavimas.

⁵ Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-08-16 įsakymo Nr. 1K-288 2 p. išlaidas pateisinantys dokumentai: rangovų (paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų) pateiktos sąskaitos, perdavimo-priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai ir kt. dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas.

⁶ Ten pat, išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai – banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš banko sąskaitos ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

Siekdamas padidinti audito efektyvumą, kitas auditorius išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detalaus patikrinimo testus sujungė. Taigi atliko tiek pat išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detalių testų. Atlikdamas kontrolės (atitikimo) ir detalių testavimą, kitas auditorius išskyrė šias su pagrindinėmis kontrolės priemonėmis susijusias klausimų grupes:

- apmokėjimo sąskaitos pagrįstumas / išlaidų tinkamumo vertinimas;
- mokėjimo atlikimas;
- mokėjimų apskaita.

Pavyzdžius viešųjų pirkimų procedūrų kontrolės (atitikimo) ir detaliam tikrinimui kitas auditorius atrinko remdamasis Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateikta informacija apie projekto pasirašytų sutarčių verčių duomenis, kurioje nurodoma, kad Projekto visų šešiolikos sutarčių suma – 10 239 478,56 EUR.

Projekto įgyvendinimo metu pasirašytos ir įgyvendintos šešios rangos darbų ir trys paslaugų sutartys, septynios įrangos tiekimo sutartys (10 239 478,56 EUR). 5 lentelėje pateikiama audituojamo Projekto pasirašytų sutarčių duomenų visuma ir detaliam viešųjų pirkimų procedūrų testavimui atrinkti pavyzdžiai.

Kitas auditorius pavyzdžius viešųjų pirkimų procedūrų tikrinimui ir detaliam testavimui atrinko taikydamas šiuos būdus:

- Vadovaudamasis 530 TAS, dėl rizikų, nustatytų išankstinio planavimo (tyrimo) metu, atrinkdamas pavyzdžius kontrolės (atitikimo) ir detaliam patikrinimui, taikė specifinių objektų (*svarbūs objektai*) parinkimo būdą. Viešųjų pirkimų sutartys, kurių individuali pasirašytos sutarties vertė viršijo leistiną paklaidą 102 395 EUR (t.y. 1 proc. nuo visų pasirašytų sutarčių sumos 10 239 478,56 EUR, neįvertinus EK sprendimo biudžetą viršijančios dalies, finansuojamos iš LR biudžeto lėšų), sudarė tikrinimo visumą. Tačiau sutartys, patekusios į tikrinamų sutarčių imtį ir kurioms jau buvo atliktos tarpinės institucijos viešojo pirkimo procedūros patikros (žr. 4 priedas), detaliam pertikrintos 50 proc. Tačiau į tikrinamą visumą papildomai įtraukta įrangos tiekimo sutartis, kurios pirkimo būdas buvo „Neskelbiamos derybos“ ir dar viena individualiai nereikšminga įrangos tiekimo sutartis. Viešųjų pirkimų procedūrų tikrinimui buvo atrinktos 5 statybos darbų rangos, 3 paslaugų ir 3 įrangos tiekimo sutartys, kurių pasirašytų sutarčių verčių suma sudaro 9 300 198,94 EUR, arba 91 proc. visų pasirašytų sutarčių vertės sumos.
- Į tikrinamą visumą nepateko 1 statybos darbų rangos ir 4 įrangos tiekimo sutartys, kurių kiekvienos vertės suma arba neviršijo leistinos paklaidos sumos, t. y. 102 395 EUR (t.y. 1 proc. nuo visų pasirašytų sutarčių sumos 10 239 478,56 EUR, neįvertinus EK sprendimo biudžetą viršijančios dalies, finansuojamos iš LR biudžeto lėšų), arba jai buvo atlikta tarpinės institucijos viešojo pirkimo procedūros patikra, kaip aprašyta šios ataskaitos 4 priede pateiktoje suvestinėje Projekto patikrų lentelėje.

5 lentelė. Projekto pasirašytų sutarčių duomenų visuma viešųjų pirkimų procedūrų testavimui (detalizuota pagal sutartis)

Sutarties pasirašymo data	Sutarties Nr.	Rangovas / paslaugų teikėjas	Sutarties objektas	Sutarties suma be PVM, EUR
Individualiai reikšmingos statybos darbų rangos, paslaugų ir įrangos tiekimo sutartys:				
2004-07-14	A/2004/S02	UAB „Šiaulių kelias“	Kompostavimo aikštelės įrengimas	299 790,00
2005-07-08	A/2005/S04	VĮ „Šiaulių regiono keliai“	Atliekų priėmimo punktų statyba	1 074 193,99
2005-07-08	A/2005/S05	AS „Merko Ehitus“	Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba	2 740 848,01
2006-05-04	A/2006/Š13	UAB „Šiaulių plentas“	Kairių sąvartyno uždarymo I etapas	1 933 438,37
			Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas	1 914 765,41
2005-12-15	A/2005/Š10	UAB „NCC titanas“		
	EuropeAid/11427			
2003-09-08	7/D/SV/LT	WSP International Sweden AB	Techninės ir konkursinės dokumentacijos parengimas	594 000,00
			Techninė pagalba VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC)	198 610,00
2004-06-30	ISPA/12/SV/LT	VšĮ „Projektų vadybos grupė“		
	EuropeAid/11650			
2004-09-16	7/D/SV/LT	M&S Umwelprojekt GmbH	Techninė priežiūra	289 950,00
2008-09-08	S-08-240	UAB „Mecro Technikonas“	Ekskavatoriaus pirkimas	97 022,70
Iš viso individualiai reikšmingų sutarčių suma:				9 142 618,48
Individualiai nereikšmingos statybos darbų rangos, paslaugų ir įrangos tiekimo sutartys, papildomai įtrauktos į visumą:				
2006-05-31	2006/7/A/PT/LT	UAB „Intrac Lietuva“	Daugiafunkcinio traktoriaus įsigijimas	66 610,80
2006-12-28	2006/17/A/PT/LT	UAB „Balžuva“	Kompostuojamų atliekų smulkintuvas JENZ AZ 30	90 969,65
Iš viso papildomai įtrauktų sutarčių suma:				157 580,45
Į tikrinamą visumą nepatekę statybos darbų rangos ir įrangos tiekimo sutartys:				
2006-09-11	A/2006/Š/15	UAB „Kamesta“	Privaziavimo kelio į naują Aukštrakių sąvartyną statyba	554 204,86
2006-03-28	2006/5/A/PT/LT	UAB „Oksata“	Atliekų tankintuvo įsigijimas	220 090,94
2006-06-22	2006/9/A/PT/LT	UAB „Silberauto“	Sunkvežimio su priekaba įsigijimas	118 418,14
2007-06-20	A/2007/S/27	UAB „Kelių mašinos“	Komposto vartytuvai-kaušas (ALLU SC2-20)	28 151,07
2006-03-28	2006/6/A/PT/LT	UAB „ARGO ekspresas“	Konteinerių įsigijimas	18 414,62
Iš viso individualiai nereikšmingų sutarčių suma:				939 279,63
Iš viso				10 239 478,56

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

Audito metu kitas auditorius 100 proc. patikrino:

- visų pagal rangos darbų, paslaugų ir įrangos tiekimo sutartis išrašytų sąskaitų faktūrų įvedimą į galutinio paramos gavėjo apskaitos programos nebaigtos statybos sąskaitą, o darbams pasibaigus – į ilgalaikį turtą, atsargas ir sąnaudas;
- visų pagal rangos darbų, paslaugų ir įrangos tiekimo sutartis išrašytų sąskaitų faktūrų apmokėjimus su NFD pateikta apmokėjimų detalizacija bei su Lietuvos banko pagal mokėjimų prašymus pervestomis sumomis.

Atliktų darbų aktų individualių išlaidų pozicijų pavyzdžius detaliam testavimui kitas auditorius atrinko remdamasis 2009 m. gegužės 11 d. Finansų ministerijos raštu Nr. (18.27.8-01)-6K-0904922 jiems vertinimui pateiktos Projekto galutinės išlaidų ataskaitos duomenimis, kurioje nurodyta EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma pagal rangos darbų sutartis – 8 338 071,31 EUR (visa EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma – 10 050 955,44 EUR).

6 lentelėje pateikiama audituojamo Projekto išlaidų duomenų visuma (Projekto tinkamų finansuoti išlaidų laikotarpiu apmokėtos sąskaitos (mokėjimo prašymai)) detalizuota pagal sutartis ir atliktų darbų aktų pozicijas, taip pat kontrolės (atitikimo) ir detaliam testavimui atrinkti pavyzdžiai.

Siekdamas padidinti audito efektyvumą, gauti pakankamų, tinkamų ir patikimų audito įrodymų, reikalingų nuomonei Deklaracijoje pareikšti, ir vadovaudamasis išankstinio planavimo metu surinkta informacija, kitas auditorius taikė statistinę atranką. Tiriamąją duomenų visumą jis suskaidė pagal sutartis; pagal riziką ir piniginę vertę suskirstė į dvi subvisumas.

Pavyzdžius išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detaliam testavimui kitas auditorius atrinko taikydamas šiuos būdus:

- vadovaudamasis 530 TAS, dėl rizikų, nustatytų išankstinio planavimo (tyrimo) metu, atrinkdamas pavyzdžius kontrolės (atitikimo) ir detaliam patikrinimui taikė specifinių objektų (*svarbūs objektai*) parinkimo būdą. Šios pagal rangos darbų sutartis apmokėtos atliktų darbų aktų pozicijos, kurių suma – 5 554 803,47 EUR (55,3 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų), sudarė 1 subvisumos imtį;
- atsižvelgdamas į rangos darbų sutarčių pozicijoms taikomą didesnę riziką dėl išlaidų atitikties tinkamumo taisyklėms, rangos darbų sutarčių, kurios nepateko į 1 subvisumą, atrinkdamas pavyzdžius kontrolės (atitikimo) ir detaliam patikrinimui taikė statistinės atrankos bei 530 TAS numatytą specifinių objektų parinkimo būdą. Taigi, į 1 subvisumą nepatekusių rangos sutarčių atliktų aktų pozicijos, kurių suma – 223 076,61 EUR (2,2 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų), sudarė 2 subvisumos imtį;
- tikrino visas (100 proc.) pagal paslaugų sutartis išrašytas apmokėjimo sąskaitas, jų suvedimą į galutinio paramos gavėjo apskaitos programą ir išrašytų sąskaitų faktūrų atitiktį pasirašytoms

sutartims, kurių suma – 1 073 206,21 EUR (10,7 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų);

- tikrino visas (100 proc.) pagal įrangos tiekimo sutartis išrašytas apmokėjimo sąskaitas, jų suvedimą į galutinio paramos gavėjo apskaitos programą ir išrašytų sąskaitų faktūrų atitiktį pasirašytoms sutartims, kurių suma – 639 677,92 EUR (6,4 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų).

Taigi, atlikdamas kontrolės (atitikimo) ir detalių EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų (atliktų rangos darbų pozicijų) testavimą, kitas auditorius patikrino 74,5 proc. visų jiems vertinti 2009 m. gegužės 11 d. Finansų ministerijos raštu Nr. (18.27.8-01)-6K-0904922 pateiktoje galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje deklaruotų išlaidų sumos (iš jų 57,5 proc. atlikdamas atliktų rangos darbų pozicijų testavimus ir 17,0 proc. tikrindamas pagal paslaugų ir įrangos tiekimo sutartis išrašytas apmokėjimo sąskaitas, jų suvedimą į galutinio paramos gavėjo apskaitos programą ir atitiktį pasirašytoms paslaugų sutartims).

Audito metu kitas auditorius taip pat patikrino 79,5 proc. išrašytų PVM sąskaitų faktūrų atitiktį atliktų darbų aktams ir apmokėjimo sąskaitoms (žr. 7 lentelę). Jas atrinkdami taikė specifinių objektų (*svarbūs objektai*) parinkimo būdą. Tikrinimo visumą sudarė PVM sąskaitos faktūros, kurių individuali vertė viršijo leistiną paklaidą 101 194,69 EUR (t. y. 1 proc. nuo visų apskaitoje užregistruotų PVM sąskaitų faktūrų vertės 10 119 468,92 EUR) ir po vieną didžiausios vertės PVM sąskaitą faktūrą iš likusių ir į imtį nepateikusių sutarčių.

6 lentelė. Projekto išlaidų duomenų visuma pavyzdžiams atrinkti ir atrinkti pavyzdžiai išlaidų testavimui (detalizuota pagal sutartis ir atliktų darbų aktų pozicijas)

Rangos ir paslaugų sutarčių Nr.	EK deklaruotų Projekto tinkamų išlaidų visuma		Iš viso detaliam išlaidų testavimui atrinkta, iš jų:		Pavyzdžiai, atrinkti iš 1 subvisumos		Pavyzdžiai, atrinkti iš 2 subvisumos	
	(atliktų darbų aktų pozicijos)				(svarbūs objektai)		(atsitiktinė atranka)	
	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR
Statybos darbų rangos sutartys								
A/2004/S02	119		16		15		1	
		299 790,00		249 444,06		248 851,43		592,63
A/2005/S04	82		42		41		1	
		1 074 193,53		993 673,83		983 826,75		9 847,08
A/2005/S05	916		32		19		13	
		2 663 476,34		1 671 633,61		1 553 303,07		118 330,54
A/2006/Š13	501		32		25		7	
		1 903 740,76		1 292 161,43		1 265 304,39		26 857,04
A/2005/Š10	379		27		18		9	
		1 842 665,82		1 072 108,39		1 004 659,07		67 449,32
A/2006/Š15	65		11		11		-	
		554 204,86		498 858,76		498 858,76		-
Iš viso darbų sutarčių:	2 062	8 338 071,31	160	5 777 880,08	129	5 554 803,47	31	223 076,61
Paslaugų sutartys								
EuropeAid/114277/D/SV/LT	-		-		-		-	
		594 000,00		594 000,00		594 000,00		-
ISPA/12/SV/LT	-		-		-		-	
		189 256,21		189 256,21		189 256,21		-
EuropeAid/116507/D/SV/LT	-		-		-		-	
		289 950,00		289 950,00		289 950,00		-
Iš viso paslaugų sutarčių:	-	1 073 206,21	1 073 206,21	1 073 206,21	1 073 206,21	1 073 206,21		

6 lentelė. Projekto išlaidų duomenų visuma pavyzdžiams atrinkti ir atrinkti pavyzdžiai išlaidų testavimui (detalizuota pagal sutartis ir atliktų darbų aktų pozicijas) (tęsinys)

Rangos ir paslaugų sutarčių Nr.	EK deklaruotų Projekto tinkamų išlaidų visuma		Iš viso detaliam išlaidų testavimui atrinkta, iš jų:		Pavyzdžiai, atrinkti iš 1 subvisumos		Pavyzdžiai, atrinkti iš 2 subvisumos	
	(atliktų darbų aktų pozicijos)				(svarbūs objektai)		(atsitiktinė atranka)	
	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR
Įrangos tiekimo sutartys								
2006/5/A/PT/LT	-						-	
		220 090,94		220 090,94		220 090,94		-
2006/9/A/PT/LT	-						-	
		118 418,14		118 418,14		118 418,14		-
2006/7/A/PT/LT	-						-	
		66 610,80		66 610,80		66 610,80		-
2006/17/A/PT/LT	-						-	
		90 969,65		90 969,65		90 969,65		-
A/2007/S/27	-						-	
		28 151,07		28 151,07		28 151,07		-
2006/6/A/PT/LT	-		-		-		-	
		18 414,62		18 414,62		18 414,62		-
S-08-240	-		-		-		-	
		97 022,70		97 022,70		97 022,70		-
Iš viso įrangos tiekimo sutarčių:		639 677,92	-	639 677,92	-	639 677,92		0
Iš viso		10 050 955,44		7 490 764,21		7 267 687,60		223 076,61

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

7 lentelė. Projekto išlaidų duomenų visuma pavyzdžiams atrinkti ir atrinkti pavyzdžiai išlaidų testavimui pagal PVM sąskaitas faktūras (detalizuota pagal sutartis)

Rangos ir paslaugų sutarčių Nr.	PVM sąskaitų faktūrų suma	Iš viso detaliam išlaidų testavimui atrinkta, iš jų:	Proc. nuo visos sumos
	EUR	EUR	
Statybos darbų rangos sutartys			
A/2004/S02	299 790,00	124 083,94	41,4
A/2005/S04	1 074 193,53	454 476,05	42,3
A/2005/S05	2 731 989,84	2 631 114,83	96,3
A/2006/Š13	1 903 740,76	1 448 370,31	76,1
A/2005/Š10	1 842 665,82	1 443 976,01	78,4
A/2006/Š/15	554 204,86	554 204,86	100,0
Iš viso darbų sutarčių:	8 406 584,81	6 656 226,00	79,2
Paslaugų sutartys			
EuropeAid/114277/D/SV/LT	594 000,00	594 000,00	100,0
ISPA/12/SV/LT	189 256,21	59 788,08	31,6
EuropeAid/116507/D/SV/LT	289 950,00	96 300,00	33,2
Iš viso paslaugų sutarčių:	1 073 206,21	750 088,08	69,9
Įrangos tiekimo sutartys			
2006/5/A/PT/LT	220 090,94	220 090,94	100,0
2006/9/A/PT/LT	118 418,14	118 418,14	100,0
2006/7/A/PT/LT	66 610,8	66 610,80	100,0
2006/17/A/PT/LT	90 969,65	90 969,65	100,0
A/2007/S/27	28 151,07	28 151,07	100,0
2006/6/A/PT/LT	18 414,62	18 414,62	100,0
S-08-240	97 022,70	97 022,70	100,0
Iš viso įrangos tiekimo sutarčių:	639 677,92	639 677,92	100,0
Iš viso	10 119 468,94	8 045 992,00	79,5

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

Siekdamas papildomai įsitikinti, kad rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose nurodyti darbai atlikti vadovaujantis Komisijos reglamente [2] ir Finansiniame memorandume / Komisijos Sprendime [6, 7] nustatytais reikalavimais ir tikslais, kitas auditorius atliko patikrą projekto įgyvendinimo vietoje – pas galutinį paramos gavėją VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą.

2009 m. liepos 8 d. atlikdamas patikrą vietoje VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centre metu kitas auditorius susipažino su šio galutinio paramos gavėjo apskaitos dokumentais ir įsitikino, kad visas paramos lėšomis įsigytas turtas yra apskaitytas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro apskaitoje. 2009 m. liepos 8 d. per patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje buvo tikrinami atlikti darbai, atrinkti remiantis audito išankstinio planavimo metu nustatyta rizika. Darbai atrinkti patikrinus VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ilgalaikio turto ir kitus apskaitos

dokumentus, įvertinus pasirašytas statybos darbų rangos sutartis, peržiūrėjus Europos Komisijai pateiktą paraišką paramai gauti ir jos pakeitimus, Projekto galutinę ataskaitą, peržvelgus visų darbų rangos sutarčių, kurias pateikė APVA, atliktų darbų aktų elektronines versijas. Pagal tai patikrai vietoje buvo atrinkta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė (rangos sutartis Nr. A/2004/S02), Kairių sąvartyno uždarymo I-asis etapas (rangos sutartis Nr. A/2006/Š13), naujasis regioninis sąvartynas Aukštrakiuose (rangos sutartis Nr. A/2005/S05), privažiavimo kelias į Aukštrakių sąvartyną (rangos sutartis Nr. A/2006/Š15), 3 atliekų priėmimo punktai (Radviliškio RAPP, Žironų kaime.; Ginkūnų SAPP; Kairių SAPP) (rangos sutartis Nr. A/2005/S04), 2 uždaryti mažieji sąvartynai (Kairių-Gudelių, Kairių-Kirbailių) ir 10 konteinerinių aikštelių, įrengtų Šiaulių mieste (rangos sutartis Nr. A/2005/Š10). Šios patikros metu taip pat patikrinta, ar Projekto viešinimo priemonės (informaciniai standai) atitinka joms keliamus reikalavimus.

Pagal Projekto galutinei ataskaitai patikrinti parengtą audito programą buvo vertinama Projekto galutinė ataskaita:

- ar ji parengta pagal Komisijos reglamento [1] II priedo F straipsnio 4 dalyje galutinei ataskaitai nurodytus reikalavimus;
- ar joje nėra reikšmingų netikslumų, ypač dėl Projekto įvykdymo, laikantis jam nustatytų tikslų;
- ar ji tinkamai pateikia Projekto įgyvendinimą – Finansinio memorandumo [6] I priedo 7 dalyje numatytus tikslus.

Kitas auditorius vertino, ar informavimo ir viešinimo priemonės įgyvendintos pagal Komisijos reglamentuose [1,4] ir Finansinio memorandumo [6] III.6 priede pateiktus reikalavimus.

Kitas auditorius peržiūrėjo Sanglaudos fondo priežiūros komitetui teikiamas ataskaitas.

Pagrindinis auditorius, siekdamas surinkti su Projekto pažeidimais susijusią informaciją, išsiuntė paklausimus:

- Finansų ministerijai⁷, kuri turėjo pateikti informaciją apie visus jai žinomus su Projektu susijusius pažeidimus;
- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai⁸ (FNTT), kad ji informuotų, ar buvo atliekami tyrimai, susiję su tikrinamo Projekto vykdymu. Jei tokie tyrimai buvo atliekami, pateikti teisės aktais leistiną informaciją apie tyrimų būklę ir rezultatus.

Pagrindinis auditorius gavo pakankamą įsitikinimą, kad atliekant audito užduotis kito auditoriaus darbas atitiko audito tikslus, o jo darbo metodai, procedūros ir audito standartai, yra

⁷ Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2009-02-02 raštas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Nr. S-(70-1.10.1)-242 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“.

⁸ Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2009-02-02 raštas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos Nr. S-(70-1.10.1)-243 „Dėl informacijos pateikimo“.

tinkami, kad būtų gauti patikimi audito įrodymai, atlikdamas šias Valstybinio audito reikalavimuose ir 500 TAS numatytas audito procedūras:

- įrašų ir dokumentų tikrinimą;
- paklausimus (valstybinių auditorių pateiktus klausimus, atsakymų vertinimus);
- patvirtinimą (į paklausimą iš trečiosios šalies tiesiogiai gautas atsakymas, patvirtinantis informaciją);
- perskaičiavimą.

Siekdamas užtikrinti tinkamą vadovavimą darbui, gerą veiksmų koordinavimą ir kokybės kontrolę, pagrindinis auditorius:

- surengė 9 susitikimus su kitu auditoriumi audito planavimo, apimties, tikslų, auditui taikytinos metodikos klausimams aptarti, kuriuose buvo pristatytos kitų pagrindinio auditoriaus atliktų Sanglaudos fondo projektų baigiamųjų auditų metu identifikuotos rizikos, detalai aptartas atliktinas / atliktas darbas ir preliminarūs audito rezultatai, aptarti kito auditoriaus per auditą patirti sunkumai, pasiūlytos priemonės jiems išvengti, aptarti pagrindinio auditoriaus atliktos kito auditoriaus darbų detaliosios peržiūros metu kilę klausimai;
- perdavė svarbią informaciją, reikalingą kito auditoriaus darbui atlikti (pateikti auditui atlikti analizuotini ES ir nacionaliniai teisės aktai, EK išaiškinimai dėl reglamentų nuostatų įgyvendinimo ir taikymo, iš audituojamų subjektų gauta su auditu susijusi informacija, teikti įvairūs paaiškinimai);
- atliko periodines darbo metodų ir procedūrų kokybines peržiūras:
 - ▶ susipažino su kito auditoriaus naudojamomis priežiūros ir peržiūros sistemomis;
 - ▶ atliko visų audito paslaugų teikimo sutartyje numatytų pagrindinių dokumentų (rizikos veiksmių suvestinės, audito plano ir programų, įvykdytų audito programų ir su audituojamu subjektu suderintos audito ataskaitos (darbo dokumento)) detaliją peržiūrą;
 - ▶ atliko audito proceso metu parengtų ir atsitiktinai atrinktų darbo dokumentų detaliją peržiūrą.

Šio audito rezultatai, gauti įvertinus vidaus kontrolę ir atlikus detaliuosius testus, pateikiami ataskaitos 8–16 dalyse.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS

8. Pažeidimai

Finansų ministerija 2009 m. vasario 17 d. raštu Nr. (4.79-06)-6K-0901668 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ informavo, kad yra gauta informacija apie Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimus, susijusius su audituojamu Projektu. Rašte įvardijami pažeidimai: 13 053,73 Lt (3 780,62 EUR) netinkamų finansuoti Projekto išlaidų dėl Aukštrakių sąvartyno administraciniame pastate įrengto kompiuterių ir telefono tinklo, dėl 33 167,26 Lt (9 605,90 EUR) vertės įsigytų baldų administraciniam pastatui, dėl 112 323,25 Lt (32 531,06 EUR) vertės įsigytos kompiuterinės įrangos, dėl 10 808,00 Lt (3 130,21 EUR) vertės įrengtos pirties ir dėl 67 211,20 Lt (19 465,71 EUR) vertės įrengtos patalpos inžinieriui. Netinkamos finansuoti išlaidos dėl įsigytos kompiuterinės įrangos ir įrengtos patalpos inžinieriui buvo nustatytos LR aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnybai atlikus Projekto deklaruotų tinkamų finansuoti lėšų atrankinį patikrinimą (2007 m. lapkričio 19 d. ataskaita Nr. 4-4-(2)-07-17). Netinkamos finansuoti išlaidos dėl įrengto kompiuterių ir telefono tinklo, įsigytų baldų administraciniam pastatui, įrengtos pirties ir dėl įsigytos kompiuterinės įrangos buvo nustatytos MI (LR finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentui) 2007 m. spalio 11 d. atlikus patikrą įgyvendinančioje institucijoje, prieš tvirtinant trečiąją tarpinę mokėjimo paraišką EK. Iš viso netinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 236 563,44 Lt (68 513,50 EUR). Tyrimai dėl netinkamų finansuoti išlaidų buvo inicijuoti pažeidimų kontrolieriaus:

- 2008 m. gegužės 9 d. raštu Nr. APVA-1761 patvirtinta, kad 112 323,25 Lt (32 531,06 EUR) dėl įsigytos kompiuterinės įrangos ir 67 211,20 Lt (19 465,71 EUR) dėl įrengtos inžinieriui patalpos yra netinkamos finansuoti išlaidos (pažeidimo registracijos Nr. LT/08/012/SF/2);
- 2009 m. gegužės 28 d. raštu Nr. APVA-2679 patvirtinta, kad 10 808 Lt (3 130,21 EUR) dėl įrengtos pirties yra netinkamos finansuoti išlaidos (pažeidimo registracijos Nr. LT/07/010/SF/2);
- 2009 m. gegužės 4 d. raštu Nr. APVA-2231 patvirtinta, kad 13 053,73 Lt (3 780,62 EUR) dėl Aukštrakių sąvartyno administraciniame pastate įrengto kompiuterių ir telefono tinklo ir 33 167,26 Lt (9 605,90 EUR) dėl įsigytų baldų administraciniam pastatui yra netinkamos finansuoti išlaidos (pažeidimo registracijos Nr. LT/09/024/SF/1).

APVA 2007 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. APVA-5728 ir 2008 m. gegužės 9 d. raštu Nr. APVA-1761 informavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie LR vidaus reikalų ministerijos apie atvejus dėl pastebėtų galimų išlaidų, kurios yra netinkamos finansuoti.

Audito metu nustatyta, kad visi Finansų ministerijos įvardijami pažeidimai galutinėje ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje atskleisti kaip netinkamos finansuoti išlaidos.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos 2009 m. vasario 19 d. raštu Nr. 25/11-4-1087 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad FNTT ikiteisminių tyrimų dėl Projekto neatliko.

9. Patikrinimai

Informacija apie Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų atliktus Projekto patikrinimus / patikras pateikta ataskaitos 4 priede.

9.1. VI patikrinimai

(1) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatyta, kad vadovaujančioji institucija neplanavo ir neatliko valdymo ir kontrolės sistemos patikrų:

- mokėjimo institucijoje 2006–2008 m;
- tarpinėje institucijoje 2005 m. ir 2007 m;
- įgyvendinančioje institucijoje 2006 m.

Audito metu nustatyta, kad vadovaujančioji institucija neatliko planuotų patikrų įgyvendinančioje institucijoje 2006 m.

Išvada

Sistemos veikimo priežiūra numatant ir atliekant patikras buvo atliekama nereguliariai.

9.2. MI patikrinimai

(2) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatyta, kad mokėjimo institucija neatliko 2006 m. plane numatytos patikros vietoje Aplinkos projektų valdymo agentūroje. Nors patikra vietoje buvo atlikta 2007 m. pradžioje, tačiau atliktos patikros vietoje ataskaita nebuvo parengta.

Finansų ministro įsakymu patvirtintas MI darbo procedūrų vadovas [14] numato, kad galutinė patikros vietoje ataskaita turi būti parengta per tris mėnesius nuo patikros vietoje atlikimo. Audito metu nustatyta, kad MI (NFD) neužtikrino šios nuostatos tinkamo įgyvendinimo:

- patikra vietoje atlikta 2005 m. lapkričio 21–22 d., patikros vietoje ataskaita parengta tik 2006 m. rugsėjo 8 d., vėluojant 9 mėn.;
- patikra vietoje atlikta 2004 m. gruodžio 20–21 d., patikros vietoje ataskaita parengta 2005 m. balandžio 13 d., vėluojant 1 mėn.

Išvada

Nesilaikyta NFD procedūrų vadove nustatytos tvarkos dėl patikrų atlikimo laiko ir atliktų patikrų ataskaitų parengimo termino.

9.3. APVA patikrinimai

(3) Vidutinės svarbos pastebėjimas

APVA procedūrų vadove [17] nustatytas patikros vietoje ataskaitos parengimo penkių darbo dienų terminas. Per laikotarpį nuo 2002 iki 2008 metų APVA atliko dešimt patikrų vietoje, tačiau devynių patikrų vietoje ataskaitos buvo parengtos pavėluotai. Audito metu nustatėme, kad:

- patikra vietoje atlikta 2004 m. gruodžio 2 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-3, parengta 2004 m. gruodžio 14, vėluojant 3 darbo dienas;
- patikra vietoje atlikta 2005 m. liepos 14 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-05 parengta 2006 m. spalio 23 d., vėluojant daugiau nei metus ir tris mėnesius;
- patikra vietoje atlikta 2005 m. rugsėjo 9 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-11 parengta 2006 m. spalio 23 d., vėluojant daugiau nei metus.
- patikra vietoje atlikta 2006 m. gegužės 24 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-04 parengta 2007 m. sausio 8 d., vėluojant daugiau nei septynis mėnesius;
- patikra vietoje atlikta 2006 m. gegužės 26 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-05 parengta 2007 m. sausio 8 d., vėluojant daugiau nei septynis mėnesius;
- patikra vietoje atlikta 2007 m. sausio 10 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-1 parengta 2007 m. sausio 19 d., vėluojant 2 darbo dienas;
- patikra vietoje atlikta 2007 m. sausio 10 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-2 parengta 2007 m. sausio 19 d., vėluojant 2 darbo dienas;
- patikra vietoje atlikta 2007 m. spalio 29 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-18 parengta 2007 m. lapkričio 19 d., vėluojant 10 darbo dienų;
- patikra vietoje atlikta 2007 m. spalio 29 d., patikros vietoje ataskaita Nr. SA-19 parengta 2007 m. lapkričio 19 d., vėluojant 10 darbo dienų.

Išvada

Patikros vietoje ataskaitos parengtos nesilaikant APVA procedūrų vadove nurodyto termino.

(4) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Pagal Projekto vykdymo metu galiojusį APVA direktoriaus įsakymu patvirtintą APVA procedūrų vadovą [17] kasmet turi būti atliekamos kiekvienos darbų sutarties patikros vietoje. Be to, procedūrų vadovas numato, kad iki sumokant galutinę sumą rangovui pagal konkrečią darbų

sutartį, būtinai turi būti atlikta patikra vietoje, priešingu atveju, projekto vykdytoji galutinė suma negali būti išmokėta.

Audito metu nustatyta, kad:

- 2005 m. liepos 8 d. darbų sutarties Nr. A/2005/S04 darbai buvo pradėti 2005 m. liepos 25 d., baigti iki 2007 m. sausio 15 d. APVA neatliko patikros vietoje 2005 metais;
- 2005 m. liepos 8 d. darbų sutarties Nr. A/2005/S05 darbai buvo pradėti 2005 m. liepos 15 d., baigti 2007 m. vasario 26 d. APVA patikrą vietoje atliko du kartus – 2006 m. gegužės 24 d. ir 2007 m. sausio 10 d., nors darbų sutarties trukmė buvo treji metai;
- 2006 m. gegužės 4 d. darbų sutarties Nr. A/2006/Š13 darbai buvo pradėti 2006 m. gegužės 15 d., baigti iki 2008 m. birželio 15 d. APVA patikrą vietoje atliko du kartus – 2007 m. spalio 29 d. ir 2008 m. liepos 24 d., nors darbų sutarties trukmė buvo treji metai;
- 2005 m. gruodžio 15 d. darbų sutarties Nr. A/2005/Š10 darbai buvo pradėti 2005 m. gruodžio 15 d., baigti iki 2008 m. gegužės 30 d. APVA patikrą vietoje atliko vieną kartą (2007 m. spalio 29 d.), nors darbų sutarties trukmė buvo treji metai;
- 2006 m. rugsėjo 11 d. darbų sutarties Nr. A/2006/Š15 darbai buvo pradėti 2005 m. gruodžio 15 d., baigti iki 2007 m. gegužės 31 d. APVA per pastarąjį laikotarpį neatliko nė vienos patikros vietoje.

Išvada

Nesilaikyta APVA procedūrų vadovo nuostatos dėl patikrų vietoje atlikimo tvarkos (tikrinti kiekvieną darbų sutartį mažiausiai po vieną kartą per metus).

(5) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Pagal Projekto vykdymo metu galiojusį APVA direktoriaus įsakymu patvirtintą APVA procedūrų vadovą [17] patikrą vykdo patikros vietoje atlikimo komisija, o „komisijos pirmininku skiriamas procedūrų kontrolierius, joje taip pat dalyvauja finansų kontrolierius ir atsakingas projektų vadovas iš Atliekų / Vandens projektų administravimo skyriaus. Į komisijos sudėtį gali būti siūlomi ir kiti APVA, AM atstovai arba išorės ekspertai“.

Audito metu nustatyta, kad 2007 m. spalio 29 d. vykdant planines patikras vietoje (patikros vietoje atlikimo ataskaitos Nr. SA-18 ir Nr. SA-19) patikros komisiją sudarė projektų vadovas ir finansų kontrolės skyriaus vedėjas, o 2008 m. liepos 24 d. vykdant neplaninę patikrą vietoje (patikros vietoje atlikimo ataskaita Nr. SA/N-1) patikros komisiją sudarė techninis ekspertas (komisijos pirmininkas) ir projektų vadovas. Procedūrų kontrolierius, vykdant šias patikras, nedalyvavo.

Išvada

Nesilaikyta APVA procedūrų vadovo nuostatos dėl patikros vietoje atlikimo komisijos sudėties (komisijos veikloje nedalyvavo procedūrų kontrolierius).

10. Viešieji pirkimai

(6) Didelės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatėme, kad perkančioji organizacija (APVA), atlikdama pirkimą Nr. 36891 (sutarties Nr. 2006/7/A/PT/LT) atviro konkurso būdu, nesilaikė VPI 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų, kadangi perkančioji organizacija, negavusi nė vieno priimtino pasiūlymo, pirkimą tęsė neskelbiamų derybų būdu. Atliekant pirkimą šiuo būdu pirkimo sąlygos iš esmės buvo pakeistos, t. y. atsisakyta dalies komponentų (moliusko tipo kriauklės kaušo (vertė – 16 617,17 Lt), šiukšlių šlavimo įtaiso (vertė – 18 389,06 Lt), aptarnavimo ir priežiūros garantinio laikotarpio metu (vertė – 6 636,06 Lt), atsarginių dalių (vertė – 6 280,98 Lt)), kurie buvo įvardyti konkurso sąlygose atliekant pirkimą atviro konkurso būdu. Perkančioji organizacija (APVA) taip pat nesilaikė VPI 25 straipsnio 2 dalies nuostatų, kuriomis remiantis techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Kadangi pakeitus pirkimo būdą iš atviro konkurso į neskelbiamas derybas perkamo objekto techninė specifikacija buvo pakeista – taip galėjo būti diskriminuojami kiti tiekėjai, kurie galbūt galėjo pateikti pasiūlymus, atitinkančius konkurso sąlygose nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus, jeigu atviro konkurso sąlygų techninių specifikacijų dalyje nebūtų nurodyta komponentų, kurių buvo atsisakyta vėliau, atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

Išvada

Perkančioji organizacija (APVA), atlikdama pirkimą Nr. 36891 (sutarties Nr. 2006/7/A/PT/LT) neskelbiamų derybų būdu, nesilaikė VPI 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir VPI 25 straipsnio 2 dalies nuostatų.

(7) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatyti APVA procedūrų vadovo [17] nuostatų nesilaikymo atvejai. Pagal APVA procedūrų vadovą perkančioji organizacija (APVA) privalo pildyti APVA procedūrų vadove numatytus patikrų lapus (susijusius su viešaisiais pirkimais). Perkančioji organizacija (APVA), vykdydama pirkimą Nr. 28096 (sutartis Nr. A/2005/S04) ir pirkimą Nr. 29248 (sutarties Nr. A/2005/S05), neužpildė patikros lapų Nr. 5.P10 „Pranešimas apie sutarties sudarymą“, Nr. 5.P7 „Informacija kandidatams ir dalyviams apie pirkimo procedūros rezultatus“ ir Nr. 5.P8 „Informacija apie paraiškos ar pasiūlymo atmetimo priežastis“.

Išvada

Nesilaikyta APVA procedūrų vadove numatytų procedūrų dėl patikros lapų, susijusių su viešaisiais pirkimais (neužpildyti patikros lapai).

(8) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Perkančioji organizacija (APVA ir ŠRATC) nesilaikė VPĮ 19 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad „pirkimo procedūrų ataskaita turi būti parengta ir, pirkimui pasibaigus, per 14 dienų pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai“, taip pat ir APVA procedūrų vadovo nuostatos, kad viešojo pirkimo procedūrų ataskaita išsiunčiama Viešųjų pirkimų tarnybai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties sudarymo. Audito metu nustatyta:

- dėl pirkimo Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240) sutartis su rangovu UAB „Mecro Technikonas“ pasirašyta 2008 m. rugsėjo 8 d., o viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai išsiųsta 2009 m. kovo 23 d., t. y. nesilaikant termino ir vėluojant šešis mėnesius (perkančioji organizacija – ŠRATC);
- dėl pirkimo Nr. 34231 viešojo pirkimo procedūrų ataskaita buvo išsiųsta Viešųjų pirkimų tarnybai 2006 m. sausio 11 d. faksu, o pirkimo procedūrų pabaiga buvo 2005 m. gruodžio 21 d., kuri buvo nustatyta atmetus visus pasiūlymus ir gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, kad būtų atmesti visi pasiūlymai (perkančioji organizacija – APVA);
- dėl pirkimo Nr. 37830 sutartis (Nr. A/2006/Š13) su rangovu UAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta 2006 m. gegužės 4 d., o viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai išsiųsta 2006 m. birželio 2 d., t. y. nesilaikant termino ir vėluojant 15 kalendorinių dienų (perkančioji organizacija – APVA).

Išvada

Perkančiosios organizacijos (APVA ir ŠRATC) viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas (pirkimų Nr. 34231 ir Nr. 37830 (sutartis Nr. A/2006/Š13) ir Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240)) Viešųjų pirkimų tarnybai išsiuntė nesilaikydamos nustatyto termino.

(9) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, viešojo pirkimo komisija posėdžių protokoluose turi nurodyti komisijos sprendimo motyvus, pateikti paaiškinimus, kiekvieno komisijos nario nuomonę. Viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokoluose (dėl pirkimo Nr. 33089 (sutartis Nr. A/2006/Š10), pirkimo Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240), pirkimo Nr. 36891 (sutartis Nr. 2006/7/A/PT/LT), pirkimo Nr. 43757 (sutartis Nr. 2006/17/A/PT/LT), pirkimo Nr. 34231/37830 (sutarties Nr. A/2006/Š13), pirkimo Nr. 28096 (sutarties Nr. A/2005/S04) ir pirkimo Nr. 29248 (sutarties Nr. A/2005/S05)) bendra tvarka yra nurodytas priimtas sprendimas, motyvuojant kiekvieną dienotvarkėje iškeltą klausimą, tačiau nepateikta kiekvieno komisijos nario nuomonė.

Išvada

Viešųjų pirkimų komisijos protokoluose individualios komisijos narių nuomonės nepateiktos, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme.

(10) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, viešojo pirkimo komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokoluose dėl pirkimo Nr. 33089 (sutartis Nr. A/2006/Š10), pirkimo Nr. 36891 (sutartis Nr. 2006/7/A/PT/LT), pirkimo Nr. 43757 (sutartis Nr. 2006/17/A/PT/LT), pirkimo Nr. 34231/37830 (sutartis Nr. A/2006/Š13), pirkimo Nr. 28096 (sutartis Nr. A/2005/S04) ir pirkimo Nr. 29248 (sutartis Nr. A/2005/S05) nėra nurodyta kiekvieno komisijos nario pozicija atlikus balsavimo procedūrą.

Išvada

Viešųjų pirkimų komisijos protokoluose nėra nurodyta kiekvieno komisijos nario pozicija atlikus balsavimo procedūrą, kuomet remiantis būtų galima teigti, kad komisija priėmė sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme.

(11) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Vykdamas pirkimą Nr. 43757 atviro konkurso būdu, sudaryta viešojo pirkimo komisija buvo įpareigota savo darbe vadovautis APVA direktoriaus 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. T1-14 patvirtintu Prekių, darbų ir paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu, tačiau kiekvienas vertinimo komisijos narys, pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kuriame buvo minimas vėlesnės redakcijos Prekių, darbų ir paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas APVA direktoriaus 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-101.

Išvada

Vykdydama savo funkcijas APVA netinkamai seka vidinių teisės aktų atnaujinimus ir pakeitimus.

(12) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Pagal VPI 100 straipsnio 2 dalį, „sudariusi pirkimo sutartį, perkančioji organizacija kitiems dalyviams nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą, juose nurodo tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis“. Perkančioji organizacija (ŠRATC), vykdydama pirkimą Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240), to neatliko.

Išvada

Perkančioji organizacija (ŠRATC) dėl pirkimo Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240) neišsiuntė pranešimo apie pirkimo sutarties sudarymą kitiems konkurso dalyviams, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme.

(13) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Pagal VPĮ 18 straipsnio 1 dalį, „tiekėjas sudaryti sutartį kviečiamas raštu, kartu jam pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o derybų su vienu tiekėju atveju – kad jo pasiūlymas atitinka keliamus reikalavimus, ir nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.“ Perkančioji organizacija (ŠRATC), vykdydama pirkimą Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240), raštu nepakvietė tiekėjo UAB „Mecro Technikonas“ sudaryti sutartį.

Išvada

Perkančioji organizacija (ŠRATC) dėl pirkimo Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240) raštu nepakvietė tiekėjo sudaryti sutartį, kaip reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme.

(14) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Perkančioji organizacija (APVA) dėl pirkimo Nr. 34231 gavo 2005 m. gruodžio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą (2005 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. 4S-3159), kad būtų atmesti visi pasiūlymai, todėl 2006 m. sausio 6 d. išsiuntė raštus abiem tiekėjams, tačiau 5 darbo dienų terminas, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje (galiojusi redakcija), buvo pradelstas.

Išvada

Perkančioji organizacija (ŠRATC), priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą Nr. 34231, pradelsė 5 darbo dienų terminą, per kurį pagal Viešųjų pirkimų įstatymą privalo pranešti kandidatams ir dalyviams apie savo sprendimą.

(15) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatyti netinkamai užpildyti APVA procedūrų vadove [17] reglamentuoti patikros lapai dėl viešųjų pirkimų:

- patikros lape Nr. 7 „Direktoriaus įsakymas dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo, pranešimas kandidatams apie laimėjusį pasiūlymą bei siūlymas laimėtojui sudaryti sutartį“ (pirkimas Nr. 43757 (sutartis Nr. 2006/17/A/PT/LT)) nenurodyta, kaip vertinami kontrolės objektai (taip; ne; netaikoma), tik pateikti komentarai;
- 2005 m. rugsėjo 12 d. tvirtindamas patikros lapą Nr. 2 „Skelbimas apie pirkimą“ (pirkimas Nr. 34231 (sutartis Nr. A/2006/Š/13)) APVA direktorius nepateikė galutinės išvados dėl vertinamo dokumento.

Išvada

Nesilaikyta APVA procedūrų vadove numatytų procedūrų dėl patikros lapų, susijusių su viešaisiais pirkimais, pildymo.

(16) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatyta:

- Neužpildytos atskiros vertinimo lentelės dalys (pirkimas Nr. 33089 (sutartis Nr. A/2006/Š10)). Du viešųjų pirkimų komisijos nariai neatlikto detalaus finansinio pasiūlymo patikrinimo, nes nėra pateiktas bendras IX dalies vertinimas, o dėl pirkimo Nr. 34231/37830 (sutartis Nr. A/2006/Š13) neužpildytos vertinimo lentelių atskiros eilutės.
- Vertinimo lentelės dėl techninių pasiūlymų atitikties vertinimo (Nr.3) (pirkimas Nr. 43757 (sutartis Nr. 2006/17/A/PT/LT)) saugomos atskirai nuo protokolo ir esama nesutapimų jas užpildant tarp atskirų viešojo pirkimo komisijos narių.
- Vertinimo lentelės, pridėtos prie 2006 m. vasario 2 d. Protokolo (pirkimas Nr. 36891 (sutartis Nr. 2006/7/A/PT/LT)), pasirašytos visų viešojo pirkimo komisijos narių tik 2006 m. vasario 10 d., t. y. vėliau, nei įvyko posėdis.
- Visų viešųjų pirkimų komisijos narių dėl kiekvieno gauto pasiūlymo vertinimai yra pateikti vienoje vertinimo lentelėje (pirkimas Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240)), o ne kiekvieno komisijos nario atskirai užpildytoje.

Išvada

Netinkamai (neišsamiai) užpildytos vertinimo lentelės (pirkimas Nr. 33089 (sutartis Nr. A/2006/Š10); pirkimas Nr. 34231/37830 (sutartis Nr. A/2006/Š13); pirkimas Nr. 43757 (sutartis Nr. 2006/17/A/PT/LT); pirkimas Nr. 65079 (sutartis Nr. S-08-240)) ir neužtikrinamas tinkamas jų naudojimas (pirkimas Nr. 43757 (sutartis Nr. 2006/17/A/PT/LT); pirkimas Nr. 36891 (sutartis Nr. 2006/7/A/PT/LT)).

(17) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Perkančioji organizacija (APVA), vykdydama pirkimą Nr. 28096 (sutartis Nr. A/2005/S04), nurodė neteisingą viešojo pirkimo komisijos vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros protokolo, kuris parengtas pagal pavyzdinę VPK-3 formą (pateiktą LR Viešųjų pirkimų tarnybos 2003 m. vasario 25 d. įsakyme Nr. 1S-20) datą. Susitikimas įvyko 2005 m. kovo 14 d., tačiau protokole įrašyta 2004 m. kovo 14 d.

Išvada

Nurodyta neteisinga viešojo pirkimo komisijos vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros protokolo data.

(18) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Perkančioji organizacija (APVA), vykdydama pirkimą Nr. 28096 (sutartis Nr. A/2005/S04) ir pirkimą Nr. 29248 (sutartis Nr. A/2005/S05), panaudojo įsakymo dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo formą, kuri neatitinka pavyzdinės formos, pateiktos APVA procedūrų vadovo prieduose.

Parengtame įsakyme nėra nurodyta, kad sudaryta komisija savo darbe turi vadovautis Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. T1-14 patvirtintu Prekių, darbų ir paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu.

Išvada

Įsakymo dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo forma neatitinka APVA procedūrų vadovo prieduose pateiktos formos.

(19) Nedidelės svarbos pastebėjimas

PRAG 3.3.9.3 straipsnyje nurodyta, kad visi prašymai dėl paaiškinimų, kurie siunčiami raštu, turi būti pasirašyti komisijos pirmininko ir komisijos sekretoriaus. Perkančioji organizacija (APVA), vykdydama pirkimą (sutartis Nr. EuropeAid/114277/D/SV/LT), 2003 m. kovo 15 d. išsiuntė prašymus dėl paaiškinimo kompanijoms „WSP International Sweden“ AB ir „Sogreah“, 2003 m. kovo 20 d. kompanijoms „WSP International Sweden“ AB ir „Halcrow Group Ltd“, 2003 m. kovo 30 d. – kompanijai „Halcrow Group Ltd“. Šie prašymai buvo pasirašyti tik komisijos pirmininko, o komisijos sekretoriaus parašo nėra, taigi jie parengti nesilaikant PRAG 3.3.9.3 straipsnio reikalavimų.

Išvada

Nebuvo laikomasi PRAG 3.3.9.3 straipsnio reikalavimų, pagal kuriuos visi prašymai dėl paaiškinimų turi būti pasirašyti komisijos pirmininko ir komisijos sekretoriaus.

(20) Nedidelės svarbos pastebėjimas

PRAG 3.3.10.2 straipsnyje nurodyta, kad atplėšus vokus su pasiūlymais, komisijos pirmininkas arba komisijos sekretorius visus pasiūlymus turi sunumeruoti tokia pačia tvarka, kokia buvo gauti, ir įrašyti savo inicialus. Perkančiajai organizacijai (APVA) vykdant pirkimą (sutarties Nr. EuropeAid/114277/D/SV/LT), komisijos pirmininkas ir sekretorius neįrašė savo inicialų nė viename pateiktame pasiūlyme.

Išvada

Nebuvo laikomasi PRAG 3.3.10.2 straipsnio nuostatos, pagal kurią gautuose pasiūlymuose turi būti įrašyti komisijos pirmininko ir sekretoriaus inicialai.

(21) Nedidelės svarbos pastebėjimas

PRAG 3.3.10.2 straipsnyje nurodyta, kad gavus vokus su pasiūlymais komisijos pirmininkas ir sekretorius turi skersai voko užklajavimo linijos užrašyti savo inicialus. Peržiūrėjus perkančiosios organizacijos (APVA) vykdyto pirkimo (sutarties Nr. EuropeAid/116507/D/SV/LT) pateiktus dokumentus, buvo rastas „SWECO International“ vokas, kuriame buvo „SWECO International“ finansinis pasiūlymas, tačiau ant užklajavimo linijų nebuvo komisijos pirmininko ir sekretoriaus inicialų. Likusių vokų su pasiūlymais perkančioji organizacija nepateikė.

Išvada

Nebuvo laikomasi PRAG 3.3.10.2 straipsnio nuostatos, pagal kurią gavus vokus su pasiūlymais komisijos pirmininkas ir sekretorius turi skersai voko užklėjavimo linijos užrašyti savo inicialus.

11. Išlaidų tinkamumas finansuoti ir atlikti darbai

(22) Didelės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatėme, kad galutinis paramos gavėjas (ŠRATC), įsigytą įrangą registruodamas apskaitoje, į šio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įtraukė išlaidas, tiesiogiai nesusijusias su šio turto įsigijimu, kurios nepriskiriamos tinkamoms finansuoti išlaidoms:

- pagal 2008 m. rugsėjo 8 d. sutartį Nr. S-08-240 (tiekėjas UAB „Mecro Technikonas“) buvo įsigytas ekskavatorinis krautuvus JCB 3CX Super su įranga, taip pat techninio aptarnavimo bei priežiūros paslauga ir garantinio laikotarpio metu susidėvinčios atsarginės dalys (20 000 Lt). Visa tai ŠRATC apskaitė kaip vieną ilgalaikio materialiojo turto vienetą;
- pagal 2006 m. birželio 22 d. sutartį Nr. 2006/9/A/PT/LT (tiekėjas UAB „Silberauto“) buvo įsigytas sunkvežimis MB Actros 2536 su priekaba ROADEX LVS 20, atsarginės dalys ir vartojimo reikmenys (4 434,17 Lt). Atsarginės dalis ir vartojimo reikmenis ŠRATC įtraukė į priekabos ROADEX LVS 20 įsigijimo savikainą.

Pagal 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 [3] 1 skyriaus 5 straipsnio 1 dalies ir 7 skyriaus 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, tokios išlaidos, kurios bus patiriamos vėlesnėje ŠRATC veikloje, nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

Išvada

ŠRATC, įregistruodamas apskaitoje įsigytą įrangą, į šio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įtraukė išlaidas, tiesiogiai nesusijusias su šio turto įsigijimu. Visos įrangos pirkimo sutartyse numatytos ir patirtos **24 434,17 Lt (7 076,62 EUR)** išlaidos, susijusios su atsarginių dalių, techninio aptarnavimo paslaugos, vartojimo reikmenų įsigijimu, mūsų nuomone, yra netinkamos finansuoti.

(23) Didelės svarbos pastebėjimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu statybos darbų rangos sutarčių techninės priežiūros funkcijoms vykdyti 2004 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta sutartis Nr. Europe Aid/116507/D/SV/LT su „M&S Umweltprojekt GmbH“, kurioje numatyta, kad veiklos išlaidos, kurių rangovas nefinansuoja, įskaitomos į paslaugos vertę.

Audito metu nustatėme, kad trijose statybos darbų rangos sutartyse buvo numatytos ir vėliau patirtos išlaidos, susijusios su techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimu. Vienoje iš šių sutarčių (sutartis Nr. A/2005/S05) šios išlaidos, t. y. 67 211,20 Lt (19 465,71 EUR), buvo pripažintos

netinkamomis finansuoti (Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnybos 2007 m. lapkričio 19 d. Projekto deklaruotų tinkamų finansuoti lėšų atrankinis patikrinimas).

8 lentelėje pateikiama informacija apie likusių dviejų statybos darbų rangos sutarčių išlaidas, kurios buvo įtrauktos į atliktų darbų aktus ir kartu su išlaidas pateisinančiais ir apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais deklaruotos EK kaip tinkamos finansuoti.

8 lentelė. Informacija apie techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimo išlaidas, kurios buvo įtrauktos į rangos sutarčių išlaidas pateisinančius dokumentus ir deklaruotos EK				
Rangos sutarties Nr.	Su inžinieriaus aprūpinimu susijusių išlaidų, deklaruotų EK, suma, EUR	Reikalavimai, susiję su inžinieriaus aprūpinimu, numatyti rangos sutarčių techninėse specifikacijose	Išlaidų pozicijos rangos sutarčių Atliktų darbų aktuose	Sutarties, pagal kurią vykdytos FIDIC inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros funkcijos, numeris
A/2006/Š/15	785,27	Rangovas turi savo lėšomis parūpinti patalpas inžinieriui (30 m ³ biuro erdvė, 3 telefono linijos, 4 telefonai, interneto pajungimas, faksas, baldai sanitariniai mazgai, persirengimo bei rūbų laikymo patalpos).	Inžinieriaus aprūpinimas – 785,27 EUR (2 711,40 Lt),	Europe Aid/116507/D/SV/LT
A/2006/Š10	15 060,24	Rangovas turi savo lėšomis parūpinti automobilį inžinieriui. Rangovas privalo apmokėti automobilio nuomą, pilną draudimą, degalus, techninį aptarnavimą, projekto tikslų įvykdymui bei neviršijant maksimalios ridos 60 000 km per 18 mėn. Rangovas turi savo lėšomis parūpinti kiekviename Šiaulių regiono rajone patalpas Inžinieriui, kuriose jis galėtų atlikti su darbų priežiūra susijusius darbus. Jose turi būti įrengta inžinieriaus darbo vieta (darbo stalas).	Inžinieriaus aprūpinimas – 15 060,24 EUR (52 000,00 Lt);	Europe Aid/116507/D/SV/LT
Iš viso	15 845,51			

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

2004-04-01 EK audito ataskaitoje Nr. REGIOG4/MR D(2004) ir paskesnėje šio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje⁹ nurodyta, kad nuostatos, numatytos rangos sutartyse dėl automobilių ir įrangos prižiūrinčiam inžinieriui sudaro riziką dėl inžinieriaus nepriklausomumo.

Visos inžinieriaus aprūpinimo išlaidos turėtų būti numatytos techninės priežiūros sutartyse. Taip pat nurodyta, kad tokia praktika neturėtų būti tęsiama būsimų sutarčių atžvilgiu. EK nuomone, rangos sutartyse numatytos inžinieriaus techninio aprūpinimo išlaidos, yra netinkamos paramai gauti.

⁹ EK raštas Nr. H3/MR/djdd D(2004) 5443

Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba, identifikavusi potencialius netinkamų finansuoti išlaidų atvejus, tolesnių sisteminių patikrinimų, tų sutarčių, kurios nepateko į planinės patikros apimtį, neatliko.

Kadangi audito metu nustatėme, kad trijose (iš šešių) rangos sutartyse buvo numatytos išlaidos, susijusios su inžinieriaus aprūpinimu, galima **rizika**, kad ir kitose aplinkosaugos srities projektų sutartyse gali būti numatytos ir patirtos tokio pobūdžio išlaidos.

Išvada

Visos rangos sutartyse numatytos ir patirtos **54 711,40 Lt (15 845,51 EUR)** išlaidos, susijusios su techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimu, mūsų nuomone, yra netinkamos finansuoti.

Rekomendacija dėl pastebėjime nurodytų trūkumų teikta Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 baigiamojo audito metu, todėl šio audito metu rekomendacija neteikiama.

12. Audito seka ir apskaitos sistemos

(24) Didelės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatėme, kad galutinis paramos gavėjas (ŠRATC) apskaitoje neparodė įsiskolinimo valstybės biudžetui dėl pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų pagal nustatytus pažeidimus (žr. 8 skyrių „Pažeidimai“, t. y. 222 398,92 Lt (64 411,18 EUR). ŠRATC teigimu, iki šiol nėra gautas oficialus pranešimas dėl šių lėšų grąžinimo, kad būtų galima padaryti atitinkamą įrašą apskaitoje. Auditui pateiktoje Projekto galutinėje ataskaitoje teigiama, kad nustatytą pažeidimų (išskaičiuotą) sumą, atsiradus finansinėms galimybėms, ŠRATC grąžins iki 2009 m. gruodžio 31 d. (24 psl.).

Audito metu nustatėme, kad MI (NFD) ir II (APVA) savo apskaitos sistemose apskaitė ne visas pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidas pagal nustatytus pažeidimus ir atitinkamai neparodė įsiskolinimo valstybės biudžetui. MI apskaityta suma – 58 733,57 EUR pagal AM VAT atliktą Projekto deklaruotų tinkamų finansuoti lėšų atrankinį patikrinimą (2007 m. lapkričio 19 d. ataskaita Nr. 4-4-(2)-07-17) bei 2007 m. spalio 11 d. Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentui atlikus patikrą II, prieš tvirtinant trečiąją tarpinę mokėjimo paraišką EK. Neapskaitytų išlaidų suma – 2 352,75 EUR (2007 m. spalio 11 d. Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentui atlikus patikrą II, prieš tvirtinant trečiąją tarpinę mokėjimo paraišką EK). APVA nepateikė mokėjimo institucijai informacijos apie priimtą sprendimą susigrąžinti lėšas ir kitos reikalingos informacijos, todėl netinkamos finansuoti išlaidos ir skola valstybės biudžetui nebuvo įregistruotos MI apskaitos sistemoje.

II neapskaityta suma – 12 414,41 EUR.

Išvada

Apskaityti ne visi išsipareigojimai ir gautinos sumos MI, II ir galutinio paramos gavėjo apskaitos sistemose:

1. MI savo apskaitos sistemoje apskaitė ne visas pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidas pagal nustatytus pažeidimus ir neparodė įsiskolinimo valstybės biudžetui. Neapskaitytų išlaidų suma – 2 352,75 EUR.
2. II savo apskaitos sistemoje apskaitė ne visas pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidas pagal nustatytus pažeidimus ir neparodė įsiskolinimo valstybės biudžetui. Neapskaitytų išlaidų suma – 12 414,41 EUR.
3. Kadangi II pagal nustatytus pažeidimus neinformavo apie rastas netinkamas finansuoti išlaidas galutinio paramos gavėjo (ŠRATC), ši savo apskaitos sistemoje neparodė įsiskolinimo valstybės biudžetui. Neapskaitytų išlaidų suma – 64 411,18 EUR.

1 rekomendacija

MI savo apskaitos sistemoje apskaityti netinkamų finansuotų išlaidų sumos dydžio (2 352,75 EUR) įsiskolinimą valstybės biudžetui.

2 rekomendacija

II savo apskaitos sistemoje apskaityti netinkamų finansuotų išlaidų sumos dydžio (12 414,41 EUR) įsiskolinimą valstybės biudžetui ir informuoti galutinį paramos gavėją (ŠRATC) apie nustatytus pažeidimus ir netinkamas finansuoti išlaidas.

3 rekomendacija

Galutiniam paramos gavėjui (ŠRATC) savo apskaitos sistemoje apskaityti netinkamų finansuoti išlaidų sumos dydžio (64 411,18 EUR) įsiskolinimą valstybės biudžetui.

(25) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Remiantis Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307, paramą administruojanti institucija, nustačiusi arba įtarusi, kad esama pažeidimų, per 10 darbo dienų privalo atlikti pažeidimo tyrimą. Audito metu nustatyta, kad paramą administruojanti institucija šio Projekto metu nevykdė minėtų taisyklių nuostatų, nes nė vieno pažeidimo tyrimai nebuvo atlikti per 10 darbo dienų nuo jų nustatymo datos:

- pažeidimas dėl įrengtos pirties buvo įformintas 2009 m. balandžio 3 d. Finansų ministerijos raštu, tyrimas dėl pažeidimo baigtas 2009 m. gegužės 28 d., t. y. per 35 darbo dienas po pažeidimo nustatymo / įtarimo;

- pažeidimas dėl įsigytos kompiuterinės įrangos ir įrengtos patalpos inžinieriui buvo įformintas 2008 m. balandžio 2 d. Aplinkos ministerijos raštu Nr. (15-1)-D8-2785, tyrimas dėl pažeidimo baigtas 2008 m. gegužės 9 d., t. y. per 27 darbo dienas po pažeidimo nustatymo / įtarimo;
- pažeidimas dėl Aukštrakių sąvartyno administraciniame pastate įrengto kompiuterių ir telefono tinklo buvo įformintas 2009 m. balandžio 14 d. Finansų ministerijos raštu Nr. ((18.27.8-01)-5K-0906907)-6K0903600, tyrimas dėl pažeidimo baigtas 2009 m. gegužės 4 d., t.y. per 14 darbo dienų po pažeidimo nustatymo / įtarimo.

Išvada

Nebuvo laikomasi Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307, kuriomis remiantis pažeidimo tyrimai turi būti atlikti per 10 darbo dienų nuo jų nustatymo datos.

13. Viešinimo priemonės

(26) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Kitam auditoriui nebuvo pateikti įrodymai (nuotraukos) dėl 20 informacinių stendų, buvusių prie atliekų priėmimo punktų, nors Projekto galutinėje ataskaitoje nurodyta, kad jie buvo pastatyti (119 psl.). Papildomai audito metu buvo peržiūrėtas Informacinių stendų pastatymo suderinimo aktas ir atliktų darbų aktai Nr.1-1, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, kuriais buvo patvirtintas informacinių stendų pastatymas pagal statybos darbų rangos sutartį Nr. A/2005/S04.

Kitam auditoriui nebuvo pateikti įrodymai (nuotraukos) dėl 15 informacinių stendų, įrengtų dėl mažųjų sąvartynų tvarkymo darbų, pastatytų prie įvažiavimų į savivaldybes, nors Projekto galutinėje ataskaitoje (119 psl.) nurodoma, kad jie buvo pastatyti. Papildomai audito metu buvo peržiūrėti atliktų darbų aktai Nr.1 ir Nr. 2, kuriais buvo patvirtintas informacinių stendų pastatymas pagal statybos darbų rangos sutartį Nr. A/2005/Š10.

Išvada

Auditoriui nepateikti įrodymai dėl 20 ir 15 informacinių stendų įrengimo atitinkamai pagal sutartį Nr. A/2005/S04 ir sutartį Nr. A/2005/Š10.

4 rekomendacija

Papildyti APVA procedūrų vadovą, numatant gauti iš galutinio paramos gavėjo, kaupiti ir saugoti viešinimo priemonių įrodymus (nuotraukas) dėl informacinių stendų įrengimo.

14. Projekto galutinė ataskaita

Finansų ministerija 2009 m. gegužės 11 d. raštu Nr. (18.27.8-01)-6K-0904922 (žr. 5 priedą) mums vertinti pateikė Projekto galutinę ataskaitą (žr. 7 priedą).

(27) Didelės svarbos pastebėjimas

Tarybos reglamento II priedo F straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Komisijai galutinė ataskaita turi būti pateikta per šešis mėnesius po to, kai baigiamas vykdyti projektas arba projekto etapas. Šio reglamento II priedo D straipsnio 2.d) dalyje nustatyta, kad per šešis mėnesius nuo nustatyto darbų pabaigos termino Komisijai pateikiama mokėjimo paraiška ir paraiška dėl išlaidų, nustatytų sprendime suteikti paramą projektui, projekto etapui ar projekto grupei.

Sanglaudos fondo ir Ex-ISPA 2000–2006 metų projektų uždarymo gairių (angl. *Guidelines on the Closure of Cohesion Fund and Ex-ISPA projects 2000-2006*)¹⁰ 2.2 p. rekomenduojama deklaraciją baigus teikti paramą pateikti per 6 mėn. nuo paskutinės išlaidų tinkamumo datos kartu su prašymu galutiniam mokėjimui ir galutine išlaidų deklaracija ir projekto galutine ataskaita.

Remiantis EK gairėmis dėl baigiamosios deklaracijos parengimo (angl. *Guidance note on declaration at winding-up of projects under article 12 1. f of Regulation 1164/94, article 13 and annex iii of regulation 1386/2002*), Valstybės kontrolė Deklaraciją turi pateikti užbaigus kiekvieną projektą, projekto etapą (techniškai ir finansiškai nepriklausomą) arba projektų grupę ir ne vėliau kaip pateikus prašymą galutiniam mokėjimui ir galutinę išlaidų deklaraciją.

Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (su pakeitimais), reglamentuoti projekto galutinės ataskaitos, galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos pateikimo susijusioms institucijoms terminai.

Remiantis taisyklių 6.10 p., mokėjimo institucija baigiamajam valstybiniam auditui atlikti pateikia įgyvendinančiosios institucijos patvirtintą galutinę projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitą ir mokėjimo paraišką Europos Komisijai galutinei išmokai gauti, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki nustatyto šių dokumentų pateikimo Europos Komisijai termino.

Mokėjimo institucija Projekto galutinę ataskaitą ir galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką deklaraciją baigus teikti paramą rengiančiai institucijai (Valstybės kontrolei) pateikė tik 2009 m. gegužės 11 d., t. y. likus 50 dienų iki Tarybos reglamentu nustatyto šių dokumentų pateikimo Europos Komisijai termino.

Audito metu mokėjimo institucija pateikė dokumentus, įrodančius, kad Projekto galutinė ataskaita, už kurios parengimą atsakinga APVA, parengta su dideliais trūkumais ir klaidomis. Jų

¹⁰ COCOF 08/0022/02-EN, final version of 23/04/2008.

taisymui skirta daug laiko ir pastangų, todėl užtruko galutinės ataskaitos vertinimas šioje institucijoje.

Išvada

Valdymo ir kontrolės sistemos institucijos neužtikrino kokybiškai ir laiku parengtos Projekto galutinės ataskaitos.

(28) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatėme šiuos neatitikimus Projekto galutinėje ataskaitoje:

- 22 psl. lentelėje Nr. 3 „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimo viešasis pirkimas“ skiltyje „Darbų teikimo terminai – Pabaiga“ nurodyta „2005-07-16“. Audito metu nustatyta, kad darbai buvo įforminti ir 2005 m. rugsėjo mėn. pagal rugpjūčio mėn. atliktus darbus, nors pagal sutartį darbų pabaiga 2005-08-19;
- 23 psl. lentelėje Nr. 5 „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statybos viešasis pirkimas“ skiltyje „Darbų teikimo terminai – Pabaiga“ nurodyta neteisinga darbų vykdymo pabaiga – 2008-02-26, nors turėtų būti 2007-02-26 pagal 2007-01-15 pakeitimą Nr. 1. Analogiška klaida, nurodant darbų pabaigos datą, buvo padaryta galutinės ataskaitos 40 psl.;
- 26 psl. lentelėje Nr. 7 „Mažųjų sąvartynų / šiukšlynų sutvarkymo ir kontenerinių aikštelių įrengimo viešasis pirkimas“ skiltyje „Darbų teikimo terminai – Pabaiga“ nurodyta, kad „2007-12-15, pratęsta iki 2008-05-30“, tačiau nenurodyta, kada šis pakeitimas buvo padarytas;
- 27 psl. lentelėje Nr. 8 „Kairių sąvartyno uždarymo I-ojo etapo viešasis pirkimas“ skiltyje „Darbų teikimo terminai – Pabaiga“ nurodyta, kad „2007-11-15, pratęsta iki 2008 m. kovo 12 d. ir iki 2008-06-15, tačiau nenurodyta, kada šie pakeitimai buvo padaryti;
- 30 psl. lentelėje Nr. 10 „Atliekų tvarkymo įrangos tiekimo viešasis pirkimas“ skiltyje „Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas“ c) dalies paskutiniame sakinyje nurodyta, kad „UAB „Mecro Technikonas“ 2008-07-08 pakviestas pasirašyti pirkimo sutartį“, nors audito metu peržiūrėjus susijusius su pirkimu dokumentus nustatyta, kad sprendimas dėl nugalėtojo buvo priimtas 2008-07-09 viešojo pirkimo komisijos posėdyje (protokolas Nr. VP-EP6). Taip pat nenurodyta, kad pirkimas vyko supaprastinto atviro konkurso būdu;
- 31 psl. lentelėje Nr. 10 „Atliekų tvarkymo įrangos tiekimo viešasis pirkimas“ skiltyje „Prekių teikimo terminai – Pabaiga“ nurodytas terminas pagal atitinkamą sutartį, o ne faktinis sutarties įvykdymas. UAB „Silberauto“ sutartis buvo įvykdyta 2006-12-18 (pasirašytas priėmimo perdavimo aktas), o ne 2006-10-22, kaip nurodyta;
- 68 psl. galutinės ataskaitos 2.6 skyriuje „Projekto atitiktis Finansavimo memorandumui“ 2 pastraipos paskutiniame sakinyje nurodyta, kad Finansinio memorandumo pakeitimas patvirtintas 2006 m. spalio 30 d., nors turėtų būti 2006 m. spalio 27 d.;

- 69 psl. lentelėje Nr. 17 „Pagal Finansavimo memorandumą pasiekti fiziniai elementai“ skiltyje „Fizinis įgyvendinimas“ nurodyti atitinkami fiziniai elementai: dugno sluoksnio įrengimas 41 000 m², šiukšlynų plotas 134,5 ha. Audito metu pagal gautus dokumentus nustatyta, kad Projekto fizinis įgyvendinimas išvardytų elementų turėtų būti atitinkamai: 42 099 m² ir 141,45 ha.
- 72 psl. lentelėje Nr. 19 „Projekto finansavimo šaltiniai“ yra aritmetinių klaidų eilutėje „Iš viso“ ties stulpeliais „Išmokėta pagal sutartį“, „Bendras sutarties įvykdymas“, „Bendras projekto įvykdymas“, skirtumas 16 516,73 EUR. Skiltyje „Bendras sutarties įvykdymas“ suma turėtų būti 188 523,11 EUR, o „Bendras projekto įvykdymas“ – 195 809,97 EUR;
- 77 psl. 3.3 skyriuje „Statybos sutarčių išskaidymas pagal atskirus komponentus“ nepateikta atskira lentelė apie Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimą Šiauliuose pagal sutartį su UAB „Šiaulių kelias“ (A/2004/S02) (nes tokia informacija yra pateikta apie visas kitas likusias sutartis);
- 78 psl. lentelės Nr. 23 „Aukštrakių sąvartyno įrengimo statybos darbų sutarties išskaidymas Sutartis Nr. A/2005/S05“ eilutėje 2.1.1 „Sąvartyno statybos darbai“ suma 1 925 131,75 EUR, eilutėje 2.1.2. „Sąvartyno įrenginiai“ suma 128 58,08 EUR ir eilutėje 2.2.1 „Tarnybinio pastato statybos darbai“ suma 156 904,21 EUR yra pateiktos įvertinus padarytus pakeitimus pagal pakeitimų orderius, o ne pagal pradinės sutarties informaciją;
- 88 psl. lentelėje Nr. 28 „Projekto nepanaudotos lėšos“ eilutėje „Viso“ pateiktos neteisingos sumos ties skiltimis „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba“ ir „Kairių sąvartyno uždarymas (I-as etapas)“ bei ties skiltimi „Viso“. Viso projekto nepanaudotos lėšos sudaro 195 809,98 EUR;
- galutinės ataskaitos 2.7. skyriuje (70 psl.), aprašant projekto įgyvendinimo patikras, nepateikta informacija apie APVA 2005–2008 m. atliktas patikras projekto vykdymo vietoje (žr. 9 lentelę, plačiau žr. 4 priedą).

9 lentelė. Informacija apie galutinėje ataskaitoje nepateiktas projekto patikras vietoje

Ataskaitos data, numeris	Patikrinimą atlikusi institucija	Patikros pobūdis ir objektas
2005-07-14 Nr. SA-05	APVA	Planinė – „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose“
2005-09-09 Nr. SA-11	APVA	Planinė – ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartis dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tarp Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centre
2006-05-24 Nr. SA-04	APVA	Planinė – „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba“, sutartis Nr. A/2005/S05

2006-05-26 Nr. SA-05	APVA	Planinė – „Atliekų priėmimo punktų statyba“, sutartis Nr. A/2005/S04
2007-01-10 Nr. SA-1	APVA	Planinė – „Atliekų priėmimo punktų statyba“, sutartis Nr. A/2005/S04
2007-01-10 Nr. SA-2	APVA	Planinė – „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštakiuose statyba“, sutartis Nr. A/2005/S05
2007-10-29 Nr. SA-18	APVA	Planinė – „Kairių sąvartyno uždarymo I-asis etapas“, sutartis Nr. A/2006/Š13
2007-10-29 Nr. SA-19	APVA	Planinė „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas“, sutartis Nr. A/2005/Š10
2008-07-24 Nr. SA/N-1	APVA	Neplanuota „Kairių sąvartyno uždarymas (I etapas)“, sutartis Nr. A/2006/Š13

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

Išvada

Projekto galutinėje ataskaitoje pateikta informacija neišsami, netiksli ir kai kuriais atvejais neatitinka informacijos, pateiktos kartu su išlaidas pateisinančiais ir apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais.

15. Projekto galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška

Finansų ministerija 2009 m. gegužės 11 d. raštu Nr. (18.27.8-01)-6K-0904922 (žr. 5 priedą) mums vertinti pateikė Projekto galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką, kurioje EK tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 868 876,58 EUR. Europos Komisijai deklaruota prašoma Bendrijos paramos likučio suma – 1 053 024,00 EUR (žr. 6 priedą).

Informacija apie Europos Komisijai teiktas mokėjimo paraiškas ir Europos Komisijos pervestas Sanglaudos fondo lėšas pateikta 10 lentelėje.

10 lentelė. Europos Komisijai teiktos mokėjimo paraiškos ir Europos Komisijos pervestos SF lėšos

Mokėjimo paraiška	Paraiškos pateikimo EK data	Mokėjimo paraiškoje prašoma SF dalis, EUR	EK pervesta SF dalis, EUR	Skirtumas, EUR
I avansinio	2002-07-31	526 512,00	526 512,00	-
II avansinio	2004-07-25	526 512,00	526 512,00	-
I tarpinio	2005-10-29	836 548,16	836 548,16	-
II tarpinio	2006-08-30	1 216 929,39	1 216 929,39	-
III tarpinio	2007-11-28	1 105 594,45	1 105 594,45	-
Galutinio	2009-05-11	1 053 024,00	-	1 053 024,00
Iš viso		5 265 120,00	4 212 096,00	1 053 024,00

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

11 lentelėje pateikiamas auditorių atliktas Sanglaudos fondo paramos likučio apskaičiavimas.

11 lentelė. SF paramos likučio apskaičiavimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Suma, EUR
1.	Finansiniu memorandumu patvirtinta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma	9 402 000,00
2.	EK deklaruotos tinkamos finansuoti Projekto išlaidos	10 050 955,44
3.	EK sprendimo biudžetą viršijanti dalis, finansuojama iš LR biudžeto lėšų (2 eil. - 1 eil.)	648 955,44
4.	Audito metu nustatytos netinkamos finansuoti Projekto išlaidos (žr. (22) ir (23) pastebėjimus ¹¹)	22 922,13
5.	Didžiausia galima SF paramos suma pagal Finansinį memorandumą (1 eil. x 56 proc.)	5 265 120,00
6.	Pagal avansinio ir tarpinio mokėjimo paraiškas Europos Komisijos pervestos sumos	4 212 096,00
7.	Perskaičiuotas SF paramos likutis (5 eil. – 6 eil.)	1 053 024,00

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad audito metu nustatėme netinkamų finansuoti išlaidų, Projekto galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje perskaičiuotas SF paramos likutis turi būti **1 053 024,00 EUR**.

(29) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Projekto galutinės mokėjimo paraiškos A priede „Projekto fizinio ir finansinio įgyvendinimo ataskaitoje“ skiltyje „Fizinis įgyvendinimas“ nurodyti atitinkami fiziniai elementai: kaupo dugno įrengimas 41 000 m², šiukšlynų plotas 134,5 ha. Audito metu pagal gautus dokumentus nustatyta, kad išvardytų elementų fizinis įgyvendinimas turėtų būti atitinkamai 42 099 m² ir 141,45 ha.

Išvada

Projekto galutinėje mokėjimo paraiškoje pateikta informacija, susijusi su fiziniu įgyvendinimu, yra netiksli ir kai kuriais atvejais neatitinka informacijos, pateiktos kartu su išlaidas pateisinančiais ir apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais.

¹¹ Remiantis COCOF 08/007/01 gairių 7.4 punktu, kai šalies narės valdymo ir kontrolės sistema pati nustato netinkamas finansuoti išlaidas ir jas pati ištaiso, šios netinkamos finansuoti išlaidos gali būti pakeistos kitomis to paties projekto ar kito projekto, numatyto tame pačiame sprendime, tinkamomis finansuoti išlaidomis. Atsižvelgiant į tai, kad audituojamo projekto išlaidos, viršijančios EK sprendimu nustatytą sumą, buvo 648 955,44 EUR, ši suma bus sumažinta 22 921,62 EUR netinkamų finansuoti išlaidų suma.

16. Klaidų vertinimas

Atlikę detalų testavimą, nustatėme žinomą klaidą – 22 922,13 EUR, susijusią su netinkamomis finansuoti išlaidomis dėl inžinieriaus aprūpinimo (žr. (23) pastebėjimą), ir dėl į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įtrauktas išlaidas tiesiogiai nesusijusias su šio turto įsigijimu (žr. (22) pastebėjimą). Audito metu nustatyta žinoma klaida neviršija nustatytos leistinos paklaidos dydžio (žr. 6 ataskaitos dalį) ir Projekto baigiamajam auditui taikyto reikšmingumo lygio, kuris yra 2 proc. visų EK deklaruotų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų, t. y. 201 019,11 EUR (žr. 6 ataskaitos dalį).

Išvada

Audito metu nustatyta žinoma klaida (22 922,13 EUR) neviršija nustatyto reikšmingumo lygio (201 019,11 EUR).

7-ojo audito departamento direktorė

Vilija Stirbienė

7-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė

Žaneta Rozenbergaitė

Valstybinio audito ataskaita pateikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, 3 egz.

Valstybinio audito ataskaitos kopija (nuorašas) pateikta Lietuvos Respublikos Seimui, 1 egz.

PRIEDAI

Valstybinio audito ataskaitos
 „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
 projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008
 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
 sistemos plėtra“
 1 priedas

Valstybinio audito ataskaitoje vartojamos santrumpos

Santrumpa	Pavadinimas
AM	Aplinkos ministerija
AM VAT	Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba
APVA	Aplinkos projektų valdymo agentūra
BF	Bendrasis finansavimas
Deklaracija	Deklaracija baigus teikti paramą
EK	Europos Komisija
EK rekomendacijos	EK rekomendacijos Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą
ES	Europos Sąjunga
FIDIC	Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
FNTT	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
GPG	Galutinis paramos gavėjas
IĮ	Igyvendinančioji institucija
LR	Lietuvos Respublika
MI	Mokėjimo institucija
NFD	Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentas
PRAG	Praktinis Phare, ISPA, SAPARD sutarčių parengimo procedūrų vadovas
RAPP	Rajono atliekų priėmimo punktas
SAPP	Seniūnijos atliekų priėmimo punktas
SF	Sanglaudos fondas
SFMIS	ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo informacinė kompiuterizuota valdymo ir priežiūros sistema
ŠRATC	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
TAS	Tarptautiniai audito standartai
TI	Tarpinė institucija
UAB	Uždaroji akcinė bendrovė
VBAMS	Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistema
VI	Vadovaujančioji institucija
VK	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
VPI	Viešųjų pirkimų įstatymas

Šaltinis – UAB „Ernst & Young Baltic“

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008
„Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
sistemos plėtra“
2 priedas

Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, kuriais remtasi valstybinio audito ataskaitoje

1. 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą.
2. 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1386/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų tvarkos atlikimo.
3. 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2003, nustatantis specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo.
4. 2004 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 621/2004, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su Sanglaudos fondo veikla.
5. 2005 m. balandžio 15 d. EK rekomendacijos dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą.
6. Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Finansinis memorandumas.
7. EK 2006-10-27 sprendimas Nr. K(2006)5294, iš dalies keičiantis Sprendimą PH/2001/5765 dėl paramos skyrimo projektui Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje CCI 2001/LT/16/P/PE/008
8. Sanglaudos fondo ir ex-ISPA priemonės projektų 2000–2006 uždarymo gairės, 2008-04-23 Nr. COCOF 08/0022/02-EN.
9. Practical Guide to PHARE, ISPA and SAPARD contract procedures (PRAG).
10. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas, 1995-05-30 Nr. I-907 (su pakeitimais).
11. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su pakeitimais).
12. Lietuvos Respublikos Seimo 2007-10-11 nutarimas Nr. X-1295 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Europos Sąjungos finansinės paramos auditus“ pakeitimo“.

13. Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (su pakeitimais).
14. Mokėjimo institucijos darbo procedūrų vadovas Europos Sąjungos Struktūriniais fondams ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondui, patvirtintas LR finansų ministro 2004-04-29 įsakymu Nr. 1K-166 „Dėl Mokėjimo institucijos darbo procedūrų vadovo Europos Sąjungos Struktūriniais fondams ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondui“ (su pakeitimais).
15. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų atrankinių patikrinimų pavyzdinė metodika, patvirtinta LR finansų ministro 2005-12-29 įsakymu Nr. 1K-404 „Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų atrankinių patikrinimų pavyzdinės metodikos patvirtinimo“.
16. Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymu Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų“ (su pakeitimais).
17. Aplinkos projektų valdymo agentūros procedūrų vadovas, patvirtintas APVA direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. T1-92 „Dėl Aplinkos projektų valdymo agentūros procedūrų vadovo patvirtinimo“ (su pakeitimais).
18. Pagrindinės sutarties vartotojo vadovas „Framework contract AMS/451 for operational short-term technical assistance to beneficiary countries“.
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1043 „Dėl informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių patvirtinimo“.

Valstybinio audito ataskaitos
 „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
 projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008
 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
 sistemos plėtra“
 3 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas

Rekomen- dacijos eilės numeris ataskaitoje	Pastebėjimas valstybinio audito ataskaitoje	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomen- dacija	Veiksmas / Priemonės / Komentarai	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data)
1.	(24) Didelės svarbos pastebėjimas Audito metu nustatėme, kad galutinis paramos gavėjas (ŠRATC) apskaitoje neparodė įsiskolinimo Valstybės biudžetui dėl pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų pagal nustatytus pažeidimus (žr. 8 skyrių „Pažeidimai“), t. y. 222 398,92 Lt (64 411,18 EUR). ŠRATC teigimu, iki šiol nėra gautas oficialus pranešimas dėl šių lėšų grąžinimo, kad būtų galima padaryti atitinkamą įrašą apskaitoje. Auditui pateiktoje Projekto galutinėje ataskaitoje teigiama, kad nustatytą pažeidimų (išskaičiuotą) sumą, atsiradus finansinėms galimybėms, ŠRATC sugrąžins iki 2009 m. gruodžio 31 d. (24 psl.). Audito metu nustatėme, kad MI (NFD) ir II (APVA) savo apskaitos sistemose apskaitė ne visas pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidas pagal nustatytus pažeidimus ir atitinkamai neparodė projekto įsiskolinimo valstybės biudžetui. MI apskaityta suma sudaro 58 733,57 EUR pagal AM VAT atliktą Projekto deklaruotų tinkamų finansuoti lėšų atrankinį patikrinimą (2007 m. lapkričio 19 d. ataskaita Nr. 4-4-(2)-07-17) bei 2007 m. spalio 11 d. LR finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentui atlikus patikrą II, prieš tvirtinant trečiąją tarpinę mokėjimo paraišką EK. Neapskaitytų išlaidų suma sudaro 2 352,75 EUR (2007 m. spalio 11 d. LR finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentui atlikus patikrą II, prieš tvirtinant trečiąją tarpinę mokėjimo paraišką EK). APVA nepateikė mokėjimo institucijai informacijos apie priimtą sprendimą susigrąžinti lėšas ir kitos reikalingos informacijos, todėl netinkamos finansuoti išlaidos ir skola valstybės biudžetui nebuvo užregistruotos MI apskaitos sistemoje.	Savo apskaitos sistemoje apskaityti netinkamų finansuoti išlaidų sumos dydžio (2 352,75 EUR) įsiskolinimą valstybės biudžetui	MI	MI 2009 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr.((18.9.4-01)-5K-0919314)-6K-0908925 „Dėl Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų grąžintinų sumų“ paprašė APVA iki rugsėjo 18 d. pateikti visų šios institucijos priimtų sprendimų susigrąžinti neteisėtai panaudotas Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšas kopijas.	Iki 2009-09-30

Rekomendacijos eilės numeris ataskaitoje	Pastebėjimas valstybinio audito ataskaitoje	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija	Veiksmas / Priemonės / Komentarai	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data)
	II neapskaityta suma – 12 414,41 EUR.				
2.	-“-,“	Savo apskaitos sistemoje apskaityti netinkamų finansuoti išlaidų sumos dydžio (12 414,41 EUR) įsiskolinimą valstybės biudžetui ir informuoti galutinį paramos gavėją (ŠRATC) apie nustatytus pažeidimus ir netinkamas finansuoti išlaidas.	APVA	Netinkamos finansuoti išlaidos bus užfiksuotos projektų apskaitos sistemoje Navision Attain.	Iki 2009-09-30
3.	-“-,“	Savo apskaitos sistemoje apskaityti netinkamų finansuoti išlaidų sumos dydžio (64 411,18 EUR) įsiskolinimą valstybės biudžetui.	ŠRATC	Savo apskaitos sistemoje apskaitys netinkamų finansuoti išlaidų sumą.	Iki 2009-09-18
4.	(26) Nedidelės svarbos pastebėjimas Kitam auditoriui nebuvo pateikti įrodymai (nuotraukos) dėl 20 informacinių stendų, buvusių prie atliekų priėmimo punktų, nors Projekto galutinėje ataskaitoje nurodyta, kad jie buvo pastatyti (119 psl.). Papildomai audito metu buvo peržiūrėtas Informacinių stendų pastatymo suderinimo aktas ir atliktų darbų aktai Nr.1-1, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, kuriais buvo patvirtintas informacinių stendų pastatymas pagal statybos darbų rangos sutartį Nr. A/2005/S04. Kitam auditoriui nebuvo pateikti įrodymai (nuotraukos) dėl 15 informacinių stendų, įrengtų dėl mažųjų sąvartynų tvarkymo darbų, pastatytų prie įvažiavimų į savivaldybes, nors Projekto galutinėje ataskaitoje (119 psl.) nurodoma, kad jie buvo pastatyti. Papildomai audito metu buvo peržiūrėti atliktų darbų aktai Nr.1 ir Nr. 2, kuriais buvo patvirtintas informacinių stendų pastatymas pagal statybos darbų rangos sutartį Nr. A/2005/Š10.	Papildyti APVA procedūrų vadovą, numatant gauti iš galutinio paramos gavėjo, kaupti ir saugoti viešinio priemonių įrodymus (nuotraukas) dėl informacinių stendų įrengimo.	APVA	Bus atsižvelgta į pastabą ir papildytas APVA procedūrų vadovas.	Iki 2009-09-30

Valstybinio audito ataskaitos
 „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
 projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008
 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
 sistemos plėtra“
 4 priedas

Informacija apie projekto patikrinimus

Patikrinimą atlikusi institucija	Patikros/ Patikrinimo ataskaitos data ir numeris	Patikros tipas	Patikros tikslas	Pastebėjimai ir rekomendacijos
Patikrinimai Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumui užtikrinti				
Finansų ministerija (Vadovaujančioji institucija)	2005-03-23 (patikros lapas Nr.4.8)	Patikrinimai Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumui užtikrinti	Nacionalinio fondo departamentas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija - Mokėjimo institucija: Patikrinimai Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumui užtikrinti	Pastebėjimų ir rekomendacijų prie patikros lapo nebuvo pateikta.
Finansų ministerija (Vadovaujančioji institucija ir Mokėjimo institucija)	2005-11-21 (VI patikros lapas Nr. 4.8) ir 2006-09-08 ataskaita	Patikrinimai Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumui užtikrinti.	APVA: Patikrinimai Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumui užtikrinti	Pastebėjimų ir rekomendacijų prie patikros lapo nebuvo pateikta. Patikros ataskaitoje pateiktos rekomendacijos: 2.2.1. Procedūrų vadove aprašyti naujai priimtų darbuotojų mokymo plano sudarymo ir esamų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procedūrą. 2.2.2. Patvirtinti darbuotojų pavadavimo planą su konkrečių darbuotojų pavardėmis. 2.3.1.1. Suderinti procedūrų vadovą su esamais teisės aktais. 2.3.1.2. Užtikrinti patikros lapų, numatytų procedūrų vadove, naudojimą. 2.3.1.3. Nustatyti procedūras, įpareigojančias pateikti vadovaujančiajai ir tarpinei institucijoms derinti įgyvendinančiosios institucijos su galutiniais paramos gavėjais numatomas sudaryti sutartis dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą. 2.3.1.4. Nustatyti procedūras, kaip įgyvendinančioji institucija vykdo ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 10.15 punkte numatytos funkcijos, perduotos galutiniam

Finansų ministerija
(Vadovaujančioji
institucija)

2006-03-06 (patikros
lapas Nr. 4.8)

Patikrinimai
Sanglaudos fondo
valdymo ir kontrolės
sistemos
efektyvumui
užtikrinti

Aplinkos ministerija: Patikrinimai
Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės
sistemos efektyvumui užtikrinti

paramos gavėjui, atlikimo priežiūrą. 2.3.2.1. Bylų nomenklatūroje nustatyti, kad dokumentų saugojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, kai iš EK gaunama galutinė išmoka projekto išlaidoms kompensuoti. 2.3.2.2. Patikslinti ir papildyti Procedūrų vadove esančią informaciją, susijusią su išlaptintos informacijos administravimu. 2.3.3.1. APVA darbuotojams atliekant pateiktų dokumentų kontrolę pagal kompetenciją vizuoti dokumentų, kurie pagrindžia šių darbuotojų nurodomus atsakymus patikros lape, lapus (išskyrus dokumentus, dėl kurių patikros lape pateikiama neigiama nuomonė) ir taip patvirtinti, kad šiuos dokumentus įvertino teigiamai. 2.3.3.2. Procedūrų vadove aprašyti procedūrą, kuria vadovaujantis atrenkami patikrinimui atliktų darbų akte nurodomi darbai, taip pat nustatant tikrintinų atliktų darbų kiekį procentais. Taip pat nurodyti, kad su galutiniu mokėjimu patikrinama pilnai, ar atliktų darbų aktuose nurodyti kiekiai neviršija rangovo pasiūlymų medžiagoje nurodytų kiekių. 2.3.5.1. Procedūrų vadove numatyti duomenų įtraukimo į SFMIS ir jos valdymo bei priežiūros tvarką. 2.3.5.2. Pritaikius SFMIS mokėjimo duomenims vesti, nedelsiant įtraukti tokius duomenis.

Pastebėjimai: 1.1. Nepakankamai apibrėžtos procedūros, susijusios su pažeidimų nustatymu, registravimu, tyrimu, šalinimu ir prevencija. 1.2. Neįgyvendinama ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų LRV 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026, 9.3 punkte tarpinėms institucijoms numatyta teisė atlikti įgyvendinančiosios institucijos ir galutinių paramos gavėjų patikrinimus, susijusius su Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimu, valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumu. 1.3. Neparengti ir į Europos Sąjungos sanglaudos fondo projektų administravimo procedūrų vadovą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2005-09-16 įsakymu Nr. D1-452, neįtraukti patikros lapai, susiję su pažeidimų nustatymo, įgyvendinančiųjų institucijų ir galutinių paramos gavėjų patikrinimų, sanglaudos fondo projektų pusmečio ir metinių ataskaitų tikrinimo procedūromis. Rekomendacijos: 2.1. Apibrėžti procedūras, susijusias su pažeidimų nustatymu, registravimu, tyrimu, šalinimu ir prevencija. 2.2. Parengti ir

Nacionalinio fondo
departamentas,
Finansų ministerija
(Mokėjimo institucija)

2005-04-13

Patikrinimai
Sanglaudos fondo
valdymo ir kontrolės
sistemos
efektyvumui
užtikrinti

APVA sukurtos valdymo ir kontrolės
sistemos efektyvumo įvertinimas
administruojant Sanglaudos fondo projektus
2000/LT/16/PE/001, 2000/LT/16/PE/002 ir
2001/LT/16/P/PA/002.

patvirtinti Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumui užtikrinti planą. 2.3. Vadovaujantis patvirtintu patikrinimų Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumui užtikrinti planu, atlikti aplinkos apsaugos įgyvendinančiojoje institucijoje ir galutiniuose paramos gavėjuose patikrinimus techniniu, finansiniu ir administraciniu aspektais. 2.4. Parengti ir į Europos Sąjungos sanglaudos fondo projektų administravimo procedūrų vadovą įtraukti patikros lapus, susijusius su pažeidimų nustatymo, įgyvendinančiųjų institucijų ir galutinių paramos gavėjų patikrinimų, Sanglaudos fondo projektų pusmečio ir metinių ataskaitų tikrinimo procedūromis.

Rekomendacijos: 2.2. 1) Patvirtinti darbuotojų pavadavimo planą su konkrečiomis darbuotojų pavardėmis; 2.2. 2) Procedūrų vadove aprašyti naujai priimtų darbuotojų mokymo plano sudarymo ir esančių valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo procedūras; 2.3. 1) Siekdami padidinti patikros procedūrų efektyvumą, siūlytume visuose patikros lapuose pateiktas lenteles papildyti dviem stulpeliais, skirtais klausimą užpildžiusio ir klausimą patikrinusio asmens parašams; 2.5. 2) Pagerinti atskaitomybės sistemą, kad informacija apie pasirašytus kontraktus būtų operatyviai įtraukiama į mokėjimo institucijai teikiamas ataskaitas; 2.5. 3) Jei tikrinimo procedūros užtrunka ir būtini papildomi veiksmai, šiuos faktus reikėtų nurodyti ir pildomame patikros lape; 2.6. 1) Siūlytume apsvarstyti galimybę papildyti ISPA sąskaitų patikrinimo ir tarpinio mokėjimo paraiškos patikros lapus papildomais klausimais: ar visos deklaruojamos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal ES reikalavimus; ar visos išlaidas pagrindžiančios apmokėtos sąskaitos atitinka projektą; 2.6. 3) Siūlytume dokumentuoti VBAMS ir valiutinių paraiškų kontrolę vizuojant šias paraiškas; 2.7. Procedūrų vadove detalizuoti buhalterinius įrašus, kurie nėra reglamentuoti kitais teisės aktais; 2.8. Patikslinti procedūrų vadovą dėl informavimo apie pažeidimus ir ataskaitų siuntimo; 2.9. iki 2009-05-31 suderinti bylų nomenklatūrą su Lietuvos archyvų departamentu prie LRV; 2.10. 1) Suderinus su galutiniais

paramos gavėjais ir kitomis atsakingomis institucijomis, aprašyti procedūras, kaip informuojama Agentūra, jei kitas nei valstybės biudžeto lėšas išmoka ne galutinis paramos gavėjas; 2.10. 2) Aprašyti procedūrą, užtikrinančią galutinės projekto ataskaitos parengimą likus bent šešiams mėnesiams iki galutinio EK nustatyto termino galutinio mokėjimo paraiškai pateikti, kad kitos atsakingos institucijos spėtų susipažinti su šia ataskaita ir suderinti nuomones. Taip pat numatyti galutinės ataskaitos pateikimą ne tik Nacionalinio fondo departamentui, bet ir Valstybės kontrolei, vykdančiai galutinį auditą.

Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikros

Tarpinė institucija	2007-07-08 Nr.5	Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikra	Sutarties Nr. A/2006/Š13 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kairių sąvartyno uždarymo I etapas“, pirkimas Nr. 37830.	Patikrinimo metu esminių pažeidimų LR viešųjų pirkimų įstatymui nenustatyta, išskyrus nustatytus pastebėjimus (pirkimo dokumentus pateikė ŠRATC, šios informacijos APVA dokumentų byloje nėra (7p.); Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita VPT pateikta vėliau nei per 14 dienų (13 p.); ne visi su pirkimu susiję dokumentai saugomi dokumentų byloje (14 p.)).
Tarpinė institucija	2007-09-04 Nr. 11	Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikra	Sutarties pav. „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas“, pirkimas Nr. 33089.	Patikrinimo metu LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatyta.
Tarpinė institucija	2007-09-20 Nr. 10	Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikra	Sutarties Nr. 2006/6/A/PT/LT „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Konteinerių įsigijimas“, pirkimas Nr. 36891.	Patikrinimo metu LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatyta, išskyrus pažymėtus pastebėjimus (byloje nėra įrodančio dokumento, kad vienas tiekėjų gavo pirkimo dokumentus (7 p.); ne visi dokumentai saugomi byloje (14 p.)).
Tarpinė institucija	2007-09-24 Nr. 11	Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikra	Sutarties Nr. 2006/5/A/PT/LT „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Atliekų tankintuvo įsigijimas“, pirkimas Nr. 36891.	Patikrinimo metu LR viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nenustatyta.
Tarpinė institucija	2007-09-28 Nr. 8	Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikra	Sutarties Nr. 2006/11/ND/PT/LT „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Daugiafunkcinio traktoriaus	Viešojo pirkimo procedūros atliktos laikantis VPI ir kitų teisės aktų reikalavimų. Nutraukiant atvirą konkursą nebuvo gautas VPT sutikimas nutraukti VP procedūrą (byloje nėra

			įsigijimas“, pirkimas Nr. 36891.	dokumento, įrodančio šį faktą). Byloje nėra dokumentų apyrašo.
Tarpinė institucija	2007-09-28 Nr. 10	Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikra	Sutarties Nr. A/2006/Š/15 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Privažiavimo kelio į naująjį Aukštakių sąvartyną statyba“, pirkimas Nr. 42303.	Viešojo pirkimo procedūros atliktos laikantis VPI ir kitų teisės aktų reikalavimų. Byloje nėra dokumentų apyrašo. Dokumentai susegti neišlaikant nuoseklumo. Nėra dokumentų, įrodančių konkurso dokumentų išsiuntimą tiekėjams.
Tarpinė institucija	2007-09-28 Nr. 7	Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikra	Sutarties Nr. 2006/9/A/PT/LT „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Sunkvežimio su priekaba įsigijimas“, pirkimas Nr. 36891.	Viešojo pirkimo procedūros atliktos laikantis VPI ir kitų teisės aktų reikalavimų. Byloje nėra dokumentų apyrašo.

Valdymo ir kontrolės sistemos auditas

LR aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba	2005-07-11	Valdymo ir kontrolės sistemos auditas	Patikrinti ir įvertinti FM 2001/LT/16/P/PE/008 projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ ES ISPA/Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo valdymo ir kontrolės sistemą, patikrinti, ar ji atitinka finansinio memorandumo ir komisijos reglamentų reikalavimus.	Vidaus audito ataskaitoje pateiktos išvados: ŠRATC nepilnai užtikrinama valdymo ir kontrolės sistema, įgyvendinant projektą, nes: 1. Esama prieštaravimų PIG vadovo pareiginių nuostatų reglamentavime įstaigos vidiniuose norminiuose dokumentuose; 2. Pateiktame ŠRATC etatų sąrašė nėra numatyta PIG vadovo pareigybė, kaip to reikalauja LR Aplinkos ministerijos APVA ir ŠRATC sutarties dėl užduočių pasiskirstymo 5 priedas, ŠRATC procedūrų vadovo 2-4 priedas; 3. ŠRATC direktorius vykdo funkcijas (PIG vadovo) nepriskirtas jam jo pareigybės aprašyme. Tokiu būdu neįgyvendinamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 3 straipsnio nuostatos, dėl aiškaus funkcijų atskyrimo. Rekomendacijos: 1. Suvienodinti PIG vadovo pareigybių aprašymo reglamentavimą ŠRATC vidiniuose aktuose; 2. Atskirti ŠRATC vadovo ir PIG vadovo funkcijas; 3. ŠRATC steigėjui įsteigti PIG vadovo etatą ir skirti tam lėšų; 4. ŠRATC direktoriui: perduoti visas PIG vadovo pareigybes aprašyme numatytas funkcijas naujai priimtam PIG vadovui. Audito atlikimo metu buvo parengta ir pasirašyta APVA (2004-11-04) ir ŠRATC (2004-11-15) „ISPA/ Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartis dėl užduočių ir

atsakomybės pasiskirstymo tarp Aplinkos ministerijos APVA ir ŠRATC“, tačiau ši sutartis nebuvo patvirtinta Aplinkos ministerijos, todėl neturi pilnos teisinės galios, ir visi reikalavimai, kylantys iš šios sutarties, gali būti ginčijami, dėl nepakankamo šios rūšies sutartims teisės aktuose numatytų procedūrų laikymosi. Sutartis įsigalioja tik pasirašius visoms sutarties šalims. Kol Aplinkos ministerija nepatvirtins sutarties, už projekto įgyvendinimą bus atsakinga APVA. Rekomendacijos: Aplinkos ministerijos sekretoriui patvirtinti sutartį.

Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimai

LR aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba	2007-11-19 Nr.4-4-(2)-07-17	Atrankinis patikrinimas pagal VAT 2007 metų planą	Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimas ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Iki patikrinimo visų deklaruotų išlaidų suma sudarė 12 661 155,87 Lt, atrankinio patikrinimo metu patikrinta suma sudarė 6 552 079,72 Lt, t.y. 52% visų iki patikrinimo deklaruotų išlaidų sumos.	Ataskaitoje pateiktos išvados: 1. Sutarties Nr. A/2005/S05 „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba“ ADA Nr. 3 aktuojama kompiuterinė įranga yra netinkamos finansuoti išlaidos. Netinkamų išlaidų suma - 112 323,25 Lt. 2. Sutarties Nr. A/2005/05 „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba“ ADA Nr. 1 aktuotos išlaidos skirtos „Patalpos inžinieriui įrengimui“ – 67 211,20 Lt neatitinka EK reglamento (EB) nr. 16/2003 25 str. reikalavimų išlaidų tinkamumui. 3. ŠRATC vykdant projekto apskaitą nėra laikomasi apskaitos standartų. 4. Rangovo AS „Merko Ehitus“ Aukštrakių sąvartyno statybos darbų žurnale nėra įrašų apie 2005 m. gruodžio mėn. atliktus darbus, kurie buvo aktuoti atliktų darbų akte Nr. 2. Tokiu būdu Rangovas nesilaikė Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 2002 m. spalio 31 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 571 reikalavimų ir sutarties Nr. A/2005//S05 bendrųjų sąlygų. 5. Rangovo AS „Merko ehitus“ Aukštrakių sąvartyno statybos darbų žurnaluose atliekamų darbų kiekiai pateikiami naudojant kitokius nei sutarties kiekių žiniaraščiuose matavimo vienetų, darbų pavadinimai neatitinka kiekių žiniaraščiuose naudojamų darbų pavadinimų. Tokiu būdu pildant statybos darbų žurnalus nėra užtikrinama tinkama audito seka. 6. ŠRATC apskaitoje sąskaitų apmokėjimą galima identifikuoti tik pagal sumą, operacijų įrašai neapima patvirtinamųjų dokumentų (rangovo sąskaitų) pobūdžio, numerio ir datos. Valdymo ir kontrolės sistemos įvertinimas. Projekto

valdymo ir kontrolės sistema gali būti vertinama kaip patenkinama, nustatyta projekto valdymo ar jo įgyvendinimo neatitikimų, klaidų, kurie gali turėti neigiamą įtaką projekto įgyvendinimui.

Patikros projekto vykdymo vietoje

APVA (Įgyvendinančioji institucija)	2004-12-02 Nr. SA-3	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė sutarties „ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartis dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tarp Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vykdymo“ patikra	Bendra išvada: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro bei Šiaulių apskrities savivaldybių ir apskrities veikla, tvarkant žemės nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, yra nepatenkinama. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras turėtų geriau atlikti užsakovo funkcijas, kaip tai LR statybos įstatyme ir Statybos techniniuose reglamentuose. Būtinai veiksmai: 1) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras privalo skatinti savivaldybes ir apskrities viršininko administraciją, kad sutvarkytų sąvartynų teritorijų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus. 2. Iki 2004-12-31 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras privalo paruošti ir pateikti APVA'ai 2005 metų projekto įgyvendinimo grafiką. 3. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras privalo pateikti APVA'ai visuomenės informavimo veiksmų planą. 4. Iki 2005-02-01 pateikti APVA'ai sutarties ir darbo užduoties nesilaikymo, vėlavimo ir kitų trūkumų, kurie pastebėti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro veikloje, detalią ataskaitą bei siūlymus, kaip spręsti problemas, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendinamas. 5. Nuolat APVA'ai teikti informaciją apie įvykius, kurie gali neigiamai paveikti projekto įgyvendinimą. 6. Pateikti APVA'ai ISPA/Sanglaudos programos sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkimo patvirtinimą. 7. APVA iki gruodžio pabaigos pateiks Procedūrų vadovą.
APVA (Įgyvendinančioji institucija)	2005-07-14 Nr. SA-05	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė – „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose“	Projekto įgyvendinimas vėlavo apie 2 mėnesius. Patikros metu įsitikinta, kad ataskaitose patvirtinti darbai yra atlikti. Patikros metu nebuvo nustatyti trūkumai, kurie neigiamai paveiktų tolesnį projekto įgyvendinimą.

APVA (Igyvendinančioji institucija)	2005-09-09 Nr. SA-11	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė - ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartis dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tarp Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro	Patikros vietoje atlikimo išvados: Esminių trūkumų nebuvo nustatyta. Rekomendacijos paramos gavėjui: Nuolat koreguoti Procedūrų vadovą, atsižvelgiant į pastebėtus trūkumus ar klaidas, bei reaguojant į besikeičiančią padėtį.
APVA (Igyvendinančioji institucija)	2006-05-24 Nr. SA-04	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė – „Naujojo regioninio sąvartyno Aukšttrakiuose statyba“, sutarties Nr. A/2005/S05	Patikros vietoje atlikimo išvados: Patikros metu nebuvo nustatyti trūkumai, kurie neigiamai paveiktų tolesnį projekto įgyvendinimą.
APVA (Igyvendinančioji institucija)	2006-05-26 Nr. SA-05	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė – „Atliekų priėmimo punktų statyba“, sutarties Nr. A/2005/S04	Patikros vietoje atlikimo išvados: Patikros metu nebuvo nustatyti trūkumai, kurie neigiamai paveiktų tolesnį projekto įgyvendinimą.
APVA (Igyvendinančioji institucija)	2007-01-10 Nr. SA-1	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė – „Atliekų priėmimo punktų statyba“, sutarties Nr. A/2005/S04	Patikros vietoje atlikimo išvados: Trūkumų nenustatyta.
APVA (Igyvendinančioji institucija)	2007-01-10 Nr. SA-2	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė – „Naujojo regioninio sąvartyno Aukšttrakiuose statyba“, sutarties Nr. A/2005/S05	Patikros vietoje atlikimo išvados: Nustatyti trūkumai neturės esminės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.
APVA (Igyvendinančioji institucija)	2007-10-29 Nr. SA-18	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė – „Kairių sąvartyno uždarymo I-asis etapas“, sutarties Nr. A/2006/Š13	Patikros vietoje atlikimo išvados: Esminių trūkumų, kurie įtakotų tolesnį sutarties įgyvendinimą, nebuvo nustatyta. Pastabos ir rekomendacijos: 1. Rengti pilnas rangovo teikiamų aktų suvestines, kuriose matytųsi kiekvieno mėnesio kiekvienos akto eilutės kiekis ir suma, bei atskiram stulpelyje būtų sumuojami visų mėnesių kiekiai ir sumos. Patvirtinus pakeitimo nurodymus, koreguoti aktų suvestinėje atitinkamas eilutes. 2. Patvirtinti pakeitimo nurodymų tikrinimo ir tvirtinimo įstaigoje procedūrą bei priskirti darbuotojus, kurie atsakingi už pakeitimo nurodymų pagrįstumo, atlikimo sutarties kiekių žiniaraščiams bei aritmetikos tikrinimą. 3. Per dvi savaites nuo ataskaitos gavimo dienos pateikti aukščiau nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą.

APVA (Igyvendinančioji institucija)	2007-10-29 Nr. SA-19	Planinė patikra projekto vykdymo vietoje	Planinė – „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir kontenerinių aikštelių įrengimas“, sutarties Nr. A/2005/Š10	Patikros vietoje atlikimo išvados: Patikros metu apsilankytose vietose pažeidimų nenustatyta, tačiau yra rizika, kad rangovas laiku nespės įvykdyti sutarties apimtyje numatytų darbų. Pastabos ir rekomendacijos: 1. Rengti pilnas rangovo teikiamų aktų suvestines, kuriose matytųsi kiekvieno mėnesio kiekvienos akto eilutės kiekis ir suma, bei atskiriame stulpelyje būtų sumuojami visų mėnesių kiekiai ir sumos. Patvirtinus pakeitimo nurodymus, koreguoti aktų suvestinėje atitinkamas eilutes. 2. Patvirtinti pakeitimo nurodymų tikrinimo ir tvirtinimo įstaigoje procedūrą bei priskirti darbuotojus, kurie atsakingi už pakeitimo nurodymų pagrįstumo, atlikimo sutarties kiekių žiniaraščiams bei aritmetikos tikrinimą. 3. Per dvi savaites nuo ataskaitos gavimo dienos pateikti aukščiau nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą.
APVA (Igyvendinančioji institucija)	2008-07-24 Nr. SA/N-1	Neplanuota	„Kairių sąvartyno uždarymas (I etapas)“, sutarties Nr. A/2006/Š13. (Pakeitimų orderio Nr.6 (08.04.28) kiekių natūroje bei su juo susijusių techninių ir finansinių dokumentų bei darbų patikrinimas. Patikrinti dokumentai: statybos leidimas, statybos žurnalai, techninis projektas, žiniaraščiai, brėžiniai bei darbai natūroje.)	Išvados: 1. Darbai yra atlikti, jie nėra įtraukti į ankstesnius jau įvykdytų darbų aktus 2. Nustatyta, kad pakeitimo orderyje Nr. 6 nurodyti papildomi darbai gali būti atliekami šios sutarties apimtyse, paskaičiuoti kiekiai yra tinkami, ir yra susiję su nenumatytomis fizinėmis sąlygomis. 3. Pagal statybos normų reikalavimus techninio projekto papildymas turi būti derinamas su projekto rengėju. Inžinierius informavo, kad projekto vykdymo priežiūros funkciją atlieka inžinierius, tokiu atveju užtenka jo suderinimo. 4. Papildomų darbų vienetų įkainiai nustatyti, vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais, išskyrus poziciją Nr.2.18, reikia pataisyti sąmatą. 5. Pakeitimų orderio įforminimas dalinai neatitinka FIDIC sutarties reikalavimų, kadangi pakeitimų užsakymą inicijavo ne rangovas, o užsakovas kartu su savo atstovu - inžinieriumi. Tad reikia patikslinti / pateikti papildomus dokumentus. 6. Rangovas ir inžinierius atitinkamai turi patikslinti Statybos žurnalą, o darbai turi būti įtraukti į išpildomąją dokumentaciją. 7. Pageidautina, kad į pakeitimų orderį įtrauktas rezervo balansas (Užsakovo rezervo likutis pagal sutartį yra 121 815 Lt, numatyta papildomų darbų suma yra 70 948 Lt.). 8. Užsakovas turi tikrinti ir kontroliuoti, kaip nurodo savo 2008-07-04 papildomame paaiškinime, kad koreguojant techninį projektą, pakeitimų orderyje Nr. 6 atlikti darbai nebūtų

įtraukti į II etapo darbus.

Patikrą vietoje atliko
UAB „Ernst & Young
Baltic”

2009-07-08


Patikra vietoje

Žr. šios ataskaitos 8 dalyje.

Esminių trūkumų nebuvo nustatyta.

Šaltinis – AM VAT, VI, MI, APVA, UAB „Ernst & Young Baltic“

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008
„Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
sistemos plėtra“
5 priedas



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
Finansinio audito 7-ajam departamentui

2009-05-11 Nr. (18.27.8-01)-6K-09049221

**DĖL MOKĖJIMO PARAIŠKOS GAUTI IŠ SANGLAUDOS FONDO GALUTINĘ IŠMOKĄ
PROJEKTO NR. 2001/LT/16/P/PE/008 IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI**

Siunčiame Jums Finansų ministerijos (Sanglaudos fondo mokėjimo institucijos) patvirtintos galutinio mokėjimo paraiškos Europos Komisijai gauti iš Sanglaudos fondo galutinę išmoką projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ išlaidoms kompensuoti kopiją kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūros (įgyvendinančiosios institucijos) patvirtinta projekto galutinės ataskaitos kopija (pridedama).

PRIDEDAMA:

1. Mokėjimo paraiškos Europos Komisijai kopija, 17 lapų.
2. Projekto galutinės ataskaitos ir jos priedų kopijos, 1 egzempliorius.

Ministerijos sekretorius

Aloyzas Vitkauskas

Donatas Skara, tel. 2390 283

Valstybės biudžetinė įstaiga
J. Tumo-Vaižganto g. 8A/2, LT-01512 Vilnius

Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481

El. paštas finmin@finmin.lt
<http://www.finmin.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 288601650

DS_CF_VK_2001PPE008_GA_MP_20090508

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008
„Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
sistemos plėtra“
6 priedas

Projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita

CERTIFICATE AND STATEMENT OF EXPENDITURE AND APPLICATION FOR PAYMENT

EUROPEAN COMMISSION

KOPIJA

Cohesion Fund

(Final certificate and statement of expenditure and application for payment)

Name of project: **Šiauliai Regional Waste Management Systems Development**

Commission Decision No _____ of **21/12/2001**

Commission Reference (CCI No) **2001/LT/16/P/PE/008**

National reference _____ (if any)

CERTIFICATE

I, the undersigned Mr. Aloyzas Vitkauskas, Undersecretary of the Ministry of Finance, representing the paying authority designated by¹ the Government of the Republic of Lithuania Resolution No. 1026 on the Administration of Assistance from the European Union's Cohesion Fund in Lithuania of 24 August 2001 (Official Gazette No. 74-2596, 2001, No. 103-3777, 2004, No. 87-3483, 2008), hereby certify that all eligible expenditure included in the attached statement, representing the contributions of the Cohesion Fund and national funding, was paid in line with the progress of the project

after²:

2	1	1	2	2	0	0	1
d	d	m	m	y	y	y	y

and amounts to:

10.050.955,44	EUR
(exact amount to two decimal places)	

The attached statement of expenditure broken down by category of expenditure, and by project in the case of a group of projects, covers expenditure up to


3	1	1	2	2	0	0	8
(dd/mm/yyyy)							

and is an integral part of this certificate, as is the accompanying report on progress of the project compared with plans.

I also certify that the project is making satisfactory progress towards completion in accordance with the objectives and that the information given in the progress report is correct.

¹ Indicate the administrative instrument of designation in accordance with Article D(1) and (4) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, with appropriate references and the date.

² Starting date for eligibility of expenditure under the decision.



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2009-05-11

I further certify that the project is being implemented in accordance with the terms of the decision and in compliance with the provisions of Regulation (EC) No 1164/94, in particular as regards:

1. compliance with the provisions of the Treaty and instruments adopted under it and with Community policies, in particular the rules on protection of the environment, transport (including trans-European networks), competition, and the award of public contracts (Article 8 of Regulation (EC) No 1164/94);
2. application of management and control procedures to the project, in particular to verify the reality of expenditure claimed and the proper execution of the project in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1386/2002 and to prevent, detect and correct irregularities, pursue fraud, and recover unduly paid amounts (Article 12 of Regulation (EC) No 1164/94 and Articles G and H of Annex II thereto).

In accordance with Article G(3) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, the supporting documents are and will continue to be available for a minimum period of three years following payment of the balance by the Commission.

I certify that:

1. the statement of expenditure is accurate and results from accounting systems based on verifiable supporting documents;
2. the statement of expenditure and the application for payment take account of any recoveries made and interest received thereon;
3. details of the underlying transactions are recorded, where possible, on computer files and are available on request to the Commission departments responsible.

Date

1	1	0	5	2	0	0	9

 (dd/mm/yyyy)


ALOYZAS VITKAUSKAS

Undersecretary of the Ministry of Finance

Name in capitals, stamp, position and signature of competent authority



TIKRA
Skryniaus vedėja


Aldona Čepelienė

2009 -05- 11

Statement of expenditure incurred in the project³
 Reference No (CCI code – Code commun d'identification): 2001/LT/16/PE/008
 Name of project: Siauliai Regional Waste Management Systems Development
 Date: 31/12/2008

Category of expenditure	Total expenditure incurred to date (between 21/12/2001 ⁴ and 31/12/2008)	Expenditure certified in present declaration	Total expenditure planned (initial budget)	Expenditure incurred to date, as proportion of initial budget (%)	Estimated expenditure still required to complete measure
1. Planning	594.000,00	0,00	594.000,00	100,00	0,00
2. Land acquisition					
3. Site preparation ⁷					
4. Building and construction ⁶	8.338.071,31	3.647.092,81	7.718.270,36	108,03	0,00
5. Equipment	639.677,92	125.173,77	575.971,22	111,06	0,00
6. Technical assistance	479.206,21	96.610,00	488.560,00	98,09	0,00
7. Publicity ⁵					
8. VAT or equivalent					
9. Other (contingencies, reserves)	0,00	0,00	25.198,42	0,00	0,00
TOTAL	10.050.955,44	3.868.876,58	9.402.000,00	106,90	0,00

³For decisions on groups of projects, expenditure must be broken down by projects, except where the expenditure is common to the group, as it in the case of technical assistance or publicity.

⁴Starting date for eligibility of expenditure.

⁵Under Decision 96/445/EC (OJ L 188, 27.7.1996, p. 47).

⁶Expenditure exceeding Financing memorandum EUR 717.468,94 financed by State Budget during the period of 21/12/2001 – 31/12/2008.

⁷Site preparation costs, included in the application for assistance for project "Siauliai Regional Waste Management Systems Development", are subsumed in building and construction contracts.



TIKRA
 Skryniaus vedėja
 Aldona Čepelienė

2009-05-11

Annex to statement of expenditure: recoveries effected since the last certified statement of expenditure and included in the present statement of expenditure

<i>Amount ordered to be recovered</i>	N.A.
<i>Debtor</i>	N.A.
<i>Date of issue of recovery order</i>	N.A.
<i>Authority which issued recovery order</i>	N.A.
<i>Date of recovery</i>	N.A.
<i>Amount recovered</i>	N.A.



TIKRA
 Skyriaus vedėja
 Aldona Čepelienė

2009-05-11

APPLICATION FOR FINAL PAYMENT

Name of project: Šiauliai Regional Waste Management Systems Development

Commission reference (CCI No) 2001/LT/16/P/PE/008

Pursuant to Article D(2)(d) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, I, the undersigned Mr. Aloyzas Vitkauskas, Undersecretary of the Ministry of Finance, request payment of the amount of **EUR 1.053.024,00** as a final payment. This application meets the admissibility requirements because:

Delete as appropriate

(a)	the report on the progress of the project in relation to physical and financial indicators and demonstrating its conformity with the decision granting the assistance, including the specific conditions laid down	- is enclosed as Annex A
(b)	the final report on implementation required under the Annex to Annex II to the Regulation, including in the latter case details of compliance with the public procurement rules	- is enclosed
(c)	observations and recommendations made by national and/or Community audit authorities, in particular the correction of suspected or proven irregularities	- are enclosed as Annex C
(d)	the main technical, financial and legal problems that have arisen and the measures taken to correct them	- are indicated in Annex D
(e)	the analysis of any departures from the original financial plan	- is enclosed as Annex E
(f)	the publicity measures taken with regard to the measure	- are indicated in Annex F
(g)	none of the certified expenditure has been suspended pursuant to Article G(2) or H(2) of Annex II to the Regulation	

Payment should be made to:

Beneficiary:	Name: Ministry of Finance of the Republic of Lithuania Address: T. Vaižganto 8a/2, LT 01512, Vilnius, Lithuania Contact: Mr. Donatas Skara Telephone: +370 5 239 02 83 E-mail: D.Skara@finmin.lt Fax: +370 5 239 00 39
Bank:	Bank name: Bank of Lithuania Bank address: Gedimino av. 6, Vilnius, Lithuania Post Code: LT 01103 Town: Vilnius Sort code: 10100 BIC code: LIABLT2X
Account No.:	632425 IBAN LT62 1010 0000 0063 2425
Account holder (if different from beneficiary)	

Date



11	05	20	09

 (dd/mm/yyyy)

ALOYZAS VITKAUSKAS

Undersecretary of the Ministry of Finance

Name in capitals, stamp, position and signature of competent authority



TIKRA

Skyriaus vedėja

2009-05-11

Aldona Čepelienė

A PRIEDAS

Projektu „įvadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“
Finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/PE/008, patvirtintas 2001/12/21

Projekto fizinio ir finansinio įgyvendinimo ataskaita

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos	Fizinis įgyvendinimas					Finansinis įgyvendinimas					Finansinio įgyvendinimo lygis (%)	Fizinio įgyvendinimo lygis (%)
	Fiziniai rodikliai (*)		fizinis įgyvendinimas nuo paskutinių metų mokestimo paraiškos (2007-07-01)	fizinis įgyvendinimas iki šios mokestimo paraiškos (2008-12-31)	fizinio įgyvendinimo eiga (%)	Finansiniai rodikliai			išlaidos iki šios mokestimo paraiškos (2008-12-31) (**)			
	vienetas	kiekis				numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (eurais)	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (%)	išlaidos nuo paskutinių mokestimo paraiškos (2007-07-01) (**)				
										(8)-(7)/(7 iš viso)*100		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)*100	(7)	(8)-(7)/(7 iš viso)*100	(9)	(10)	(11)=(10)/(7)*100	(12)=(6)*(8)/100	
Techninio projekto ir konkurso dokumentacijos parengimas	%	100	0,0	100,0	100,0	594.000,00	6,3	0,00	594.000,00	100,0	6,3	
Naujojo regioninio sąvartyno Aukštiraknių statyba	%	100	55,0	100,0	100,0	2.731.989,38	29,1	1.503.358,48	2.663.476,34	97,5	29,1	
Aparatavimo atliekų, infrastruktūros statiniai bei tarpinės pastatų	m ²	1	1,0	1,0	100,0							
Žemės darbai	m ²	70.000	24.500,0	70.000,0	100,0							
Kurpų dugnas	m ²	41.000	16.400,0	41.000,0	100,0							
Plintu apdailinti ir tvarkymo sistema	komplektas	1	1,0	1,0	100,0							
Privaziavimo kelių į naująjį Aukštiraknių sąvartynų statyba	m	2.050	0,0	2.064	100,7	554.204,86	5,9	248.925,79	554.204,86	100,0	5,9	
Kairių sąvartyno uždarymo I-asis etapas	%	100	35,0	100,0	100,0	1.903.740,76	20,2	774.397,67	1.903.740,76	100,0	20,2	
Plintu apdailinti ir tvarkymo sistema	komplektas	1	0,0	1,0	100,0							
Atliekų priėmimo punkty statyba	%	100	0,0	100,0	100,0	1.074.193,99	11,4	107.940,68	1.074.193,99	100,0	11,4	
Seniūnijų atliekų priėmimo punktai	vnt	6	0,0	6,0	100,0							
Mažųjų sąvartynų/šiltnaminių suvartynų ir konteinerinių atliekų įrengimas (***)	%	100	18,0	100,0	100,0	1.125.196,88	12,0	1.012.470,19	1.842.665,82	163,8	12,0	
Šiltnaminių suvartynų	vnt	116	17,0	116,0	100,0							
Šiltnaminių plotas	ha	134,5	20,5	134,5	100,0							
A tipo konteinerinės atliekų	vnt	165	58,0	165,0	100,0							
B tipo konteinerinės atliekų	vnt	82	4,0	82,0	100,0							
Žaliųjų atliekų kompostavimo atliekų įrengimas šiltnamiose	%	100	0,0	100,0	100,0	299.790,00	3,2	0,00	299.790,00	100,0	3,2	
Atliekų tvarkymo įrengimo teiktas	%	100	15,0	100,0	100,0							
Atliekų tankinimo įrengimas	vnt	1	0,0	1,0	100,0	220.090,94	2,3	0,00	220.090,94	100,0	2,3	
Konteinerių įrengimas	vnt	6	0,0	6,0	100,0	18.414,62	0,2	0,00	18.414,62	100,0	0,2	
Dugidukacinio traktoriaus įsigijimas	vnt	1	0,0	1,0	100,0	66.610,80	0,7	0,00	66.610,80	100,0	0,7	
Sunkvežinio su priekaba įsigijimas	vnt	1	0,0	1,0	100,0	118.418,14	1,3	0,00	118.418,14	100,0	1,3	
Kompostuojamų atliekų emulsiatorius	vnt	1	0,0	1,0	100,0	90.969,65	1,0	0,00	90.969,65	100,0	1,0	
Kompostų vartynas - kančias	vnt	1	1,0	1,0	100,0	28.151,07	0,3	28.151,07	28.151,07	100,0	0,3	
Elektroninio įrengimas	vnt	1	1,0	1,0	100,0	97.022,70	1,0	97.022,70	97.022,70	100,0	1,0	

SKYRIAUS VEDĖJA



2009-05-11

Aldona Čepėlienė

A PRIEDAS

Projektų įgyvendinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra
 Finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PE/008, patvirtintas 2001/12/21

Projekto fizinio ir finansinio įgyvendinimo ataskaita

Tinkamą finansuoti išlaidų kategorijos	Fizinis įgyvendinimas				Finansinis įgyvendinimas				Finansinio įgyvendinimo lygis (%)	Fizinio įgyvendinimo lygis (%)	
	Fiziniai rodikliai (*)		fizinis įgyvendinimas nuo paskutinės mokėjimo paraiškos (2007-07-01)	fizinis įgyvendinimas iki šios mokėjimo paraiškos (2008-12-31)	fizinio įgyvendinimo eiga (%)	Finansiniai rodikliai		išlaidos nuo paskutinės mokėjimo paraiškos (2007-07-01) (**)			išlaidos iki šios mokėjimo paraiškos (2008-12-31) (***)
	vietetas	kiekis				numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (eurais)	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)*100	(7)	(8)=(7)/(7 iš viso)*100	(9)	(10)	(11)=(10)/(7)*100	(12)=(6)/(8)*100
Techninė pagalba Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui	%	100	0,0	100,0	100,0	189 256,21	2,0	0,00	189 256,21	100,0	2,0
Techninė priežiūra Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui	%	100	15,0	100,0	100,0	289 950,00	3,1	96 610,00	289 950,00	100,0	3,1
IŠ VISO						9 402 000,00	100	3 868 876,58	10 050 955,44	106,9	100,0
										Bendras finansinio įgyvendinimo lygis	Bendras fizinio įgyvendinimo lygis

(*) Apima 100% visų tinkamų finansuoti išlaidų

(**) Finansinis įgyvendinimas pagal kiekvieną sutarčių komponentą nenurodytas, kadangi toks sumokėtu lėšų išskirtas yra labai sudėtingas arba neįmanomas. Pagal darbų sutarčių sąlygas, iš kiekvieno tarptinio mokėjimo pažymos sumos yra gražinamas sumokėtas avansas ir subalansuoti pinigai. Gražinimo ir subalansavimo dydis yra nustatomas kiekvienoje darbų rangos sutartyje. Norint išskirti sumokėtą sumą pagal kiekvieną sutarčių komponentą, sugrąžinto avanso ir subalansuotų pinigų sumos taip pat turėtų būti išskaidytos kiekvienam komponentui. Dėl šios priežasties rangovų teiktamos sąskaitos ir tarptinio mokėjimo pažymos pasidaryti labai sudėtingos. Be to, sutartyje numatyti bendrojo pobūdžio darbai apima visus komponentus, todėl jų paskirstymas asimetrinis komponentams yra neįmanomas.

(***) Sutarčiai „Mažųjų sąvartynų/šluoslynų sutvarkymas ir konteinerinių atliekų įrengimas“ iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto buvo papildomai skirta 789 568,53 euro, kadangi gauti pasitvirtinti vizijos. Finansiniame memorandume numatyta biudžetą. Šios lėšos nėra įtrauktos į tinkamų finansuoti išlaidų sumą (7 stulpelis). Per deklaruojamą laikotarpį buvo panaudota 351 199,27 euro ir ši suma buvo įtraukta į bendrą deklaruojamų išlaidų sumą (9 ir 10 stulpeliai).



TIKRA
 Skyriaus vedėja
 Aldona Čepelytė

2009-05-11

A PRIEDAS (tesinys)

Projekto pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PE/008

SU PROJEKTU SUSIJUSIOS SPECIALIOS SĄLYGOS (8 FINANSINIO MEMORANDUMO STRAIPSNIS)

Nurodomos specialiosios sąlygos bei kaip ir kada jos buvo įgyvendintos:

1. Su prielaidomis ir turto statusu susijusi sąlyga.

Šalis paramos gavėja nenumato pokyčių ir esminių pakeitimų susijusių su vykdymo ar įgyvendinimo sąlygomis, išsipareigojimais ir t.t. Nenumatoma ir nuosavybės teisių į bet kurią projekto lėšomis finansuotos infrastruktūros dalį bei veiklos sąlygų pasikeitimą.

2. Sąlyga, susijusi su projekto gyvybingumu.

Viešojoji įstaiga „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ buvo įkurta 2002 m. Ji atsakinga už efektyvų projekto įgyvendinimą.

3. Sąlyga susijusi su įmonės įsteigimu:

Viešojoji įstaiga „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ buvo įkurta 2002-06-25.

4. Sąlyga susijusi su poveikio aplinkai analize:

2005-08-22 LR Finansų ministerijai pateikta informacija, kurios reikalaujama šiame punkte. Antras avansinis mokėjimas gautas 2005-09-19.



TIKRA

Styriaus vedėja

2009-05-11

Aldona Čepėlienė

A1 PRIEDAS

GAUTŲ SĄSKAITŲ IR MOKĖJIMŲ PAGAL RANGOVUS SUVESTINĖ

Projekto pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra
 Projekto (Finansinio memorandum) Nr.: 2001/LT/16/P/PE/008

Data: 21/12/2001

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
M&S Umwelprojekt GmbH Nr.EuropeAId/116507/D/ SV/LT (paslaugos)	4	2007.07.13	2007.08.17	21.660,80	Už 2006 m. spalio mėn. - 2007 m. kovo mėn. suteiktas paslaugas
			2007.08.17	17.019,20	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	5	2008.04.01	2008.05.07	16.203,60	Už 2007 m. balandžio mėn. - rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas
			2008.05.07	12.731,40	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
AS "Merko Ehitus" Nr. A/2005/S05 (darbai)	4****	2006.05.30	2006.08.02	66.407,49	Už 2006 m. gegužės mėn. atliktus darbus
			2006.08.02	12.770,67	Sanglaudos fondo dalis
			2006.08.22	39.406,64	Valstybės biudžeto dalis
	5****	2006.07.31	2006.09.07	73.210,18	Užsakovo dalis*
			2006.09.18	57.522,28	Už 2006 m. liepos mėn. atliktus darbus
	6****	2006.08.31	2006.11.10	59.575,15	Sanglaudos fondo dalis
			2006.11.17	46.809,05	Užsakovo dalis*
	7****	2006.09.29	2006.12.08	81.248,86	Už 2006 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus
			2006.12.20	63.838,38	Sanglaudos fondo dalis
	8****	2006.10.31	2006.12.08	81.248,86	Užsakovo dalis*
			2006.12.20	63.838,38	Už 2006 m. spalio mėn. atliktus darbus
	9****	2006.12.15	2006.12.22	213.615,62	Sanglaudos fondo dalis
			2007.01.03	167.840,84	Užsakovo dalis*
	10****	2007.02.15	2007.04.24	115.009,28	Už 2006 m. gruodžio 16 d. - 2007 m. vasario 15 d. atliktus darbus
			2007.05.09	90.364,47	Sanglaudos fondo dalis
	11****	2007.02.26	2007.04.24	6.533,40	Užsakovo dalis*
			2007.04.24	535,35	Sanglaudos fondo dalis
	12****	2007.04.17	2007.05.14	104.544,18	Valstybės biudžeto dalis
			2007.05.14	32.055,31	Užsakovo dalis*
	13	2007.06.27	2007.10.04	48.447,25	Sulaikomi pinigai
			2007.10.31	88.152,25	Sanglaudos fondo dalis
					Užsakovo dalis*
					Netinkamos finansuoti išlaidos (Aukštųjų mokyklų administraciniui pastatui įsigyti kompiuteriai ir patalpos inžinieriui įrengimas)
				-29.118,19	Sanglaudos fondo dalis***
				-22.878,58	Valstybės biudžeto dalis***
					Netinkamos finansuoti išlaidos (Aukštųjų mokyklų administraciniame pastate įrengti kompiuterių ir telefono tinklai, įsigyti baldai)
				-7.496,46	Sanglaudos fondo dalis***
				-2.565,20	Valstybės biudžeto dalis***
				-3.324,86	Užsakovo dalis***
					Netinkamos finansuoti išlaidos (Aukštųjų mokyklų administraciniame pastate įrengta pirtis)
				-1.752,92	Sanglaudos fondo dalis***
				-599,83	Valstybės biudžeto dalis***
				-777,46	Užsakovo dalis***



TIKRA
 Skyriaus vedėja
 Aldona Čepelienė

2009-05-11

A1 PRIEDAS

GAUTŲ SĄSKAITŲ IR MOKĖJIMŲ PAGAL RANGOVUS SUVESTINĖ

Projekto pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra
 Projekto (Finansinio memorandum) Nr.: 2001/LT/16/P/PE/008

Data: 21/12/2001

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
VI "Šiaulių regiono keliai" Nr. A/2005/S04 (darbai)	14	2007.11.20	2007.12.10	60.446,77	Už 2007 m. lapkričio mėn. atliktus darbus
			2007.12.10	17.601,74	Sanglaudos fondo dalis
			2007.12.27	29.892,17	Valstybės biudžeto dalis
UAB "NCC titanas" Nr. A/2005/S10 (darbai)	6	2007.05.31			Už 2007 m. balandžio mėn. - gegužės mėn. atliktus darbus
			2007.07.23	28.426,09	Sanglaudos fondo dalis
			2007.07.23	16.484,19	Valstybės biudžeto dalis
			2007.07.23	40.075,72	Valstybės biudžeto dalis**
	7	2007.06.29	2007.08.01	5.850,60	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. birželio mėn. atliktus darbus
			2007.08.16	16.036,35	Sanglaudos fondo dalis
			2007.08.16	22.608,40	Valstybės biudžeto dalis**
	8	2007.07.31	2007.09.17	12.599,98	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. liepos mėn. atliktus darbus
			2007.09.05	37.665,66	Sanglaudos fondo dalis
			2007.09.05	53.101,89	Valstybės biudžeto dalis**
	9	2007.08.27	2007.09.25	29.594,46	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus
			2007.09.26	51.558,12	Sanglaudos fondo dalis
			2007.09.26	72.687,78	Valstybės biudžeto dalis**
	10	2007.09.28	2007.10.17	40.509,94	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. rugsėjo mėn. atliktus darbus
			2007.10.31	57.719,29	Sanglaudos fondo dalis
			2007.10.31	81.373,93	Valstybės biudžeto dalis**
	11	2007.12.04	2007.12.21	45.350,87	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. spalio mėn. - gruodžio mėn. atliktus darbus
			2007.12.14	57.611,58	Sanglaudos fondo dalis
			2008.07.29	45.266,24	Užsakovo dalis*
	12	2008.05.30			Už 2008 m. gegužės mėn. atliktus darbus
			2008.07.09	34.927,52	Sanglaudos fondo dalis
			2008.07.09	51.311,97	Valstybės biudžeto dalis**
			2008.10.15	27.443,04	Užsakovo dalis*
	13	2008.07.31			Sulaikomi pinigai
			2008.09.09	70.772,93	Sanglaudos fondo dalis
			2008.09.09	53.353,09	Valstybės biudžeto dalis
			2008.09.09	30.039,58	Valstybės biudžeto dalis**
UAB "Šiaulių plentas" Nr. A/2006/S13 (darbai)	11	2007.05.31	2008.10.28	30.100,97	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. gegužės mėn. atliktus darbus
			2007.07.13	43.102,71	Sanglaudos fondo dalis
	12	2007.06.29	2007.08.01	33.866,42	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. birželio mėn. atliktus darbus
			2007.08.06	42.741,64	Sanglaudos fondo dalis
	13	2007.08.31	2007.08.27	33.582,72	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus
			2007.10.10	107.185,92	Sanglaudos fondo dalis
	14	2007.10.31	2007.10.31	84.217,51	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. spalio mėn. atliktus darbus
			2007.12.11	52.856,22	Sanglaudos fondo dalis
	15	2008.02.13	2008.07.29	41.529,89	Užsakovo dalis*
					Už 2007 m. lapkričio mėn. - 2008 m. sausio mėn. atliktus darbus
			2008.02.22	43.370,37	Sanglaudos fondo dalis
	16	2008.06.30	2008.12.30	34.076,73	Užsakovo dalis*
					Už 2008 m. birželio mėn. atliktus darbus
			2008.08.22	10.946,58	Sanglaudos fondo dalis
	17	2008.07.02	2008.09.08	26.849,77	Už 2008 m. birželio mėn. atliktus darbus
			2008.12.30	29.697,12	Sanglaudos fondo dalis
					Užsakovo dalis*
					Sulaikomi pinigai
			2008.09.03	30.876,24	Sanglaudos fondo dalis
			2008.10.03	75.733,24	Sulaikomi pinigai
			2008.12.30	83.364,59	Sanglaudos fondo dalis

10



TIKRA
 Skyriaus vedėja
 Aldona Čepėlienė

2009-05-11

A1 PRIEDAS

GAUTŲ SĄSKAITŲ IR MOKĖJIMŲ PAGAL RANGOVUS SUVESTINĖ

Projekto pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Projekto (Finansinio memorandum) Nr.: 2001/LT/16/P/PE/008

Data: 21/12/2001

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
UAB "Kamesta" Nr. A/2006/S/15 (darbai)	3	2007.05.31	2007.07.27	108.362,96	Už 2007 m. gegužės mėn. atliktus darbus
			2007.07.27	20.928,58	Sanglaudos fondo dalis
			2007.08.09	64.213,77	Valstybės biudžeto dalis
	4	2007.11.29	2007.12.10	15.517,74	Užsakovo dalis*
			2007.12.10	6.062,16	Sulaikomi pinigai
			2007.12.22	6.130,34	Sanglaudos fondo dalis
	5	2008.06.02	2008.07.09	15.517,74	Valstybės biudžeto dalis
			2008.07.09	6.062,17	Sulaikomi pinigai
			2008.12.29	6.130,33	Sanglaudos fondo dalis
UAB "Kelių mašinos" Nr. A/2007/S/27 (iranga)	1	2007.08.31	2007.10.03	15.764,60	Galutinis mokėjimas už komposto vartytuvą-kausą ALLU SC 2-20
			2007.10.03	12.386,47	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
UAB "Mecro Technikonas" Nr. S-08-240 (iranga)	1	2008.10.31	2008.12.01	69.926,91	Galutinis mokėjimas už ekskavatorinį krautuvą JCB 3CX SUPER
			2008.12.22	7.363,22	Sanglaudos fondo dalis
			2008.12.29	19.732,57	Užsakovo dalis*
					Užsakovo dalis*
Iš viso A1 priede				3.868.876,58	

*Paskolos dalis, kurią sumoka užsakovas

** Finansiniame memorandume numatytą biudžetą viršijanti dalis, finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

***Pagal rangovo pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus, buvo apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos. Užfiksuotas pažėjimas.

**** Šie mokėjimai nebuvo įtraukti į trečiojo tarpinio mokėjimo paraišką.



TIKRA
Skyriaus vedėja
[Signature]
Aldona Čepelienė

2009-05-11

C PRIEDAS

Projekto pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PE/008, patvirtintas 2001/12/21

NACIONALINIŲ IR/ARBA EUROPOS BENDRIJŲ INSTITUCIJŲ ATLIKTŲ PATIKRINIMŲ IR ATRANKINIŲ PATIKRINIMŲ IŠVADOS BEI REKOMENDACIJOS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba nuo 2007-09-03 iki 2007-10-12 atliko projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ atrankinį patikrinimą. Patikrinimo metu vertintos deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos ir vidaus kontrolės sistema.

Buvo padaryta tokia išvada:

Projekto valdymo ir kontrolės sistema gali būti vertinama kaip *patenkinama* – nustatyta projekto valdymo ir jo įgyvendinimo neatitikimų, klaidų, kurie gali turėti neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

Buvo pateiktos šios išvados ir rekomendacijos:

1. Išvada. Sutarties Nr. A/2005/S05 „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba“ ADA Nr. 3 aktuojama kompiuterinė įranga yra netinkamos finansuoti išlaidos. Netinkamų išlaidų suma – 112 323,25 Lt.

1. Rekomendacija. Tarpinei (LR Aplinkos ministerijai) ir Įgyvendinančiai institucijai (Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA)) priimti sprendimą dėl netinkamų išlaidų už „Kompiuterinę įrangą“ – 112 323,25 Lt išieškojimo. Apie priimtus sprendimus informuoti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnybą (toliau – VAT).

2. Išvada. Sutarties Nr. A/2005/S05 „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba“ ADA Nr. 1 aktuotos išlaidos skirtos „Patalpos inžinieriui įrengimui“ – 67 211,20 Lt. neatitinka Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 25 str. reikalavimų išlaidų tinkamumui.

2. Rekomendacija. Tarpinei (LR aplinkos ministerijai) ir Įgyvendinančiai institucijai (APVA) priimti sprendimą dėl netinkamų išlaidų už „Patalpos inžinieriui įrengimą“ – 67 211,20 Lt išieškojimo. Apie priimtus sprendimus informuoti VAT.

Atsakymas į 1 ir 2 išvadas bei rekomendacijas. APVA 2008-04-22 užregistravo pažeidimą sutarties Nr. A/2005/S05 „Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba“ dėl netinkamų išlaidų už „Kompiuterinę įrangą“ ir „Patalpos inžinieriui įrengimą“. 2008-05-09 APVA raštu Nr. APVA 1761 informavo Finansų ministeriją bei Aplinkos ministeriją ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą apie pažeidimą. APVA 2008-04-08 raštu Nr. APVA-1418 kreipėsi į VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą“ (toliau – ŠRATC) su prašymu pateikti VAT rekomendacijų įgyvendinimo planą bei netinkamų išlaidų sugrąžinimo. Pakartotinai 2008-05-28 išsiųstas raštas Nr. APVA-2025 dėl netinkamų išlaidų sugrąžinimui. ŠRATC netinkamas išlaidas išpareigojo sugrąžinti iki 2009-12-31 (galutinės projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ ataskaitos 24 psl.).

3. Išvada. ŠRATC vykdant projekto apskaitą nėra laikomasi apskaitos standartų.

3. Rekomendacija. ŠRATC tinkamai vykdyti projekto apskaitą (laikantis kaupimo principo ir kitų apskaitos standartų reikalavimų). VAT informuoti apie terminą, per kurį bus tinkamai apskaitytas ir inventorizuotas projekto eigoje įgytas turtas.

Atsakymas į 3 išvadą ir rekomendaciją. Laikomasi rekomendacijų.

4. Išvada. Rangovo AS „Merko Ehitus“ Aukštrakių sąvartyno statybos darbų žurnale nėra įrašų apie 2005 m. gruodžio mėn. atliktus darbus, kurie buvo aktuojami atliktų darbų akte Nr. 2. Tokiu būdu rangovas nesilaikė Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 – Statybos darbai“, 2002 m. spalio 31 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 571 reikalavimų ir sutarties Nr. A/2005/S05 bendrųjų sąlygų.

4. Rekomendacija. APVA ir ŠRATC užtikrinti, kad rangovo aktuojami darbai būtų pagrįsti statybos darbų žurnalų įrašais ar atitinkamais darbų atlikimą patvirtinančiais dokumentais.



Skyriaus vadėja
Aldona Čepelienė

2009-05-11

5. Išvada. Rangovo AS „Merko Ehitus“ Aukštųjų savartyno statybos darbų žurnaluose atliekamų darbų kiekiai pateikiami naudojant kitokius nei sutarties kiekių žiniaraščiuose matavimo vienetų, darbų pavadinimai neatitinka sutarties kiekių žiniaraščiuose naudojamų darbų pavadinimų. Tokiu būdu pildant statybos darbų žurnalus nėra užtikrinama tinkama audito seka.

5. Rekomendacija. APVA ir ŠRATC užtikrinti, kad Rangovo aktuojami darbai būtų pagrįsti statybos darbų žurnalų įrašais ar atitinkamais darbų atlikimą patvirtinančiais dokumentais. APVA ir ŠRATC užtikrinti, kad statybos darbų žurnalai būtų pildomi užtikrinant tinkamą audito seką.

Atsakymas į 4 ir 5 išvadas bei rekomendacijas. APVA 2007-10-22 raštu Nr. APVA-4480 ir 2007-12-06 raštu Nr. APVA-5390 informavo VAT, kad vadovaujantis APVA procedūrų vadovu, APVA atlieka statybos sutarčių vykdymo patikras vieną kartą per metus. Siekiant įgyvendinti auditorių rekomendacijas, t. y. kontroliuoti statybų žurnalų pildymą, patikras vietoje reikėtų atlikti vieną kartą per savaitę. APVA nuomone, tokia kontrolės forma būtų perteklinė, netikslinga ir dubliuojanti techninės priežiūros vadovo ir užsakovo darbą.

6. Išvada. ŠRATC apskaitoje sąskaitų apmokėjimą galima identifikuoti tik pagal sumą, operacijų įrašai neapima patvirtinamųjų dokumentų (rangovo sąskaitų) pobūdžio, numerio ir datos.

6. Rekomendacija. Siekiant užtikrinti tinkamą audito seką bei rangovo sąskaitų identifikavimą ŠRATC vykdyti projekto apskaitą įtraukiant duomenis apie rangovų sąskaitos pobūdį, numerį ir datą.

Atsakymas į 6 išvadą ir rekomendaciją. Laikomasi rekomendacijų.

7. Išvada ir rekomendacija. ŠRATC rengiant, o APVA priimant ir tikrinant mokėjimo prašymus ir juos pagrindžiančius dokumentus, atidžiau tikrinti Rangovų pateikiamų sąskaitų, atliktų darbų aktų ir tarpinio mokėjimo pažymų duomenis.

Atsakymas į 7 išvadą ir rekomendaciją. Laikomasi rekomendacijų.



TIKRA
Skyriaus vedėja

[Signature] 2009-05-11
Aldona Čepelienė

D PRIEDAS

Projekto pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PE/008, patvirtintas 2001/12/21

TECHNINĖS, FINANSINĖS AR TEISINĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS

Užsitiese Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų tvarkymo įrangos tiekimas pirkimo procedūros dėl pasyvaus tiekėjų dalyvavimo pirkimo konkursuose. Pirkimą teko skelbti penkis kartus, kad įsigyti visą Finansinio memorandumo pakeitime – Komisijos sprendime Nr. K(2006)5294 nurodytą įrangą.

Užsitiesus sutarties Nr. A/2005/Š10 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas“ darbų atlikimo terminui, defektų nustatymo periodas tęsis iki 2009 m. gegužės 29 d. bei taip pat užsitiesus sutarties Nr. A/2006/Š13 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kairių sąvartyno uždarymo I-asis etapas“ darbų atlikimo terminui, defektų nustatymo periodo pabaiga yra 2009 m. birželio 9 d.

Techninės priežiūros konsultantų įsipareigojimai baigsis po defektų nustatymo periodo t.y. po 2009 m. birželio 9 d. Kadangi 2006 m. spalio 27 d. Komisijos sprendime Nr. K(2006)5294 nurodytas išlaidų tinkamumo termino pabaiga yra 2008 m. gruodžio 31 d., 2008 m. gruodžio 4 d. pasirašytas sutarties Nr. EuropeAid/116507/D/SV/LT pakeitimas, kuriuo konsultantas įsipareigojo pateikti 10 % sutarties vertės garantiją (kurios galiojimo laikas iki paskutinės atlikimo pažymos išdavimo) bei galutinę ataskaitą su audito pažyma.



TIKRA
Skyniaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-11

E PRIEDAS

Projekto pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PE/008, patvirtintas 2001/12/21

PRIEŽASTYS, LĖMUSIOS SKIRTUMĄ TARP FIZINIO IR FINANSINIO ĮGYVENDINIMO, NUKRYPTIMUS NUO NUMATYTO GRAFIKO

Sutarčiai Nr. A/2005/Š10 „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas“ dalis mokėjimų buvo atlikta iš Finansinį memorandumą viršijančių lėšų (deklaruojamu laikotarpiu buvo išmokėta 1.012.470,19 euro, iš kurių 351.199,27 euro sudarė Finansinį memorandumą viršijančios lėšos). Kadangi ši Finansinį memorandumą viršijanti suma buvo įskačiuota į bendrą deklaruojamų išlaidų sumą (A priedo „Projekto fizinio ir finansinio įgyvendinimo ataskaita“ 9 ir 10 stulpeliai), o sutarties vertė nurodyta tik Finansinio memorandumo neviršijanti sutarties dalis, finansinio įgyvendinimo rodiklis (A priedo „Projekto fizinio ir finansinio įgyvendinimo ataskaita“ 11 stulpelis) viršija 100 % ir sudaro 163,8 %.



T I K R A
Skyriaus vedėja

Aidona Čepelienė

2009-05-11

F PRIEDAS

Projekto pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Finansinis memorandumas Nr. 2001/LI/16/P/PE/008, patvirtintas 2001/12/21

PROJEKTO VIEŠINIMAS

1. Stendai darbų vykdymo vietose: Taip ☒ Ne ☐ Netaikoma ☐		
2. Informacijos priemonės, kuriose visuomenė buvo informuojama apie projektą:		
2.1. Spauda	☐	
2.2. Televizija	☐	
2.3. Radijas	☐	
2.4. Internetas	☒	
3. Kitos vaizdo ir garso informacijos priemonės ☐		
4. Kita. ☒		
Priemonė	Igyvendinimo data	Nuorodos/informacijos šaltiniai*
Internetas (www.sratc.lt)	Nuolat (paskutinis atnaujinimas 2009 m. sausio 28 d.)	Bendra informacija apie VšĮ ŠRATC įgyvendinamą projektą „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.
	2005 m. spalį (atnaujinta 2006 m. gruodį)	Informacija „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė“.
	2006 m. gruodį	Informacija „Atliekų priėmimo punktai“.
	2007 m. vasario 28 d. (atnaujinta 2007 m. birželį)	Informacija „Aukštųjų sąvartynas“.
	2007 m. gruodį	Informacija „Bendro naudojimo konteinerinės aikštelės“.
	2008 m. birželį	Informacija „Privažiavimo kelio į naująjį Aukštųjų sąvartyną I etapo II eilės statyba“, „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas“ ir „Kairių sąvartyno uždarymo I-sis etapas“.
	2008 m. spalį	www.sratc.lt paskelbta informacija „Atliekų tvarkymo įrangos įsigijimas“.
Pranešimai žiniasklaidai	2007 m. gruodžio 29 d.	Pranešimas „Projektas bus baigtas įgyvendinti kitame!“.
	2008 m. sausio 14 d.	Pranešimas „Naujos investicijos į atliekų tvarkymo sistemą“.
	2008 m. gruodžio 30 d.	Pranešimas „Projektas baigtas, darbai tęsiasi“.
Informaciniai stendai	2004 m. liepą** (Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose, sutarties Nr. A/2004/S02)	Informacinis stendas, pastatytas prie įvažiavimo į Kairių sąvartyną.
	2005 m. liepą** (Naujo regioninio sąvartyno Aukšturkiuose statyba, sutarties Nr. A/2005/S05)	Informacinis stendas, pastatytas prie įvažiavimo į statomus objektus.



IKRA
Skyriaus vedėja
Aidona Čepelienė

2009-05-11

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008
„Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
sistemos plėtra“
7 priedas

Projekto galutinė ataskaita

KOPIJA**VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

Įmonės kodas 145787276, PVM mokėtojo kodas LT457872716

Korespondencijai: P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai, tel./faks. (8-41) 520002, el. p. info@sratc.lt

A.s. LT624010044200021860 AB DnB NORD bankas; A.s. LT700075800001345575 AB bankas Snoras

Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, buveinės adresas: Aukštakių km., LT-81402 Šiaulių rajonas Šiaulių r. sav.

Projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

Nr. 2001/LT/16/P/PE/008

GALUTINĖ ATASKAITA

Parengė: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

Patvirtino: LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra

Direktorius
Regimantas Vegelė

Vardas ir pavardė, parašas

K. Tumingas

Vardas ir pavardė, parašas



2009

TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA**

Kodas 8877956, A. Juozapavičiaus g. 9-610, LT-09311 Vilnius, tel. 272 57 58, faks. 272 25 63, el. p. apva@apva.lt <http://www.apva.lt>

PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Aš, Kastytis Tuminas, Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūros vadovas, tvirtinu, kad darbai, aprašyti Galutinėje ataskaitoje yra įvykdyti remiantis sprendimu suteikti paramą projektui Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

Kastytis Tuminas
Įgyvendinančios institucijos APVA vadovas

Data:
Vilnius

2009. 04. 23



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelėjanė

2009 -05- 0 8

2

**PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS**

Aš, Regimantas Vėgelė, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ŠRATC) direktorius, tvirtinu, kad informacija, pateikta Galutinėje ataskaitoje yra teisinga, o atlikti darbai įvykdyti, remiantis sprendimu suteikti paramą Sanglaudos fondo aplinkos investicijų projektui „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, projekto registracijos numeris **2001/LT/16/P/PE/008**.

VšĮ ŠRATC direktorius

Regimantas Vėgelė

**TIKRA**
Skyriaus vedėja
Aidona Čepelėdienė

2009-05-08


Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



TURINYS

TRUMPINIAI	10
1. ĮVADAS	12
1.1. ESAMA PADĖTIS ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE	12
1.2. SANGLAUDOS FONDO PARAMA	12
1.3. SANGLAUDOS FONDO VALDYMAS	13
2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS	17
2.1. PROJEKTO APRAŠYMAS	17
2.2. PROJEKTO VALDYMO YPATUMAI	18
2.3. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS	19
2.3.1. Techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimas	20
2.3.2. Techninė pagalba Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui	20
2.3.3. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose	21
2.3.4. Techninė priežiūra	22
2.3.5. Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba	23
2.3.6. Atliekų priėmimo punktų statyba	24
2.3.7. Mažųjų sąvartynų/šiukšlų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas	25
2.3.8. Kairių sąvartyno uždarymo I-asis etapas	26
2.3.9. Privažiavimo kelio į naująjį Aukštrakių sąvartyną statyba	28
2.3.10. Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas	28
2.4. SITUACIJA PRIEŠ PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ	32
2.5. PROJEKTO DARBAI	35
2.6. PROJEKTO ATITIKTIS FINANSAVIMO MEMORANDUMUI	67
2.7. PROJEKTO PATIKROS	70
3. FINANSINĖ PROJEKTO ANALIZĖ	72
3.1. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI	72
3.2. IŠLAIDŲ ANALIZĖ PAGAL ATSKIRUS PROJEKTO KOMPONENTUS	73
3.3. STATYBOS DARBŲ SUTARČIŲ IŠSKAIDYMAS PAGAL ATSKIRUS KOMPONENTUS	77
3.4. MOKĖJIMAI	81
4. PROJEKTO EKONOMINĖS NAUDOS ANALIZĖ	89
4.1. ĮMONĖS FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS	89
4.2. FINANSINĖS PROJEKTO ANALIZĖS ĮVERTINIMAS	90
4.2.1. Piniginių srautų įvertinimas	91
4.3. PROJEKTO EKONOMINIS VERTINIMAS	100
4.3.1. Aplinkos taršos sumažinimo efektyvumas	100
4.3.2. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo efektyvumas	103
4.3.3. Naujų darbo vietų sukūrimas ir darbuotojų kompetencijos lygio augimas	106
4.4. PROJEKTO APLINKOSAUGINIS VERTINIMAS	106
4.4.1. Regioninis sąvartynas Aukštrakiuose	106
4.4.2. Mažųjų sąvartynų/šiukšlų sutvarkymas	110
4.4.3. Bendro naudojimo konteinerinių aikštelių įrengimas	110
4.4.4. Atliekų priėmimo punktų įrengimas	111

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I K R A
Skyriaus vadėja
Aldona Čepelienė

2009-05-08



4.4.5.	Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.....	111
4.4.6.	Kairių sąvartynas.....	111
5.	POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ASPEKTAI PAGAL ATSKIRUS PROJEKTO KOMPONENTUS.....	114
5.1.	VERTINIMO NUOSTATOS.....	114
5.1.1.	Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas Aukšttrakuose	114
5.1.2.	Atliekų priėmimo punktai.....	114
5.1.3.	Kairių sąvartyno uždarymo I-etapas	117
5.1.4.	Mažųjų sąvartynų uždarymas ir kontenerinių aikštelių įrengimas.....	117
5.1.5.	Kompostavimo aikštelės įrengimas Kairiuose.....	117
6.	PROJEKTO VIEŠINIMAS	118
6.1.	EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO FINANSUOJAMO PROJEKTO VIEŠINIMAS.....	118
6.2.	BPD FINANSUOJAMAS PROJEKTAS ORIENTUOTAS Į KURIAMOS ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS VIEŠINIMĄ.....	126
	IŠVADOS.....	128
	PRIEDAI.....	129



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėdienė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



PAVEIKSLĖLIAI

1 pav. Sanglaudos fondo valdymas Lietuvoje	15
2 pav. Kairių sąvartyno teritorija prieš pradėdant uždarymo darbus	33
3 pav. Šiaurinė Kairių sąvartyno dalis ir privažiavimo kelias vakarinio šlaito dalyje	33
4 pav. Privažiavimo kelias į Aukštakių sąvartyną	34
5 pav. Baisogalos atliekų priėmimo punktas su asfaltbetonio sluoksniu	34
6 pav. Iškiršta Aukštakių sąvartyno teritorija	34
7 pav. Mažieji sąvartynai-šiukšlynai	35
8 pav. Statybvietės vaizdas, ekskavatoriumi nukasus paviršinį žemės sluoksnį	36
9 pav. Geotekstilės išklojimas	36
10 pav. Smėlio sluoksnio įrengimas ir sutankinimas	37
11 pav. Skaldos sluoksnio įrengimas ir sutankinimas	37
12 pav. Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis ir filtrato drenažo linija	37
13 pav. Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio išklojimas ir drenažo linijos įrengimas	37
14 pav. Filtrato drenažinės linijos nutekamojo vamzdžio anga su koštuvu	38
15 pav. Apšvietimo stulpas šiaurinėje aikštelės dalyje	38
16 pav. Įrengta tvora ir įvažiavimo vartai	38
17 pav. Metalų konstrukcijų ir karkaso statyba	39
18 pav. Stoginė	39
19 pav. Aptverta žolyno ir asfaltbetonio dangos teritorija	39
20 pav. Medžių kirtimas	40
21 pav. Geologiniai kasinėjimai sąvartyno teritorijoje	40
22 pav. 1-os kaupo sekcijos įrengimo darbai	41
23 pav. Kelio žymėjimo darbai	41
24 pav. Pylimai bentonito kilimo ir geomembranos sutvirtinimui	41
25 pav. Kaupo dugnas padengtas plėvele	42
26 pav. Filtrato kaupimo rezervuaro įrengimo darbai	42
27 pav. Pralaidos vamzdžio įrengimas po privažiavimo keliu	42
28 pav. Bentonito kilimo, geomembranos ir geotekstilės klojimo bei įrengimo darbai	43
29 pav. Drenažinės sistemos įrengimas ir drenažo vamzdžių padengimas granitiniu žvyru	43
30 pav. Paruošiamieji administracinio pastato statybos darbai	43
31 pav. Žemės darbai	44
32 pav. Geomembranos klojimo darbai	44
33 pav. Įrengtas naftos produktų separatorius	44
34 pav. Sumontuotas apšvietimo bokštas	45
35 pav. Administracinio pastato statyba	45
36 pav. Kasinėjimo vieta, kurioje buvo tikrinama geomembrana	45
37 pav. Kelių sąvartyno teritorijoje įrengimas	46
38 pav. Priešgaisrinio rezervuaro įrengimas	46
39 pav. Dezinfekavimo duobė	46
40 pav. Vaizdas į aptarnavimo aikštelę	47
41 pav. Įrengtas kompaktoriaus privažiavimo kelias	47
42 pav. Plovimo punktas	47
43 pav. Vidinis sąvartyno privažiavimo kelias	48
44 pav. Žemės darbai Baisogalos APP	48

Projektas Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R A

Skyriaus vadėja

Aldona Čopelienė

2009-05-08



45 pav. Paklotas geotekstilės kilimas ir išrikiuoti balastai (pritvirtinimai) geotekstilės apsaugai nuo galimos neigiamos vėjo įtakos	49
46 pav. Pagrindo iš dolomitinės skaldos įrengimas Baisogalos APP	49
47 pav. Paruoštas asfaltbetonio sluoksnis ir įrengti tvoros stulpai teritorijai aptverti	49
48 pav. Įrengtas vamzdis po privažiavimo keliu Raudėnų APP	50
49 pav. Dalis pagamintų konteineriai	50
50 pav. APP su išstatytais konteineriais	50
51 pav. Statybos darbai vakariniame sąvartyno šlaite	52
52 pav. Dambos įrengimas rytiniame šlaite	52
53 pav. Filtrato linijos šiaurinėje dalyje	53
54 pav. Supulto karjerinio molio vertikalinis planiravimas	53
55 pav. Vakarinio šlaito užpylimas karjeriniu moliu ir molio perstūmimas	53
56 pav. Montuojamas šulinys SH-06, įjungiamosios linijos iš 500 ir 400 ultra PVC vamzdžių	54
57 pav. Vamzdžių ir šulinių apipilimas smėliu, smėlio sutankinimas	54
58 pav. Vamzdžių apipylimas moliu gruntu	54
59 pav. Montuojamas siurblinės šulinys	55
60 pav. Sumontuota siurblinės Nr. 3 skydinė	55
61 pav. Atliekų kasimas ir perstūmimas, dėl per didelio statumo	55
62 pav. Atliekų kasimas	56
63 pav. Vaizdas į rytinį šlaitą	56
64 pav. Vaizdas į vakarinį šlaitą	56
65 pav. Atliekų perkasimas sąvartyno viršūnėje	57
66 pav. Buvusio melioracijos griovio užpylimas moliu	57
67 pav. Filtrato traukimas iš melioracijos griovio	57
68 pav. Tranzitinio kelio formavimas vakarinio šlaito papėdėje	58
69 pav. Paviršinio vandens surenkamųjų griovių formavimas	58
70 pav. Filtrato prasiveržimo vietos rytiniame šlaite	58
71 pav. Užvažiavimo kelio statyba	59
72 pav. Molių gruntu paviršiaus purenimas	59
73 pav. Geotekstilės įrengimas paviršinio vandens surinkimo grioviuose šiauriniame šlaite	59
74 pav. Įrengtas užvažiavimo kelias, atliekų patalpinimui	60
75 pav. Įrengtas užvažiavimo kelias rytinio šlaito papėdėje	60
76 pav. Dučių mažasis sąvartynas (išvežtas)	61
77 pav. Mažasis sąvartynas Medikonyse	61
78 pav. Bendro naudojimo konteinerinės aikštelės pradžios darbai	61
79 pav. A tipo Stačiūnų konteinerinė aikštelė be konteinerių	62
80 pav. A tipo bendro naudojimo konteinerinė aikštelė su konteineriais Šiauliuose	62
81 pav. B tipo bendro naudojimo konteinerinė aikštelė su konteineriais Šiauliuose	62
82 pav. Privažiavimo kelias ir šalia jo įrengtas informacinis stendas	64
83 pav. Privažiavimo kelio sutankinimas	64
84 pav. Atkasti pakelės šuliniai	64
85 pav. Šulinių žiedų keitimo darbai	65
86 pav. Pilamas smėlio – žvyro mišinys	65
87 pav. Išstumdomas ir išlyginamas smėlio-žvyro mišinys	65
88 pav. Elektros kabelio paklojimas	66
89 pav. Keičiami pralaidos galų g/b žiedai	66
90 pav. Asfalto sluoksnio klojimas	66

Projekto Nr. 2001/LT/16/PVE/008 Galutinė ataskaita



TIKRA
Skynaus vedėja

2009-05-08

Aldona Čepelienė

7

91 pav. Kelio sankasos šlaitų sutankinimas ir apželdinimas	67
92 pav. Įrengtos nuvažos ir kelio pakraščiuose pastatyti kelio žymėjimo stulpeliai	67
93 pav. Finansavimo šaltiniai	72
94 pav. Projekto sudedamosios dalys pagal sutartis	73
95 pav. Įvykdytos projekto sudedamosios dalys	73
96 pav. Lėšų įsisavinimas	81
97 pav. Sutvarkyti atliekų kiekiai	102
98 pav. Komunalinių atliekų konteineriai	102
99 pav. Antrinių žaliavų konteineriai	103
100 pav. Mokesčiai gyventojams už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą 2005-2009 m.	105
101 pav. Aukštųjų savartyno dugno konstrukcija	108
102 pav. Informacinė lenta prie Aukštųjų savartyno statybos laikotarpiu	120
103 pav. Informacinis stendas šalia privažiavimo kelio į Aukštųjų savartyną	120
104 pav. Informacinis stendas prie Kairių savartyno	120
105 pav. Informacinis stendas prie žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje Kairiuose	121
106 pav. Informacinis stendas prie mažųjų savartynų-šlukslynų	121
107 pav. Informacinis stendas prie Baisogalos atliekų priėmimo punkto	121
108 pav. Informacinis stendas prie Grinkiškio atliekų priėmimo punkto	122
109 pav. Informacinis stendas prie Ginklinių atliekų priėmimo punkto	122
110 pav. Informacinis stendas prie Meškuičių atliekų priėmimo punkto	122
111 pav. Informacinis stendas prie Kelmės atliekų priėmimo punkto	123
112 pav. Informacinis stendas prie Klovainių atliekų priėmimo punkto	123
113 pav. Informacinis stendas prie Rozalimo atliekų priėmimo punkto	123
114 pav. Atminimo lenta Aukštųjų savartyne, pakabinta ant administracinio pastato	124
115 pav. Atminimo lentų pavyzdžiai prie uždarytų mažųjų savartynų-šlukslynų	124
116 pav. Atminimo lenta prie Kairių savartyno	125
117 pav. Atminimo lentų pavyzdžiai prie atliekų priėmimo punkto	126
118 pav. Atminimo lenta prie žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Šiauliuose	126



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



Lentelė Nr. 1. Techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimo viešasis pirkimas	20
Lentelė Nr. 2. Techninės pagalbos viešasis pirkimas	20
Lentelė Nr. 3. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimo viešasis pirkimas	21
Lentelė Nr. 4. Techninės priežiūros viešasis pirkimas	22
Lentelė Nr. 5. Naujo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statybos viešasis pirkimas.....	23
Lentelė Nr. 6. Atliekų priėmimo punktų statybos viešasis pirkimas	24
Lentelė Nr. 7. Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų sutvarkymo ir konteinerinių aikštelių įrengimo viešasis pirkimas.....	25
Lentelė Nr. 8. Kairių sąvartyno uždarymo I-ojo etapo viešasis pirkimas.....	26
Lentelė Nr. 9. Privažiavimo kelio į naująjį Aukštrakių sąvartyną statybos viešasis pirkimas	28
Lentelė Nr. 10. Atliekų tvarkymo įrangos tiekimo viešasis pirkimas.....	28
Lentelė Nr. 11. Kompostavimo aikštelės įrengimo statybos darbai	35
Lentelė Nr. 12. Naujo regioninio sąvartyno statybos darbai	39
Lentelė Nr. 13. Atliekų priėmimo punktų statybos darbai.....	48
Lentelė Nr. 14. Kairių sąvartyno uždarymo statybos darbai	50
Lentelė Nr. 15. Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų uždarymo ir konteinerinių aikštelių įrengimo statybos darbai	60
Lentelė Nr. 16. Privažiavimo kelio į regioninį sąvartyną statybos darbai	63
Lentelė Nr. 17. Pagal Finansavimo memorandumą pasiekti fiziniai elementai	69
Lentelė Nr. 18. Projekto patikros.....	70
Lentelė Nr. 19. Projekto finansavimo šaltiniai	72
Lentelė Nr. 20. Išlaidų analizė pagal projekto komponentus.....	74
Lentelė Nr. 21. Atliekų priėmimo punktų darbų sutarties išskaidymas Sutartis Nr. A/2005/S04.....	77
Lentelė Nr. 22. Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų sutvarkymo ir konteinerinių aikštelių įrengimo sutarties išskaidymas Sutartis Nr. A/2005/Š10	77
Lentelė Nr. 23. Aukštrakių sąvartyno įrengimo statybos darbų sutarties išskaidymas Sutartis Nr. A/2005/S05	78
Lentelė Nr. 24. Kairių sąvartyno uždarymo statybos darbų sutarties išskaidymas Sutartis Nr. A/2006/Š13	79
Lentelė Nr. 25. Privažiavimo kelio į sąvartyną statybos darbų išskaidymas Sutartis Nr. A/2006/Š15	80
Lentelė Nr. 26. Mokėjimai.....	81
Lentelė Nr. 27. Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas.....	85
Lentelė Nr. 28. Projekto nepanaudotos lėšos.....	87
Lentelė Nr. 29. Projekto prielaidų ir rezultatų palyginimas.....	90
Lentelė Nr. 30. Projekto piniginių srautų įvertinimas.....	92
Lentelė Nr. 31. Investicijos, susijusios su projekto įgyvendinimu	93
Lentelė Nr. 32. Investicijų atsipirkimo trukmė	93
Lentelė Nr. 33. Panaudotos paskolos ir nuosavų lėšų atsipirkimo laikas	94
Lentelė Nr. 34. Investicijos, tūkst. eurų	95
Lentelė Nr. 35. Veiklos pajamos ir išlaidos, tūkst. eurų	96
Lentelė Nr. 36. Finansavimo šaltiniai, tūkst. eurų	96
Lentelė Nr. 37. Finansinis tvarumas, tūkst. eurų	96
Lentelė Nr. 38. Finansinės vidinės gražos normos nuo investicijų apskaičiavimas, tūkst. eurų	97
Lentelė Nr. 39. Finansinės Vidinės gražos normos nuo kapitalo apskaičiavimas, tūkst. eurų	98
Lentelė Nr. 40. Filtrato surinkimo sistema	100

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čaplėjienė

2009-05-08



Lentelė Nr. 41. Komposto sąnaudos	101
Lentelė Nr. 42. Ekonominės naudos dydis pagal atskirus komponentus, proc.....	103
Lentelė Nr. 43. Tarifų ir susikaupimo normų palyginimas.....	103
Lentelė Nr. 44. Atliekų tvarkymo paslauga	104
Lentelė Nr. 45. Aplinkosauginės priemonės.....	109
Lentelė Nr. 46. Atliekų priėmimo punktų poveikio aplinkai vertinimas	114
Lentelė Nr. 47. Viešinimas	118



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čeplėjienė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



Trumpiniai

AM
APVA
APP
BRD
EK
ES
FIDIC
Finansavimo memorandumas arba FM
LR
ISPA
BRAC
Procedūrų vadovas
SF
STR
SRAAD
SRATC
VAT
VSI

Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
Atliekų priėmimo punktai
Bendras programavimo dokumentas
Europos Komisija
Europos Sąjunga
Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
Projekto Finansavimo memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PE/008
Lietuvos Respublika
Pasirengimo Narystei Struktūrinės Politikos Instrumentas
Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms
ŠRATC įgyvendinamo projekto įgyvendinimo procedūrų vadovas
Sanglaudos fondas
Statybos techninis reglamentas
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
vidaus audito tarnyba
Viešoji įstaiga



TIKRA
Skyriaus vadėja

Aldona Čeplėtienė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

**Bendroji informacija**

Projekto pavadinimas	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas		
Projekto registracijos numeris	2001/LT/16/P/PE/008		
Išvengiamieji institucija	LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra A. Juozapavičiaus g. 9-610 LT-09311 Vilnius		
Galutinės paramos gavėjas	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras P. Lukšio g. 8 LT-76206 Šiauliai		
Sanglaudos fondo paramos dydis pagal Europos Komisijos sprendimą skirti projektui • Sanglaudos fondo lėšų (toliau vadinama Europos Komisijos sprendimas)	56 proc.		
Finansavimo memorandumo Komisijos pasirašymo data	2001-12-21	Finansavimo memorandumė nurodyta projekto pabaigos data	2006-12-31
Europos Komisijos sprendimo keitimo data	2006-10-27	Europos Komisijos sprendimo pakeitime nurodyta projekto pabaigos data	2008-12-31
		Projekto pabaiga	2008-12-31
Išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios data	2001-12-21, 2005-09-09 (išlaidos, susijusios su projekto pakeitimais)		



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2004-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



1. Įvadas

1.1. Esama padėtis atliekų tvarkymo srityje

1996 m. paskelbtame Pranešime apie Bendrijos strategiją atliekų tvarkymo srityje pateikiama Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Dokumentas patvirtina 1989 m. Bendrijos atliekų tvarkymo strategijoje nustatytą „principų hierarchiją“, t.y. pirmiausiai atliekų susidarymo prevencija ir toliau lieka pirmuoju prioritetu, o po jo seka pakartotinis naudojimas, atliekų perdirbimas, kitoks atliekų naudojimas (energijai gauti) ir galiausiai saugus atliekų šalinimas

Atliekų tvarkymas Lietuvoje yra prioritetinė aplinkos apsaugos sritis, kurios svarba nurodyta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550 (Žin., 1996, Nr. 103-2347) patvirtintoje Valstybinėje aplinkos apsaugos strategijoje.

Siekiant įvykdyti atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES direktyvų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, LR Vyriausybė 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 (2007-10-31 nutarimo Nr. 1224 redakcija) patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nustatyti atliekų tvarkymo prioritetai ir principai, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, kuriais vadovaujantis pradėtos diegti regioninės atliekų tvarkymo sistemos, apimančios kelių savivaldybių teritorijas ir padedančios apsaugoti aplinką nuo užteršimo atliekomis. Regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimas – naujas ir perspektyvus reiškinys, sąlygotas Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai.

Atliekų tvarkymo sistemos tikslas – iki 2010 metų sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, organizuoti jos funkcionavimą ir įgyvendinti šios sistemos plėtrą.

1.2. Sanglaudos fondo parama

Vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties nuostatomis, Europos Bendrijos Taryba 1994 m. gegužės 16 d. reglamentu Nr. 1164/94, įsteigiančiu Sanglaudos fondą, kurio pakeitimai buvo atlikti Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1264/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą, ir 1999 m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1265/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentu Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedą, įsteigė Sanglaudos fondą. Reglamentas taip pat nustato Sanglaudos fondo remtinąs priemones, galimas paramos formas, dydžius ir sąlygas bei pagrindinius projektų tvirtinimo, įgyvendinimo, priežiūros ir vertinimo principus.

Sanglaudos fondas – tai struktūrinė priemonė, sukurta 1993 m. ir nuo 1994 m. padedanti valstybėms narėms sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei stabilizuoti savo ekonomiką, mažinant skirtumus tarp regionų. Sanglaudos fondas finansuoja iki 85 proc. tinkamų išlaidų, susijusių su svarbiausiais aplinkosaugos ir transporto infrastruktūros projektais. Tokiu būdu stiprinama ES sanglauda ir solidarumas. Parama skiriama atskiriems projektams juos individualiai suderinus su Europos Komisija. Visi projektai finansuojami pagal šiuos kriterijus:

- Projektas atitinka ES direktyvų reikalavimus ir skirtas brangiausių direktyvų įgyvendinimui;
- finansuojami ne mažesni kaip 10 mln. EUR vertės projektai;
- finansuojama iki 80 – 85 proc. projekto vertės;
- turi būti išlaikytas balansas tarp transporto ir aplinkos apsaugos projektų;



Projekto Nr. 2004/LT/6P/PE/008 Galutinė ataskaita

Skyniaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



- Projektas turi atitikti “teršėjas moka” bei “darnaus vystymosi” principus, atliktas poveikio aplinkai vertinimas bei nepatekti į Natura 2000 saugomas teritorijas;
- Projektai gali būti grupuojami ir skirstomi į stadijas;
- Suteikiama techninė pagalba projektų rengimui, monitoringui, projektų vertinimui, visuomenės informavimui.

Sanglaudos fondo parama Lietuvoje buvo teikiama vadovaujantis bendru Lietuvos Respublikos finansų, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtinta ir su Europos Komisija suderinta Sanglaudos fondo strategija 2004-2006 metams. Strategijoje apibrėžiamos pagrindinės šio fondo paramos panaudojimo kryptys. Jos atitinka ilgalaikius Lietuvos tikslus bei ES politikos gaires transporto plėtros ir aplinkos apsaugos srityse.

Atliekų tvarkymo regioninės sistemos (naujų sąvartynų įrengimas ir senų uždarymas, atliekų priėmimo aikštelių, kompostavimo aikštelių ir perkrovimo stočių įrengimas) – viena iš pagrindinių aplinkosaugos investicijų kryptų 2004-2006 m.

Šiaulių regione atliekų tvarkymo problemas imtasi spręsti 2001 m. gruodžio 21 d. Europos Komisijai ir 2002 m. liepos 2 d. Finansų ministrei Daliai Grybauskaitei, nacionalinei ISPA koordinatoriui, pasirašius ISPA aplinkos investicijų projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Finansinį memorandumą pagal 2001 m. parengtą galimybių studiją ir ISPA fondo paraišką, kuriose buvo pateiktas projekto “Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” investicijų planas, finansinė investicinių kaštų bei pajamų analizė ir poveikio aplinkai vertinimas.

Atliekų tvarkymo sistemos kūrimo teisinė ir administracinė bazė:

- Atliekų direktyva (2006/12/EB);
- Sąvartynų direktyva (1999/31/EB);
- Pavojingų atliekų direktyva (91/689/EEB);
- Atliekų deginimo direktyva (2000/76/EB, 94/67/EB, 89/369/EEB, ir 89/429/EEB);
- Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva (2004/12/EB);
- LR atliekų tvarkymo įstatymas;
- Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas;
- Atliekų tvarkymo taisyklės.

1.3. Sanglaudos fondo valdymas

ISPA yra pasirengimo narystei ES struktūrinės politikos priemonė, kuri kaip ir PHARE, SAPARD, yra skirta kitų finansinių išteklių panaudojimui ypač svarbių projektų įgyvendinimui skatinti Vidurio ir Rytų Europos šalyse kandidatėse. Konkrečiai ISPA finansinės paramos programa yra skirta padėti minėtoms šalims priartinti aplinkosaugos ir transporto būklę prie ES šalių būklės.

ISPA finansinės paramos programos tikslas buvo prisidėti prie stojimo partnerystės tikslų įgyvendinimo kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje ir prisidėti siekiant atitikti nacionalinius aplinkosaugos ir transporto sektorių plėtros ir kokybės gerinimo tikslus.



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



ISPA yra Sanglaudos fondo prototipas, įsteigtas 2000–2006 metų laikotarpiui **Europos Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1267/1999**, parengiančiu struktūrinės pasirengimo narystei politikos instrumentą.

Kadangi Sanglaudos fondas yra ES finansinė priemonė, jį valdant dalyvauja šios ES institucijos:

- **Europos Parlamentas**, kuris tvirtina ES biudžetą, kartu ir Sanglaudos fondo lėšas kiekvienam finansiniam laikotarpiui;
- **Europos Taryba**, kurios sprendimu priimtas reglamentas, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir nustatantis jo išteklių paskirstymą šalims narėms bei įtvirtinantis pagrindines valdymo taisykles;
- **Europos Komisija**, kuriai tenka pagrindinis Sanglaudos fondo valdymo ES lygiu vaidmuo, yra atsakinga už projektų patvirtinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą, potencialaus ir realaus kiekvieno projekto poveikio įvertinimą. Įgyvendinus projektą, Europos Komisija patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Atsižvelgiant į ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2004, Nr. 103-3777; 2008, Nr. 87-3483) sudaryta trijų lygmenų Sanglaudos fondo valdymo ir administravimo struktūra. Tiesioginė atsakomybė už projektų valdymą ir finansinę kontrolę tenka šalims narėms. Sanglaudos fondo valdymą reglamentuojantys teisės aktai nurodo keletą institucijų, kurios dalyvauja valdant šį fondą šalyje narėje.

Sanglaudos fondo administravimo sistema yra paremta ISPA paramos programos valdymo sistema, panaudojant patirtį, įgytą valdant ISPA lėšas.

Sanglaudos fondo valdymo struktūra nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į ES dienos yra tokia:

Finansų ministerija – vadovaujančioji ir mokėjimo institucija;

Aplinkos ministerija – tarpinė institucija aplinkos apsaugos srityje;

Aplinkos projektų valdymo agentūra – įgyvendinančioji institucija aplinkos apsaugos srityje,




Projektas Nr. 2001/2004/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čeplėdienė

2009-05-08

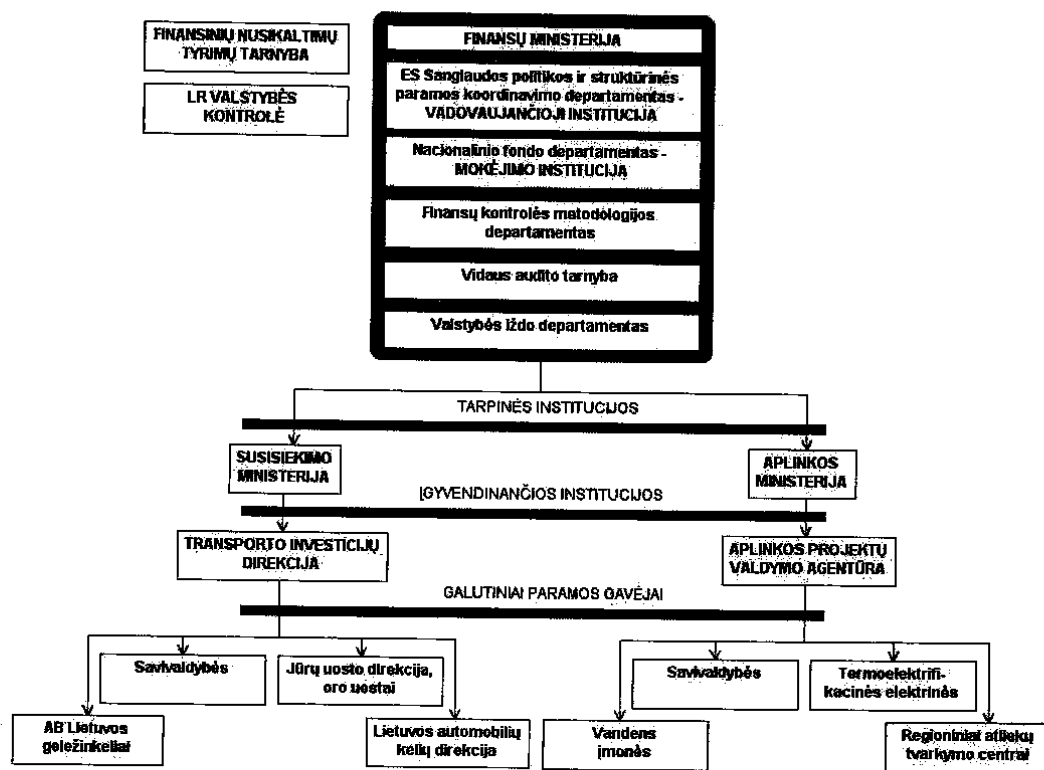

I pav. Sanglaudos fondo valdymas Lietuvoje

Įgyvendinant ISPA/ Sanglaudos fondo finansuojamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", galutinis paramos gavėjas – VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras", todėl žemiau aprašomos tik susijusios institucijos, tai yra dešinioji 1 paveikslėlio dalis.

Finansų ministerija – Vadovaujančioji ir Mokėjimo institucija.

- *Vadovaujančioji institucija* įgyvendina ES Sanglaudos fondo strategiją, koordinuoja ES Sanglaudos fondo lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūrą, atlieka kitas SF vadovaujančiosios institucijos funkcijas.
- *Mokėjimo institucija* administruoja iš Europos Komisijos gautas Sanglaudos fondo lėšas, tikrina ir teikia Europos Komisijai mokėjimo paraiškas išmokoms gauti, užtikrina tinkamą projektų įgyvendinimo finansinę priežiūrą bei atlieka kitas Sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijas.
- *Finansų kontrolės metodologijos departamentas* – koordinuoja SF projektų atrankinių patikrinimų procesą ir teikia Europos Komisijai kasmetinę ataskaitą apie šiuos patikrinimus.
- *Vidaus audito skyrius* – atlieka Finansų ministerijos ES Sanglaudos politikos ir struktūrinių

Projekto Nr. 2004/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



Skyriaus vedėja

Aldona Čeplėjienė

2009-05-08



paramos koordinavimo departamento vidaus auditą.

- *Valstybės išdo departamentas* – administruoja valstybės išdo sąskaitose esančias SF lėšas, atlieka SF ir bendrojo finansavimo mokėjimus rangovams ir tvarko šių lėšų apskaitą.

Aplinkos ministerija (AM) – tarpinė institucija. Pagal kompetenciją rengia Sanglaudos fondo strategijos aplinkosauginę dalį, siūlo projektų, tinkamų finansuoti iš Sanglaudos fondo, sąrašą; užtikrina Sanglaudos fondo paraiškų parengimą, prireikus teikia siūlymus dėl Europos Komisijos sprendimo pakeitimų bei atlieka kitas Sanglaudos fondo tarpinės institucijos funkcijas.

Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba – atlieka Sanglaudos fondo projektų atrankinius patikrinimus.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) – įgyvendinančioji institucija, kuri organizuoja viešuosius pirkimus, pasirašo sutartis, užtikrina, kad įgyvendinant Sanglaudos fondo projektus, būtų laikomasi Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų teisės aktų bei užtikrina informavimo ir viešumo veiksmų įgyvendinimą bei atlieka kitas Sanglaudos fondo įgyvendinančios institucijos funkcijas.

Galutiniai naudos (paramos) gavėjai – institucijos, gaunančios paramą ir tiesioginę naudą iš įgyvendinamų projektų.

Įgyvendinančios institucijos ir galutinio paramos gavėjo atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymas:

Aplinkos projektų valdymo agentūra

- Organizuoja viešuosius pirkimus ir pasirašo sutartis, organizuoja techninį projektų įgyvendinimą.
- Atlieka projekto finansinę kontrolę jo įgyvendinimo laikotarpiu, tikrina projekto įgyvendinimą vietoje, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, informuoja Aplinkos ministeriją apie tikrinimo rezultatus.
- Rengia projekto vykdymo eigos, Sanglaudos fondo ir Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas, teikia šias ataskaitas Finansų ir Aplinkos ministerijoms.
- Vykdo mokėjimus už atliktus darbus iš ISPA/Sanglaudos fondo ir Valstybės biudžeto. Įgyvendina projekto informavimą ir viešumą bei vykdo visuomenės informavimo veiksmų plano įgyvendinimo kontrolę.
- Rengia išmokų iš Sanglaudos fondo ir Valstybės biudžeto lėšų dydžio prognozes einamiesiems ir vieneriems ateinantiesiems metams, teikia šias prognozes Finansų ministerijai.
- Teikia auditoriams visą su projektu susijusią dokumentaciją ir įgyvendina audito išvadas ir rekomendacijas susijusias su Agentūros veikla.

VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

- Dalyvauja parengiant viešųjų pirkimų dokumentus, konkursams kuriuos skelbia Aplinkos projektų valdybos agentūra, skiria savo atstovą ir dalyvauja vertinimo komisijos posėdžiuose, pasirašo sutartis Užsakovo vardu.
- Teikia tikrinimui Aplinkos projektų valdybos agentūrai viešųjų pirkimų dokumentus, konkursų, kuriuos skelbia Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.
- Atlieka projekto įgyvendinimo paruošiamuosius darbus, analizę, pateikia Aplinkos projektų valdymo agentūrai išėties duomenis darbų apimtims ir technologijai.



Projektas Nr. 2004A/P/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R A
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



- Koordinuoja ir derina su savivaldybėmis bei kitomis institucijomis visus su projektu susijusius techninius sprendimus.
- Atsako už techninių specifikacijų, brėžinių kokybę bei savalaikį jų parengimą.
- Paruošia ir teikia savivaldybėms dokumentus dėl lėšų iš kitų, nei Sanglaudos fondas ir Valstybės biudžeto (paskolų, nuosavų lėšų) skyrimo projekto įgyvendinimui.
- Atlieka projekto techninę priežiūrą, įgyvendina projekto finansiniame memorandume nurodytus fizinius ir finansinius rodiklius.
- Vykdo projekto išlaidų apskaitą ir projekto finansinę priežiūrą, teikia ataskaitas Aplinkos projektų valdymo agentūrai.
- Teikia Aplinkos projektų valdymo agentūrai mokėjimo prašymus, sumoka projekto vykdytojams mokėtinas iš kitų nei Sanglaudos ar Valstybės biudžeto lėšos šaltinių (gautos paskolos, nuosavos lėšos) lėšas.
- Kaupia, sistemina visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

2. Projekto įgyvendinimas

2.1. Projekto aprašymas

Šiaulių regionas yra trečias pagal dydį visoje Lietuvoje, kurio bendras plotas yra 8540 km². Čia gyvena apie 360 tūkst. gyventojų, o 37 proc. iš jų gyvena Šiaulių mieste. Šiaulių miestas yra ketvirtas pagal dydį Lietuvoje, o jo plotas yra 81 km².

2001 m. gruodžio 21 d. Europos Komisijai pritarus projektui „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ pasirašytas Finansinis memorandumas, kuriame:

- Bendra projekto vertė – 9 402 000 EUR, iš jų:
- 56 proc. sudaro negražintina Europos bendrijos parama (5 265 120 EUR),
- 22 proc. (2 056 880 EUR) – Valstybės biudžeto lėšos,
- 22 proc. (2 080 000 EUR) – skolintos lėšos.

Projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas – sukurti aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu darnią atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus.

Projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ rezultatai:

- Pastatytas naujas regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Aukšttrakiuose (Šiaulių raj.).
- Rekonstruotas privažiavimo kelias į Aukšttrakių sąvartyną.
- Šiaulių apskrityje įrengti 34 atliekų priėmimo punktai.
- Šiaulių apskrityje įrengtos 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės.
- Kairiuose (Šiaulių raj.) įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.
- Uždarytas Šiaulių miesto senasis sąvartynas Kairiuose.
- Šiaulių apskrityje uždaryti ir sutvarkyti 116 mažųjų sąvartynų (šiukšlynų).
- Įsigyta reikalinga įranga.



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

2009-05-08



2005 m. birželio mėnesį įvyko projekto kofinansavimui reikalingos paskolos pirkimo konkursas. Konkurso laimėtojas AB bankas „NORD/LB Lietuva“ įsipareigojo projekto įgyvendinimui suteikti 2,08 mln. EUR paskolą. Paskolos grąžinimo terminas – 15 metų.

Projekto įgyvendinimo metu, paaiškėjus papildomam (717.468,94 EUR) lėšų poreikiui Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų uždarymui (Sutarties Nr. S/2005/S10), lėšos skirtos iš valstybės biudžeto. Papildomas lėšų poreikis atsirado tada, kai konkursui „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas“ pateiktų tiekėjų pasiūlymuose nurodyta darbų atlikimo kaina viršijo darbams atlikti turimą biudžetą. Šią sumą suderinus su LR Aplinkos ir Finansų ministerijomis nuspręsta, kad „minimo komponento padidėjusi vertė bus finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų“. Viso iš Valstybės biudžeto minimai sutarčiai skirta – 789.568,53 EUR.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistema pilnai funkcionuoti pradėjo pastačius naują regioninę sąvartyną Aukštrakuose. Jo statyba baigta 2007 m. pradžioje.

2.2. Projekto valdymo ypatumai

2002 m. birželio 25 d. 7-į Šiaulių apskrities savivaldybių (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto) įsteigė viešąją įstaigą Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, kuris atsakingas už regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, jos funkcionavimo organizavimą, plėtojimą ir administravimą Šiaulių apskrities teritorijoje.

Suderinus pasiskirstymą pareigomis ir atsakomybe tarp ŠRATC ir APVA bei Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo principus tarp apskrities savivaldybių, 2006 m. vasario mėn. 8 d. Šiaulių regiono (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto) savivaldybės pasirašė Šiaulių apskrities savivaldybių bendradarbiavimo regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje sutartį, kurioje vienas iš pagrindinių Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos organizavimo principų – Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema yra vieninga komunalinių atliekų tvarkymo sistema, integruojanti savyje Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas.

VšĮ ŠRATC techninę pagalbą teikiantys konsultantai VšĮ „Projektų vadybos grupė“ paruošė dokumentų paketus, reikalingus minėtos sistemos organizaciniais principams įgyvendinti.

Visi paruošti dokumentų projektai buvo suderinti ir pateikti visoms Šiaulių apskrities savivaldybėms. Tačiau ne visos Šiaulių apskrities savivaldybės tarybų sprendimais užtikrino visos regiono atliekų tvarkymo sistemos vieningumą bei solidaraus rinkliavos dydžio taikymo principą.

Sudarytos koncesijos sutartys su Akmenės rajono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėmis, kurios suteikė leidimą ŠRATC:

- teikti viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas;
- būti naujo regioninio sąvartyno operatoriumi;
- vykdyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, integruotos į regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kūrimą, palaikymą, vystymą bei plėtrą;
- rinkti vietinę rinkliavą;
- organizuoti atliekų surinkėjo parinkimo konkursą.



Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



Tais pačiais metais Šiaulių rajono savivaldybė, panaikino 2005 m. gegužės 26 d. anksčiau priimtą tarybos sprendimą "Dėl pavedimo viešajai įstaigai „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdyti apskrityje atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis" ir pati paskelbė viešąjį konkursą komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į Aukštųjų savartyną paslaugai teikti, patvirtinusi:

- atliekų tvarkymo planą;
- atliekų tvarkymo taisykles.

Kitos ŠRATC funkcijos Šiaulių rajono savivaldybėje nesikeičia, lyginant su kitomis Šiaulių apskrities savivaldybėmis, ŠRATC administruoja vietinę rinkliavą, teikia pagalbą regiono savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus, eksploatuoja atliekų priėmimo punktus, kompostavimo aikšteles ir kitus atliekų surinkimo, tvarkymo objektus, organizuoja buityje susidarantių antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių, pavojingų atliekų surinkimą iš gyventojų apskrities teritorijoje ir kt.

Joniškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybės pavedė ŠRATC administruoti komunalinių atliekų tvarkymo (išskyrus šalinimo) sistemą ir vietinę rinkliavą.

2007 metų vietinės rinkliavos dydžio už Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymą preliminarūs ekonominiai skaičiavimai atliko ŠRATC techninę pagalbą teikiantys konsultantai – VŠĮ „Projektų vadybos grupė“ vadovaujantis Aplinkos ministerijos rekomenduota vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo metodika.

Atliekų tvarkymą Šiaulių regione organizuoja ir Apskrities viršininko administracija (atliekų tvarkymo planų rengimo organizavimas ir jo įgyvendinimo kontrolė, savivaldybių veiksmų, įgyvendinant bendras regionines programas, koordinavimas, parama sprendžiant kitus svarbius klausimus) bei atliekų tvarkytojai (atliekų surinkimo paslaugas teikiančios įmonės).

Projektui pasibaigus, t.y. nuo 2009 m. sausio 1 d., gavėjo šalis užtikrina, kad visi viešieji (centrinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, įskaitant audituojančias įmones) ir privatūs subjektai, dalyvaujantys valdant projektą, susijusį su FM, turėtų priėjimą prie projekto apskaitos ir kitų su projektu išlaidomis susijusių dokumentų, kuriuos atsakingosios institucijos privalo saugoti penkerius metus nuo paskutinio su projektu susijusio mokėjimo.

2.3. Viešųjų pirkimų vykdymas

Projekto įgyvendinimui užtikrinti, reikalingų darbų ir paslaugų viešieji pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis „Praktiniu vadovu sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje“ (PRAG) ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Viešųjų pirkimų dokumentuose sutarčių sąlygos darbams buvo parengtos pagal FIDIC tipinių sutarčių sąlygas, o sutarčių sąlygos paslaugoms – pagal Bendrąsias EB finansuojamų paslaugų sutarčių sąlygas. Detalesnė informacija apie viešuosius pirkimus pateikiama žemiau.

Visi projekto įgyvendinimo metu vykdyti pirkimai buvo atliekami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais LR teisės aktais bei konkurso sąlygomis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.



TIKRA
Siekiausias vedėja
Aldona Čepelienė

2009-05-08



2.3.1. Techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimas

Lentelė Nr. 1. Techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimo viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2003-02-14
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Konkurso pasiūlymų vertinimas vyko pagal PRAG procedūras, 2003 metais Pirkimo būdas – tarptautinis ribotas konkursas. Išankstinis skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2002-07-25. Skelbimo apie pirkimą paskelbimo spaudoje data – 2002-12-12.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėju:	WSP International Sweden AB
Sutarties sudarymo data:	2003-09-08
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	594.000,00 EUR (be PVM)
Darbu teikimo terminai:	
Pradžia:	2003-09-08
Pabaiga:	2005-01-08
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projekto tikslas – parengti techninį projektą ir konkursinę dokumentaciją Kairių savartyno uždarymui, Naujojo regioninio savartyno Aukštakiuose įrengimui, atliekų priėmimo punktų įrengimui, mažųjų savartynų/ šiukšlynų sutvarkymui ir konteinerinių aikštelių įrengimui; parengti konkursinę dokumentaciją naujojo regioninio savartyno įrangos įsigijimui.

Pagal 2003 m. rugsėjo 8 d. su WSP International Sweden AB pasirašytą Techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimo sutartį Nr. EuropeAid/114277/D/SV/LT pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 594.000,00 EUR iš kurių:


- Sanglaudos fondo dalis: 332.640,00 EUR,
- Paskolos dalis: 0 EUR,
- LR biudžeto dalis: 261.360,00 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

2.3.2. Techninė pagalba Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui

Lentelė Nr. 2 Techninės pagalbos viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2003-05-30, 2003-08-26
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2003-06-09. Konkurso pasiūlymų vertinimas vyko pagal PRAG procedūras, 2003 metais. 2004 m. sausio mėn. Europos Komisijos delegacija atmetė jai patvirtinti pateiktą pasiūlymų



Projekto Nr. 2004/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

2009-05-08

21



		vertinimo ataskaitą, kadangi vertinimo komisijos nariai nesilaikė PRAG reikalavimų, kuriame sakoma, kad visi vertinimo metu konkurso dalyviui duoti balai turi būti konkrečiai paaiškinami. Persvarstyta vertinimo ataskaita dar kartą pateikta Europos Komisijos delegacijai 2004 m. sausio mėn. ir buvo atmesta 2004 m. kovo mėn. Atmetimo priežastis – komisijos nariai savo vertinimo lentelėse nepateikė išsamaus paaiškinimo. Persvarstyta vertinimo ataskaita patvirtinta 2004 m. gegužį. Pirkimo būdas – supaprastintas konkursas.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:		VšĮ „Projektų vadybos grupė“
Sutarties sudarymo data:		2004-06-30
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:		Pasirašytos sutarties vertė 198.610,00 EUR (be PVM).
Darbų teikimo terminai:	Pradžią:	2004-06-30
	Pabaigą:	2006-06-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:		Sutarties tikslas – padėti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui (SRATC) projekto valdyme bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrimo.

Pagal 2004 m. birželio 30 d. su VšĮ „Projektų vadybos grupė“ pasirašytą Techninės pagalbos sutartį Nr. ISPA/12/SV/LT pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 189.256,21 EUR iš kurių:


- Sanglaudos fondo dalis: 105.983,48 EUR,
- Paskolos dalis: 0 EUR,
- LR biudžeto dalis: 83.272,73 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 95,29 proc. numatytų lėšų. Nukrypimai nuo sutarties – 9.353,79 EUR. Nepanaudotos lėšos buvo perskirstytos ir panaudotos kitose sutartyse (įrangos pirkimas).

2.3.3. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose

Lentelė Nr. 3. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimo viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2003-08-08
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2003-08-25. Konkurso pasiūlymų vertinimas vyko pagal PRAG procedūras, kurios pradėtos 2003 metais. 2004 m. vasario mėn. Europos Komisijos delegacijai buvo pateikta derybų ataskaita, kuri buvo atmesta 2004 m. balandžio mėn., nes buvo paprašyta konkurso dalyviui pateikti papildomą užklausimą. Persvarstyta



Projektas Nr. 2004/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

22



		derybų ataskaita patvirtinta 2004 m. gegužės mėn. Pirkimo būdas – neskelbiamos derybos (statybos darbai pagal FIDIC geltonąją knygą).
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:		UAB „Šiaulių kelias“
Sutarties sudarymo data:		2004-07-14
Darbu kaina arba kainodaros taisyklės:		Sutarties darbų vertė 299.790,00 EUR (be PVM).
Darbu teikimo terminai:		
	Pradžią:	2004-07-14
	Pabaigą:	2005-07-16
Trumpas perkamų darbų aprašymas:		Pagal šią sutartį, rangovas turi pastatyti „žaliųjų“ atliekų kompostavimo aikštelę Kairių savivaldybės teritorijoje.

Pagal 2004 m. liepos 14 d. su UAB „Šiaulių kelias“ pasirašytą Kompostavimo aikštelės įrengimo Kairiuose sutartį Nr. A/2004/S02 pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 299.790,00 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 167.882,40 EUR,
- Paskolos dalis: 0 EUR,
- LR biudžeto dalis: 131.907,60 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

2.3.4. Techninė priežiūra

Lentelė Nr. 4. Techninės priežiūros viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:		2003-06-17
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:		Išankstinis skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2003-05-14. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2003-07-30. Konkurso pasiūlymų vertinimas vyko pagal PRAG procedūras, kurios pradėtos 2003 metais. 2004 m. sausį Europos Komisijos delegacija atmetė jai patvirtinti pateiktą trumpojo sąrašo sudarymo ataskaitą, kuri patvirtinta 2004 m. vasarį. Konkurso pasiūlymų vertinimo ataskaitą patvirtinta 2004 m. liepos mėnesį, tad konkurso pasiūlymų vertinimas įvyko 2004 metais. Pirkimo būdas – tarptautinis ribotas konkursas.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:		M&S Umweltprojekt GmbH
Sutarties sudarymo data:		2004-09-16
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:		Sutarties paslaugų vertė 289.950,00 EUR (be PVM).
Darbu teikimo terminai:		
	Pradžią:	2004-09-16
	Pabaigą:	2007-09-16. 2008-12-04 pagal sutarties pakeitimą Nr. 1 sutarties terminas pratęstas iki

Projekto Nr. 2001/MT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

23



Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	2009-07-07. Sutarties tikslas – projekto apimtyje statomų objektų techninė priežiūra apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei FIDIC darbų sutarčių sąlygose. Techninės priežiūros paslaugos turės būti teikiamos šiems objektams: naujojo regioninio sąvartyno statyba, atliekų priėmimo punktų (34 vnt.), Kairių sąvartynų uždarymas, mažųjų sąvartynų ir šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas, kompostavimo aikštelės įrengimas.

Pagal 2004 m. rugsėjo 16 d. su M&S Umwelprojekt GmbH pasirašytą Techninės priežiūros sutartį Nr. EuropeAid/116507/D/SV/LT pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 289.950,00 EUR iš kurių:


- Sanglaudos fondo dalis: 162.372,00 EUR,
- Paskolos dalis: 0 EUR,
- LR biudžeto dalis: 127.578,00 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

2.3.5. Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba

Lentelė Nr. 5. Naujojo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statybos viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2005-02-24
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Išankstinis skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2004-06-02. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-03-09. Konkurso vertinimo procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2005-05-03. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2005-06-13 ir ją patvirtinus, 2005-06-23 laimėtojas pakviestas sudaryti darbų atlikimo sutartį. Pasiūlymų vertinimo metu ir po jo tiekėjų skundų nėra gauta. Pirkimo būdas – atviras konkursas (statybos darbai pagal FIDIC raudonąją knygą).
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AS „Merko Ehitus“
Sutarties sudarymo data:	2005-07-08
Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	Sutarties darbų vertė 2.740.848,00 EUR (be PVM).
Darbų teikimo terminai:	
Pradžia:	2005-07-08
Pabaiga:	2007-01-15, pratęsta iki 2008-02-26
Trumpas perkamų darbų aprašymas:	Pagal šią sutartį rangovas turi pastatyti naująjį



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

24



Šiaulių regioninį sąvartyną Aukštrakiuose įrengiant visą suprojektuotą infrastruktūrą bei pastatus, I atliekų deponavimo sekciją (4,1 ha).

Pagal 2005 m. liepos 8 d. su AS "Merko Ehitus" pasirašytą naujo regioninio sąvartyno statybos darbų sutartį Nr. A/2005/S05 pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 2.731.989,84 EUR, iš kurių pagal sutartį išmokėta 2.663.476,34 EUR:

- Sanglaudos fondo dalis: 1.491.546,73 EUR,
- Paskolos dalis: 672.756,16 EUR,
- LR biudžeto dalis: 499.173,45 EUR.
- Nustatyta pažeidimų (išskaičiuota) suma: 68.513,5 EUR:
 - Pažeidimas Nr. 1 – 51.996,77 EUR (už „Kompiuterinę įrangą“ ir „Patalpos inžinieriui),
 - Pažeidimas Nr. 2 – 13.386,52 EUR (už Kompiuterinis-telefoninis tinklas“ ir „Baldai tarnybiniam pastatui“),
 - Pažeidimas Nr. 3 – 3.130,21 EUR (už „Pirtelės įrengimas“).

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 97,18 proc. numatytų lėšų. Nukrypimas nuo sutarties – 77.371,66 EUR. Nepanaudotos lėšos buvo perskirstytos ir panaudotos kitose sutartyse (įrangos pirkimas).

Nustatytą pažeidimų (išskaičiuotą) sumą, atsiradus finansinėms galimybėms, ŠRATC sugrąžins iki 2009-12-31.

2.3.6. Atliekų priėmimo punktų statyba

Lentelė Nr. 6. Atliekų priėmimo punktų statybos viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo gyvenamajame institucijoje data:	2005-01-25
Pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Išankstinis skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2004-06-02. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-01-28. Konkurso vertinimo procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2005-03-14. Gauti 7 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2005-05-23. Gavus vieną skundą dėl pasiūlymo atmetimo priežasčių jis buvo išnagrinėtas ir priimtas. Pakartotinai preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2005-06-13 ir ją patvirtintus, 2005-06-23 laimėtojas pakviestas sudaryti darbų atlikimo sutartį. Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas (statybos darbai pagal FIDIC raudonąją knygą).
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	VI „Šiaulių regiono keliai“
Sutarties sudarymo data:	2005-07-08
Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	Sutarties darbų vertė 1.074.193,99 EUR (be PVM).



Projekto Nr. 2004/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
Skyriaus vedėja

2009-05-08

Aldona Čepelienė

25



Darbų teikimo terminai:

Pradžia:	2005-07-08
Pabaiga:	2007-01-15
Trumpas perkamų darbų aprašymas:	Pagal šią sutartį rangovas turi pastatyti 6 rajoninius ir 28 seniūnijų atliekų priėmimo punktus, kurie yra išsidėstę po visą Šiaulių regioną.

Pagal 2005 m. liepos 8 d. su VĮ "Šiaulių regiono keliai" pasirašytą 34 atliekų priėmimo punktų įrengimo sutartį Nr. A/2005/S04 pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 1.074.193,53 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 601.548,37 EUR,
- Paskolos dalis: 237.643,93 EUR,
- LR biudžeto dalis: 235.001,23 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų. Nukrypimas nuo sutarties – 0,46 EUR.

2.3.7. Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas

Lentelė Nr. 7. Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų sutvarkymo ir konteinerinių aikštelių įrengimo viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2005-07-25
Trumpas pasiūlyimų vertinimo procedūrų aprašymas:	Išankstinis skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2004-06-02. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-29. Konkurso vertinimo procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2005-09-19. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Pasiūlyimų vertinimo ataskaita patvirtinta 2005-10-04, tačiau preliminarinė eilė nebuvo paskelbta tol kol, nebuvo gautas LR Aplinkos ir LR Finansų ministerijų sutikimas skirti papildomų lėšų projekto finansavimui iš valstybės biudžeto. Gavus šį sutikimą, preliminarinė pasiūlyimų eilė paskelbta 2005-11-28 ir ji patvirtinta 2005-12-08. Patvirtinus pasiūlyimų eilę gauti du konkurso dalyvio skundai, kurie buvo išnagrinėti ir atmesti, o su konkurso laimėtoju sudaryta darbų atlikimo sutartis. Pirkimo būdas – atviras konkursas (statybos darbai pagal FIDIC geltonąją knygą).
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Šiaulių titanas“, nuo 2007-09-13 UAB „NCC titanas“ (2007-11-15 pakeitimas Nr.1)
Sutarties sudarymo data:	2005-12-15
Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	Sutarties darbų vertė 1.914.765,41 EUR (be

Projekto Nr. 2001/LT/M6/P/RE/098 Galutinė ataskaita



Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



Darbu teikimo terminai:	PVM).
Pradžia:	2005-12-15
Pabaiga:	2007-12-15, pratęsta iki 2008-05-30
Trumpas perkamų darbų aprašymas:	Pagal šią sutartį rangovas turi sutvarkyti 116 mažųjų sąvartynų /šiukšlynų, kurie yra išsidėstę visame Šiaulių regione. Ši sutartis apima 247 bendro naudojimo konteinerinių aikštelių įrengimą. Dalis aikštelių bus įrengta šalia sutvarkomų šiukšlynų, kita dalis – miestų, miestelių bei kaimų teritorijose.

* – konkursui „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas“ pateiktų tiekėjų pasiūlymo vertinimo metu paaiškėjus, kad pasiūlymuose nurodyta darbų atlikimo kaina viršija šiems darbams atlikti turimą biudžetą, kuris numatytas Europos Komisijos 2001 m. gruodžio 21 d. patvirtinto Finansinio Memorandumo „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 pakeitime, išsiųstame Europos Komisijos derinimui 2005 m. rugsėjo mėnesį, buvo kreiptasi į LR Aplinkos ir LR finansų ministerijas, prašant apsvarstyti galimybę skirti papildomą finansavimą (trūkstamas lėšas 0,845 mln. Eur) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (2005-11-23 raštas Nr. APVA-2881). 2005-12-06 raštu Nr. ((2.37-05)-5K-0527691)-6K-0511586), LR Finansų ministerija praneša, kad „minimo komponento padidėjusi vertė bus finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų“. Gavus šį pritarimą 2005 m. gruodžio 15 d. pasirašyta projekto „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas“ darbų atlikimo sutartis.

Pagal 2005 m. gruodžio 15 d. su UAB „Šiaulių titanas“ pasirašytą Mažųjų sąvartynų uždarymo ir konteinerinių aikštelių įrengimo sutartį Nr. A/2005/Š10 pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 1.842.665,82 EUR iš kurių:


- Sanglaudos fondo dalis: 614.516,07 EUR,
- Paskolos dalis: 236.716,10 EUR,
- LR biudžeto dalis: 273.964,71 EUR.
- Finansavimo memorandumą viršijanti dalis: 717.468,94 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 96,23 proc. numatytų lėšų. Pagal Finansinį memorandumą šiukšlynų sutvarkymui skirtas biudžetas buvo 1.070.000,00 EUR, tačiau reali sutarties vertė yra 1.914.765,41 EUR. 844.765,41 EUR skirtumas finansuojamas iš valstybės biudžeto. 2008-08-01 sutarties pakeitimas Nr. 2 – sutarties vertė yra 1.914.765,41 EUR. 789568,53 EUR skirtumas finansuojamas iš valstybės biudžeto

2.3.8. Kairių sąvartyno uždarymo I-asis etapas

Lentelė Nr. 8. Kairių sąvartyno uždarymo I-ojo etapo viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2005-09-19, 2006-01-21.
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Išankstinio skelbimo apie numatomą pirkimą paskelbimo spaudoje data – 2005-06-02. Skelbimo apie pirkimą paskelbimo spaudoje data – 2005-09-16. Konkurso vertinimo procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
Skyriaus vadėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08


27



		2005-11-03. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Pasiūlymų vertinimo ataskaita patvirtinta 2005-11-30, ir pripažinus visus pasiūlymus neatitinkančiais pirkimo dokumentų reikalavimų, kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės dėl sutikimo atmesti visus pasiūlymus. Šis susitikimas gautas 2005-12-28 ir pirkimo procedūros buvo nutrauktos. Antrą kartą skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-01-25. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2006-03-01. Gauti 5 tiekėjų pasiūlymai. Pasiūlymų vertinimo ataskaita patvirtinta 2006-04-10. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-04-11 ir ją patvirtinus, 2006-04-24 laimėtojas pakviestas sudaryti darbų atlikimo sutartį. Pasiūlymų vertinimo metu ir po jo tiekėjų skundų nėra gauta. Pirkimo būdas – atviras konkursas (statybos darbai pagal FIDIC raudonąją knygą).
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:		UAB „Šiaulių plentas“
Sutarties sudarymo data:		2006-05-04
Darbu kaina arba kainodaros taisyklės:		Sutarties darbų vertė 1.933.438,37 EUR (be PVM).
Darbu atlikimo terminai:	Pradžią:	2006-05-04
	Pabaigą:	2007-11-15, pratęsta iki 2008 m. kovo 12 d., ir iki 2008-06-15.
Trumpas perkamų darbų aprašymas:		Kairių sąvartyno I-ojo etapo uždarymo metu bus atliekami šie darbai: filtrato drenažo sistemų bei slėginės linijos, sankasų (bernų) įrengimas pagal sąvartyno perimetrą, vakarinio apatinio (žemiau kelio) sąvartyno kaupo šlaito (~1 ha) sutvarkymas; atliekų kaupo šlaitų (vakarinio viršutinio ir rytinio viršutinio) nuolydžių sumažinimas – nukasant atliekas ir jas supilant ant kaupo viršaus: atliekų kaupo dalies (vakarinio, šiaurinio ir rytinio šlaitų viršutinės dalies bei kaupo) – maždaug 7,5 ha užpylimas molio sluoksniu (~80 cm) ir dirvožemio sluoksniu (~20 cm).

Pagal 2006 m. gegužės 4 d. su UAB „Šiaulių plentas“ pasirašytą Kairių sąvartyno uždarymo (I-etapas) sutartį Nr. A/2006/Š13 pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 1.903.740,76 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 1.066.094,82 EUR,
- Paskolos dalis: 779.078,96 EUR,
- LR biudžeto dalis: 58.566,98 EUR.



T I K R A
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiejienė

2009-05-08



Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 98,46 proc. numatytų lėšų. Nukrypimai nuo sutarties – 29.697,61 EUR.

2.3.9. Privažiavimo kelio į naująjį Aukštrakių sąvartyną statyba

Lentelė Nr. 9. Privažiavimo kelio į naująjį Aukštrakių sąvartyną statybos viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinamojoje institucijoje data:	2006-06-12
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Išankstinis skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-12-14. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-06-28. Konkurso vertinimo procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2006-08-07. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Pasiūlymų vertinimo ataskaita patvirtinta 2006-08-17. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-08-18 ir ją patvirtinus, 2006-09-01 laimėtojas pakviestas sudaryti darbų atlikimo sutartį. Pasiūlymų vertinimo metu ir po jo tiekėjų skundų nėra gauta. Pirkimo būdas – atviras konkursas (statybos darbai pagal FIDIC raudoną knygą).
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Kamesta“
Sutarties sudarymo data:	2006-09-11
Darbo kaina ir bankamodaros taisyklės:	Sutarties darbų vertė 554 204,86 EUR (be PVM).
Darbu atlikimo terminai:	Pradžią: 2006-09-11 Pabaigą: 2006-12-15, pratęsta iki 2007-05-31
Trumpas perkamų darbų aprašymas:	Privažiavimo kelio į naująjį Aukštrakių sąvartyną (ilgis – 2,064 km) įrengimas, atliekant esamo kelio praplatinimo ir asfaltavimo darbus.

Pagal 2006 m. rugsėjo 11 d. su UAB „Kamesta“ pasirašytą Privažiavimo kelio į sąvartyną darbų sutartį Nr. A/2006/S/15 pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 554.204,86 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 310.354,72 EUR,
- Paskolos dalis: 122.606,74 EUR,
- LR biudžeto dalis: 121.243,40 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

2.3.10. Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas

Lentelė Nr. 10. Atliekų tvarkymo įrangos tiekimo viešasis pirkimas

Pirkimo dokumentų suderinimo

a) 2005-12-02



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skyriaus vadėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

29



įgyvendinančiojoje institucijoje data:

- b) 2006-03-08
- c) 2006-08-22
- d) 2007-03-30
- e) 2008-04-28

Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:

Išankstinio skelbimo apie numatomą pirkimą paskelbimo spaudoje data – 2005-11-16. Pirkimo būdas – atviras konkursas (tiekimas). Konkurso vertinimo procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu.

a) Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-12-14. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2006-02-01. Pirkimo 1 daliai „Atliekų tankintuvo įsigijimas“ gauti 3 pasiūlymai, pirkimo 2 daliai „Sunkvežimio su priekaba įsigijimas“ gauti 2 pasiūlymai, pirkimo 3 daliai „Daugiafunkcinio traktoriaus įsigijimas“ gautas 1 pasiūlymas, pirkimo 6 daliai „Konteinerių įsigijimas“ gauti 2 pasiūlymai. Pirkimo dalims „Mobilaus komposto smulkintuvo įsigijimas“, „Komposto vartytuvo įsigijimas“ ir „Ekskavatoriaus įsigijimas“ pasiūlymų negauta. Pasiūlymų vertinimo ataskaita patvirtinta 2006-03-03. Pirkimo 1, 2 ir 6 dalims Preliminarios pasiūlymų eilės paskelbtos 2006-03-07 ir jas 2006-03-20 patvirtinus, laimėtojai pakviesti sudaryti prekių tiekimo sutartis. 2 dalies pirmoje pasiūlymų eilės vietoje buvusiai kompanijai atsisakius sudaryti sutartį, sutartis sudaryta su antroje vietoje esančia kompanija. 3 daliai pateiktas tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, tad 2006-03-17 gavus VPT pritarimą nutarta šios dalies pirkimą tęsti neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamos derybos įvyko 2006-04-28, ataskaita patvirtinta 2006-05-16 ir tiekėjas pakviestas sudaryti sutartį.

b) Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-03-15. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2006-04-25. Pirkimo dalims „Mobilaus komposto smulkintuvo įsigijimas“, „Komposto vartytuvo įsigijimas“ ir „Ekskavatoriaus įsigijimas“ pasiūlymų negauta.

c) Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-25. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2006-10-16. Pirkimo dalims „Komposto vartytuvo įsigijimas“ ir „Ekskavatoriaus įsigijimas“ pasiūlymų negauta.

Projekto Nr. 2004/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



TIKRA
Skyriaus vadovė

Aldona Čeplėdienė

2009-05-08



	įsigijimas“ pasiūlymų negauta. Pirkimo daliai „Mobilaus komposto smulkintuvo įsigijimas“ gauti 2 pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08 ir ją patvirtinus, 2006-12-12 laimėtojas pakviestas sudaryti įrangos tiekimo sutartį. Pasiūlymų vertinimo metu ir po jo tiekėjų skundų nėra gauta. d) Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-13. Voko su tiekėjo pasiūlymu atplėšimas įvyko 2007-06-06. Į pasiūlymo daliai – komposto vartytuvas, kaušas gautas 1 pasiūlymas. 2007-06-12 patvirtinus laimėtoją UAB „Kelių mašinos“, 2007-06-20 sudaryta sutartis su paslaugos tiekeju. e) Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2008-05-21. 2008-06-11 įvyko ekskavatoriaus pirkimo viešojo konkurso vokų plėšimo procedūra. Pateikti 2 pasiūlymai. UAB „Intrac Lietuva“ pateiktas pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis keliamų techninių reikalavimų. UAB „Mecro technikonas“ 2008-07-08 pakviestas pasirašyti pirkimo sutartį.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	a) UAB „Oksata“ (atliekų tankintuvas); UAB „Silberauto (sunkvežimis su priekaba); UAB „Argo ekspresas“ (konteinerių įsigijimas); UAB „Intrac Lietuva“ (daugiafunkcinis traktorius). b) negauta pasiūlymų c) UAB „Balžuva“ (mobilaus komposto smulkintuvas). d) UAB „Kelių mašinos“ (komposto vartytuvas-kaušas) e) UAB „Mecro technikonas“ (ekskavatorius).
Sutarties sudarymo data:	a) 2006-03-28 (UAB „Oksata“); 2006-06-22 (UAB „Silberauto“); 2006-03-28 (UAB „Argo ekspresas“); 2006-05-31 (UAB „Intrac Lietuva“); b) - c) 2006-12-28 (UAB „Balžuva“); d) 2007-06-20 (UAB „Kelių mašinos“). e) 2008-09-08 (UAB „Mecro technikonas“)
Prekių kaina arba kainodaros taisyklės:	a) 220.090,94 EUR (be PVM UAB „Oksata“); 118.418,14 EUR (be PVM UAB „Silberauto“); 18.414,62 EUR (be PVM UAB „Argo ekspresas“); 66.610,80 EUR (be PVM UAB „Intrac Lietuva“); b)



Skriaus vedėja
Aldona Čepelienė

2009-05-08

31



	c) 90.969,65 EUR (be PVM UAB „Balžuva“); d) 28.151, 07 EUR (be PVM UAB „Kelių mašinos“). e) 97.022,70 EUR (be PVM UAB „Mecro technikonas“).
Prekių tiekimo terminai:	Pradžia: a) 2006-03-28 (UAB „Oksata“); 2006-06-22 (UAB „Silberauto“); 2006-03-28 (UAB „Argo ekspresas“); 2006-05-31 (UAB „Intrac Lietuva“). b) - c) 2006-12-28 (UAB „Balžuva“); d) 2007-06-20 (UAB „Kelių mašinos“); e) 2008-09-08 (UAB „Mecro technikonas“)
	Pabaiga: a) 2006-07-28 (UAB „Oksata“); 2006-10-22 (UAB „Silberauto“); 2006-07-28 (UAB „Argo ekspresas“); 2006-09-30 (UAB „Intrac Lietuva“); b) - c) 2007-04-28 (UAB „Balžuva“); d) 2007-12-20 (UAB „Kelių mašinos“); e) 2008-11-01 (UAB „Mecro technikonas“)
Išimties perkamų prekių aprašymas:	Tankintuvas, Sunkvežimis su priekaba, Ekskavatorius, Daugiafunkcinis traktorius, Mobilus komposto smulkintuvas, Komposto vartytuvas, 30 m ³ konteineriai

Pagal 2006 m. kovo 28 d. su UAB „Oksata“ pasirašytą sutartį Nr. 2006/5/A/PT/LT apmokėta 220.090,94 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 123.250,93 EUR,
- LR biudžeto dalis: 96.840,01 EUR.

Pagal 2006 m. birželio 22 d. su UAB „Silberauto“ pasirašytą sutartį Nr. 2006/9/A/PT/LT apmokėta 118.418,14 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 66.314,16 EUR,
- LR biudžeto dalis: 52.103,98 EUR.

Pagal 2006 m. kovo 28 d. su UAB „Argo ekspresas“ pasirašytą sutartį Nr. 2006/6/A/PT/LT apmokėta 18.414,62 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 10.312,19 EUR,
- LR biudžeto dalis: 8.102,43 EUR.

Pagal 2006 m. gegužės 31 d. su UAB „Intrac Lietuva“ pasirašytą sutartį Nr. 2006/7/A/PT/LT apmokėta 66.610,80 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 37.302,05 EUR,
- LR biudžeto dalis: 29.308,75 EUR.



Projekto Nr. 2004/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
Skyriaus vedėja

2009-05-08

Aldona Čepelienė



Pagal 2006 m. gruodžio 28 d. su UAB „Balžuva“ pasirašytą sutartį Nr. 2006/17/A/PT/LT apmokėta 90.969,65 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 50.943,00 EUR,
- LR biudžeto dalis: 40.026,65 EUR.

Pagal 2007 m. birželio 20 d. su UAB „Kelių mašinos“ pasirašytą sutartį Nr. A/2007/S/27 apmokėta 28.151,07 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 15.764,60 EUR,
- LR biudžeto dalis: 12.386,47 EUR.

Pagal 2008 m. rugsėjo 8 d. su UAB „Mecro technikonas“ pasirašytą sutartį Nr. S-08-240 apmokėta 97.022,70 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 69.926,91 EUR,
- Paskolos dalis: 27.095,79 EUR.

2.4. Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Prieš pradėdant kurti Šaulių regiono atliekų tvarkymo sistemą apskrities sąvartynai buvo trijų tipų: 7 miesto sąvartynai, kurių kiekvienas aptarnavo daugiau kaip 35000 gyventojų, 47 seniūnijų sąvartynai, kurie aptarnavo vidutiniškai po 3000 gyventojų ir 104 kaimo sąvartynai, kurie aptarnavo mažiau kaip po 1500 gyventojų. Viso regione buvo virš 150 veikiančių sąvartynų. Didžiausias jų – Šiaulių miesto buitinių atliekų sąvartynas Kairiuose.

Bendras visų sąvartynų plotas – 207 hektarai, juose iš viso sukaupta beveik 3,8 milijonai m³ atliekų.

Iš visų regione buvusių komunalinių atliekų sąvartynų tik Kairių sąvartynas buvo prižiūrimas: atvežamos atliekos kontroliuojamos ir sveriamos, suspaudžiamos bei užpilamos. Tuo tarpu kiti regiono komunalinių atliekų sąvartynai veikė neprižiūrimi, nebuvo realios atvežamų atliekų kontrolės, apskaitos, monitoringo.

Iš regiono savivaldybių tik Šiaulių mieste buvo įrengtos stambiagabaritinių ir statybinių atliekų aikštelės. Antrinių žaliavų surinkimas buvo vykdomas tik Šiaulių mieste, ir nežymūs kiekiai surenkami Kelmėje bei Radviliškyje. Surinktos antrinės žaliavos buvo perduodamos tvarkyti įmonėms, užsiimančiomis antrinių žaliavų tvarkymu. Nežymūs biologiškai suyrančių atliekų kiekiai buvo surenkami tik Kelmės ir Šiaulių rajonuose bei Šiaulių mieste.

Pagal iš regiono savivaldybių surinktus duomenis, tuo metu regione atliekų tvarkymą ir nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimą vykdė apie 20 įmonių. Antrinių žaliavų ir biodegrazuojamų atliekų surinkimo regione praktiškai nebuvo. Išimtis – Šiaulių miestas, nes buvo sudarytos galimybės antrinių žaliavų surinkimui ir atliekų rūšiavimo uždavinys jau buvo pradėtas spresti.

Nepavojingos atliekos. Pagrindinė atliekų šalinimo vieta visame Šiaulių regione buvo sąvartynai.

Popieriaus – kartono atliekos Šiaulių regione buvo surenkamos konteinerių aikštelėse Šiaulių mieste, o kituose miestuose ir gyvenvietėse – nereguliariu organizuotu surinkimu iš gyventojų taikant apvažiavimo būdą. Bet galima teigti, kad realiai šis surinkimas nebuvo vykdomas, nes daugumoje savivaldybių antrinių žaliavų surinkimo nebuvo.



TIKRA
Skyriaus vadėja

2009-05-08

Aldona Čepelienė




Stiklo atliekų surinkimo tvarka analogiška kaip ir popieriaus bei kartono. Šiaulių regione stiklas buvo surenkamas antrinių žaliavų konteinerių aikštelėse Šiauliuose ir kai kuriuose rajonų miestuose.



Juodas ir spalvotas metalas buvo surenkamas Šiauliuose 2 – jose įmonėse. Juodo metalo laužą Joniškio savivaldybėje surinko 3 įmonės.

Pavojingos atliekos. Pagrindinis pavojingų atliekų tvarkymo būdas buvo jų surinkimas ir transportavimas laikinam saugojimui į UAB "Toksika" gamybinę bazę Aukštakiuose.

Antrinių žaliavų surinkimas buvo vykdomas tik Šiaulių mieste, ir nežymūs kiekiai surenkami Kelmėje bei Radviliškyje. Surinktos antrinės žaliavos perduodamos tvarkyti įmonėms, užsiimančiomis antrinių žaliavų tvarkymu. Nežymūs biodegrazuojamų atliekų kiekiai surenkami tik Kelmės ir Šiaulių rajonuose bei Šiaulių mieste.

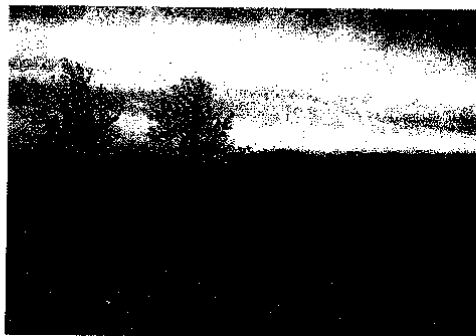

2 pav. Kairių sąvartyno teritorija prieš pradant uždarymo darbus

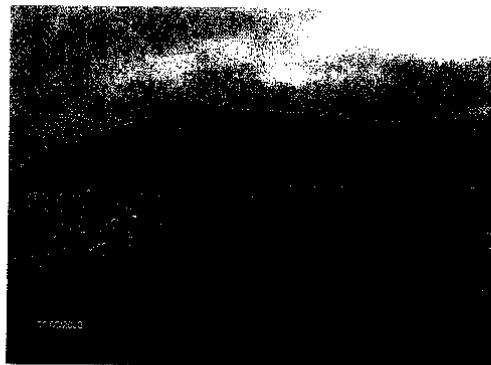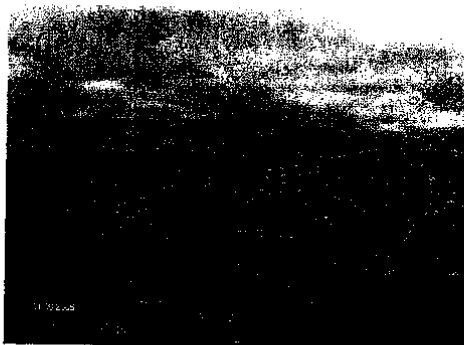

3 pav. Šiaurinė Kairių sąvartyno dalis ir privažiavimo kelias vakarinio šlaito dalyje



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skyriaus vedėja

2009-05-08

Aidona Čepelienė


34



4 pav. Privažiavimo kelias į Aukstrakių savartyną



5 pav. Baisogalos atliekų priėmimo punktas su asfaltbetonio sluoksniu

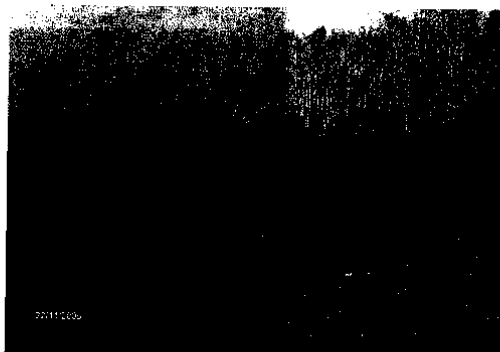

6 pav. Iškirta Aukstrakių savartyno teritorija





Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
 Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

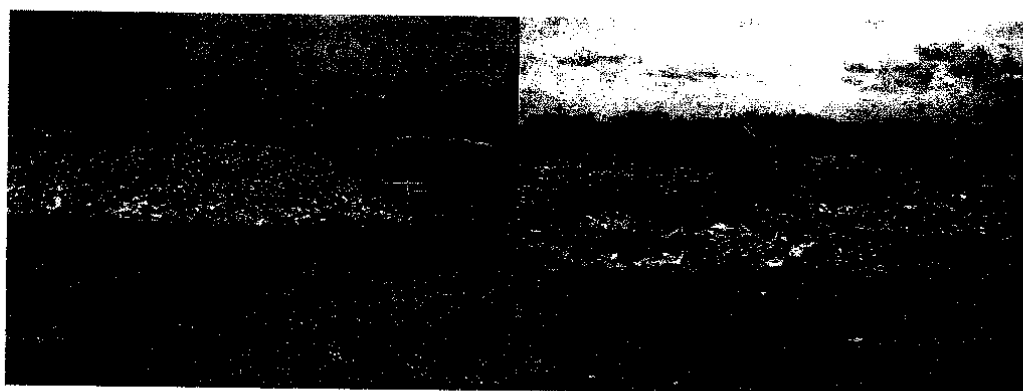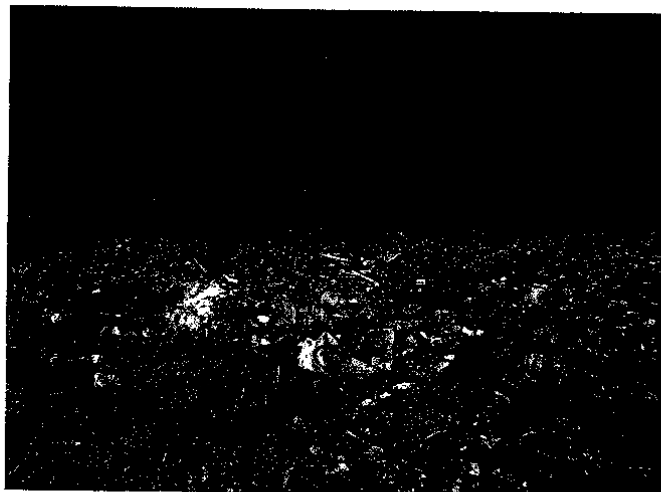

7 pav. Mažieji savartynai-šiukšlynai

2.5. Projekto darbai

Projekte numatyti darbai buvo vykdomi pagal šešias atskiras darbų sutartis. Smulkesnė informacija pateikiama žemiau:

Lentelė Nr. 11. Kompostavimo aikštelės įrengimo statybos darbai

Sutarties Nr.	A/2004/S02
Sutarties pavadinimas	Kompostavimo aikštelės įrengimas Kairiuose
Sutarties pobūdis	FIDIC Statybos sutarties sąlygos "Geltonoji knyga"
Sutarties aprašymas	Įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, įrengtos privažiuojamųjų kelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo asfaltuotos aikštelės, stoginė, nuotekų nuvedimas į savartyno filtrato drenažą, sutvarkyta aplinka, teritorija aptverta, įrengtas apšvietimas.



Projekto Nr. 2004/MT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
Skyriaus vadovė

Aldona Čepelienė

2009-05-08




Darbu rangovas	UAB "Šiaulių kelias"
Darbu pradžios data	2004-07-14
Darbu pabaigos data	2005-07-16

Atliktų darbų aprašymas

- Atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai;
- Ant paklotos geotekstilės užpiltas atvežtas drenuojantis gruntas;
- Įrengti nuotekų surinkimo latakai;
- Įrengta dangos konstrukcija;
- Išasfaltuota aikštelė, kurios matmenys 140 x 70 m.
- Aptarnavimo aikštelėje pastatytas pastatas – stoginė (12x24 m), skirtas aptarnaujančių mechanizmų parkavimui, kitų įrengimų saugojimui;
- Pasirūpinta kompostavimo lauko apšvietimu, prisijungus prie Kairių savartyno abonentinio tinklo;
- Kompostavimo lauko teritorija aptverta 2,15 m aukščio vielos tinklo tvora, įvažiavimo vietoje suprojektuoti vartai;
- Rekonstruotas veikiantis drenažas patenkantis po kompostavimo laukų;
- Prie pastato sienos pietinėje pusėje įrengtas priešgaisrinis stendas: 2 gesintuvai, smėlio dėžė, 2 kastuvai, 200 l talpos indas vandeniui, 2 gesintuvai, nedegus auðklas 1,5 x 1,5 m.




8 pav. Statyb vietės vaizdas, ekskavatoriumi nukasus paviršinį žemės sluoksnį



9 pav. Geotekstilės išklojimas

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



TIKRA

Skyriaus vadovė

Aldona Čepelienė

2009-05-08



10 pav. Smėlio sluoksnio įrengimas ir sutankinimas



11 pav. Skaldos sluoksnio įrengimas ir sutankinimas



12 pav. Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis ir filtrato drenažo linija



13 pav. Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio išklojimas ir drenažo linijos įrengimas




Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skyriaus vadovė

Aldona Čepėlienė

2009-05-08

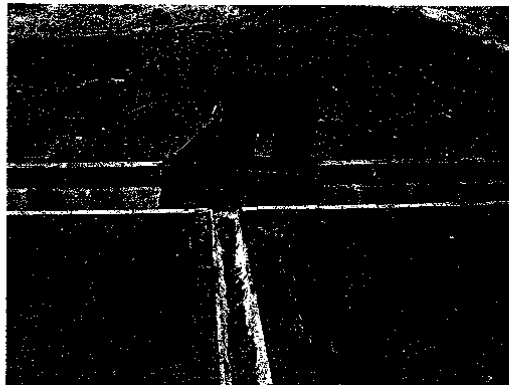

14 pav. Filtrato drenazinės linijos nutekamojo vamzdžio anga su koštuvu



15 pav. Apšvietimo stulpas šiaurinėje aikštelės dalyje



16 pav. Įrengta tvora ir įvažiavimo vartai



Projekto Nr. 2001/IT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


TIKRA
Skyriaus vedėja

2009-05-08

Aldona Čeplojienė



17 pav. Metalų konstrukcijų ir karkaso statyba

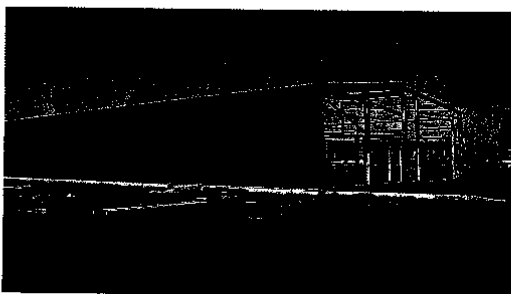


18 pav. Stoginė



19 pav. Atvėrta žolyno ir asfaltbetonio dangos teritorija

Lentelė Nr. 12. Naujo regioninio sąvartyno statybos darbai

Sutarties Nr.	A/2005/S05
Sutarties pavadinimas	Naujo regioninio sąvartyno statybos darbai
Sutarties pobūdis	FIDIC Statybos sutarties sąlygos "Raudonoji knyga"
Sutarties aprašymas	Pastatytas naujasis Šiaulių regiono sąvartynas Aukštakiuose su visa suprojektuota infrastruktūra bei pastatais, įrengta I atliekų deponavimo sekcija (4,1 ha).
Darbų rangovas	AS "Merko Ehitus"
Darbų pradžios data	2005-07-08



Projekto Nr. 2001/ET/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepėlienė

2009-05-08



Darbų pabaigos data

2008-02-26

Atliktų darbų aprašymas


- Iškiristas miškas, išvežtos nereikalingos žemės;
- Atlikti sąvartyno kaupo dugno kasinėjimo darbai;
- Paklotas bentonito ir geomembranos kilimas;
- Atlikti tvoros tvėrimo darbai;
- Paklota geotekstilė;
- Pakloti nuotekų ir drenažiniai vamzdžiai;
- Įrengti šuliniai;
- Įrengtas drenažinis sluoksnis;
- Įrengta sąvartyno atliekų kaupo I sekcija (4,1 ha);
- Pastatytas administracinis pastatas;
- Įrengta filtrato kaupimo sistema su keturiomis siurblinėmis (filtrato, fekalinio vandens, filtrato-fekalinio vandens ir drenažinio vandens);
- Atlikti priešgaisrinio rezervuaro įrengimo darbai;
- Įrengtas paviršinio vandens surenkamasis griovys. Griovio šlaitai buvo sutvirtinti betoninėmis plokštėmis;
- Įrengtas naftos produktų separatorius;
- Įrengta sąvartyno aptarnavimo zona, išasfaltuota teritorija;
- Įrengtas aptarnavimo kelias;
- Įrengtas apšvietimo bokštas su žaibosauga.



20 pav. Medžių kirtimas



21 pav. Geologiniai kasinėjimai sąvartyno teritorijoje



Projekto Nr. 20017-16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA


Skyriaus vadėja

Aldona Čeplėdienė

2009-05-08



22 pav. 1-os kaupo sekcijos įrengimo darbai

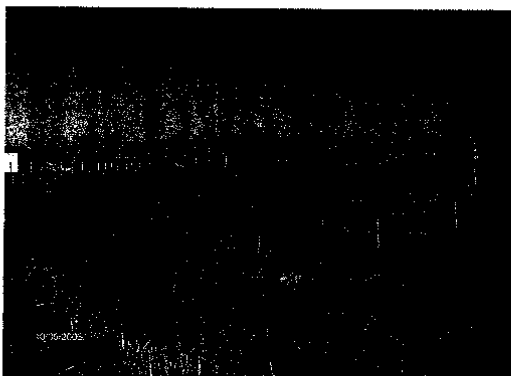

23 pav. Kelio žymėjimo darbai



24 pav. Pylimai bentonito kilimo ir geomembranos sutvirtinimui


Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


TIKRA
 Skyriaus vadovė


Aldona Čepelienė

2009-05-08


42

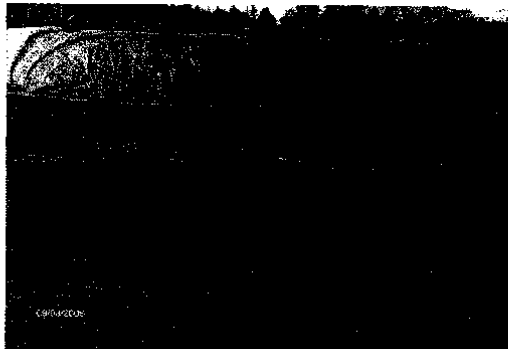

25 pav. Kaupo dugnas padengtas plėvele

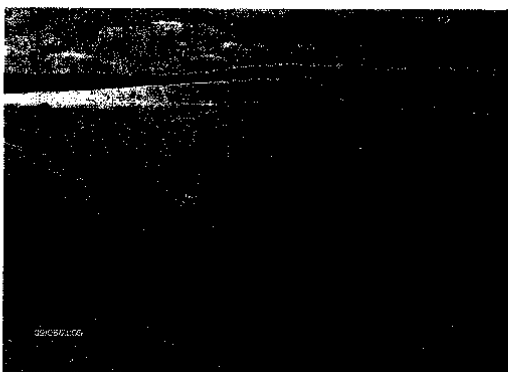

26 pav. Filtrato kaupimo rezervuaro įrengimo darbai

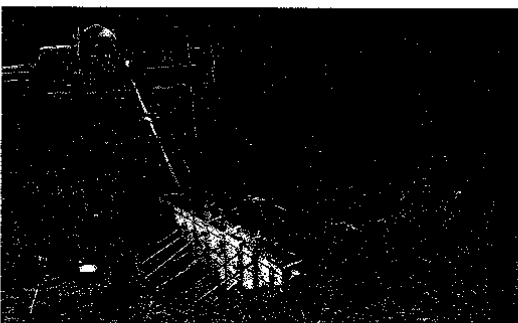

27 pav. Pralaidos vamzdžio įrengimas po privažiavimo keliu



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
 Skyriaus vadovė

Aldona Čepčijonė

2009-05-08



28 pav. Bentonito kilimo, geomembranos ir geotekstilės klojimo bei įrengimo darbai



29 pav. Drenažinės sistemos įrengimas ir drenažo vamzdžių padengimas granitiniu žvyru



30 pav. Paruošiamieji administracinio pastato statybos darbai



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skvyraus vadeja

Aldona Čeplėjienė


2009-05-08



31 pav. Žemės darbai



32 pav. Geomembranos klojimo darbai

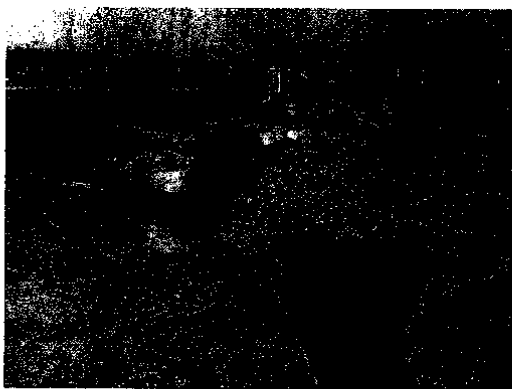

33 pav. Įrengtas naftos produktų separatorius




Projekto Nr. 2001/AT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R A

Skaitymo vedėja

Alicija Čaplelienė

2009-05-08

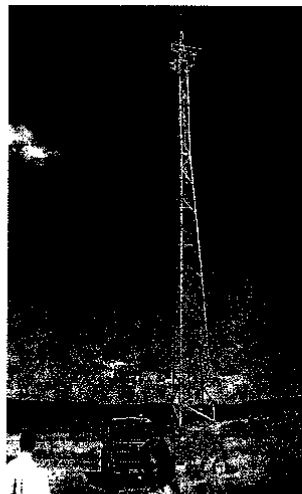

34 pav. Sumontuotas apšvietimo bokštas



35 pav. Administracinio pastato statyba



36 pav. Kasinėjimo vieta 2 kurioje buvo tikrinama geomembrana




Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skryniaus vartija

Aldona Čepčionė

2009-05-08

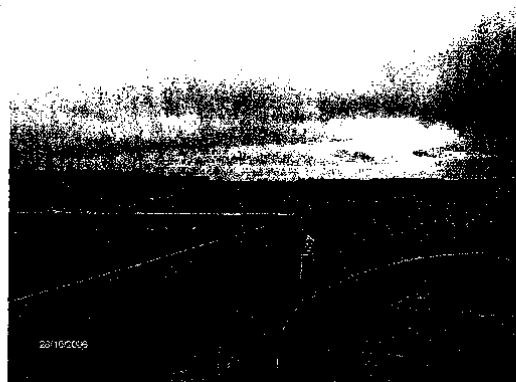

37 pav. Kelių sąvartyno teritorijoje įrengimas



38 pav. Priešgaisrinio rezervuaro įrengimas



39 pav. Dezinfekavimo duobė



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skyriaus vadėja

Aldona Čopljienė

2009-05-08

47



40 pav. Vaizdas į aptarnavimo aikštelę




41 pav. Įrengtas kompaktoriaus privažiavimo kelias



42 pav. Plovimo punktas

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


TIKRA
 Skyriaus vadovė

Aldona Čeplojienė

2009-05-08



43 pav. Vidinis sąvartyno privažiavimo kelias

Lentelė Nr. 13. Atliekų priėmimo punktų statybos darbai

Sutarties Nr.	A/2005/S04
Sutarties pavadinimas	34 atliekų priėmimo punktų statybos darbai
Sutarties pobūdis	FIDIC Statybos sutarties sąlygos "Raudonoji knyga"
Sutarties aprašymas	Įrengti 34 atliekų priėmimo punktai, iš jų 28 seniūnijų ir 6 rajoniniai. Punktuose įrengtos kietos dangos aikštelės su konteneriais, teritorija aptverta tvora ir įrengtas apšvietimas.
Darbų rangovas	VI "Šiaulių regiono keliai"
Darbų pradžios data	2005-07-08
Darbų pabaigos data	2007-01-15
Atliktų darbų aprašymas	– Nukastas augalinis sluoksnis; – Įrengtas geotekstilės apsauginis sluoksnis; – Paklota geotekstilė; – Įrengtas šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis; – Iš dolomitinės skaldos įrengtas pagrindas – Įrengtas apšvietimo stulpas



44 pav. Žemės darbai Baisogalos APP

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


TIKRA
 Skyriaus vadovė

Aldona Čeplojienė


2009-05-01



45 pav. Paklotas geotekstilės kilimas ir išrikiuoti balastai (pritvirtinimai) geotekstilės apsaugai nuo galimos neigiamos vėjo įtakos



46 pav. Pagrindo iš dolomitinės skaldos įrengimas Baisogalos APP

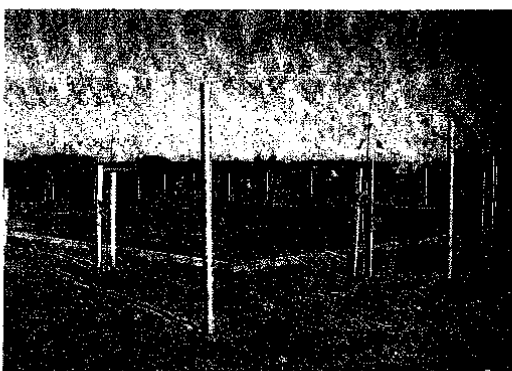

47 pav. Paruoštas asfaltbetonio sluoksnis ir įrengti tvoros stulpai teritorijai aptverti

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



TIKRA


Styriaus vėliava

2009-05-08

Aldona Čepičienė



48 pav. Įrengtas vamzdis po privažiavimo keliu Raudėnų APP

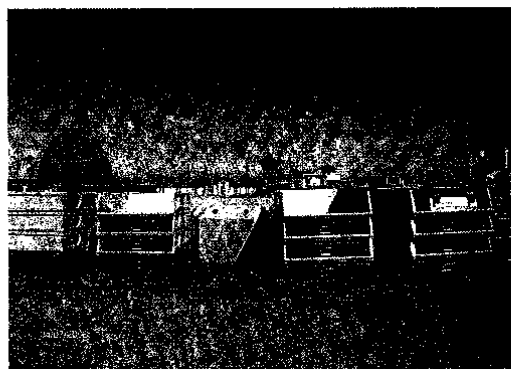

49 pav. Dalis pagamintų konteineriai



50 pav. APP su išstatytais konteineriais

Lentelė Nr. 14. Kairių sąvartyno uždarymo statybos darbai

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



TIKRA

Skystaus metalo


2009-05-08

Aldona Čepėlionė



Sutarties Nr.	A/2006/Š13
Sutarties pavadinimas	Kairių sąvartyno uždarymo I-etapas
Sutarties pobūdis	FIDIC Statybos sutarties sąlygos "Raudonoji knyga"
Sutarties aprašymas	Igyvendinti Kairių sąvartyno uždarymo I etape numatyti darbai: pilnai sutvarkyta žemutinė papėdė su aptarnavimo keliu ir vakarinė bei pietinė pusės iki viršutinės bermos. Dalinai pridengta dalis rytinio šlaito ir dalis kaupo viršūnės. Pilnai įrengta filtrato surinkimo sistema ir dalis švaraus vandens kritulių surinkimo sistemos.
Darbų rangovas	UAB "Šiaulių plentas"
Darbų pradžios data	2006-05-04
Darbų pabaigos data	2008-06-15
Atliktų darbų aprašymas	- Sąvartyno kaupo teritorijoje (8,19 ha) atlikti darbai: paklota filtrato drenažinė linija – 956 m., filtrato savitakinė linija – 620 m., paklota filtrato slėginė linija – 370 m., pastatytos ir įrengtos siurblynės Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3. Įmontuota siurblynė Nr.4. Suformuoti pietinis ir rytinis šlaitai, vakarinis šlaitas iki kelio apatinės dalies. Pradėti kelio sankasos supylimo ir atliekų kaupo perforavimo darbai. Paruošti darbo projekto brėžiniai: kaupo užpylimo vertikalinis planas, kaupo formavimo ir uždengimo pjūvis, užvažiuojamo kelio planas, sąvartyno apvažiuojamo kelio planas, paviršinio vandens sistemos nuvedimo planas, papėdės pjūvis; - Rytinio šlaito papėdėje įrengta spaudiminė linija ir antžeminė siurblynės ryšių kamera; - Sąvartyno šiaurinio šlaito dalyje buvo įrengta siurblynė, o šiaurinio šlaito papėdėje spaudiminė linija; - Paklotas elektros kabelis, einantis nuo sąvartyno svarstyklių iki pirmosios siurblynės; - Atliktas atliekų kaupo mechanizuotas kasimas dėl per didelio šlaitų statuto. Atliekų kaupo perteklius buvo pervežtas į viršutinę sąvartyno dalį. Duobių užpylimas ir atliekų perstumimas atliktas buldožeriais sutankinant vibrovolais; - Vakarinio šlaito papėdėje buvo formuojami pylimai, užvežamas karjerinis molis ir vykdomi žemės ir kaupo tvarkymo darbai; - Vakarinio šlaito papėdėje gruntas buvo sluoksniuojamas horizontaliai, 50 cm storio sluoksniais. - Paklotos nuotekų šalinimo linijos 500 mm iš ultra PVC vamzdžių; - Sumontuoti šuliniai iš ultra PF 400 mm vamzdžių; - Papildomai sumontuotas persipilimo šulinys; - Filtrato siurblynėse atliktas siurblių montavimas ir įvykdyti derinimo bei paleidimo darbai. - sumontuotas siurblys, papildomai įstatyti lygio reguliatoriai, skydinė, bei atlikti kiti statybos, montavimo, derinimo ir paleidimo darbai. - Atlikti savitakinės linijos paklojimo darbai

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


T I K E A
Skyriaus viršininkas

2009-05-08

Aldona Čepelienė



- Supiltas drenažinis sluoksnis iš žvyro. Ant drenažinio sluoksnio paklota geotekstilė, kad filtratas patektų į drenažinę liniją, o iš jos į siurblines;
- Atlikti šlaitų formavimo darbai, kuriems buvo atvežta papildomai molio.
- Atliktas atliekų kaupimo mechanizuotas kasimas dėl per didelio sąvartyno kūno statumo. Atliekos buvo perstumiamos iki 50 metrų. 14000 m³ atliekų buvo perkasta ir sutankinta;
- Atliktas vakariniame šlaite esančio kelio formavimas. Kad būtų galima rengti kelio pasluoksnius buvo nukasta 1050 m³ grunto. 2060 m³ lovio dugno buvo planuojama buldozeriu. Išplaniruotas lovio dugnas buvo taip pat tankinamas vibrovolu. Paskiau įrengtas smėlio pasluoksnis (35 cm storio) iš šalčiui atsparaus gamtinio smėlio, kuris vėliau buvo sutankintas vibrovolu. Taip pat buvo įrengtas 25 cm storio pasluoksnis iš žvyro ir skaldos mišinio;
- Buvęs melioracijos griovys užpiltas moliu;
- Sumontuoti gelžbetoniniai šulinio žiedai ketvirtai siurblinei ir pastatytas gelžbetoninis namelis elektros skydinei;
- Sumontuota aikštelė ir kopėčios ketvirtai siurblinei, išbetonuotas siurblynės dugnas 2,2 m³. Duobės buvo užpildytos mechanizuotai ir rankiniu būdu;
- Atliktas šlaitų apipiltų 5 cm juodžemio apsejimas žole.




51 pav. Statybos darbai vakariniame sąvartyno šlaite



52 pav. Dambos įrengimas rytiniame šlaite

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R A
Skyriaus vadovė


2009-05-08

Aldona Čepėjienė

53



53 pav. Filtrato linijos šiaurinėje dalyje

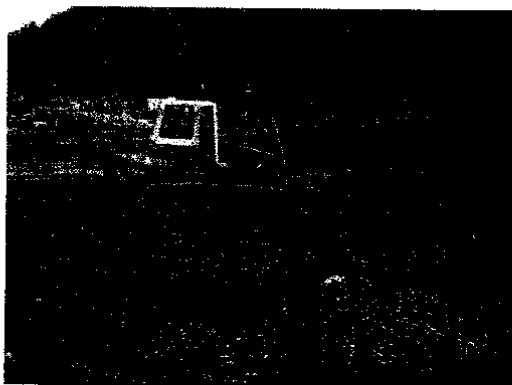

54 pav. Supilto karjerinio molio vertikalinis planiravimas



55 pav. Vakarinio šlaito užpylimas karjeriniu moliu ir molio perstūmimas



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


T I K R A

Skyriaus vadovė

Aldona Čeplėdienė

2009-05-08


54

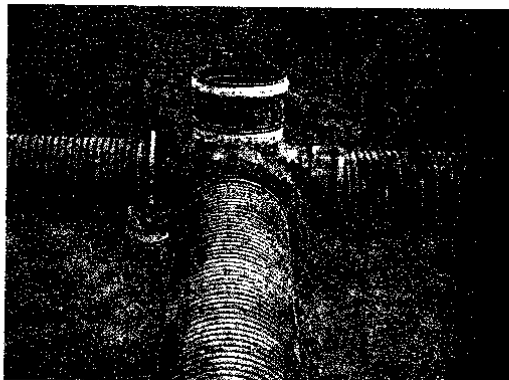


56 pav. Montuojamas šulinys SH-06, įjungiamosios linijos iš 500 ir 400 ultra PVC vamzdžių



57 pav. Vamzdžių ir šulinių apipilimas smėliu, smėlio sutankinimas

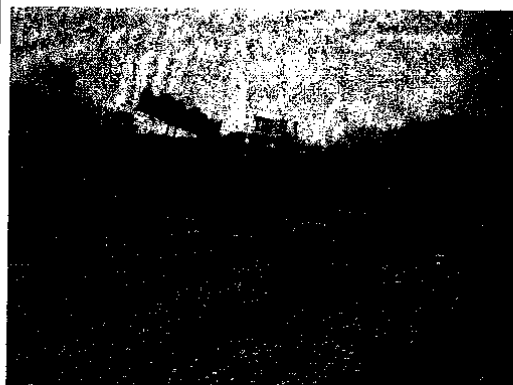

58 pav. Vamzdžių apipylimas molingu gruntu




Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


TIKRA
Sąjūdos valdžia

Aldona Čepėlienė

2009-05-08

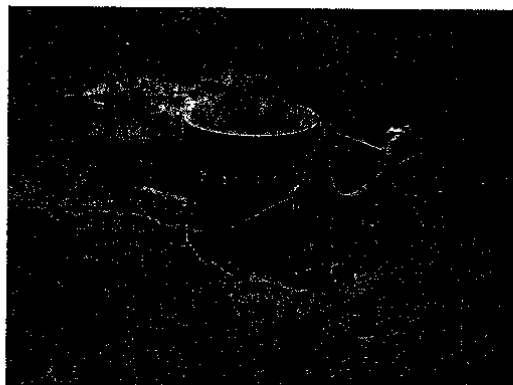

59 pav. Montuojamas siurblinės šulinys

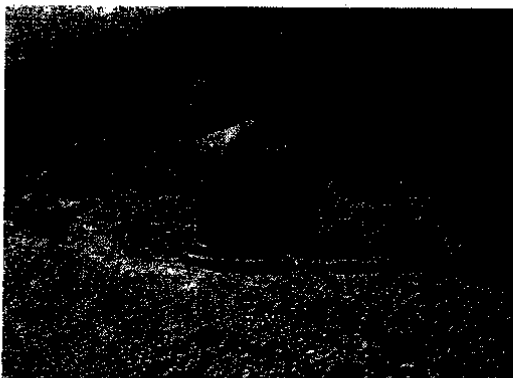

60 pav. Sumontuota siurblinės Nr. 3 skydinė



61 pav. Atliekų kasimas ir perstūmimas, dėl per didelio statumo



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
 Skyriaus vadovė


Aidona Čepelienė

2009-05-08

56




62 pav. Atliekų kasimas

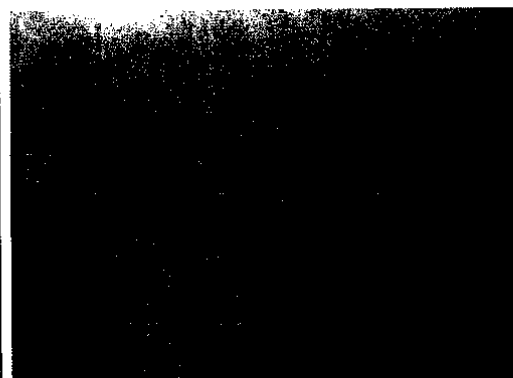

63 pav. Vaizdas į rytinį slaitą



64 pav. Vaizdas į vakarinį slaitą



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIEA
Skaitymo vieta

Alicona Čepelčienė

2009-05-08


57



65 pav. Atliekų perkasimas sąvartyno viršūnėje



66 pav. Buvusio melioracijos griovio užpylimas moliu

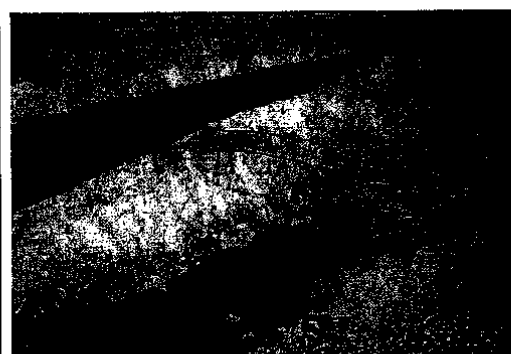

67 pav. Filtrato traukimas iš melioracijos griovio



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R I N A
Slynaus parašas

2009-05-08


Aldona Čepelionė



68 pav. Tranzitinio kelio formavimas vakarinio šlaito papėdėje



69 pav. Paviršinio vandens surenkamųjų griovių formavimas

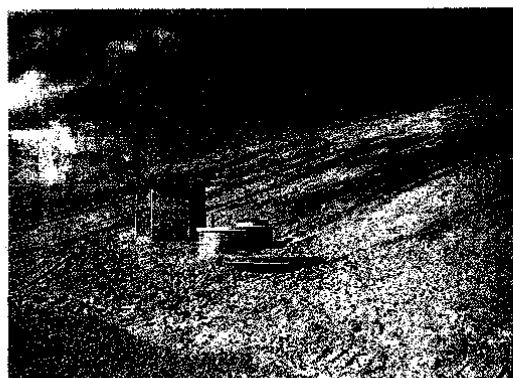

70 pav. Filtrato prasiveržimo vietos rytiniame šlaite



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA

Skynaus vardu

Aldona Čepėlienė

2009-05-08

59




71 pav. Užvažiavimo kelio statyba



72 pav. Molingo grunto paviršiaus purenimas



73 pav. Geotekstilės įrengimas paviršinio vandens surinkimo grioviuose šiauriniame šlaite



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIKRA
 Skyriaus vadovė

Aldona Čepčiūnė

2009-05-08

60



74 pav. Įrengtas užvažiuojamo kelias, atliekų patalpinimui



75 pav. Įrengtas užvažiuojamo kelias rytinio šlaito papėdėje

Lentelė Nr. 15. Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų uždarymo ir konteinerinių aikštelių įrengimo statybos darbai

Sutarties Nr.	A/2005/Š10
Sutarties pavadinimas	Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų uždarymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas
Sutarties pobūdis	FIDIC Statybos sutarties sąlygos "Geltonoji knyga"
Sutarties aprašymas	Įrengtos 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės ir uždaryti 116 mažieji sąvartynai/šiukšlynai, iš jų 113 sutvarkyta naudojant uždengimo būdą ir 3 naudojant išvežimo būdą.
Darbų rangovas	UAB "Šiaulių titanas"
Darbų pradžios data	2005-12-15
Darbų pabaigos data	2008-05-30
Atliktų darbų aprašymas	– 116 Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų uždarymo darbai atlikti pagal techninį projektą. Kai kurie sąvartynai-šiukšlynai išvežti į paskirtą vietą ir padengti vandeniu nepralaidžiu, mineraliniu sluoksniu;



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T 1112 A


Savivaldybės vadovas

A. Čepkėlienė

2009-05-08



— 247 Konteinerinės aikštelės įrengtos pagal suderintus techninius projektus. Atliekų surinkimui skirtos A ir B tipo konteinerinės aikštelės bei individualūs konteineriai.

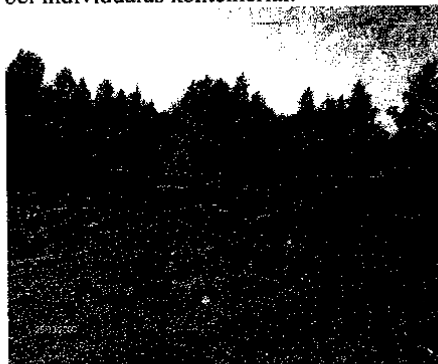

76 pav. Dučių mažasis sąvartynas (išvežtas)




77 pav. Mažasis sąvartynas Medikonyse



78 pav. Bendro naudojimo konteinerinės aikštelės pradžios darbai

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



TIKSA
Skynaus vėliava

2009-05-08

Aldona Čepelienė




79 pav. A tipo Stačiūnų konteinerinė aikštelė be konteinerių



80 pav. A tipo bendro naudojimo konteinerinė aikštelė su konteneriais Šiauliuose



81 pav. B tipo bendro naudojimo konteinerinė aikštelė su konteneriais Šiauliuose



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R A
Skypeus y kija

Aldona Čepčiūnė

2009-05-08



Lentelė Nr. 16. Privažiavimo kelio į regioninę sąvartyną statybos darbai


Sutarties Nr.	A/2006/Š15
Sutarties pavadinimas	Privažiavimo kelio į sąvartyną statyba
Sutarties pobūdis	FIDIC Statybos sutarties sąlygos "Geltonoji knyga"
Sutarties aprašymas	Rekonstruota privažiavimo kelio atkarpa. Kelias išplatintas iki 8 m., pašalinti pavojingi staigūs posūkiai, važiuojamoji kelio dalis padengta asfalto danga.
Darbu rangovas	UAB "Kamesta"
Darbu pradžios data	2006-09-11, perkelta į 2006-12-04
Darbu pabaigos data	2007-05-31
Atliktų darbų aprašymas	– Rekonstruota 2064 m ilgio privažiavimo kelio atkarpa – Įrengta ir išlyginta sankasa; – Iškirsti krūmai; – Atvežtas žvyro-smėlio bei žvyro-skaldos mišinys dangos įrengimui; – Atkasti šuliniai žiedų bei perdangų pakeitimui; – Atlikti pralaidos ilginimo darbai; – Įrengtas šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio bei 20 cm storio skaldos; – Įrengtas išlyginamojo pagrindo sluoksnis, sumontuoti apvalūs surenkami gelžbetoninio vandentiekio šuliniai sausuose gruntuose, apvalūs surenkami gelžbetoninio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose; – Atlikta kabelio apsauga; – Pakloti polietileniniai vamzdžiai paruoštoje tranšėjoje; – Paklota geotekstilė; – Demontuoti g/b pralaidos antgaliai; – Prailginta pralaida ir įrengti sparnai; – Įrengtas asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinis sluoksnis; – Sutvirtinti šlaitai pasėjant daugiametes žoles, paskleidžiant augalinį gruntą rankiniu būdu; – Užpiltas žvyro mišinys kelkraščių paaukštinimui; – Įrengtos 9 nuvažos.

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R A
Skynaus viršėja

2009-05-08

Aldona Čepelienė

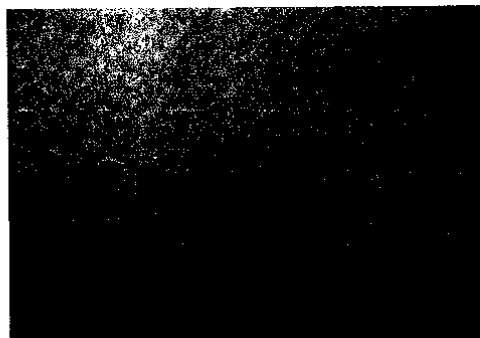


82 pav. Privažiavimo kelias ir šalia jo įrengtas informacinis stendas



83 pav. Privažiavimo kelio sutankinimas



84 pav. Atkasti pakelės šuliniai




Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R A
Styriausioje

Aldona Čepelienė

2009-05-08

65

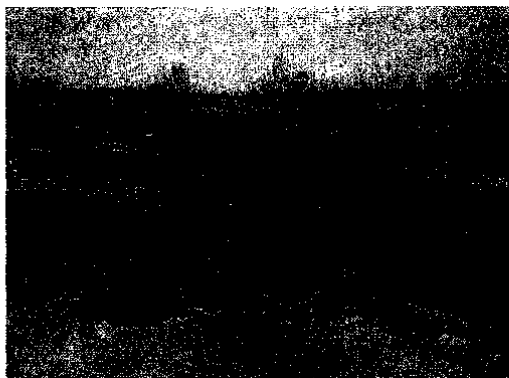

85 pav. Sulinių žiedų keitimo darbai



86 pav. Pilamas smėlio – žvyro mišinys



87 pav. Išstumdomas ir išlyginamas smėlio-žvyro mišinys

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


TIKRA
 Skyriaus vadovė


2009-05-08

Aldona Čepičienė

66



88 pav. Elektros kabelio paklojimas

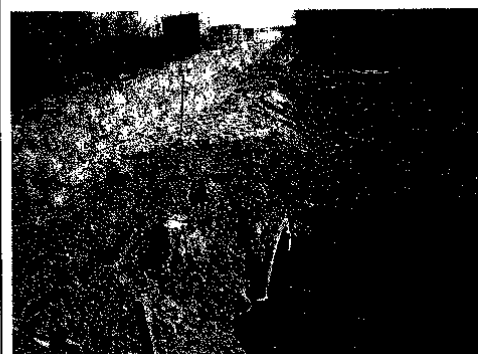

89 pav. Keičiami pralaidos galų g/b žiedai





90 pav. Asfalto sluoksnio klojimas

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


TIKRA
 Skyriaus vadovė

Aldona Čepčienė

2009-05-08

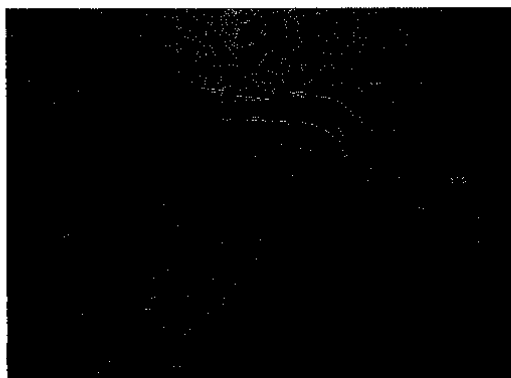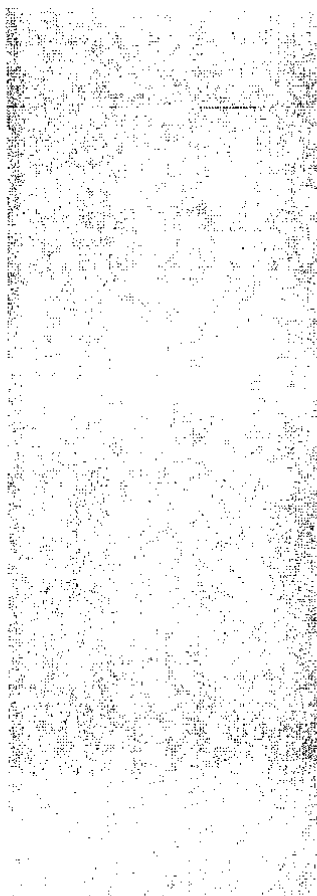

91 pav. Kelio sankasos šlaitų sutankinimas ir apželdinimas



92 pav. Įrengtos nuvažos ir kelio pakraščiuose pastatyti kelio žymėjimo stulpeliai

2.6. Projekto atitiktis Finansavimo memorandumui

2001 m. gruodžio 21 d. pasirašytame projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Finansiniame memorandume numatytos specialiosios sąlygos projekto įgyvendinimui. Europos Bendrijų parama minėtam projektui yra teiktina esant šioms sąlygoms:

1. Prielaidų ir įrenginių statuso sąlyga.

Ši sąlyga reiškia, kad Komisija turi teisę peržiūrėti ISPA nustatytą paramos dydį, jei per 5 m. nuo darbų pabaigos eksploatacijos sąlygos (tarifai, pajamos ir t.t...) gerokai skirsis nuo pradinių prielaidų, naudotų nustatant paramos sumą ir (arba) atsiradus dideliems nukrypimams, kai:

- 1.1. atsiranda poveikis eksploatacijai ar įgyvendinimo sąlygoms arba privačiam ar valstybiniam subjektui suteikiamas neteisėtas pranašumas;



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

TIESIOJA
Skyriaus viršininkas
Aldona Čepičienė

2009-05-08



1.2. susidaro sąlygos arba nuosavybės teisių dėl bet kurios finansuotos infrastruktūros dalies pasikeitimas, arba nutraukus eksploataciją ar esant kitiems pasikeitimams.

Projekto įgyvendinimo metu atlikus detalius tyrimus ir parengus preliminarą projektinę dokumentaciją paaiškėjo, kad būtinas finansinio memorandumo pakeitimas. Todėl 2005 m. birželio 20 d. ŠRATC kreipėsi į įgyvendinančiąją instituciją dėl Finansavimo memorandumo pakeitimo. Finansinio memorandumo pakeitimas patvirtintas 2006 m. spalio 30 d.

Tam, kad nebūtų pažeista su projektu susijusi specialioji sąlyga, 5 m. nuo darbų pabaigos bus išsaugota proporcija tarp kaštų ir naudos, o nusatyti tarifai bus tokio dydžio, kad gautos pajamos padengtų sistemos išlaidas (esant objektyvioms priežastims (augant žaliavų, medžiagų sąnaudoms), tarifas proporcingai didės, didėjant veiklos sąnaudoms). Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad nebus ryškių pakitimų, kurie skirsis nuo pradinių prielaidų, kuriomis remiantis buvo nustatyta pagalbos suma.

2. Gyvybingumo sąlyga

Ši sąlyga priklauso nuo to ar atitinkamos institucijos skirs pakankamai lėšų veiksmingam įrenginių eksploatavimui ir priežiūrai užtikrinti.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas perduotas ŠRATC nuosavybėn, kuris yra atsakingas už eksploataciją bei priežiūrą.

3. Įmonės įsteigimo sąlyga

Finansavimo memorandumo specialiosiose sąlygose nurodyta, kad turi būti įkurta regioninė atliekų tvarkymo įmonė – VšĮ ŠRATC, kuri bus atsakinga už regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, jos funkcionavimo organizavimą, plėtojimą ir administravimą Šiaulių apskrities teritorijoje.


Sąlyga įgyvendinta ir apie tai Europos Komisija buvo informuota LR Finansų ministerijos 2005 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. ((18.27-8)-5K-0519629)-6K-0508388.

4. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos sąlyga

Reikalauja planuojamai ūkinei veiklai, t. y. kompostavimo aikštei Kairiuose, atlikti poveikio aplinkai vertinimo atranką pagal Tarybos direktyvos 85/337/EEC bei ją pataisančios 97/11/EC direktyvos nuostatas.

Poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos Respublikoje atliekamos vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu. Atsižvelgiant į tai, 2001 m. buvo atlikta atranka Šiaulių apskrities atliekų tvarkymo sistemos Galimybės studijos apimtyje. Pateikta išvada, kad Kairių sąvartyno uždarymui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Į darbų apimtį įeina ir kompostavimo aikštelės įrengimas Kairiuose.

Apie sąlygos įgyvendinimą Europos Komisija informuota LR Finansų ministerijos 2005 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. ((18.27-8)-5K-0519629)-6K-0508388.



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R E T A
Skynaus valdija
Aldona Čepelienė

2009-05-08



Projekto metu Šiaulių regione sukurta ekologiniu ir ekonominiu požiūriu subalansuota atliekų tvarkymo sistema, atitinkanti nacionalinius ir ES teisės aktų reikalavimus ir įgyvendinti FM apibrėžti tikslai:

- Aukštakiuose (Šiaulių raj.) pastatytas naujas regioninis sąvartynas.
- Rekonstruotas privažiavimo kelias į Aukštakių sąvartyną.
- Šiaulių apskrityje įrengti 34 atliekų priėmimo punktai.
- Šiaulių apskrityje įrengtos 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės.
- Kairiuose (Šiaulių raj.) įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.
- Uždarytas Šiaulių miesto senasis sąvartynas Kairiuose.
- Šiaulių apskrityje uždaryti ir sutvarkyti 116 mažųjų sąvartynų (šiukšlynų).
- Įsigyta atliekų tvarkymo įranga.

Lentelė Nr. 17. Pagal Finansavimo memorandumą pasiekti fiziniai elementai

Fiziniai elementai	Fiziniai rodikliai		Bendras fizinis įgyvendinimas	Fizinio įgyvendinimo eiga (%)
	vienetas	kiekis		
Naujojo regioninio sąvartyno Aukštakiuose statyba				
aptarnavimo aikštelė, infrastruktūros statiniai bei ūkiniai pastatai	vnt.	1	1,0	100,0
žemės darbai	m ²	70.000	70.000	100,0
Dugno sluoksnio įrengimas	m ²	41.000	41.000	100,0
filtrato surinkimo ir tvarkymo sistema	tinklas	1	1,0	100,0
Privažiavimo kelio statyba	m	2.050	2.064	100,7
Kairių sąvartyno uždarymas				
filtrato surinkimo ir tvarkymo sistema	tinklas	1	1,0	100,0
Atliekų priėmimo punktų statyba	%	100	100,0	100,0
rajoniniai atliekų priėmimo punktai	vnt.	6	6,0	100,0
Seniūnijų atliekų priėmimo punktai	vnt.	28	28,0	100,0
Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas				
šiukšlynų sutvarkymas	vienetas	116	116,0	100,0
šiukšlynų plotas	ha	134,5	134,5	100,0
A tipo konteinerinės aikštelės	vienetas	165	165,0	100,0
B tipo konteinerinės aikštelės	vienetas	82	82,0	100,0
Kompostavimo aikštelės įrengimas	vienetas	1	1	100,0
Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas				
tankintuvas	vienetas	1	1	100,0
sunkvežimis	vienetas	1	1	100,0
ekskavatorius	vienetas	1	1	100,0
daugiafunkcinis traktorius	vienetas	1	1	100,0

Projekto Nr. 2001/MT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I K R A
Skyriaus ved. pavad.
Aldona Čepėlienė

2009-05-08

70



<i>mobilius komposto smulkintuvą</i>	vienetas	1	1	100,0
<i>komposto vartytuvas</i>	vienetas	1	1	100,0
<i>30 m³ talpos konteineriai</i>	vienetas	6	6	100,0

Igyvendinti visi finansinio memorandumo I priedo 7.2 skyriuje numatyti tikslai bei sąlygos:

Bendrasis tikslas

Projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas – sukurti aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu darnią atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus.

- įrengtas naujas visus reikalavimus atitinkantis sąvartynas, kuriame surenkamas ir apdorojamas sąvartyno filtratas;
- iki 2009 m. uždaryti reikalavimų neatitinkantys 116 mažųjų sąvartynų-šiukšlynų;
- atliekų surinkimo paslauga apima 95 proc. regiono gyventojų; įrengtos 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės (žr. Lentelė Nr. 44);
- įrengti 34 atliekų priėmimo punktai (6 rajoniniai ir 28 seniūnijų), kuriose atskiriamos perdirbti tinkamos atliekos nuo atliekų, tinkamų šalinti sąvartyne. Šešiuose rajoniniuose atliekų priėmimo punktuose gali būti šalinamos pavojingos atliekos;
- vientisam atliekų tvarkymo plėtros valdymui 2002-06-25 įsteigtas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“;
- įgyvendintas principas „Teršėjas moka“, pagal kurį kiekvienas atliekų turėtojas prisideda prie atliekų šalinimo ir tvarkymo sąnaudų padengimo, taip pat užtikrinama, kad ŠRATC gautų pakankamai pajamų veiklos, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudoms padengti ir skoloms apmokėti.

2.7. Projekto patikros

Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktos trys projekto įgyvendinimo patikros, kurios detalizuojamos lentelėje.

Lentelė Nr. 18. Projekto patikros

Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos išvados
2004 m. gruodžio 2 d.	LR AM APVA	Patikros metu pateikta bendra išvada-rekomendacijos dėl efektyvesnio darbo su Šiaulių apskrities savivaldybėmis tvarkant žemės nuosavybės teise patvirtinančius dokumentus pagal LR Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento reikalavimus.
2005-05-17 – 2005-06-17	LR AM Vidaus audito tarnyba	Patikrinta ir įvertinta projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos“ ES ISPA/Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo valdymo ir kontrolės sistema, atitikimas FM ir Europos

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I K R I N A
Siklaus valdija
Aldona Čeplojienė

2009-05-08



		programos įgyvendinimo sutartį. Vidaus audito apimtis: FM, sutartys, APVA Procedūrų vadovas, SRATC Procedūrų vadovas, mokėjimo ir darbo planai, įstatai, pareigybių aprašymai. Vidaus audito tarnyba pateikė rekomendacijas tolimesniam projekto įgyvendinimui ir rekomendavo pasirašyti "ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tarp LR AM APVA ir VšĮ SRATC.
2007 m. lapkričio 19 d.	LR AM Vidaus audito tarnyba	Patikrinimo tikslas – nustatyti ar projekto išlaidos patirtos nepažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių ES SF paramos teikimą bei administravimą ir yra tinkamos bei įvertinti projekto vidaus kontrolės sistemą. Atrankinio patikrinimo atlikimo metu buvo tikrinamos pirmosios ir antrosios tarpinių ataskaitų mokėjimo paraiškų išlaidos, kurios išmokėtos pagal nurodytas ataskaitoje sutartis ir sąskaitas. Patikrinimo metu buvo nustatyti projekto valdymo ir įgyvendinimo neatitikimų, klaidų, pateiktos rekomendacijos, į kurias atsižvelgus projektas įgyvendintas ir numatyti rezultatai pasiekti laiku. Patikros metu – 179.534,45 Lt (51.996,77 EUR): 112.323,25 Lt (32.531,06 EUR) už „Kompiuterinė įranga“ ir 67.211,20 Lt (19.465,71 EUR) už „Patalpos inžinieriui“) pripažintos netinkamomis išlaidomis – pažeidimas Nr. 1.

LR Finansų ministerija 2008-05-10 rašte Nr. (4.79-06)-6K-0805319 dėl informavimo apie pažeidimus, vadovaudamasi Nacionalinio fondo departamento 2007-10-11 atlikta patikra Aplinkos projektų valdymo agentūroje, netinkamomis išlaidomis pripažino 57.028,99 Lt (16.516,73 EUR) sumą:

- 13.053,73 Lt (3.780,62 EUR) už „Kompiuterinis-telefoninis tinklas“ – pažeidimas Nr. 2.
- 33.167,26 Lt (9.605,90 EUR) už „Baldai tarnybiniam pastatui“ – pažeidimas Nr. 2,
- 10.808 Lt (3.130,21 EUR) už „Pirtelės įrengimas“ – pažeidimas Nr. 3.



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K R A
Skaitymas

2009-05-08

Alėona Čepkajienė




3. Finansinė projekto analizė

3.1. Projekto finansavimo šaltiniai


Lentelė Nr. 19. Projekto finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltiniai	Projekto biudžetas		Bendra sutarties vertė		Išmokėta pagal sutartį		Bendras sutarties įvykdymas		Bendras projekto įvykdymas	
	EUR (be PVM)	%	EUR (be PVM)	%	EUR (be PVM)	%	EUR (be PVM)	%	EUR (be PVM)	%
ISPA/Sanglaudos fondo programa (ES lėšos)	5.265.120,00	56,0	5.291.950,03	56,0	5.226.752,43	56,00	-65.197,60	98,77	-38.367,57	99,27
Valstybės biudžeto lėšos	2.056.880,00	21,88	2.060.995,46	21,81	2.030.836,39	21,76	-30.159,07	98,54	-26.043,61	98,73
Paskolos lėšos	2.080.000,00	22,12	2.096.964,53	22,19	2.075.897,68	22,24	-21.066,85	99,00	-4.102,32	99,80
Iš viso	9.402.000,00	100,0	9.449.910,02	100,0	9.333.486,50	100,0	-116.423,52	98,77	-68.513,50	99,27
Valstybės biudžeto lėšos (papildomai skirtos lėšos)	844.765,41		789.568,53		717.468,94		-72.099,59		-127.296,47	
Iš viso	10.246.765,41		10.239.478,55		10.067.472,17		-172.006,38		-179.293,24	

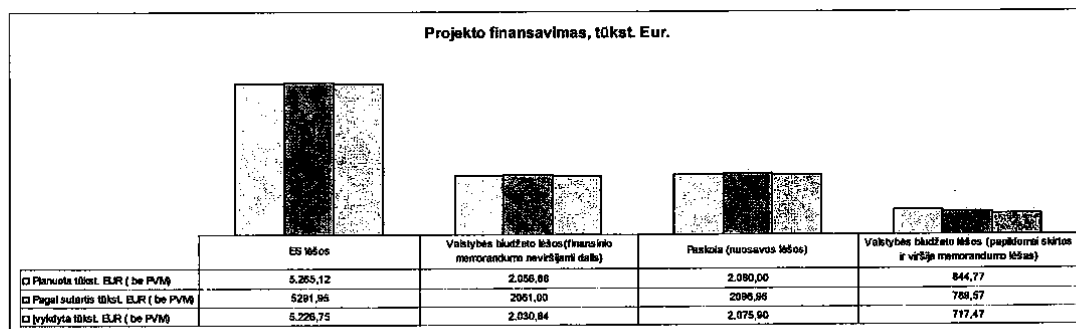

93 pav. Finansavimo šaltiniai

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita




T. J. K. B. A.
Skaitymo vieta
Aldona Čepelienė


2009-05-08




3.2. Išlaidų analizė pagal atskirus projekto komponentus

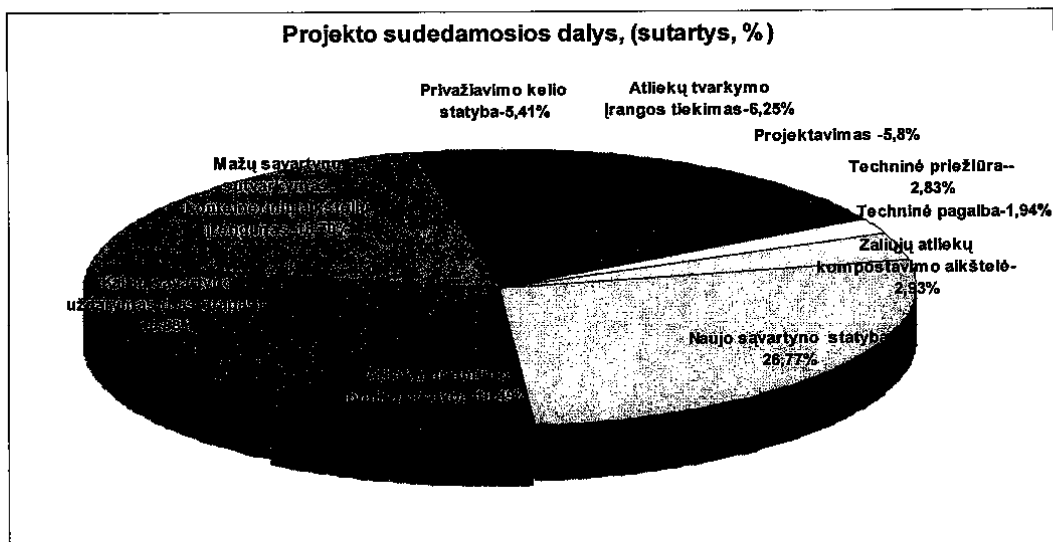

94 pav. Projekto sudedamosios dalys pagal sutartis

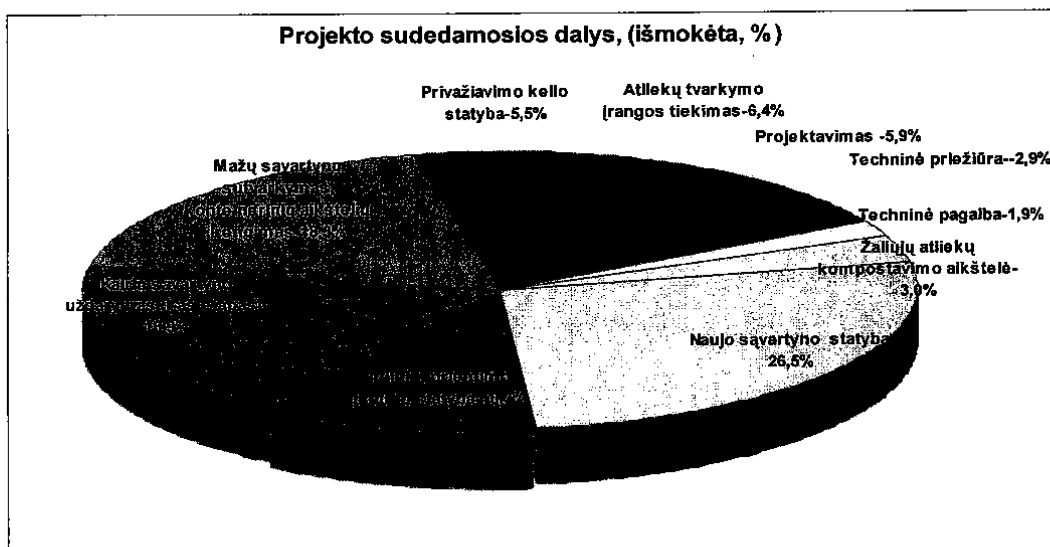

95 pav. Įvykdytos projekto sudedamosios dalys



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


TIKSLA
Skaitymas

2009-05-08

Aldona Čopljienė

Lentelė Nr. 20. Išlaidų analizė pagal projekto komponentus

Nr.	Projekto vykdytojo (rangovo, tiekėjo paslaugų teikėjo pavadinimas (sutarčių Nr.)	Sutarties pavadinimas	Bendra projekto vertė pagal darbų sutarčių EUR (be PVM)	ISPA/Sangla udos programos lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	Paskolos lėšos	FM viršijanti dalis (valstybės biudžeto lėšos)	Šmokėta pagal sutartį bendra lėšų suma, Eur. (be PVM)	ISPA/Sangla udos programos lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	Paskolos lėšos	FM viršijanti dalis (valstybės biudžeto lėšos)	Dalis, % nuo išmokėtų os bendros lėšų sumos
1	WSP International Sweden AB (EuropeAid/114277/ D/SV/LT)	Techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimas	594,000,00	332,640,00	261,360,00			594,000,00	332,640,00	261,360,00			100,00
2	M&S Umweltprojekt GmbH (EuropeAid/116507 /D/SV/LT)	Techninė priemonė	289,950,00	162,372,00	127,578,00			289,950,00	162,372,00	127,578,00			100,00
3	VšĮ "Projektų vadybos grupė" (ISPA/12/SV/LT)	Techninė pagalba	198,610,00	111,222,00	87,388,00			189,256,21	105,983,48	83,272,73			95,29
4	UAB "Šiaulių kelias" (A/2004/S02)	Žaliųjų atliekų kompostavimo aktyvūs įrenginiai Šiauliuose	299,790,00	167,882,40	131,907,60			299,790,00	167,882,40	131,907,60			100,00
5	JVS AS "Merko Ehtus" (A/2005/S05)	Naujojo regioninio sąvartyno Aukštųjų statyba	2,740,848,00	1,534,874,88	525,217,06	680,756,06		2,663,476,34	1,491,546,73	499,173,45	672,756,16		97,18
6	VI "Šiaulių regiono kelias" (A/2005/S04)	Atliekų priėmimo punktų statyba	1,074,193,99	601,548,63	235,001,42	237,643,94		1,074,193,53	601,548,37	235,001,23	237,643,93		100,00



2009-05-08

Skyriaus viršininkas
Alina Čepėlienė

75



7	UAB "Šiaulių plentas" (A/2006/Š13)	Karių savarūno uždarymas (I-as etapas)	1 933 438,37	1 082 725,49	58 566,98	792 145,90		1 903 740,76	1 066 094,82	58 566,98	779 078,96	98,46
8	UAB "NCC titanis" (A/2005/Š10)	Mažųjų savarūnų / Šukščių sutvarkymas ir kontenerinių atliekų įrengimas	1 914 765,41	614 516,07	273 964,71	236 716,10	789 568,53	1 842 665,82	614 516,07	273 964,71	236 716,10	96,23
9	UAB "Kametas" (A/2006/Š15)	Privėžavimo kėlio 1 naujūgi / Aukštųjų savarūnų saulyba	554 204,86	310 354,72	121 243,40	122 606,74		554 204,86	310 354,72	121 243,40	122 606,74	100,00
10	UAB "Oksa" (2006/5/A/PT/LT)	Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas: atliekų tankinimo įsigijimas	220 090,94	123 250,93	96 840,01			220 090,94	123 250,93	96 840,01		100,00
11	UAB "ARGO ekspresas" (2006/6/A/PT/LT)	Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas: kontenerių įsigijimas	18 414,62	10 312,19	8 102,43			18 414,62	10 312,19	8 102,43		100,00
12	UAB „Intrac Lietuva“ (2006/7/A/PT/LT)	Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas: daigiatfunkcinio traktoriaus įsigijimas	66 610,80	37 302,05	29 308,75			66 610,80	37 302,05	29 308,75		100,00
13	UAB "Siberauto" (2006/9/A/PT/LT)	Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas: sunkvežimio su prikaba įsigijimas	118 418,14	66 314,16	52 103,98			118 418,14	66 314,16	52 103,98		100,00

2009-05-08

Slytėnų skyriaus vadovas


Albina Čepklienė

Projekto Nr. 2001/LT/16/PE/008 Galutinė ataskaita

76



14	UAB "Bažuva" (2006/17/A/PT/LT)	Mobilios technikos savartynui (įskaitant mobilią kompostavimo techniką išsigijimas). Kompostuojamų atliekų smulkintuvą Jenz A.Z 30	90.969,65	50.943,00	40.026,65		90.969,65	50.943,00	40.026,65		100,00
15	UAB "Kelių mašinos" (A/2007/S/27)	Mobilios technikos savartynui išsigijimas. Komposo vartytuvų- kausės ALLU SC 2-20	28.151,07	15.764,60	12.386,47		28.151,07	15.764,60	12.386,47		100,00
16	UAB "Metro technikonas" (S-08- 240)	Mobilios technikos savartynui išsigijimas. Ekskavatoriaus pirkimas	97.022,70	69.926,91	0,00	27.095,79	97.022,70	69.926,91	0,00	27.095,79	100,00
	IS viso		10.239.478,55	5.291.950,03	2.060.995,46	2.096.964,53	10.050.955,44	5.226.752,43	2.030.836,39	2.075.897,68	717.468,94



T 1 1 1 1 1 1 1
Skaitymas: 11.03.2009

2009-05-08

Albina Čepičienė

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


3.3. Statybos darbų sutarčių išskaidymas pagal atskirus komponentus

Lentelė Nr. 21. Atliekų priėmimo punktų darbų sutarties išskaidymas Sutartis Nr. A/2005/S04

Nr.	Objektai	Darbų kaina pagal sutartį	Apmokėta pagal sutartį				Sutarties mokėjimų įvykdymas
			Viso:	ISPA/Sanglaudos programos lėšos	LR biudžeto lėšos	Paskolos lėšos	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	BENDROSIOS IŠLAIDOS	27.282,21	27.282,21	15.278,04	5.968,53	6.035,65	100,00
2	PAGRINDINIAI OBJEKTAI	995.759,67	995.759,67	557.625,42	217.842,26	220.291,99	100,00
2.1.	34 atliekų priėmimo punktai	626.933,21	626.933,21	351.082,60	137.154,13	138.696,48	100,00
2.2.	Konteineriai	368.826,46	368.826,46	206.542,82	80.688,13	81.595,51	100,00
3	Nenumatyti darbai	51.152,11	51.151,65	28.644,91	11.190,44	11.316,30	100,00
4	Iš viso įvykdyta	1.074.193,99	1.074.193,53	601.548,37	235.001,23	237.643,93	100,00
5	Lėšų sudedamosios dalys, %		100,00	56,00	22,00	22,00	

Lentelė Nr. 22. Mažųjų savartynų-šiukšlynų sutvarkymo ir konteinerinių aikštelių įrengimo sutarties išskaidymas Sutartis Nr. A/2005/Š10

Nr.		Darbų kaina pagal sutartį	Apmokėta pagal sutartį					Sutarties mokėjimų įvykdymas
			Viso:	ISPA/Sanglaudos programos lėšos	LR biudžeto lėšos	Paskolos lėšos	EM viršijamos biudžeto lėšos	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	BENDROSIOS IŠLAIDOS	108.154,54	98.017,84	32.688,26	14.573,14	12.591,76	38.164,68	90,63
2	PAGRINDINIAI OBJEKTAI	1.687.723,87	1.687.350,56	562.719,52	250.872,68	216.763,69	656.994,67	99,98
2.1	116 mažųjų savartynų/šiukšlynų sutvarkymas	1.038.734,36	1.038.733,20	346.410,20	154.437,25	133.439,75	404.446,00	100,00
2.2	247 konteinerinių aikštelių statyba	109.036,43	108.664,27	36.238,77	16.156,04	13.959,44	42.310,03	99,66



T I K R E T A
Skiytais rašais
Aldona Čepelienė

2009-05-08

78



2.3	987 konteineriai	539.953,08	539.953,08	180.070,55	80.279,39	69.364,50	210.238,64	100,00
3	Nenumatyti darbai	118.887,00	57.297,42	19.108,29	8.518,89	7.360,65	22.309,59	48,19
4	Iš viso įvykdyta	1.914.765,41	1.842.665,82	614.516,07	273.964,71	236.716,10	717.468,94	96,23
5	Lėšų sudedamosios dalys, %		100,00	33,35	14,87	12,84	38,94	

Lentelė Nr. 23. Aukštrųjų sąvartyno įrengimo statybos darbų sutarties išskaidymas *Sutartis Nr. A/2005/S05*

Nr.		Darbu kaina pagal sutartį	Apmokėta pagal sutartį				Sutarinės įmokėjimų įvykdymas
			Viso:	ISPA/Sanglaudos programos lėšos	ER biudžeto lėšos	Paskolos lėšos	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	BENDROSIOS IŠLAIDOS	238.849,00	238.849,00	133.755,44	45.918,02	59.175,54	100,00
2	STATYBOS OBJEKTAI	2.252.831,00	2.252.830,71	1.261.585,19	433.100,12	558.145,40	100,00
2.1	Sąvartyno statyba	2.053.789,83	2.053.789,56	1.150.122,14	394.835,04	508.832,38	100,00
2.1.1	Sąvartyno statybos darbai	1.925.131,75	1.925.131,48	1.078.073,62	370.100,90	476.956,96	100,00
2.1.2	Sąvartyno įrenginiai	128.658,08	128.658,08	72.048,52	24.734,14	31.875,42	100,00
2.2	Pagrindiniai objektai	199.041,17	199.041,17	111.463,05	38.265,08	49.313,04	100,00
2.2.1	Tarnybinio pastato statybos darbai	156.904,21	156.904,20	87.866,35	30.164,37	38.873,48	100,00
2.2.2	Tarnybinio pastato įrenginiai	42.136,96	42.136,97	23.596,70	8.100,71	10.439,56	100,00
3	Nenumatyti darbai	249.168,00	240.310,13	134.573,67	46.198,92	59.537,54	96,45
4	Pažeidimas 1		-51.996,77	-29118,19	-22.878,58		
5	Pažeidimas 2		-13.386,52	-7.496,46	-2.565,20	-3.324,86	
5	Pažeidimas 3		-3.130,21	-1.752,92	-599,83	-777,46	
7	Iš viso įvykdyta	2.740.848,00	2.663.476,34	1.491.546,73	499.173,45	672.756,16	97,18

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I I S
Skyriaus ved. pat.
Aldona Čepelienė

2009-05-08

79




8	Lėšų sudedamosios dalys, %	100,00	56,00	19,00	25,00

Lentelė Nr. 24. Kairių sąvartyno uždarymo statybos darbų sutarties išskaidymas *Sutartis Nr. A/2006/Š13*

Nr.		Darbų kaina pagal sutartį	Apmokėta pagal sutartį				Sutarties mokėjimų įvykdymas
			Viso:	ISPA/Sanglaudos programos lėšos	LR biudžeto lėšos	Paskolos lėšos	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	BENDROSIOS IŠLAIDOS	43.443,00	37.606,58	21.059,69	1.156,93	15.389,96	86,57
2	STATYBOS OBJEKTAI	1.714.228,17	1.705.531,48	955.097,62	52.469,24	697.964,62	99,49
2.1	Žemės ir kaupo tvarkymo darbai	1.413.251,28	1.388.225,80	777.406,44	42.707,60	568.111,76	98,23
2.2	Filtrato sistema	50.585,03	79.792,34	44.683,71	2.454,74	32.653,89	157,74
2.3	Nuotekų šalinimo sistema	89.434,37	82.106,99	45.979,92	2.525,95	33.601,12	91,81
2.4	Lauko elektros tinklai	11.685,00	11.685,00	6.543,60	359,48	4.781,92	100,00
2.5	Filtrato siurblynės	97.177,95	91.626,82	51.311,01	2.818,83	37.496,98	94,20
2.5.1	Filtrato siurblynė Nr. 1 (technologinė, konstrukcinė dalis, elektros įrenginiai, automatikos įrenginiai)	23.620,25	22.541,13	12.623,03	693,46	9.224,64	95,43
2.5.2	Filtrato siurblynė Nr. 2 (technologinė, konstrukcinė dalis, elektros įrenginiai, automatikos įrenginiai)	23.620,25	22.129,58	12.392,56	680,80	9.056,22	93,69
2.5.3	Filtrato siurblynė Nr. 3 (technologinė, konstrukcinė dalis, elektros įrenginiai, automatikos įrenginiai)	25.216,93	23.726,27	13.286,71	729,92	9.709,64	94,09

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I K R E T I
Skyriaus vedėja

Alėona Čepėlienė

2009-05-08

80




2.5.4	Filtrato siurblinė Nr. 4 (technologinė, konstrukcinė dalis, elektros įrenginiai, automatikos įrenginiai)	24.720,52	23.229,84	13.008,71	714,65	9.506,48	93,97
2.6	Savartyno nuotekų valykla	52.094,54	52.094,53	29.172,94	1.602,64	21.318,95	100,00
3	Nenumatyti darbai	175.767,20	160.602,70	89.937,51	4.940,81	65.724,38	98,37
4	Iš viso įvykdyta	1.933.438,37	1.903.740,76	1.066.094,82	58.566,98	779.078,96	98,46
5	Lėšų sudedamosios dalys, %		100,00	56,00	3,08	40,92	

Lentelė Nr. 25. Privažiavimo kelio į savartyną statybos darbų išskaidymas Sutartis Nr. A/2006/Š15


Nr.		Darbų kaina pagal sutartį	Apmokėta pagal sutartį				Sutarties mokėjimų įvykdymas
			Viso:	ISPA/Sanglaudos programos lėšos	LR biudžeto lėšos	Paskolos lėšos	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	BENDROSIOS IŠLAIDOS	28.989,52	28.989,52	16.234,13	6.342,04	6.413,35	100,00
2	PAGRINDINIAI OBJEKTAI	474.833,08	474.833,07	265.906,52	103.879,23	105.047,32	100,00
2.1	Privažiavimo kelio statyba	471.393,56	471.393,56	263.980,39	103.126,77	104.286,40	100,00
2.2	Kelio ženklų ir stendo įrengimas	3.439,52	3.439,51	1.926,13	752,46	760,92	100,00
3	Nenumatyti darbai	50.382,26	50.382,26	28.214,07	11.022,13	11.146,07	100,00
4	Iš viso įvykdyta	554.204,86	554.204,86	310.354,72	121.243,40	122.606,74	100,00
5	Lėšų sudedamosios dalys, %		100,00	56,00	22,00	22,00	

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I K R A
Skyriaus v. lia
Aldona Čeplojienė

2009-05-08

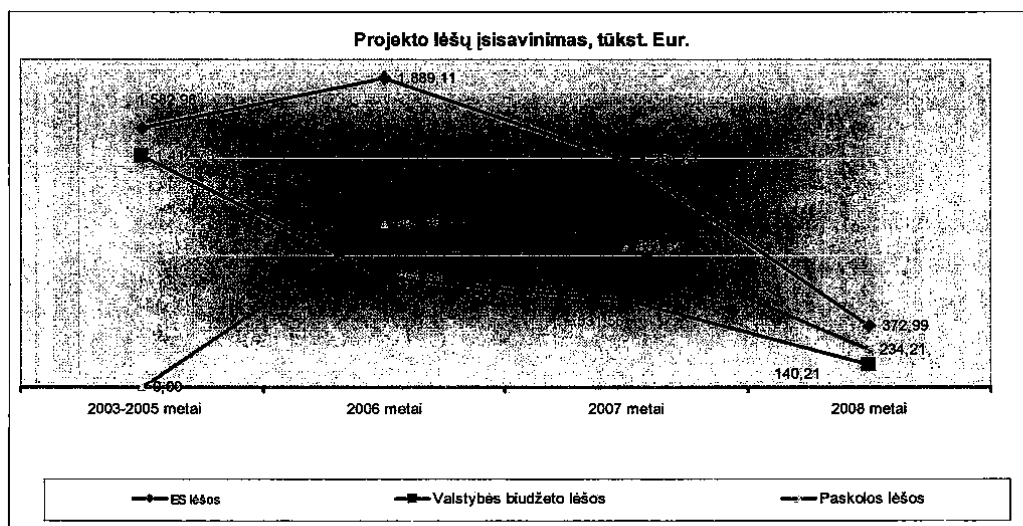

96 pav. Lėšų įsisavinimas

3.4. Mokėjimai

Mokėjimai Projekto vykdytojams buvo atliekami pagal pateiktus mokėjimo prašymus, atsižvelgiant į atliktų darbų aktus. Detalesnė informacija pateikiama lentelėje žemiau.

Lentelė Nr. 26. Mokėjimai

Saskaitos Nr.	Mokėjimų šaltinis				Suma apmokėjimui (EUR be PVM)
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Valstybės biudžeto lėšos (EUR be PVM)	Paskolos lėšos (EUR be PVM)	FM viršijančios biudžeto lėšos (EUR be PVM)	
Techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimas					
<i>Sutartis Nr. EuropeAid/114277/D/SV/LT</i>					
2003-10-07/ Nr. 1 (išankstinio mokėjimo sąskaita)	226.451,00	129.949,00			356.400,00
2005-11-28/ Nr. 2 (galutinio mokėjimo sąskaita)	106.189,00	131.411,00			237.600,00
Išmokėta suma (EUR be PVM)	332.640,00	261.360,00			594.000,00
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)					

Techninė pagalba Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui
Sutartis Nr. ISPA/12/SV/LT

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I E R A
 Sprendus v. Lija
 Aldona Čeplojienė

2009-05-08

82



2004-06-30/ Nr. 1 (išankstinio mokėjimo sąskaita)	43.535,52	34.206,48			77.742,00
2005-05-27/ Nr. 2					
2005-08-25/ Nr. 3	23.327,46	18.328,72			41.656,18
2006-01-10/ Nr. 4	20.128,99	15.815,63			35.944,62
2006-07-21/ Nr. 5	18.991,51	14.921,90			33.913,41
Išmokėta suma (EUR be PVM)	105.983,48	83.272,73			189.256,21
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)	5.238,52	4.115,27			9353,79
<i>Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose</i>					
<i>Sutaris Nr. A/2004/S02</i>					
2004-07-29/ Nr. 1 (išankstinio mokėjimo sąskaita)	29.196,83	22.940,37			52.137,20
2005-06-29/ Nr. 2	25.287,90	19.869,07			45.156,97
2005-07-05/ Nr. 3	34.249,98	26.910,69			61.160,67
2005-08-10/ Nr. 4	48.640,91	38.217,85			86.858,76
2005-09-28/ Nr. 5	13.718,54	10.778,86			24.497,40
2005-12-16/ Nr. 6	16.788,24	13.190,76			29.979,00
Išmokėta suma (EUR be PVM)	167.882,40	131.907,60			299.790,00
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)					
<i>Techninė priežiūra Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui</i>					
<i>Sutaris Nr. EuropeAID/LT/6307/D/SV/LT</i>					
2004-12-03/ (išankstinio mokėjimo sąskaita)	28.768,32	22.603,68			51.372,00
2006-06-19/ Nr. 1	1.803,76	1.417,24			3.221,00
2006-10-31/ Nr. 2	23.770,32	18.676,68			42.447,00
2007-03-12/ Nr. 3	53.928,00	42.372,00			96.300,00
2007-07-13/ Nr. 4	21.660,80	17.019,20			38.680,00
2008-04-01/ Nr. 5	16.203,60	12.731,40			28.935,00
2008-12-11/ Nr. 6	16.237,20	12.757,80			28.995,00
Išmokėta suma (EUR be PVM)	162.372,00	127.578,00			289.950,00
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)					

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I K S T A
Skaitymas: 2009-05-08
Aldona Čepkėlienė

2009-05-08

83




Naujojo regioninio sąjartyno Aukštakiuose statyba
Sutaris Nr. A/2005/S05

2005-07-15/ (išankstinio mokejimo sąskaita)	306.974,98	241.194,62			548.169,60
2005-10-29/ Nr. 1	44.307,60	34.813,12			79.120,72
2005-12-16/ Nr. 2	242.135,99	190.249,71			432.385,70
2006-04-28/ Nr. 3	56.247,43	13.598,28	30.596,13		100.441,84
2006-05-30/ Nr. 4	66.407,49	12.770,67	39.406,64		118.584,80
2006-07-31/ Nr. 5	73.210,18		57.522,28		130.732,46
2006-08-31/ Nr. 6	59.575,15		46.809,05		106.384,20
2006-09-29/ Nr. 7	81.248,86		63.838,38		145.087,24
2006-10-31/ Nr. 8	111.656,89		87.730,40		199.387,29
2006-12-15/ Nr. 9	213.615,62		167.840,84		381.456,46
2007-02-15/ Nr. 10	115.009,28		90.364,47		205.373,75
2007-02-26/ Nr. 11	6.533,40	535,35	4.598,04		11.666,79
2007-04-17/ Nr. 12	104.544,18	32.055,31			136.599,49
2007-06-27/ Nr. 13	48.447,25		88.152,25		136.599,50
<i>Pažaidimas 1</i>	<i>-29.118,19</i>	<i>-22.878,58</i>			<i>-51.996,77</i>
<i>Pažaidimas 2</i>	<i>-7.496,46</i>	<i>-2.565,20</i>	<i>-3.324,86</i>		<i>-13.386,52</i>
<i>Pažaidimas 3</i>	<i>-1.752,92</i>	<i>-599,83</i>	<i>-777,46</i>		<i>-3.130,21</i>
Išmokėta suma (EUR be PVM)	1.491.546,73	499.173,45	672.756,16		2.663.476,34
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)	43.328,15	26.043,61	7.999,90		77.371,66

Adieku priėmimo punktų statyba
Sutaris Nr. A/2005/S04

2005-07-18/ Nr. 1 (išankstinio mokejimo sąskaita)	120.309,73	94.529,07			214.838,80
2005-09-30/ Nr. 2	41.725,64	32.784,43			74.510,07
2005-10-29/ Nr. 3	43.576,71	34.238,84			77.815,55
2005-11-30/ Nr. 4	27.348,92	21.488,43			48.837,35
2005-12-21/ Nr. 5	40.609,77	31.907,68			72.517,45
2006-01-27/ Nr. 6	35.220,05		27.672,90		62.892,95
2006-02-17/ Nr. 7	23.089,04		18.141,38		41.230,42

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I P S T A
 Skyriaus v. p. d.
 Aldona Čepelienė

2009-05-08

84



2006-06-30/ Nr. 8	47.821,13		37.573,74		85.394,87
2006-07-31/ Nr. 9	35.900,02		28.207,14		64.107,16
2006-08-31/ Nr. 10	39.089,15		30.712,90		69.802,05
2006-09-29/ Nr. 11	43.418,72		34.114,70		77.533,42
2006-10-31/ Nr. 12	36.272,06		28.499,52		64.771,58
2006-12-15/ Nr. 13	6.720,66	2.451,04	2.829,48		12.001,18
2007-11-20/ Nr. 14	60.446,77	17.601,74	29.892,17		107.940,68
Išmokėta suma (EUR be PVM)	601.548,37	235.001,23	237.643,93		1.074.193,53
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)	0,26	0,19	0,01		0,46
Mažųjų sąvartynų / Šukštynų sutvarkymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas					
Sutartis Nr. A/2005/S10					
2005-12-19/ Nr. 1 (išankstinio mokėjimo sąskaita)	119.840,00	94.160,00		168.953,08	382.953,08
2006-07-03/ Nr. 2	20.470,58	16.084,03		28.859,87	65.414,48
2006-10-30/ Nr. 3	82.151,00	64.547,22		115.818,29	262.516,51
2006-12-14/ Nr. 4	18.567,95	14.589,10		26.177,48	59.334,53
2007-03-30/ Nr. 5	18.769,00	14.747,08		26.460,95	59.977,03
2007-05-31/ Nr. 6	28.426,09	16.484,19	5.850,60	40.075,72	90.836,60
2007-06-29/ Nr. 7	16.036,35		12.599,98	22.608,40	51.244,73
2007-07-31/ Nr. 8	37.665,66		29.594,46	53.101,89	120.362,01
2007-08-27/ Nr. 9	51.558,12		40.509,94	72.687,78	164.755,84
2007-09-28/ Nr. 10	57.719,29		45.350,87	81.373,93	184.444,09
2007-12-04/ Nr. 11	57.611,58		45.266,24		102.877,82
2008-05-30/ Nr. 12	34.927,52		27.443,04	51.311,97	113.682,53
2008-07-31/ Nr. 13	70.772,93	53.353,09	30.100,97	30.039,58	184.266,57
Išmokėta suma (EUR be PVM)	614.516,07	273.964,71	236.716,10	717.468,94	1.842.665,82
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)				72.099,59	72.099,59
Kairių sąvartyno uždarymas (I-as etapas)					
Sutartis Nr. A/2006/S13					
2006-05-15/ Nr. 1 (išankstinio mokėjimo sąskaita)	216.545,10	58.566,98	111.575,60		386.687,68

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

T I K E T A
Skyriaus vadovė

Aisla Čepkijienė

2009-05-08

85




2006-08-31/ Nr. 2	44.938,73		35.309,01		80.247,74
2006-09-29/ Nr. 3	44.439,38		34.916,65		79.356,03
2006-10-31/ Nr. 4	67.794,92		53.267,44		121.062,36
2006-11-30/ Nr. 5	34.463,61		27.078,55		61.542,16
2006-12-18/ Nr. 6	35.263,45		27.707,00		62.970,45
2007-01-30/ Nr. 7	41.335,74		32.478,08		73.813,82
2007-02-28/ Nr. 8	63.031,63		49.524,85		112.556,48
2007-03-30/ Nr. 9	42.333,03		33.261,67		75.594,70
2007-04-27/ Nr. 10	42.286,54		33.225,13		75.511,67
2007-05-31/ Nr. 11	43.102,71		33.866,42		76.969,13
2007-06-29/ Nr. 12	42.741,64		33.582,72		76.324,36
2007-08-31/ Nr. 13	107.185,92		84.217,51		191.403,43
2007-10-31/ Nr. 14	52.856,22		41.529,89		94.386,11
2008-02-13/ Nr. 15	43.370,37		34.076,73		77.447,10
2008-06-30/ Nr. 16	37.796,35		29.697,12		67.493,47
2008-07-02/ Nr. 17	106.609,48		83.764,59		190.374,07
Išmokėta suma (EUR be PVM)	1.066.094,82	58.566,98	779.078,96		1.903.740,76
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)	16.630,67		13.066,94		29.697,61
Privatizavimo kelio į naująjį Aukštųjų savartyną statyba					
Sutaris Nr. Nr. A/2006/S/15					
2006-10-23/ Nr. 1 (išankstinio mokėjimo sąskaita)	93.106,42	73.155,04			166.261,46
2007-03-23/ Nr. 2	77.849,86	15.035,45	46.132,30		139.017,61
2007-05-31/ Nr. 3	108.362,96	20.928,58	64.213,77		193.505,31
2007-11-29/ Nr. 4	15.517,74	6.062,16	6.130,34		27.710,24
2008-06-02/ Nr. 5	15.517,74	6.062,17	6.130,33		27.710,24
Išmokėta suma (EUR be PVM)	310.354,72	121.243,40	122.606,74		554.204,86
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)					

Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas

Lentelė Nr. 27. Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I K E T A
Styriaujamasis

2009-05-08


Aldona Čepčiūnė

86



Sutarčių pavadinimas	Sutarčių Nr.	Saskaitos data/ Saskaitos Nr.	Mokėjimų šaltinis				Suma apmokėjimų (EUR be PVM)
			ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Valstybės biudžeto lėšos (EUR be PVM)	Paskolos lėšos (EUR be PVM)	FM viršijančios biudžeto lėšos (EUR be PVM)	
Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas: atliekų tankintuvo įsigijimas	2006/5/A/PT/LT	2006-03-28/ Nr.1	24.650,19	19.368,00			44.018,19
		2006-07-12/ Nr.2	98.600,74	77.472,01			176.072,75
Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas: konteinerių įsigijimas	2006/6/A/PT/LT	2006-07-31/ Nr.1	10.312,19	8.102,43			18.414,62
Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas: daugiafunkcinio traktoriaus įsigijimas	2006/7/A/PT/LT	2006-09-26/ Nr.1	37.302,05	29.308,75			66.610,80
Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas: sunkvežimio su priekaba įsigijimas	2006/9/A/PT/LT	2006-06-28/ Nr.1	13.262,83	10.420,80			23.683,63
		2006-12-19/ Nr.2	53.051,33	41.683,18			94.734,51
Mobiliios technikos sąvartynui (įskaitant mobilią kompostavimo techniką įsigijimas). Kompostuojamų atliekų smulkinimas Jenz AZ 30	2006/17/A/PT/LT	2007-01-08/ Nr.1	10.188,60	8.005,33			18.193,93
		2007-03-21/ Nr.2	40.754,40	32.021,32			72.775,72

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



Skundų skyriaus
Aldona Cepkionė

2009-05-08

87




Mobilios technikos sąvartynui įsigijimas. Komposto vartytuvas-kaušas ALLU SC 2-20	A/2007/S/27	2007-08-31/ Nr.1	15.764,6	12.386,47		28.151,07
Mobilios technikos sąvartynui įsigijimas. Ekskavatoriaus pirkimas Nr. S-08-240	S-08-240	2008-10-31/ Nr.1	69.926,91		27.095,79	97.022,70
Išmokėta suma (EUR be PVM)			373.813,84	238.768,29	27.095,79	639.677,92
Likusi išmokėti dalis (EUR be PVM)						

Lentelė Nr. 28. Projekto nepanaudotos lėšos

Finansavimo šaltiniai	Likusi projekto sutarties dalis		Likusi išmokėti dalis					Mazųjų sąvartynų / Šukšlynų / antvarkymų / kontenerinių aikštelių įrengimas Nr. A/2005/S/10	
	Sutarties "Mazųjų sąvartynų / šukšlynų / antvarkymų / kontenerinių aikštelių įrengimas" Nr. A/2005/S/10 pakeitimas	Likusi nepanaudota projekto dalis	Techinė pagalba Nr. ISPA/12/SV/LT	Naujojo regioninio sąvartyno / antvarkymo / aikštelių statyba Nr. A/2005/S/05	Kairių sąvartynų / antvarkymų / aikštelių (1-asis etapas) Nr. A/2006/S/13	Atliekų priėmimo punkto statyba Nr. A/2005/S/04			
Pagal PM	ISPA/Sanglaudos fondo programa (ES lėšos)	15.316,07	11.513,96	-5.238,52	-43.328,15	-16.630,67	-0,26		-38.367,57
	Valstybės biudžeto lėšos	39.880,81	-35.765,35	-4.115,27	-26.043,61	0	-0,19		-26.043,61
	Paskolos lėšos	0	16.964,53		-7.999,91	-13.066,94	-0,01		-4.102,33
	Viso	-55.196,88	-7.286,86	-9.353,79	-77.371,67	-29.697,61	-0,46	0	-68.513,51
PM viršijanti dalis	Valstybės biudžeto lėšos (papildoma į skirtos	-55.196,88						-72.099,59	-127.296,47

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita




Skaitymas įvykdytas

2009-05-08

Aldona Čepkelytė

88								
lešos)								
Viso	0	-7.286,86	-9.353,79	-60.854,93	-77.371,67	-0,46	-72.099,59	-179.293,24



TIKŲ
 Skyriaus vadovė
 Aldona Čepėlienė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



4. Projekto ekonominės naudos analizė

4.1. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, visos su projekto įgyvendinimu patirtos išlaidos nebuvo numatytos projekto biudžete, šias išlaidas kompensavo Šiaulių apskrities savivaldybės.

Regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Aukšttrakiuose buvo pastatytas ir pripažintas tinkamu naudotis (2007-02-26) pradėjo veikti nuo 2007-04-02, nors dar vyko kitų projekto objektų statybos darbai. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema pradžioje buvo įgyvendinta tik Šiaulių mieste, o nuo 2007 m. antro pusmečio ir kitos regiono savivaldybės taip pat palaipsniui įvedė vietinės rinkliavos įmokas ir atliekas pradėjo vežti į regioninį sąvartyną. Nuo 2008 m. sausio 1 dienos sukurta komunalinių atliekų tvarkymo sistema pradėjo funkcionuoti visose septyniose (Joniškio, Radviliškio, Kelmės, Pakruojo, Akmenės, Šiaulių rajono, Šiaulių miesto) savivaldybėse.

Sukurtos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimo principo "Teršėjas moka" įgyvendinimui, buvo patvirtintas vieningas visoms savivaldybėms vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš rinkliavos mokėtojų ir atliekų tvarkymą dydis:

- gyventojams 17,38 EUR/metams;
- juridiniams asmenims – 52,71 EUR už 1 tonos atliekų sutvarkymą.

Savivaldybių sprendimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkciją (išskyrus Šiaulių rajono savivaldybę), bei nuosavybės teise priklausančių iš projekto lėšų pastatytą infrastruktūros objektų eksploataciją ir priežiūrą vykdo Viešojo įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.


Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimo pradžioje buvo daug nesklandumų dėl įvairių priežasčių: finansinių, ekonominių, politinių, organizacinių ir psichologinių. Dauguma šių problemų jau yra išspręstos, tačiau dar yra organizacinių ir finansinių problemų kurias reikalinga spręsti.

Projekto lėšomis sukurta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas ir finansavimas yra sudėtingas:

- viešųjų pirkimų teisinė bazė suteikia teisę konkurso dalyviams skusti viešojo pirkimo procedūras ir dokumentaciją teismams. Dėl pasinaudojimo šia teise viešojo pirkimo konkursai sustoja ilgam laikui, nes bylų nagrinėjimas teismuose užsitęsia, įvairūs teisės aktai ne pilnai gina viešąjį interesą, teismai taip pat nėra įsigilinę į viešojo intereso esmę todėl yra neskubama priimti sprendimus.
- vietinės rinkliavos dydžius įtakoja savivaldybių politikai, nes kiekviena savivaldybė yra atsakinga už atliekų tvarkymą toje savivaldybės teritorijoje,
- rinkliavos mokėtojų duomenų registrai yra netikslūs,
- dalis fizinių ir juridinių asmenų, kurie iki to laiko nesinaudojo atliekų surinkimo sistemomis, priešinasi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įdiegimui ir apmokestinimui.
- išaugo negu buvo prognozuota surenkami atliekų kiekiai.

Komunalinių atliekų surinkėjai/vežėjai iš esmės turėjo persitvarkyti savo turimą techninę bazę: investuoti lėšas į konteinerių ūkį, įsigyti naujas našesnes transporto priemones. Visa tai didino

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I I I I
Sikynas V. J. J.
Aliona Čepelienė

2009-05-08



komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo ir atliekų tvarkymo kaštus. Tokie dideli pokyčiai nebuvo įvertinti vietinės rinkliavos dydžio paskaičiavimuose. 2007-2008 metais savivaldybių įsiskolinimas už suteiktas paslaugas sudarė daugiau kaip 2,3 mln. Eur. (vietinės rinkliavos įmokos patenka į kiekvienos savivaldybės biudžetą). Viešojo įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras iš rinkliavos mokėtojų nesurinko apie 0,9 mln. Eur. rinkliavos įplaukų. Pradėjo trūkti apyvartinių lėšų atsiskaitymams su komunalinių atliekų surinkėjais/ vežėjais ir kitais tiekėjais. Apyvartinių lėšų trūkumui dengti buvo pasinaudota banko kreditu. Aukščiau paminėtų trūkumų šalinimui buvo įgyvendintos priemonės:

1. Nuo 2009 metų įsigaliojo nauji vietinės rinkliavos dydžiai:
 - gyventojams 17,38 EUR/metams,
 - už 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymą nuo 54,45 EUR/t iki 67,77 EUR/t.
2. Pertvarkyta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą administravimo sistema, leidžianti mažinti administravimo sąnaudas (gyventojams mokėjimo pranešimai siunčiami 1 kartą per metus (vietoje 1 kartą per ketvirtį), patikslintos juridinių asmenų atliekų susikaupimo normos, patikslinti vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenys ir kt.).

Prognozuojama, kad 2009 metų pabaigoje bus subalansuoti piniginių lėšų srautai, bus sumažintas savivaldybių biudžeto lėšų įsiskolinimas.

2007-2009 metais nustatytas įkainis 15,72 EUR/t yra pakankamas iš projekto lėšų įrengtų infrastruktūros objektų eksploatacinėms ir atliekų šalinimo sąnaudoms padengti. Planuojama, kad atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidos nuo 2010 metų turėtų ženkliai didėti. Rinkliavos mokesčio didinimas nepažeis projektui nustatytos specialiosios sąlygos.

4.2. Finansinės projekto analizės įvertinimas

Finansinė analizė apibendrina ir įvertina ne visą ŠRATC veiklos analizę, bet tik projektui priskiriamas pajamas, išlaidas ir investicijas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Projektą įgyvendinus iš veiklos gaunamos pajamos, todėl būtina įvertinti pajamas ir išlaidas per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Projekto piniginiai srautai ir išlaidos apskaičiuotos pagal 2008 m. ekonomines kainas Eurais (be PVM).

Lentelė Nr. 29. Projekto prielaidų ir rezultatų palyginimas

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2013	2008 faktas
	tūkst ton.	tūkst ton.	tūkst ton.	tūkst ton.	tūkst ton.	tūkst ton.	tūkst ton.	tūkst ton.
Surinktos atliekos, tūkst. ton.	70,2	77,5	83,2	87,8	90,3	92,3	100,8	139,7
Pokytis palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc.	7 %	10,0 %	7,0 %	6,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	1,4 %
Atliekų surinkimo santykis	76	83	87	90	92	92	94	95
Vidutinis tarifas 2001 m. kainomis Eur./m³	9,2	9	10,1	12,3	11,9	11,9	11,7	9,23

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I S K A
Skaitymas
Aldona Čepkajienė

2009-05-08

91



Pokytis palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc.	25 %	-2 %	12 %	22 %	-3 %	0 %	-5 %	-22 %
Namų ūkių tarifas/ gyventojui / mėn. (litas)	1,3	1,3	1,6	2	2	2	2	3,34
Pokytis palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc.	30 %	0 %	23 %	25 %	0 %	0 %	0 %	67 %
Surinktos tarifinės įplaukos (mln. Eur.)	2,5	2,7	3,3	4,3	4,4	4,5	5,3	5,3
Tiesioginės veiklos sąnaudos	2	2,7	2,9	3,1	3,5	3,5	4,3	5,3
Grynasis pelnas	0,4	-0,2	0,0	0,5	0,7	0,8	0,6	0,05
Grynujų pinigų srautas iš veiklos (mln. Eur.)	0,3	0	0,2	0,8	0,7	0,8	1,1	0,1
Paskolos grąžinimas	0	0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Grynieji pinigai sąskaitoje	0,2	0,2	0,5	1	1,4	1,9	5,5	0,1
Skolos ir lėšų iš veiklos santykis	0,5	-36,2	7,3	2	2,2	1,5	0	0,1
Skolos aptarnavimo dengimo santykis	41,3	1,4	3,8	2,2	2	2,2	3,7	5

Pagal finansavimo memorandumą projekto įgyvendinimo laikotarpis baigiasi 2013 metais (kai baigs tarnauti dvi pirmosios sąvartyno dalys). Tačiau įvertinus esamus ir būsimus pokyčius, prognozuojama, kad 2013 metais bus užpildyta komunalinėmis atliekomis tik pirmoji regioninio sąvartyno Aukštakiuose dalis. Šiuo metu Šiaulių miesto komunalinės atliekos dalinai yra transportuojamos į Kairių sąvartyną, sąvartyną šlaitams suformuoti, Kairių sąvartyno II etapo uždarymo darbams vykdyti. Tuo būdu regioninio sąvartyno antros dalies (2,7 ha ploto) užpildymas atliekomis bus pratęstas iki 2016 metų. Per tą laikotarpį bus sukauptos lėšos sąvartyno trečios ir ketvirtos dalies įrengimui. Be to pastačius atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sumažės patenkantis į regioninį sąvartyną atliekų srautas.

Daroma prielaida, kad regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas baigs tarnauti 2023 metais.


4.2.1. Piniginių srautų įvertinimas

Prognozuojamų piniginių pajamų sudėtis, susijusi tik su projekto įgyvendinimu susijusia atliekų šalinimo veikla, tai pajamos iš rinkliavos mokėtojų ir kitų atliekų turėtojų.

Piniginių išlaidų sudėtis:

- infrastruktūros objektų priežiūra ir eksploatacija: Aukštakių sąvartyno, kompostavimo aikštelės, atliekų priėmimo punktų, konteinerinių aikštelių, uždarytų mažųjų sąvartynų.
- komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas.
- banko kreditų grąžinimas.

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita




T 1 15 12 24
Skaitymas
Aukština Čopelienė

2009-05-08

Lentelė Nr. 30. Projekto piniginių srautų įvertinimas

Metai	Sutvarkyti atliekų kiekiai, tūkst. t.	Salinimo kaina, EUR/t.	Piniginės pajamos, tūkst. Eur.				Pinigų išmokėjimai, tūkst. Eur.						Piniginis pelnas	Nusidėvėjimas ir amortizacija (paskola/nuosavos lėšos)	Pelnas prieš paskirstymą, Eur. (11-12 st.)	Disponuojamas piniginis srautas, tūkst. Eur. (11+12 st.)	Mokamos palūkanos, tūkst. Eur.	Disponuojamas piniginis srautas, tūkst. Eur. (14-15 st.)
			Už suteiktas paslaugas vietinės rinkliavos mokėjimams	Kitos pajamos	Viso	Eksploataciniai sąnaudos	Administravimo sąnaudos	Banko kreditų grąžinimas	Viso									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2009	135,96	13,32	1521	290	1811	1200	440	216	1856	-45	180,09	-225	135	309	-174			
2010	132,00	16,65	1846	352	2198	1180	440	197	1817	381	179,82	201	561	114	447			
2011	132,00	19,15	2123	404	2527	1180	440	197	1817	710	179,6	530	890	103	787			
2012	132,00	19,15	2123	404	2527	1142	441	197	1780	747	154,14	593	901	92	809			
2013	132,00	19,15	2123	404	2527	1130	443	185	1758	769	127,46	641	896	81	815			
2014	130,00	19,15	2091	398	2489	1130	442	174	1746	743	114,47	629	858	70	788			
2015	130,00	19,15	2091	398	2489	1100	440	174	1714	775	109,21	666	885	60	825			
2016	130,00	19,15	2091	398	2489	1100	439	174	1713	776	74,24	702	850	50	801			
2017	130,00	19,15	2091	398	2489	1100	438	174	1712	777	69,78	707	847	40	807			
2018	130,00	19,15	2091	398	2489	1100	437	174	1711	778	69,78	708	848	30	818			
2019	130,00	19,15	2091	398	2489	1100	436	174	1710	779	69,78	709	849	20	829			
2020	128,00	19,15	2059	392	2451	1100	434	169	1703	748	51,27	697	800	10	790			
2021	128,00	19,15	2059	392	2451	1100	433	0	1533	918	51,27	867	969		969			
2022	128,00	19,15	2059	392	2451	1100	432	0	1532	919	51,27	868	970		970			
2023	128,00	19,15	2059	392	2451	1100	432	0	1532	919	3,47	916	922		922			
Viso:					33877			2203	24100		1486		11259	977				




T I K
Sąlydus
2009-05-08
Aldona Čopelienė

Lentelė Nr. 31. Investicijos, susijusios su projekto įgyvendinimu

Nr.	Investicijos	Viso	ISPA/ Sanglaudos fondo lėšos	INTERRE G projekto lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybių lėšos	Paskolos/ Namosavos lėšos
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Projektas "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"	10.050,96	5.226,75		2.748,31		2.075,90
2	Nebaigta statyba. Antrinių žaliavų rūšiavimo linijos techninis projektas	66,20					66,20
3	Projektas "Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas"	879,08		565,4	97,56		216,12
4	Kairių sąvartyno Rytinio šlaito drenažinis sluoksnio įrengimas	86,36					86,36
5	Kairių sąvartyno eksploatacijos darbo projekto techninė dokumentacija	21,72					21,72
6	Kompaktorius - tankintuvas Hanomag CL-240	21,00					21
7	Aukštųjų privažiavimo kelio projektas ir Radviliškio rajono Prastovonių kaimo sąvartyno perdavimas ŠRATC	61,24				61,24	
8	Mercedes - Benz 2536 L 6x2 4500 su priekaba Roadex LVS 20 atliekų priėmimo punktų aptarnavimui	129,89					129,89
9	Kitos investicijos	167,64					167,64
	Viso:	11.484,09	5.226,75	565,40	2.845,87	61,24	2.784,83

Lentelė Nr. 32. Investicijų atsipirkimo trukmė

Metai	Metai (skaičiais)	Diskonto norma	Investicijos, tūkst. Eur.	Disponuojamas piniginis šaltinis, tūkst. Eur.
Pradinė investicijų kaina, tūkst. Eur.	0		-11.484,09	
	suma	5 %		
2009-01-01	Likusi investicijų kaina, tūkst. Eur.			
2009	1		-7.183,39	-174
2010	2		-7.357,18	447



2009-05-08
Audėja Čepkijienė

94



2011	3		-6.910,40	787
2012	4		-6.123,69	809
2013	5		-5.314,29	815
2014	6		-4.498,81	788
2015	7		-3.711,11	825
2016	8		-2.886,53	801
2017	9		-2.085,98	807
2018	10		-1.278,85	818
2019	11		-460,67	829
2020	12		368,56	790

Projekto investicijų atsipirkimo laikotarpis – 2020 metais.

Iš ISPA/Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto skirtas finansavimas yra negražintina parama.

Lentelė Nr. 33. Panaudotos paskolos ir nuosavų lėšų atsipirkimo laikas


Metai	Metai (skaičiais)	Diskonto norma	Paskolos ir nuosavų lėšos tūkst. Eur.	Disponuojamas piniginis šaltinis tūkst. Eur.
Pradinė investicijų kaina, tūkst. Eur	0		-2.784,83	
	suma	5 %		
2009-01-01	Likusi investicijų kaina, tūkst. Eur.			
2009	1		-1.485,5	-174
2010	2		-1.659,29	447
2011	3		-1.212,51	787
2012	4		-425,80	809
2013	5		383,61	815

Projekto investicijoms panaudotos paskolos ir nuosavų lėšų sumos atsipirks 2014 metais.

Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV)

Investicijos ir piniginiai šaltiniai vertinami be infliacijos poveikio

Diskonto norma – 5 proc.



T. K. ...
Skaitymas ...
Alcuna Čopliūnė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

Lentelė Nr. 34. Investicijos, tūkst. eurų

	2004-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Pastatai ir statiniai	7165,76															
2 Mašinos ir įrenginiai	601,53															
3 Transporto priemonės	417,67															
4 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	107,1															
5 Nebaigta statyba	66,20															
6 Kitas materialus turtas	90,51															
7 Įgalintasis materialus turtas (1-6 eil.)	8 448,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Programinė įranga	15,44															
9 Kitas nematerialus turtas	135,93															
10 Įgalintasis nematerialus turtas (8-9 eil.)	151,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kitos investicinės išlaidos	2 883,95															
12 Kitos investicinės išlaidos (11 eil.)	2 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Trumpalaikis turtas 2008 12 31	3 936,3	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
14 Įsipareigojimai 2008 12 31	3 977,88	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6	5 541,6
15 Grynasis apyvartinis kapitalas (= 13-14)	-41,58	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40
16 Grynasis apyvartinis kapitalas (= 12+13+14-15)	-41,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2009-05-08

Auditorius

Lentelē Nr. 35. Veiklos pajamos ir išlaidos, tūkst. eurų

Lentelė Nr. 36. Finansavimo šaltiniai, tūkst. eurų

Lentelē Nr. 37. Finansinis tvarumas, tūkst. euru.

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

Lentelė Nr. 38. Finansinės vidinės grąžos normos nuo investicijų apskaičiavimas, tūkst. eurų

	2004-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajamos už suteiktas paslaugas vietinės rinkliavos mokesčiams	1.631,71	1.521	1.846	2.123	2.123	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.059	2.059	2.059	2.059
2	Kitos pajamos	1.672,51	290	352	404	404	398	398	398	398	398	398	392	392	392	392
3	Iš viso pajamų	3.304,22	1.811	2.198	2.527	2.527	2.489	2.489	2.489	2.489	2.489	2.489	2.451	2.451	2.451	2.451
4	Iš viso veiklos sąnaudų	3.719,39	1.820,09	1.799,82	1.799,60	1.737,14	1.700,46	1.686,47	1.613,24	1.607,78	1.606,78	1.605,78	1.585,27	1.584,27	1.583,27	1.535,47
5	Bendros investicijų išlaidos	11.442,5														
6	Iš viso išlaidų (4+5)	15.161,9	1.820,1	1.799,8	1.799,6	1.737,1	1.686,5	1.649,3	1.613,2	1.607,8	1.606,8	1.605,8	1.585,3	1.584,3	1.583,3	1.535,5

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/PE/008 Galutinė ataskaita

Lentelė Nr. 39. Finansinės Vidinės grąžos normos nuo kapitalo apskaičiavimas, tūkst. eurų

3%

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

2009-05-08


Alguna Cópilione

99



(FVGK)	Finansinė grynoji dabartinė vertė (EGDYk Sproc.)

-1.195,91



T !
Svytaro
Svytaro

2009-05-08

Aldona Čepaitienė

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

4.3. Projekto ekonominis vertinimas

Projekto ekonominis, aplinkosauginis ir socialinis efektyvumas yra glaudžiai tarpusavyje susiję:

- sumažėjo aplinkos tarša: uždaryti seni sąvartynai ir sutvarkytos užterštos teritorijos, pastatytas naujas sąvartynas, įrengta kompostavimo aikštelė, įrengti atliekų priėmimo punktai ir konteinerinės aikštelės, įsigyta nauja įranga ir mechanizmai;
- sukurta regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema, išaugo paslaugos visuotinumams, pagerėjo paslaugų kokybė;
- sukurtos naujos darbo vietos, išaugo darbuotojų kompetencijos lygis.

Projekto metu sukurtas turtas nenaudojamas komerciniams tikslams. Gautos pajamos naudojamos atliekų tvarkymo sistemai finansuoti. Finansinė vidinė gražos norma sutampa su ekonomine vidine gražos norma, kad bet kuriuo metu nustatyti tarifai bus tokio dydžio, kad būtų užtikrinta finansinė pusiausvyra, kai pajamos sutampa su patirtomis sąnaudomis.

4.3.1. Aplinkos taršos sumažinimo efektyvumas

- Kairių sąvartynas atidarytas nuo 1965 metų, buvo eksploatuojamas daugiau kaip 30 metų. Sukaupytų atliekų tūris apie 2,0 mln. m³. Neturint naujo sąvartyno, Šiaulių miesto atliekos vis dar buvo vežamos į Kairių sąvartyną, nors eksploatacijos laikas ir buvo pasibaigęs. 2002 metais įvyko sąvartyno šlaitų nuosliauža ir 44,0 tūkst. m³ filtrato išsiliejo į aplinką. Kairių sąvartyne be buitinių atliekų buvo deponuojamos atliekos iš pramonės įmonių, surenkamo filtrato sudėtyje buvo dideli kiekiai kenksmingų medžiagų, kaip chloridas, cinkas, chromas, nikelis ir kitų. Kadangi sąvartyno dugnas neturėjo nepralaidaus izoliacinio sluoksnio, dalis filtrato patekdavo į gruntinius ir paviršinius vandenius. Toliau eksploatuojant sąvartyną galėjo įvykti didelė ekologinė katastrofa. Sąvartyno uždarymui nebuvo galimybės sukaupti lėšų.

Įgyvendinus projektą, buvo pastatytos 4 siurblynės, įrengta filtrato surinkimo sistema bei filtrato surinkimo, nusodinimo, aeracijos rezervuarai. Kairių sąvartyno filtratas nebepatenka į aplinką. Dalinai apvalytas filtratas perduodamas į miesto valymo tinklus.

Įgyvendinus projektą, naujojo Aukštrakių sąvartyno dugnas įrengtas prisilaikant visų aplinkosauginių reikalavimų, įrengta filtrato surinkimo sistema, rezervuaras, pastatyti filtrato valymo atvirkštinės osmozės būdu įrenginiai. Išvaloma iki 80 proc. įeinančio filtrato kiekio.

Lentelė Nr. 40. Filtrato surinkimo sistema

Sąnaudos	Prieš projektą		Po projekto	
	vnt./metams	EUR./metams	vnt./metams	EUR./metams
Kairių sąvartyno filtrato sąnaudos, m ³	32000	69.509,0	28000	63.716,0
Aukštrakių sąvartyno filtrato sąnaudos, m ³			14400	52.132,0

- Iki projekto žaliųjų atliekų tvarkymui Šiaulių miesto gyventojams miesto teritorijoje buvo įrengta laikina kompostavimo aikštelė, nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų: filtratas patekdavo į gruntinius vandenius, vasaros sezono metu sklido nemalonūs kvapas, veisėsi vabzdžiai ir graužikai.



T I K R E T I
Sąlygos
Aldona Čepelienė

2009-05-08



Igyvendinus projektą, viso regiono žaliųjų atliekų tvarkymui įrengta Kairių kompostavimo aikštelė šalia Kairių sąvartyno, kuri atitinka visus aplinkosauginius reikalavimus. Kompostas apie 2 tūkst. ton./metus naudojamas Kairių sąvartyno šlaitų rekultivacijai, bei kaupiami kiekiai Kairių sąvartyno uždarymo II etapui.

Lentelė Nr. 41. Komposto sąnaudos

Sąnaudos	Prieš projektą		Po projekto	
	Vnt./metams	EUR. metams	Vnt./metams	EUR. metams
Komposto sąnaudos, m ³	-	-	2000	86.886,0


- Iki projekto buvo daug atliekomis užterštų teritorijų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma. "Bešeimininkės" atliekos sudarė apie 7 proc. visų komunalinių atliekų kiekio. Be to atliekomis buvo atsikratoma miškuose, nuosavose valdose užkasant po žeme, deginant.

Gyventojų patogumui iš projekto lėšų įrengus rajoninius ir seniūnijų atliekų priėmimo punktus (34 vnt.), bendro naudojimo konteinerines aikšteles (247 vnt.), atliekas galima šalinti artimiausiame punkte ar konteinerinėje aikštelėje. Per 2008 metus iš atliekų priėmimo punktų buvo išvežta 5,5 tūkst. ton. atliekų, iš kurių 50 proc. bus perdirbamos. Gamtos tarša sumažėjo 5 proc.

- Iki projekto įgyvendinimo pradžios regione buvo virš 150 veikiančių sąvartynų, iš jų: 14 rajoninių sąvartynų, 44 seniūnijų ir 116 kaimo sąvartynų.

Projekto įgyvendinimo pabaigoje vietoje 116 kaimo sąvartynų buvo įrengtas modernus, šiuolaikinis, visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkantis 1 sąvartynas. Naujasis sąvartynas yra įrengtas nesukeliant neigiamo poveikio aplinkai.

Visos surinktos ir pristatytos į sąvartyną regiono komunalinės atliekos yra apskaitomos, kontroliuojama jų sudėtis, jas saugiai šalinamos. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais surinktas atliekų kiekis labai išaugo (20 proc.), nes gyventojai šalino atliekas, kurios buvo kaupiamos daugelį metų. Nuo 2009 metų prognozuojama, kad atliekų kiekis sumažės ir bus santykinis mišrių atliekų kiekio mažėjimas ir perdirbamų atliekų kiekio augimas.




T. K. K. K.
Skaitymas
Aldona Čepelienė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


102

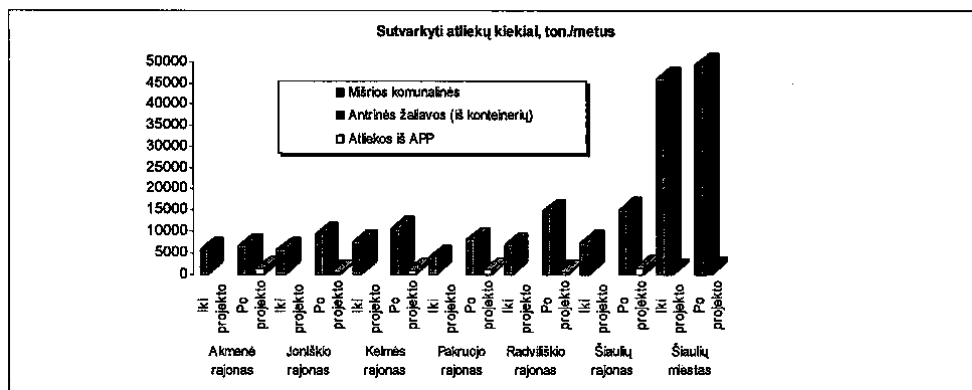

97 pav. Sutvarkyti atliekų kiekiai


Iki projekto įgyvendinimo didžioji dalis komunalinių atliekų buvo nerūšiuojamos, nenaudojamos kaip antrinės žaliavos, todėl sąvartynuose šalinamų atliekų srautai buvo labai dideli. Komunalinių atliekų rūšiavimas buvo išvystytas tik Šiaulių mieste. Antrinių žaliavų surinkimui buvo pastatyti 373 konteineriai stiklui, popieriui ir plastmasei. Tačiau dėl didelių antrinių žaliavų tvarkymo sąnaudų buvo surenkami ir išrūšiuojami nedideli antrinių žaliavų kiekiai. Per metus surenkama, išrūšiuojama ir perduodama perdirbėjams iki 600-700 tonų perdirbamų antrinių žaliavų.

Įgyvendinus projektą pastatytos antrinių žaliavų surinkimo konteinerinės aikštelės (453 vnt., iš jų 247 vnt. iš projekto lėšų) ir konteineriai (2497 vnt., iš jų 765 vnt. iš projekto lėšų). Atliekų vežėjai-surinkėjai antrines žaliavas surenka, išrūšiuoja ir perduoda perdirbimo įmonėms.

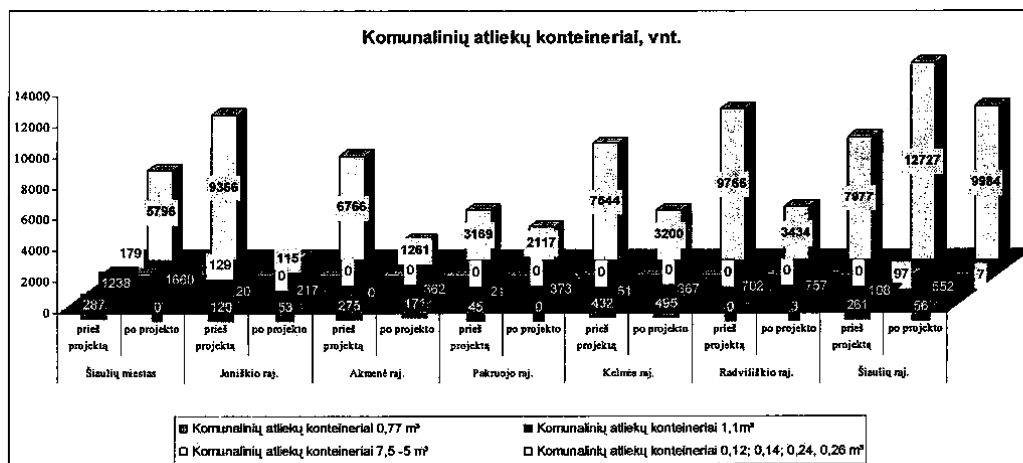

98 pav. Komunalinių atliekų konteineriai


Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T. S. S. S. S.
Sistemos
Aliona Čopelienė

2009-05-08

103

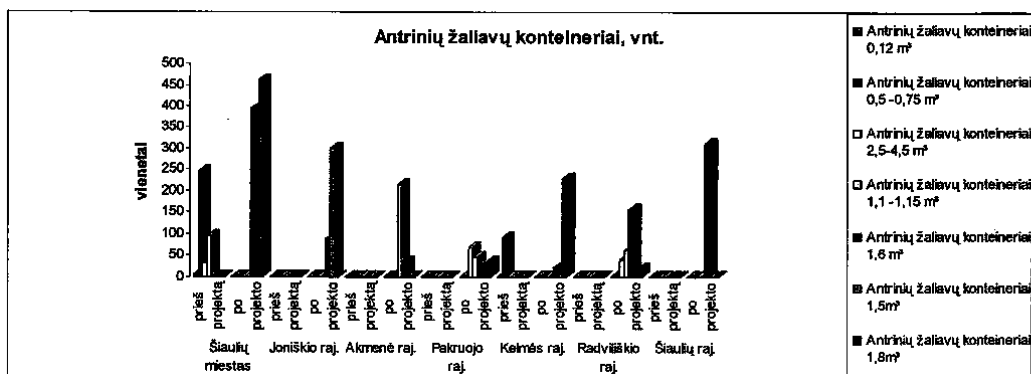

99 pav. Antrinių žaliavų konteineriai

- Projekto nebuvo įmanoma įgyvendinti be ES ir Valstybės institucijų finansinės paramos, nes savivaldybės neturi tokių finansinių galimybių, o Lietuvoje pragyvenimo lygis yra per žemas sukaupti tokias lėšas projekto įgyvendinimui. Visa suteikta ES ir Valstybės biudžeto negražintina parama 7.975,0 tūkst. Eur. (79,35 proc.) yra ekonominė nauda Šiaulių apskrįčiai.

Lentelė Nr. 42. Ekonominės naudos dydis pagal atskirus komponentus, proc.

Rodikliai	Techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimas	Techninė priežiūra	Techninė pagalba	Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė	Naujo savartyno statyba	Atliekų priėmimo punkto statyba	Kairių savartyno uždarymas (1-as etapas)	Mazų savartyno sutvarkymas, konteinerinių aikštelių įrengimas	Privažiavimo kelių statyba	Atliekų tvarkymo įrangos įrengimas
Ekonominė nauda	100	100	100	100	74,74	77,88	59,08	87,15	77,88	95,76


4.3.2. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo efektyvumas

- Iki projekto įgyvendinimo rajonų savivaldybių komunalinės įmonės aptarnavo iki 70 proc. rajoninių miestų, miestelių gyventojų ir iki 30 proc. kaimo vietovių gyventojų.

Lentelė Nr. 43. Tarifų ir susikaupimo normų palyginimas

		Iki projekto	Po projekto
Namų ūkio atliekos	Lt/gyv./mėn.	1.11 - 2.3	3.34
Komercinės atliekos	Lt/ m³	8.2 - 19.5	9.23
Namų ūkių atliekų susikaupimo normos	m³/gyv./metus	0.65 - 4.59	1.0 - 1.8

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



Skaituoklės
Aldona Čepaitienė

2009-05-08




Igyvendinus projektą regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema gali naudotis regiono komunalinių atliekų turėtojai. 2008 m. pabaigoje vieša komunalinių atliekų tvarkymo paslauga naudojosi daugiau kaip 95 proc. Šiaulių apskrities gyventojų.

Lentelė Nr. 44. Atliekų tvarkymo paslauga

Nr.	Savivaldybė	Rinkliava įvesta	Pavadinimas	Pagal registro duomenis 2009-01-01	Faktiškai apmokėta	Suteikta paslauga, proc.
1	Akmenės rajonas	2008-01-01	Gyventojų skaičius	28.225	26.071	92,4
			Įmonių skaičius	407	407	100,0
2	Joniškio rajonas	2007-10-01	Gyventojų skaičius	30.845	28.983	94,0
			Įmonių skaičius	423	423	100,0
3	Kelmės rajonas	2007-07-01	Gyventojų skaičius	36.900	34.940	94,7
			Įmonių skaičius	574	574	100,0
4	Pakruojo rajonas	2007-09-01	Gyventojų skaičius	27.321	25.118	91,9
			Įmonių skaičius	400	399	99,8
5	Radviškio rajonas	2007-10-01	Gyventojų skaičius	48.497	47.602	98,2
			Įmonių skaičius	680	680	100,0
6	Šiaulių miestas	2007-01-01	Gyventojų skaičius	123.372	117.399	95,2
			Įmonių skaičius	3.533	3.511	99,4
7	Šiaulių rajonas	2007-09-01	Gyventojų skaičius	50.277	48.514	96,5
			Įmonių skaičius	790	779	98,6
8	Viso		Gyventojų skaičius	345.437	328.627	95,1
			Įmonių skaičius	6.807	6.773	99,5

- Iki projekto įgyvendinimo savivaldybių nustatyti atliekų tvarkymo mokesčiai buvo maži, į sąnaudas nebuvo įtraukiamos sąvartynų modernizavimo, uždarymo bei priežiūros po uždarymo išlaidos. Atliekų tvarkymo paslaugas teikė ir mokesčius rinko savivaldybių komunalinės įmonės (sutarčių pagrindu).

Igyvendinus projektą įdiegta vieninga komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Visos apskrities savivaldybės patvirtino vieningą rinkliavos dydį, vienodą paskaičiavimo metodiką bei jos taikymo tvarką. Vietinės rinkliavos dydžiai fiziniams ir juridiniams asmenims, įgyvendino principą „Teršėjas moka“, kurio dydis kompensuoja atliekų šalinimo, atliekų surinkimo, transportavimo ir vietinės rinkliavos surinkimo išlaidas. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas ir apskaita vykdoma centralizuotu būdu, pavedus šias funkcijas ŠRATC.




T. Čepkė
Skaitymo data
Aldona Čepkėienė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

105

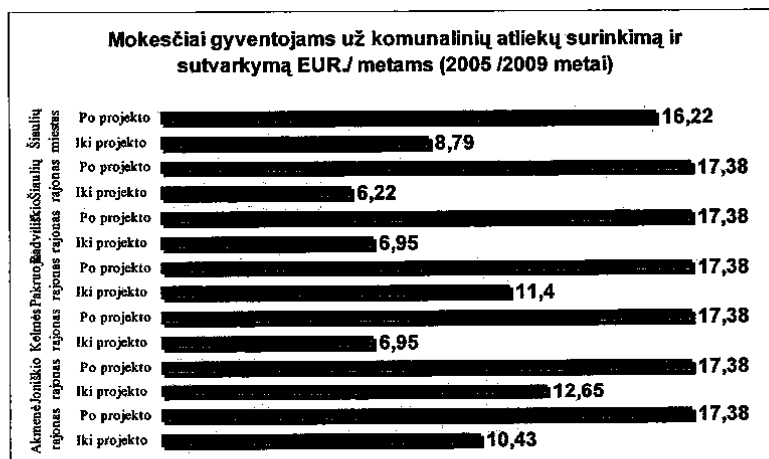


100 pav. Mokesčiai gyventojams už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą 2005-2009 m.

- Iki projekto įgyvendinimo kiekviena savivaldybė buvo atsakinga už atliekų tvarkymą savo teritorijoje. Atliekų surinkimu ir sąvartynų tvarkymu užsiėmė rajonų savivaldybių komunalinės įmonės. Nebuvo tikslios atliekų apskaitos, paslauga teikiama tik miestų ir miestelių gyventojams.

Įgyvendinus projektą, ŠRATC pradėjo pilnai įgyvendinti septynių savivaldybių priskirtas funkcijas atliekų tvarkymo srityje. Įdiegtas efektyvus komunalinių atliekų tvarkymo sistemos valdymas:

- komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas (komunalinių atliekų surinkimo kokybės kontrolė, vežėjų sutarčių administravimas, atliekų apskaita ir analizė, ir pretenzijų atliekų surinkimo klausimais nagrinėjimas);
- kitas administracinis ir finansinis valdymas: projektų įgyvendinimo priežiūra ir vykdymas, viešųjų pirkimų organizavimas, teisinių-reglamentuojančių dokumentų rengimas vadovaujantis LR teisės aktais, įstaigos dalininkų, valdybos nutarimais bei įstaigos įstatais; sutarčių su savivaldybėmis rengimas (projektų) ir administravimas, įstaigos finansinės veiklos buhalterinės apskaitos organizavimas ir atsiskaitymų su savivaldybėmis ir kitais paslaugų teikėjais kontrolė, ataskaitų ir kitų dokumentų rengimas, rinkliavos mokėtojų informavimo ir viešinimo programos įgyvendinimas;
- vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą sistemos administravimas (vietinės rinkliavos apskaita, skolų išieškojimas ir informacinė – konsultacinė veikla);
- tiesioginis gamybinės veiklos valdymas (atliekų šalinimas sąvartyne, APP ir kontenerinių aukštelių eksploatacija ir aptarnavimas, žaliųjų atliekų kompostavimas, antrinių žaliavų didžiųjų, buitinių pavojingų atliekų ir kitų specifinių atliekų tvarkymas);
- ŠRATC yra galimybė gauti aplinkosauginių projektų finansavimą, visame regione informuoti visuomenę ir centralizuotai teikti informaciją apskrities savivaldybėms, regioniniam aplinkos apsaugos departamentui, vykdyti atliekų srautų analizę, apskaitą bei kontrolę.

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T
Slytė
2009-05-08
Auditorė Gintarė



4.3.3. Naujų darbo vietų sukūrimas ir darbuotojų kompetencijos lygio augimas

Bendras išskeltų aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimas neįmanomas be kompetingų ir kvalifikuotų darbuotojų.

Iki projekto įgyvendinimo pradžios ŠRATC dirbo 9 darbuotojai, tačiau nebuvo nei vieno kvalifikuoto atliekų tvarkymo specialisto. Įgyvendinus projektą, darbuotojų kvalifikacija išaugo: 2 darbuotojai turi atliekų tvarkymo ir ekologo specialybes. Keturi (4) darbuotojai įgijo sąvartyno eksploatacijai vadovaujančio asmens kvalifikaciją, 3 darbuotojai gali vadovauti pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, šalinimo darbų vykdymui. Aštuoni (8) darbuotojai baigė pavojingų atliekų tvarkymo kursus. Du (2) darbuotojai turi pažymėjimus, kad išklausa seminaro medžiaga apie pavojingų atliekų tvarkymą.

Projekto įgyvendinimo pabaigoje iš 22 administracijos personalo darbuotojų: 15 darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų – 2 magistro laipsnį, 7 darbuotojai turi aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

Iš projekto lėšų sukurta iš esmės nauja komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra leido įgyvendinti naujų darbo vietų kūrimo uždavinius. Įkurti nauji struktūriniai padaliniai: atliekų tvarkymo ir kontrolės tarnyba; atliekų priėmimo punktų priežiūros tarnyba; Kairių sąvartyno priežiūros ir kompostavimo aikštelės tarnyba, Aukštrakių sąvartyno tarnyba. Viso sukurta daugiau kaip 70 naujų darbo vietų.

4.4. Projekto aplinkosauginis vertinimas

Atliekų tvarkymas yra viena svarbiausių aplinkos apsaugos sričių, nes reguliuoja gamybos, paskirstymo ir vartojimo produktų sąveiką su gamtine aplinka: dirvožemiu, oru, vandeniu, klimatu.

4.4.1. Regioninis sąvartynas Aukštrakiuose

Aplinkos oras

Maksimalus išmetamų teršalų kiekis neviršys leistinų koncentracijų į aplinkos orą. Aplink esantys jaunuolynai ir vidutinės brandos miškai ne tik gerai sugeria aplinkos oro teršalus, bet ir didina oro turbulentiškumą, todėl sąvartyno teršalai neskliks.


Sąvartyne šalinamos atliekos išskirs sąvartyno dujas. Sąvartyne bus įrengta susidarančių biodujų surinkimo sistema. Kiekvienoje iš numatomų įrengti sąvartyno sekcijų bus įrengta po vieną dujų emisijų matavimo tašką, kad stebint būtų galima spręsti apie esamą padėtį atskirai kiekvienoje sąvartyno sekcijoje.

Pagrindinė biodujų sudedamoji dalis – metanas. Todėl perspektyvoje numatoma susidarančias biodujas deginti ir išgauti šiluminę energiją. Surinktos dujos bus naudojamos tik uždarius visas sąvartyno sekcijas ir suformavus kaupą.

Gyventojai

Sanitarinės apsaugos zona Aukštrakių sąvartynui numatyta pagal Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygas yra 500 m pločio. Šioje zonoje gyventojų nėra. Artimiausia gyventojų sodyba

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T. Čepkionė
2009-05-08
Alžona Čepkionė



vidutiniškai už 2 km. Sąvartyno poveikis gyventojų gyvenimo sąlygoms negalimas, kadangi gyventojų pasiskirstymas teritorijoje menkas.

Vanduo

Paviršinis vanduo. Aukštųjų sąvartynas įrengtas dešiniojo Ventos intako Ringuvos baseine, apie 0,5 km į šiaurę ir šiaurės rytus praeina vandenskyra tarp Ventos ir Mūšos baseinų, Kulpės ir Ringuvos upelių takoskyroje. Apylinkėje yra daug melioracijos kanalų, kurie sujungti su šiais dviem upeliais, o Ringuvos upelis prateka vakariniu sąvartyno pakraščiu. Mažas reljefo nuolydis ir mažai vandeniui laidūs dirvožemiai nesudaro palankių paviršinio nuotėkio sąlygų, dėl to, eksploatuojant teritoriją buvo iškastas tankus sausinamųjų kanalų tinklas. Teritorijoje ir jos apylinkėse nėra ežerų. Sąvartyno teritorija melioruota – sąvartyno lietaus nuotekos (43 tūkst. m³ per metus) patenka tiesiai į melioracijos tinklą.

Priemonės mažinančios vandens teršimą:

- vykdamas paviršinio vandens monitoringą, melioracijos kanale, aukščiau ir žemiau nuotekų išleidimo vietos, periodiškai, kas trys mėnesiai, matuojama vandens cheminė tarša;
- Paviršinio vandens nuvedimas nuo aptarnavimo zonos aikštelių;

Vanduo nuo atliekų kaupio užbaigtų sandarinimo vietų nukreipiamas į griovius, įrengtus visu perimetru aplink sąvartyną. Kaupo šlaito papėdėje stovintis drenažo vanduo gali infiltruotis per molį į filtrato surinkimo sistemą. Kad šito neįvyktų, drenažo vandens surinkimui paviršiaus sandarinimo drenažiniame sluoksnyje klojamas rifliuotas PVC drenažo vamzdis su geotekstilės filtru. Magistralinė drenažo vamzdžių linija klojama aplink atliekų kaupą visu perimetru.

Gruntinis vanduo. Aukštųjų teritorijoje gruntinis vanduo slūgso moreniniame priemolyje su retais smėlio lėšiais ir tarpstuoksniais nedideliame (0-2 m) gylyje nuo žemės. Vandeningiausia paprastai yra viršutinė smėlingesnė ir plyšiuotesnė morenos dalis. Vandeningų nuogulų filtracijos koeficiento reikšmės svyruoja 0,01-0,2 m/parą ribose. Smėlio ir žvyro lėšiuose filtracijos koeficientas gali pasiekti 5-15 m/parą, tačiau dugninėje morenoje jų pasitaiko labai retai. Gruntinio vandens tėkmė orientuota pietryčių kryptimi.

Sąvartyno teritorijos centrinėje, vakarinėje ir pietinėje dalyse gruntinį vandenį talpina moreninis priesmėlis, o rytinėje ir šiaurės rytinėje dalyse fluvio-glacialinis aleuritingas smėlis ir iš dalies moreninis priesmėlis. Gruntinis vanduo atiteka iš šiaurės rytų ir rytinės pusės ir juda pietų kryptimi. Kadangi sąvartyno dauba, kurioje bus pilamos atliekos, yra įgilinta žemiau gruntinio vandens lygio, tikėtina, kad dalis atitekančio gruntinio vandens bandys aplenkti sąvartyno masyvą.

Pirmasis tarpmoreninis vandeningasis sluoksnis sąvartyno teritorijoje ir į rytus nuo jos, slūgso 15-20 m gylyje nuo žemės paviršiaus.

Priemonės mažinančios vandens teršimą:

Atsižvelgus į Aukštųjų sąvartyno teritorijos geologines ir hidrologines sąlygas, gruntinio vandens slūgsojimo gylį, vandenį talpinančias nuogulas bei požeminio vandens tekėjimo kryptį, monitoringo tinklas įrengtas iš 4 gręžinių.

Požeminio vandens monitoringo darbams vykdomas pagal suderintą su Lietuvos geologijos tarnyba programą. Pagrindiniai monitoringo darbai:



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

Skaitmeninis
T

Alina Čepkienė


2009-05-08



- gruntinio lygio vandens matavimai;
- gruntinio vandens fizinių-cheminių parametru matavimai;
- vandens cheminės sudėties tyrimai;
- surinktų duomenų įvertinimas.

Įvertinus 2007-2008 m. monitorinio tyrimų duomenis, požeminio vandens būklė sąvartyno teritorijoje yra gera. Nei vieno rodiklio vertė neviršijo norminiuose dokumentuose nustatytų Didžiausią leistiną koncentraciją. Sąvartyno teritorija parinkta atsižvelgiant į geologinių tyrinėjimų išvadas, todėl paviršinis ir požeminis vanduo nepatenka į sąvartyno kaupus.

Dėl sąvartyne iškrentančių kritulių ir atliekų degradacijos susidaro filtratas. Pagrindinę jo dalį sudaro atmosferiniai krituliai, besifiltruojantys per atliekas. Sąvartyno teritorijoje esančio gruntinio vandens apsauga bus užtikrinta įrengiant storą ir itin nelaidų skysčiams pagrindą, ant kurio papildomai išvedžiotas filtrato surinkimo vamzdynas:

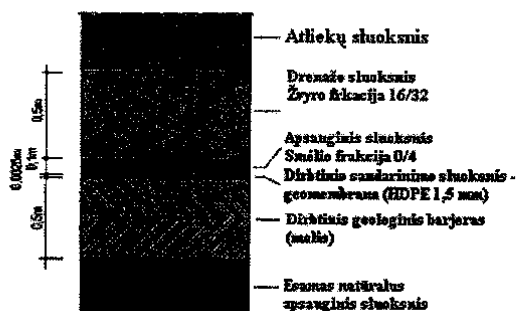


101 pav. Aukštrakių sąvartyno dugno konstrukcija

Filtratas surenkamas drenažiniame sluoksnyje paklotuose polietilenuose drenažo vamzdynuose kaupio pagrindo sandarinimo apačioje, išilgai sąvartyno perimetro. Drenažiniais vamzdžiais surinktas filtratas nukreipiamas į filtrato siurblyną, iš kurios pumpuojamas į filtrato sukupimo rezervuarą. Nevalyto filtrato cheminė sudėtis tiriama vykdant monitoringą – kartą per metus imant mėginius tyrimams.

Filtratas valomas atvirkštinės osmosės (AO) būdu. Atvirkštinės osmosės membrana sulaiko bei atskiria ištirpusias organines ir neorganines medžiagas bei sukonzentruoja jas į liekaną (koncentratą), tuo metu kai vandens molekulės yra praleidžiamos pro membraną. Vanduo praėjęs pro membraną yra visiškai švarus. Proceso išdavoje gaunami du produktai – visiškai švarus vanduo (75-95 proc.) ir sukonzentruotos nuotekose ištirpusios cheminės priemaišos – liekana (5-25 proc.) – koncentratas, kuris grąžinamas į sąvartyno kaupą.

Išvalytos nuotekos atitinka LAND 10 - 96 "Nuotėkų užterštumo normos" reikalavimus išleidžiamos į gamtinę aplinką – į sąvartyno apsauginį griovį. Išvalyto iki leistinų koncentracijų filtrato, išleidžiamo į gamtinę aplinką, cheminė sudėtis kontroliuojama kas tris mėnesius, imant mėginius vandens cheminiams parametrų iširti.

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T I S T I
Sąjaukė
2009-05-08
Aldona Čepelienė



Dirvožemis

Įrengtas sąvartynas pagal ES direktyvų reikalavimus poveikio dirvožemiui nedarys. Įrengiant sąvartyną iškasus kaupo dugną iki reikiamos altitudės, natūralus pagrindo gruntas 500 mm storio sluoksnis gerai sutankintas, jo laidumas vandeniui mažesnis nei 1×10^{-6} m/s. Po grunto tankinimo kyšantys aštresni akmenys visi iki vieno pašalinti prieš klojant geotekstilę.

Kad paviršiniai lietaus ir tirpsmo vandenys nepatektų į filtrato formavimosi zoną, drenažiniame sluoksnyje pastatytos diafragmos iš geomembranos. Diafragmos padalina kaupą skersai ties kontroliniais šuliniais. Šuliniuose vamzdis uždaromas plastmasiniu kamščiu. Pritekantis į šulinį neužterštas vanduo iš šulinio pašalinamas drenažiniu siurbliu.

Statybų metu nukastas dirvožemis sandėliuojamas dirvožemio saugojimo aikštelėje ir panaudojamas atliekų sluoksnių perpylimui, taip pat sąvartyno sekcijų laikinam perdengimui.

Biologinė įvairovė

Augalija

Aukštrakių teritorijoje išskiriami biotipai:

- miškai: auga pakaitinis baltalksnynas, 30–40 metų amžiaus, vyrauja 60–70 metų eglynai su beržų, drebulių priemaiša.
- pievos: miško pakraščių ir laukymų ekotoninės bendrijos, pagal grunto savybes – kalcitrofinės-durpyninės pievos.

Naudojamų augalų rūšių ištekliai statant sąvartyną nėra reikšmingi. Įrengiant sąvartyną miškingumo pokyčiai būtų nereikšmingi, neigiamas poveikis gali atsirasti tik sutrikus filtrato surinkimo sistemai. Aukštrakių sąvartyno ribose arti nėra saugomų teritorijų ir objektų.

Gyvūnija


Aukštrakių apylinkėse aptiktos tokios foninės dažnos paukščių rūšys: kikelis, liepsnelė, juodasis strazdas, smilginis strazdas, kareitaitė, mažoji musinukė. Plėšriesiems ir uoksiniams miško paukščiams teritorijoje tinkamų perėjimo vietų nėra. Elniniams žvėrimis ir šernams, gyvenantiems gretimose teritorijose (Gubernijos miške) sąvartynui skirti plotai, kaip veisimosi ir žiemojimo biotipai, neturi didesnės reikšmės. Suprojektuotas sąvartynas stuburinių gyvūnų faunai, gyvenančiai šiame rajone, jokios išskirtinės vertės neturi.

Apsaugos priemonės. Siekiant išvengti atsitiktinio gyvūnų patekimo į sąvartyną, teritorija aptverta metaliniu tinklu. Tinklo aukštis 1,8 m. Virš tinklo ištemptos trys eilės spygliuotos vielos. Bendras tvoros aukštis – 2,5 m. Nuo graužikų, vabzdžių ir paukščių apsisaugojama atliekas pilant ir sklaidant nedideliuose 20 x 25 m ploteliuose, jas stipriai sutankinant kompaktoriais ir užpilant gruntu.

Lentelė Nr. 45. Aplinkosauginės priemonės

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija	Nuoroda į ES teisės aktus	Technologija	Reikalavimai teisės aktuose	Atitikimas

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



Skaitmeninis
2009-05-08
Aukona Čepėlienė

110



1.	Dirvožemio ir gruntinio vandens apsauga	Sąvartynų direktyva 1999/31/EB	Nelaidus mineralinis sluoksnis	Filtracijos koeficientas ne didesnis kaip 10^{-9} m/s, storis ne mažiau kaip 1 m.	Filtracijos koeficientas mažesnis kaip 10^{-9} m/s, storis 1 m.
2.	Paviršinių vandenų apsauga	Sąvartynų direktyva 1999/31/EB	Filtrato surinkimo sistema	Susidedanti iš izoliacinės membranos ir ne mažesnio kaip 0,5 m storio drenažo sluoksnio	Susidedanti iš izoliacinės membranos ir 0,5 m storio drenažo sluoksnio
3.	Atmosferos apsauga	Sąvartynų direktyva 1999/31/EB	Biodujų surinkimas	Turi būti surenkamos ir panaudojamos arba sudeginamos	Bus įrengta surinkimo sistema ir biodujos bus deginamos
4.	I sąvartyną patenkančių atliekų tyrimas ir priėmimas	Sąvartynų direktyva 1999/31/EB	Atliekų apibūdinimas	Atliekų tyrimas atliekamas lyginimais	Atliekų atitikties testas

4.4.2. Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas

Uždaryti mažieji kaimų sąvartynai neatitiko jokių aplinkosaugos reikalavimų. Juose nebuvo jokių inžinerinių įrenginių, nebuvo surenkamas filtratas. Nors juose buvo šalinamos daugiausia buitinės atliekos, atliekų šalinimas juose nebuvo kontroliuojamas, nebuvo vedama šalinamų atliekų apskaita. Tai kėlė grėsmę aplinkai. Vienas svarbiausių kriterijų – apsaugoti nuo kenksmingų medžiagų paviršinius ir gruntinius vandenis.

113 mažųjų sąvartynų-šiukšlynų sutvarkyta naudojant uždengimo būdą ir 3 sąvartynai – naudojant išvežimo būdą.

Tvarkant uždengimo būdu, atliekos sustumtos į vieną plotą, atliekos sutankintos, suformuotas optimalios formos nuožulniais šlaitais kaupas. Kaupas uždengtas mažiausiai 0,5 m storio grunto sluoksniu. Sąvartyno uždengiamojo sluoksnio apsaugai nuo erozijos viršutinis dirvožemio sluoksnis užsėtas žole. Išspręsta paviršinių nuotekų nuvedimo sistema. Prie įvažiavimo į buvusius šiukšlynus pastatyti atliekas pilti draudžiantys ženklai.


Tvarkant išvežimo būdu, visos atliekos iš šiukšlynų teritorijos išvežtos, o teritorija išplaniruota ir užsėta žole. Prie buvusių įvažiavimo kelių taip pat pastatyti įspėjamieji ženklai, jog atliekas pilti draudžiama.

116 šiukšlynų Šiaulių apskrityje uždarymas leido sustabdyti nekontroliuojamą atsikratymą atliekomis, o jų sutvarkymas – sustabdyti šių šiukšlynų į aplinką skleidžiamą taršą.

4.4.3. Bendro naudojimo konteinerinių aikštelių įrengimas

Bendro naudojimo konteinerinių aikštelių tinklas įrengtas vietoje uždarytų kaimo sąvartynų. Tai pagerino bendrą atliekų surinkimo tvarką ir estetinį vaizdą, paspartino atliekų išvežimą. Aikštelės įrengtos miestų vietovėse (didesnio tankumo gyvenamosiose teritorijose ir padidinto žmonių susibūrimo vietose) bei didesnėse kaimo gyvenvietėse.

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T. 2009-05-08
Aliona Čiuplajienė

2009-05-08



Bendro naudojimo konteinerinėse aikštelėse pastatyti antrinėms žaliavoms surinkti skirti konteineriai, kuriose bus surenkamos perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos iš bendro atliekų srauto. Apie 90 procentų buityje susidarančių atliekų, jas perdirbus, galima dar kartą panaudoti. Rūšiuojant atliekas bus ne tik prailgintas naujojo Šiaulių regiono sąvartyno eksploatacijos laikas, bet ir bus tausojami gamtos ištekliai ir energija, saugoma šviri ir sveika aplinka.

4.4.4. Atliekų priėmimo punktų įrengimas

Atliekų priėmimo punktų paskirtis – užtikrinti antrinių žaliavų, biodegraduojančių ir kitų atliekų surinkimą ir tvarkymą uždarytų sąvartynų aptarnavimo zonoje. Neigiamo poveikio gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai bei gyventojų sveikatai nebus, išlaikoma 50 m sanitarinė apsaugos zona. Lietaus vandens nuotekos nuo asfaltuotos aikštelės nuvedamas į aplinką, nes tai nėra teršalų šaltinis.

Oro tarša neviršija leistinų normų. Sąlygų dirvožemio erozijai nėra. Pagrindinis poveikio aplinkai mažinimo veiksnys – pavyzdinga šių punktų eksploatacinė priežiūra ir savalaikis atliekų išvežimas.

4.4.5. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė

Vanduo

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė įrengta su 10 cm asfaltbetonio danga, todėl persifiltravusio, užteršto vandens patekimas į gilesnius dirvožemio sluoksnius negalimas.

Paviršinis ir iš komposto išsisunkiantis vanduo surenkamas į gelžbetoninius latakus, o iš jų išleidžiamas į Kairių sąvartyno rytinės pašlaitės filtrato drenažą, iš kurio slėgine linija paduodamas į esamą pirminio filtrato apvalymo baseiną.

Dirvožemis

Nuo statybos vietos humusingas dirvožemis nukastas ir gražintas ant šlaitų, perteklius paskleistas aplinkoje. Pylimo šlaitai ir darbų zona, gražinus humusingą gruntą, apsėti daugiametėmis žolėmis.

Kraštovaizdis

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė nekeičia esamo kraštovaizdžio, nes įkurta šalia Kairių sąvartyno. Aikštelės teritorija aptverta, suformuoti žalieji plotai.


4.4.6. Kairių sąvartynas

Aplinkos oras

Esamame sąvartyne yra du aplinkos taršiniai: sąvartynas – kaip organizuotos taršos šaltinis, būsimas sąvartyno biodujų utilizavimo (panaudojimo) įrenginys. Kadangi sąvartynas bus uždengiamas, tai ateityje dujų sklaidimas per paviršių nenumatomas (arba jis nežymus) – biodujos kaupsis sąvartyno kaupo viduje, bus surenkamos per įrengtus biodujų ištraukimo šulinius, ir, galų gale, sukūrenamos dujų jėgainėje ar gaunama elektros energija.

Bus vykdomas sąvartyno dujų ir jų degimo produktų monitoringas.

Dirvožemis



Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita

2009-05-08
Audona Čepkelytė



Pačiame esamo sąvartyno sklype augalinio dirvožemio praktiškai nėra, kadangi teritorijoje kaupiamos šiukšlės. Kai kur likęs augalinis dirvožemis yra velėninis glėjiškai nujaurėjęs, t.y. Lietuvos teritorijai būdingas dirvožemis.

Apibendrinus atliktus tyrimus daroma išvada, kad sąvartyno apylinkių dirvožemyje kaupiasi su paviršiniu ir gruntiniu vandeniu iš sąvartyno išnešamas švinas, cinkas, šiek tiek vanadis, nikelis, litis. Po 2002 m. avarijos, su išsiliejusiu filtratu į užlietus dirvožemius pateko dideli azoto junginių kiekiai, šiek tiek cinko, švino, chromo.

Pirmame etape atliekų kaupimas uždengtas moliniu sutankintu gruntu ir juodžemio sluoksniu, bei apsėtos žolės atliekų kaupimo rytinė ir šiaurinė dalys. Įrengtos lietaus vandens ir paviršinių nuotekų nuvedimo nuo atliekų kaupimo sistemos. Kairių sąvartyno uždarymo I etapo darbai užbaigti 2008 m. birželio mėn.

Iš patvirtintų 2007-2013 m. ES paramos lėšų, Kairių sąvartyno uždarymo II etape numatoma užbaigti kaupimo pilno uždengimo darbus ir pastatyti filtrato valymo įrenginius. Įgyvendinus projektą sumažės gruntinio vandens ir dirvožemio tarša ir neigiamas poveikis žmonių sveikatai. Galutinai uždarius Šiaulių regiono Kairių sąvartyną, jo teritorijoje VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdys aplinkos monitoringą (filtrato debito ir sudėties, paviršinio vandens, dujų emisijos). Patirtos sąnaudos bus padengiamos iš vietinės rinkliavos įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą.

Žemės gelmės

Naudingų iškasenų požiūriu esamas sąvartynas nėra naudingas. Esamo sąvartyno teritorijoje ir jos apylinkėse saugomų geologinių objektų nėra. Žemės gelmių užterštumo kontrolei sąvartyne ir artimiausiose jo apylinkėse yra įrengta aplinkos monitoringo sistema, apimanti gruntinio vandens, paviršinio vandens, filtrato stebėjimą.

Biologinė įvairovė

Kairių sąvartyno apylinkėse augalijos biotipai yra dirbamos žemės laukai ir pievos. Kadangi sąvartynas buvo eksploatuojamas 40 metų, tikėtina, kad joje jau susiformavo sąvartynams būdinga gyvūnijos populiacija. Šioje teritorijoje jau išplito graužikai bei parazitiniai vabzdžiai, taip pat varnių bei kirų šeimos paukščiai.


Sąvartyno uždarymas neišvengiamai įtakos rudagalvių kirų kolonijos sumažėjimą. Kadangi Europos Bendrijos svarbos ir kitos saugomos teritorijos yra nutolusios vidutiniškai apie 9,4 km nuo sąvartyno, sąvartynas įtakos biologinei įvairovei nedaro.

Kraštovaizdis

Teritorijos kraštovaizdį sudaro ariamos žemės plotai, pavienės gyvenamosios sodybos. Artimiausias gyvenamas namas (Kairių miestelis) yra už maždaug 1 km į rytus nuo sąvartyno sklypo. Artimiausia sąvartynui saugoma gamtinė teritorija yra už 3 km į pietvakarius esantis Rėkyvos draustinis, apie 5,8 km į šiaurės vakarus nuo sąvartyno yra Gubernijos miškas, apie 15 km į vakarus nuo sąvartyno yra Bulėnai ir apie 13,8 km – Paraudžių miškas.

Esamas sąvartyno uždarymas iš esmės pakeis esamą gamtovaizdį, t.y. vietoj netvarkingai eksploatuojamo sąvartyno po uždarymo bus tik tvarkingai grunto sluoksniais užpildintas ir apželdintas atliekų kaupimas. Uždarytas sąvartynas ženkliai pagerins sąvartyno apylinkių kraštovaizdžio estetinius

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



Alina Čepklienė

2009-05-08



ištekliaus. Po sąvartyno uždengimo numatoma uždengtą sąvartyną apsėti daugiametėmis žolėmis ir velėnuoti.

Sąvartyno sanitarinė apsaugos zona


Kairių sąvartynui yra privaloma 500 m pločio sanitarinė apsaugos zona. Remiantis 2004 m. parengtu Šiaulių miesto Kairių buitinių atliekų sąvartyno bei žalių atliekų kompostavimo aikštelės detalioju planu, po uždarymo sąvartyno rekultivacijos SAZ planuojama bus 200 m; po 5 metų kontrolinio periodo SAZ turėtų sumažėti iki 50 m, o po 10 metų kontrolinio periodo SAZ turėtų atitikti sklypo ribas, t.y. bus lygi 0 m.

Vanduo

Esamo sąvartyno apylinkėse didžiausi paviršinio vandens telkiniai yra Švedės tvenkinys, esantis 1,8 km atstumu į vakarus. Artimiausias paviršinio vandens telkinys esamo sąvartyno teritorijoje yra supantys Kairių sąvartyno pakraščius melioraciniai grioviai. Teršiantis sąvartyno poveikis pastebimas visuose paviršinio vandens tyrimo vietose. Gruntinis vanduo slūgso kelių metrų gylyje, o vietomis visai prie žemės paviršiaus. Sąvartynas įrengtas pažemėjime, todėl iš apylinkių atitekantis gruntinis vanduo surenka teršiančias medžiagas ir neša Švedės tvenkinio link.

Uždarius sąvartyną paviršinis vanduo nuo atliekų kaupio bus nuvedamas į melioracijos griovius, tokiu būdu sumažės susidarančio filtrato kiekis.

Siekiant išvengti taršos į požeminį vandenį, sąvartyno filtrato surinkimui įrengtos filtrato drenos, kurios nuves filtratą į surinkimo šulinius ir iš jų /į filtrato siurbines – iš kurių filtratas slėgimine linija bus parduodamas į vietinius pirminio valymo įrenginius.



T I L S A
Sąjunga
Aldona Čepkėlienė

2009-05-08



5. Poveikio aplinkai vertinimo aspektai pagal atskirus projekto komponentus

5.1. Vertinimo nuostatos

Poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu.

5.1.1. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas Aukšttrakiuose

Regioninio sąvartyno statybai bei eksploatacijai pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalavimus, turėjo būti paruošta poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita.

2000 m. birželio 23 d. patvirtinta (*Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2001 m. vasario 5 d. pateikė išvadą Nr. 3, dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių pasekmių poveikio aplinkai požiūriu*) Geografijos instituto parengta projekto „Šiaulių apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Šiaulių regioninio sąvartyno statyba“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Joje pateikta planuotos ūkinės veiklos ir projektuoto objekto (regioninio sąvartyno) bei jo gretimybių aplinkosauginis įvertinimas. Pateiktos rekomendacijos, į kokias aplinkos savybes ir ūkinės veiklos aspektus būtina atkreipti ypatingą dėmesį, kad nebūtų pažeista teritorijos ekologinė pusiausvyra ir sukelta katastrofinių bei pavojingų situacijų žmogui.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita paruošta remiantis planuota kurti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistema, regiono gamtinėmis sąlygomis bei socialiniais ir ūkiniais aspektais, glaudžiai susijusiais su planuota ūkine veikla.

5.1.2. Atliekų priėmimo punktai

Atliekų priėmimo punktai – taršos aspektu objektai nekenksmingi ir nepatenka į saugomas teritorijas, nebuvo vykdomas medžių kirtimas, nepakeistos reljefo formos, todėl poveikis gamtosauginiui požiūriu – nežymus. Dirvožemio taršos ir jo erozijos veikla nesukelia.

Vadovaujantis LR AM 2005-12-30 įsakymu Nr. D1-665 Šiaulių RAAD buvo pateikta informacija atrankai dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo. Gautos išvados:

Lentelė Nr. 46. Atliekų priėmimo punktų poveikio aplinkai vertinimas

Rajonas	Išvados
Akmenės rajonas	– 2004-06-28 Nr. 24 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui N.Akmenės mieste – PAV neprivalomas. – 2004-06-28 Nr. 23 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Kruopių seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-28 Nr. 25 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Akmenės seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-15 Nr. 37 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



Skaitmeninis
2009-05-08


2009-05-08
Aldona Čepičienė

115



	privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Ventos seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 49 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Papilės seniūnijoje – PAV neprivalomas.
Kelmės rajonas	– 2004-06-29 Nr. 29 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Raseinių g. 70a, Kelmės mieste – PAV neprivalomas. – 2004-06-29 Nr. 30 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Užvenčio miestelyje Kelmės rajone – PAV neprivalomas. – 2004-06-31 Nr. 31 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Kražių seniūnijoje Kelmės rajone – PAV neprivalomas. – 2004-06-29 Nr. 32 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Tytuvėnų seniūnijoje, Kelmės rajone – PAV neprivalomas.
Joniškio rajonas	– 2004-06-29 Nr. 26 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Kriukų mstl., Kriukų seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-29 Nr. 27 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Skaistgirio mstl., Skaistgirio sen., Joniškio rajone – PAV neprivalomas. – 2004-06-29 Nr. 28 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Želgaikių km., Žagarės sen., Joniškio rajone – PAV neprivalomas. – 2004-06-29 Nr. 33 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Bariūnų km., Kepalių sen., Joniškio rajone – PAV neprivalomas.
Pakruojo rajonas	– 2004-06-13 Nr. 13 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Žeimelio seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-28 Nr. 14 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Lygumų seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-28 Nr. 15 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Rozalimo seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-28 Nr. 16 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Klovainių seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-28 Nr. 17 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Pakruojo mieste – PAV neprivalomas.
Radviliškio rajonas	– 2004-06-28 Nr. 20 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Polekėlės seniūnijoje – PAV

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



2009-05-08


Aliona Čepelienė

116



	neprivalomas. – 2004-06-28 Nr.21 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Šeduvos seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-28 Nr.22 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Šiaulėnų seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-28 Nr.19 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Grinkiškio seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-06-29 Nr.34 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo Radviliškio rajoninio atliekų priėmimo punkto įrengimui Žironų kaime – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr.48 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Baisogalos seniūnijoje – PAV neprivalomas.
Šiaulių rajonas	– 2004-07-15 Nr. 38 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Meškiūčių seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-15 Nr. 39 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Kuršėnų mieste – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 40 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Ginkūnų seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 41 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Bubių seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 42 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Voveriškių seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 43 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Gruzdžių seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 44 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Kairių seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 45 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Šakynos seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 46 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Kužių seniūnijoje – PAV neprivalomas. – 2004-07-16 Nr. 47 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo atliekų priėmimo punkto įrengimui Raudėnų seniūnijoje – PAV neprivalomas.

Projekto Nr. 2001/LT46/R/PE/008 Galutinė ataskaita



Sąlygos:

Alicija Čepelienė

2009-05-08



5.1.3. Kairių sąvartyno uždarymo I-etapas

2001 m. buvo atlikta atranka Šiaulių apskrities atliekų tvarkymo sistemos Galimybių studijos apimtyje. Išvada: Kairių sąvartyno uždarymui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.


2001 m. gruodžio 7 d. LR AM ŠRAAD atrankos išvadoje dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo argumentavo, kad „Atsižvelgus į tai, kad aspektai sąlygojantys poveikį aplinkai yra aktualūs, tačiau sąvartynas yra esamas, o planuojama veikla apima jo sutvarkymą baigiamajam eksploatavimo etapui ir uždarymą, o taip pat bus numatomos visos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, privalomo poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia“.

5.1.4. Mažųjų sąvartynų uždarymas ir kontenerinių aikštelių įrengimas

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo – neprivaloma.

5.1.5. Kompostavimo aikštelės įrengimas Kairiuose

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir 2001 m. gruodžio 7 d. LR AM ŠRAAD pateikta atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomojo vertinimo, kurioje kompostavimo aikštelės įrengimo Kairiuose atranka atlikta kartu su Kairių sąvartyno uždarymo atranka, pateikta išvada, kad Kompostavimo aikštelės įrengimui Kairiuose poveikio aplinkai vertinimas – neprivalomas.



T 111
Sąlygos

Aldona Čepičienė

2009-05-08

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



6. Projekto viešinimas

Visuomenės aplinkosaugos švietimas ir informavimas – vienas iš svarbiausių aplinkos apsaugos uždavinių ir pagrindinių visuomenės dalyvavimo realizuojant aplinkos apsaugos tikslus garantų. Atsižvelgiant į visuomenės grupes, jų poreikius ir veiklos pobūdį, Šiaulių regione skiriamos šios prioritetinės visuomenės aplinkosaugos švietimo kryptys:

- Vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ugdymas;
- Nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginės veiklos rėmimas;
- Įvairių profesinių grupių žmonių švietimas ir kvalifikacijos kėlimas;
- Visuomenės švietimas ir informavimas.


6.1. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamo projekto viešinimas

Projekto įgyvendinimo metu periodiškai buvo skelbiama informacija apie ES SF finansuojamo projekto įgyvendinimą. 47 lentelėje pateikiamas įvykdytų priemonių sąrašas.

Lentelė Nr. 47. Viešinimas

Priemonė	Įgyvendinimo data	Nuorodos/informacijos šaltiniai
Internetas (www.sratc.lt)	Nuolat (paskutinis atnaujinimas 2009 m. sausio 28 d.)	Bendra informacija apie VšĮ SRATC įgyvendinamą projektą „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (1 lapas).
	2005 m. spalį (atnaujinta 2006 m. gruodį)	Informacija „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė“ (1 lapas).
	2006 m. gruodį	Informacija „Atliekų priėmimo punktai“ (2 lapai).
	2007 m. vasario 28 d. (atnaujinta 2007 m. birželį)	Informacija „Aukštųjų sąvartynas“ (6 lapai).
	2007 m. gruodį	Informacija „Bendro naudojimo konteinerinės aikštelės“ (4 lapai).
	2008 m. birželį	Informacija „Privažiavimo kelio į naująjį Aukštųjų sąvartyną I etapo II eilės statybą“ (žr. III priedą, 1 lapas), „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymas“ (žr. III priedą, 2 lapai) ir „Kairių sąvartyno uždarymo I-asis etapas“ (5 lapai).
	2008 m. spalį	www.sratc.lt paskelbta informacija „Atliekų tvarkymo įrangos įsigijimas“ (2 lapai).
Pranešimai žiniasklaidai	2007 m. gruodžio 29 d.	Pranešimas „Projektas bus baigtas įgyvendinti kitąmet“ (2 lapai).
	2008 m. sausio 14 d.	Pranešimas „Naujos investicijos į atliekų tvarkymo sistemą“ (2 lapai).
	2008 m. gruodžio 30 d.	Pranešimas „Projektas baigtas, darbai tęsiami“ (3 lapai).
Informaciniai stendai	2004 m. liepą** (Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose, sutarties Nr. A/2004/S02)	Informacinis stendas, pastatytas prie įvažiavimo į Kairių sąvartyną (žr. 105 pav.).
	2005 m. liepą** (Naujo regioninio sąvartyno Aukštirakiuose statyba, sutarties Nr. A/2005/S05)	Informacinis stendas, pastatytas prie įvažiavimo į statomus objektus (žr. 102 pav.).

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T
Skaitymas
Aukšta Čepkijienė

2009-05-08

119



	2005 m. liepą** (Atliekų priėmimo punktų statyba, sutarties Nr. A/2005/S04)	Informaciniai standai (žr. 107-113 pav.), pastatyti šalia 34 atliekų priėmimo punktų.
	2005 m. gruodį** (Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų uždarymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas, sutarties Nr. A/2005/S10)	16 informacinių standų pastatyti prie įvažiavimų į savivaldybes (4 – Šiaulių miesto savivaldybėje ir po 2 – šešių rajonų savivaldybėse).
	2006 m. gegužę** (Kairių sąvartyno uždarymo I-etapas, sutarties Nr. A/2006/S13)	Informacinis stendas, pastatytas prie įvažiavimo į Kairių sąvartyną (žr. 104 pav.).
	2006 m. rugsėjį** (Privaziavimo kelio į naująjį Aukštrakių sąvartyną statyba, sutarties Nr. A/2006/S15)	Informacinis stendas, pastatytas šalia privažiavimo kelio (žr. 103 pav.).
Atminimo lentos	2005 m. liepą** (Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose, sutarties Nr. A/2004/S02)	Atminimo lenta pastatyta prie įvažiavimo į Kairių kompostavimo aikštelę (žr. 118 pav.).
	2008 m. vasarį (Naujo regioninio sąvartyno Aukštrakiuose statyba, sutarties Nr. A/2005/S05)	Atminimo lenta įrengta ant administracinio pastato Aukštrakių sąvartyne (žr. 114 pav.).
	2008 m. gegužę (Mažųjų sąvartynų-šiukšlynų uždarymas ir konteinerinių aikštelių įrengimas, sutarties Nr. A/2005/S10)	Atminimo lentos įrengtos prie uždarytų 16 mažųjų sąvartynų-šiukšlynų visoje Šiaulių apskrityje (žr. 115 pav.).
	2008 m. birželį (Kairių sąvartyno uždarymo I-etapas, sutarties Nr. A/2006/S13)	Atminimo lenta pastatyta prie kelio, važiuojant į Kairių sąvartyną (žr. 116 pav.).
	2007 m. gegužę (Privaziavimo kelio į naująjį Aukštrakių sąvartyną statyba, sutarties Nr. A/2006/S15)	Atminimo lenta pastatyta šalia privažiavimo kelio į Aukštrakių sąvartyną.
Papildomos priemonės	2007 m. sausį** (Atliekų priėmimo punktų statyba, sutarties Nr. A/2005/S04)	Lentos pastatytos prie įrengtų 34 atliekų priėmimo punktų (žr. 117 pav.).
	2008 m. gegužę	Informacinės lentos prie uždarytų mažųjų sąvartynų-šiukšlynų (žr. 106 pav.).

* – publikacijų kopijos pateikiamos ataskaitos III priede.

** – vadovaujantis 2004 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 621/2004.




2009-05-08
Alicija Čepičienė

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


120




Informacinės objektų lentos

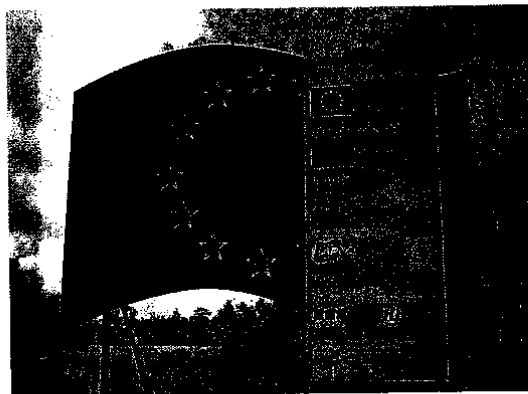

102 pav. Informacinė lenta prie Aukštakių sąvartyno statybos laikotarpiu




103 pav. Informacinis stendas šalia privažiavimo kelio į Aukštakių sąvartyną



104 pav. Informacinis stendas prie Kairių sąvartyno

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita




Sivynatė Čepėlienė

2009-05-08

Aliona Čepėlienė

121



105 pav. Informacinis stendas prie žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje Kairiuose




106 pav. Informacinis stendas prie mažųjų sąvartynų-šiukšlynų



107 pav. Informacinis stendas prie Baisogalos atliekų priėmimo punkto


Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita




Skyriaus vadovė
 Alena Čepėlienė

2009-05-08


122

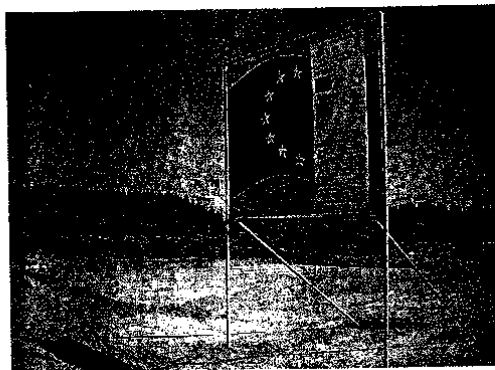


108 pav. Informacinis stendas prie Grinkiškio atliekų priėmimo punkto

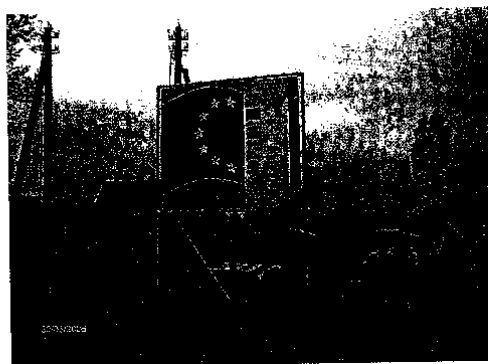

109 pav. Informacinis stendas prie Ginkūnų atliekų priėmimo punkto

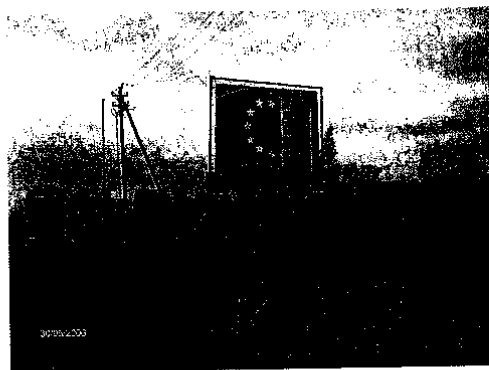

110 pav. Informacinis stendas prie Meškuičių atliekų priėmimo punkto




Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


T. Skirius
 Audona Čepkijienė

2009-05-08


123

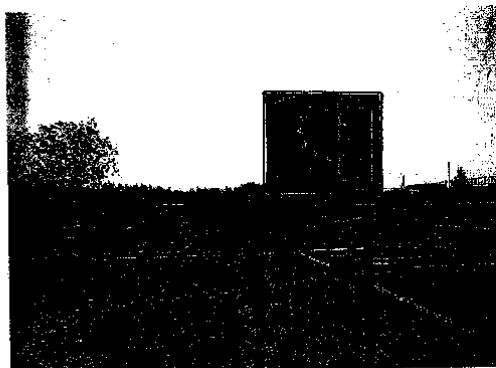

111 pav. Informacinis stendas prie Kelmės atliekų priėmimo punkto




112 pav. Informacinis stendas prie Klovainių atliekų priėmimo punkto

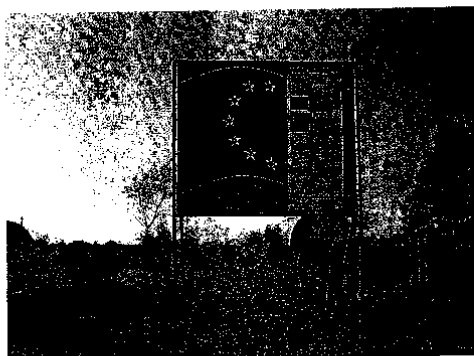

113 pav. Informacinis stendas prie Rozalimo atliekų priėmimo punkto

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita


Sveikatos apsaugos
ministerijos
Atstovė
A. Čepaitienė

2009-05-08


124



Atminimo lentos

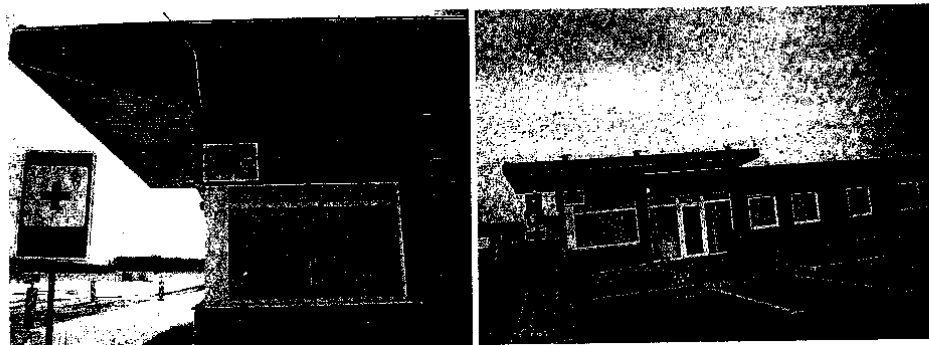


114 pav. Atminimo lenta Aukštakių sąvartyne, pakabinta ant administracinio pastato.

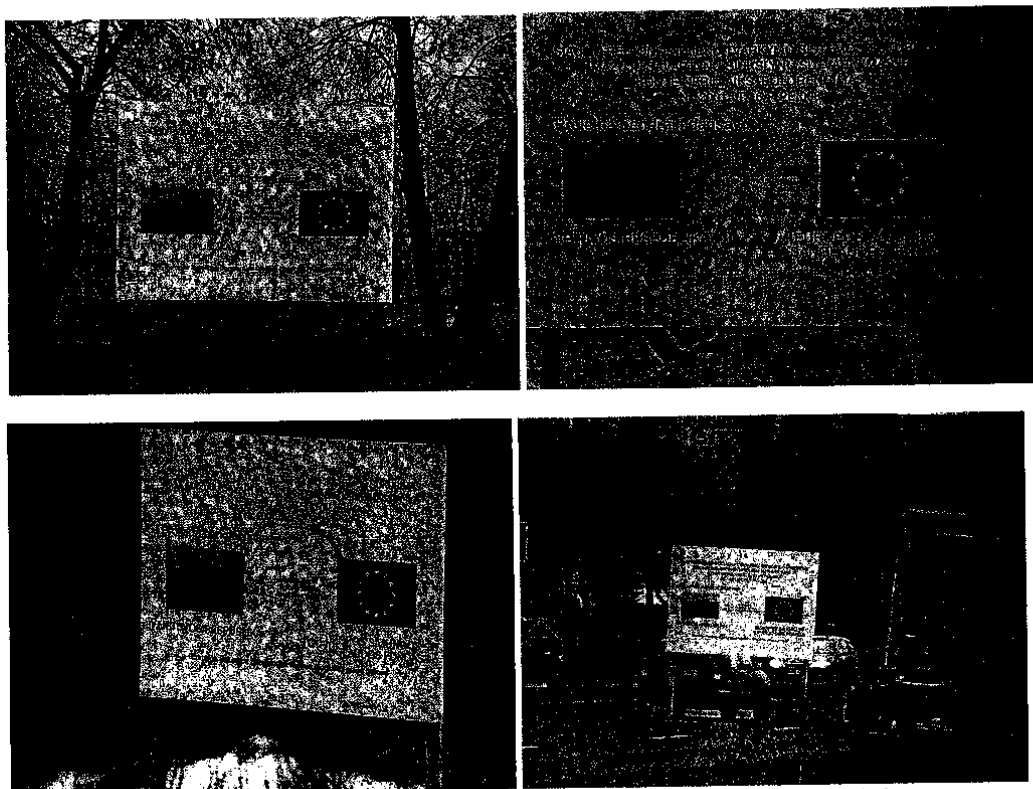

115 pav. Atminimo lentų pavyzdžiai prie uždarytų mažųjų sąvartynų-šiukšlynų

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita







T. 115-05-08
 Skyrėdavo
 2009-05-08
 Aliona Cepklienė


125



116 pav. Atminimo lenta prie Kairių sąvartyno

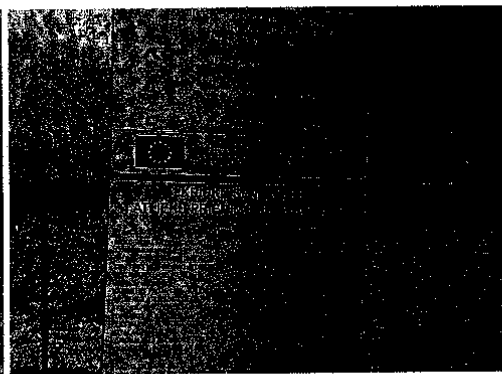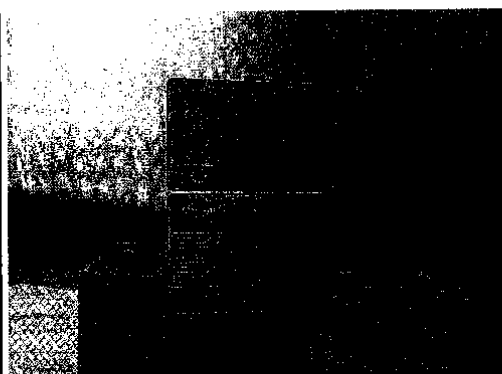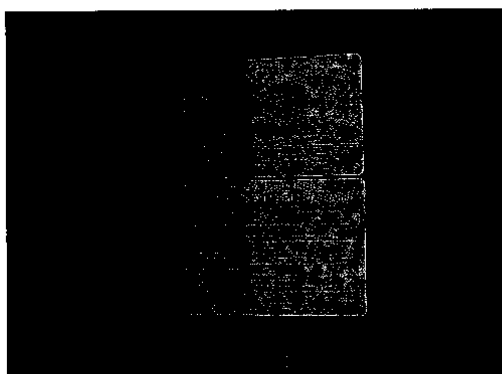

Projekto Nr. 2001/LT/16/R/PE/008-Galutinė ataskaita




Sąlydinti

Aliona Čepelienė

2009-05-08

126

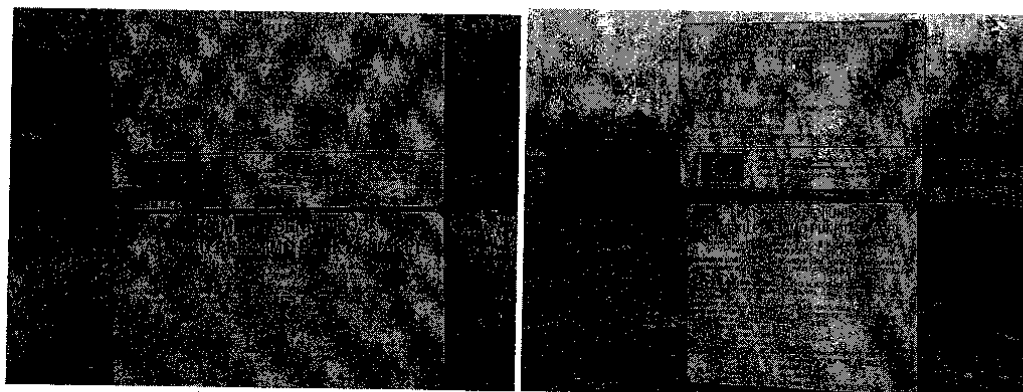

117 pav. Atminimo lentų pavyzdžiai prie atliekų priėmimo punktų




118 pav. Atminimo lenta prie žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Šiauliuose

6.2. BPD finansuojamas projektas orientuotas į kuriamos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos viešinimą

Tam, kad Šiaulių regione būtų įgyvendinta vieninga komunalinių atliekų tvarkymo sistema, ŠRATC savo iniciatyva užsakė ir 2005 m. rugpjūčio mėn. VšĮ „Projektų vadybos grupė“ parengė Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimo (2007-2009; 2010-2015 m.) Visuomenės informavimo kampanijos programą, kadangi **Sanglaudos fondas lėšų, skirtų viešinimui, neskyrė.**

Atsižvelgiant į parengtą kampanijos programą, 2006 m. gegužės 31 d. VšĮ ŠRATC pateikė LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai projekto „Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas“ paraišką finansavimui gauti per 2004-2006 m. Lietuvos bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD) (1.3 priemonė „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“).

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T
Savininkas /
2009-05-08
A. L. Čepiajienė



2006 m. lapkričio 30 d. pasirašyta paramos skyrimo projektams, pagal kuriuos įgyvendinama 2004-2006 metų BPD 1.3 priemonės paramos sutartis Nr. BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0004. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2007 m. sausio 1 d., pabaiga – 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto pagrindinis tikslas – pagerinti informacijos apie aplinkosaugą sklaidą Šiaulių apskrities gyventojams, tokiu būdu užtikrinti visuomenės teisę į saugią ir švarią aplinką, išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą bei informuojant atsakingą visuomenės požiūrį į gamtą.

Šis projektas įgyvendintas lygiagrečiai projektui „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, tačiau daugiau dėmesio skiriant atliekų rūšiavimo efektyvumo didinimui, šviečiant ir informuojant atskiras visuomenės dalis (Šiaulių regiono gyventojus, suinteresuotus ekonominius ir socialinius partnerius).

Projekto įgyvendinimo metu atlikta:

- Išleisti 4 temų lankstinukai;
- Surengta 20 mokymų/seminarų;
- Suorganizuotos dvi tarptautinės konferencijos;
- Sukurtas dokumentinis filmas;
- Sukurtas keturių televizijos laidų ciklas;
- Išleistas informacinis mokomasis leidinys;
- Suorganizuota fotoparoda-konkursas;
- Atlikta gyventojų apklausa;
- Išspausdinti 8 straipsniai regioninėje spaudoje.

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



2009 m. gegužės 18 d.
A. J. Čepaitienė


2009 m. gegužės 18 d.



Išvados

1. Įgyvendinti visi finansavimo memorandume nurodyti fiziniai rodikliai ir įgyvendinti visi trumpalaikėje 2002-2005 m. programoje apibrėžti tikslai. Įgyvendintas bendrasis tikslas – Šiaulių regione sukurta ekologiniu ir ekonominiu požiūriu subalansuota atliekų tvarkymo sistema, kuri atitinka nacionalinius ir ES teisės aktų reikalavimus:
 - 1.1. Pastatytas naujas regioninis sąvartynas Aukštrakiuose;
 - 1.2. Įrengti 34 atliekų priėmimo punktai;
 - 1.3. Įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė prie Kairių sąvartyno;
 - 1.4. Uždaryti 116 mažųjų sąvartynų-šiukšlynų ir įrengtos 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės;
 - 1.5. Baigtas Kairių sąvartyno uždarymo I-as etapas;
 - 1.6. Įsigyta visa reikalinga atliekų tvarkymo įranga.
2. Bendrijos teikta finansinė pagalba projektui įsisavinta 100 proc.
3. Projektas įgyvendintas laikantis atitinkamų Europos sutarties nuostatų aplinkos apsaugos ir jos gerinimo srityje. Sumažintas šalutinis poveikis aplinkai, gyvūnijai, žmonėms.
4. Projekto įgyvendinimo metu buvo laikomasi visų specialiųjų sąlygų, nurodytų finansavimo memorandume.
5. Projektas yra gyvybingas ir naudingas visuomenei:
 - 5.1. fiziniai ir juridiniai asmenys aprūpinti atliekų surinkimo priemonėmis
 - 5.2. įrengtos atliekų surinkimo aikštelės atliekų rūšiavimui skatinti.
6. Visi projekto įgyvendinimo metu vykdyti pirkimai buvo atliekami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais LR teisės aktais bei konkurso sąlygomis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.
7. Projekto trukmės pratęsimas iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo būtinas sėkmingam projekto įgyvendinimui.
8. Atsiskaitymai su sutarčių vykdytojais buvo atliekami laiku, pagal sutartą grafiką ir pateiktus mokėjimo prašymus (sąskaitas-faktūras). Priežastys, lėmusios skirtumą tarp fizinio ir finansinio įgyvendinimo, nukrypimus nuo numatyto grafiko yra tos, kad pirmiausiai yra atliekami darbai, o tik po to tie darbai aktuojami ir išrašomos sąskaitos-faktūros apmokėjimui. Tad nuo darbų atlikimo iki pateiktos sąskaitos-faktūros apmokėjimo praeina 1-2 mėn.

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita



T
Skaitant

2009-05-08

Aldona Čepelienė

**Priedai**

- I. Nuolatinės statybos komisijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijos
- II. Priėmimo – perdavimo aktų kopijos
- III. Viešinimo priemonės



T 112
Sąjunga
Audito ir patikrinimo tarnyba

2009-05-08**Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 Galutinė ataskaita**

KOPIJA**VIEŠOJI ISTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

Įmonės kodas 145787276, PVM mokėtojo kodas LT457872716


Korespondencijai: P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai, tel./faks. (8-41) 520002, el. p. info@sratc.lt

A.s. LT624010044200021860 AB DnB NORD bankas; A.s. LT700075800001345575 AB bankas Snoras

Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, buveinės adresas: Aukštakių km., LT-81402 Šiaulių rajonas Šiaulių r. sav.

Projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
Nr. 2001/LT/16/P/PE/008

*Nuolatinės statybos komisijos
statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijos*

I priedas

2009 m., Šiauliai

TIKRA
Sąjūdių inspekcija

Aldona Čaplėjienė

**Šiaulių regiono naujojo Aukštakių sąvartyno I-ojo etapo 1-ai statybos eilei
pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS**

Šiaulių raj. Aukštakiai

2007 m. lapkričio mėn. 23 d..

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo. R. Šileikos Potvarkiu Nr. P1-36, 2007-02-01, šios sudėties:

Komisijos pirmininkė:

P. Gedrikienė - teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone

Nariai:

R. Vėgelė	- statytojo VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius;
V. Striaupa	- projektuotojo UAB „Hidroprojekta“ projekto vadovas;
V. Vaičekauskienė	- Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;
K. Simanauskas	- Šiaulių rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas;
J. Tomošūnienė	- Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus;
J. Matusevičius	- Energetikos inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas;
V. Kozakienė	- Šiaulių RAAD Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja;
E. Kvasauskas	- Šiaulių RAAD Šiaulių rajono agentūros vedėjas;
St. Jonekis	- Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjo pavaduotojas;
V. Dambrauskas	- Šiaulių apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamento Poveikio objektų registro skyriaus vedėjas.

dalyvaujant rangovui - statybos darbų vadovui Rimantui Jankevičiui, atestato Nr.6918, galioja 2009 m. ir techniniam prižiūrėtojui J.Šarakauskui, atestato Nr.3555, galioja iki 2008 m., vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą „Šiaulių regiono naujojo Aukštakių sąvartyno I-ojo etapo 1-ai statybos eilei“ Šiaulių raj. Aukštakiai, kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2004 m. parengė UAB „Hidroprojekta“, kvalifikacijos atestato Nr. 0008, galiojimo data 2007-08-19. ir patvirtino statytojas - VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, kodas 4578727; LT -76356 Šiauliai, Ežero g. 16.
2. Leidimas statyti išduotas 2005 m. balandžio 29 d. Nr. 71, galioja iki 2015-04-29.
3. Statytojo pavadinimas ir adresas - VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, kodas 4578727; LT -76356 Šiauliai, Ežero g. 16.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas: AS „Merko Ehitus“ filialas, kvalifikacijos atestato (teisės pripažinimo pažyma) Nr. D8-4591, galioja iki 2010 m.,

subrangovai: UAB „KRS“ kvalifikacijos atestato Nr. 0930, galioja iki 2009 m..

UAB „Etecha“ kvalifikacijos atestato Nr. 610, galioja iki 2008 m.

UAB „Kelmės melioracija“ kvalifik. atestato Nr. 90, galioja iki 2008 m.


UAB „Kontessa“ kvalifikacijos atestato Nr. 4115, galioja iki 2007-12-16.

UAB „Kelmės melioracija“ kvalifik. atestato Nr.10779, galioja iki 2011 m..

5. Statyba pradėta 2005m. lapkričio mėn.

6. Faktinė statybos kaina 9 810 260,00 Lt..

7. Statinio pagrindiniai rodikliai priede Nr.6 prie pripažinimo tinkamu naudoti Akto.



KOPIJA TIKRA

Saukimo Nr. 2007-02-01

Saukimo Nr. 2007-02-01

8. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Apželdinimo darbai	ha	1,9	2007 liepa

Komisija pripažįsta, kad „Šiaulių regiono naujojo Aukštakių sąvartyno I-ojo etapo 1-ai statybos eilei“ tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, _____ tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, _____ l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, _____ l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, _____ l.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, _____ l.
6. Statinio pagrindiniai rodikliai.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

P. Gedrikienė

Komisijos nariai:

R. Vėgelė
V. Striaupa
V. Vaičekauskienė
K. Simanauskas
J. Tomošūnienė
J. Matusavičius
V. Kozakienė
E. Kvasauskas
St. Joneikis
V. Dambrauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

R. Jankevičius
J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė Stefano darbu vadovą (pareigos) Jankevičius (parašas) DINAJTA JANKEVIČIUS (v.pavardė)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

(v.pavardė)



TIKRA

Skylė: _____

KOPIJA TIKRA

Aldona Čopelienė

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

Priedas Nr.6 prie

Šiaulių regiono naujo Aukštakių sąvartyno 1-ojo etapo 1-ai statybos eilei pripažinimo
tinkama naudoti akto

**STATINIŲ IR PRIKLAUSINIŲ, KURIE PRIPAŽISTAMI TINKAMAI NAUDOTI,
SĄRAŠAS**

1. Tarnybinis pastatas 1B1b, unikalus Nr. 4400-1007-5753, bendras plotas 197,55 m², statybinis tūris 850 m³,
2. Sąvartyno kaupas SK, unikalus Nr. 4400-0772-6254, plotas 42099 m²
3. Dezinfekavimo duobė DE, unikalus Nr. 4400-1029-5315
4. Priešgaisrinis rezervuaras PR, unikalus Nr. 4400-1034-0886, tūris 550 m³
5. Svėrimo tiltelis, unikalus Nr. 4400-1029-6578
6. Plovimo punktas PL, unikalus Nr. 4400-1029-6667
7. Lietaus vandens valymas su nuotekų vamzdynu, unikalus Nr. 4400-1037-5672
8. Vandentiekio tinklai V, unikalus Nr. 4400-1028-8621
9. Šulinys su vamzdynu VŠ, unikalus Nr. 4400-1035-3096
10. Aikštelė b, unikalus Nr. 4400-1031-0075
11. Tvora t, unikalus Nr. 4400-1028-8598
12. Nuotekų šalinimo darbai, unikalus Nr. 4400-1028-8721

VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

R. Vėgelė

Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVPS vyr. specialistė
Šiaulių rajone

P. Gedrikienė

Darbų vadovas

R. Jankevičius

Techninis prižiūrėtojas

J. Šarakauskas

TIKRA
Skaitymo kopija

Aldona Čepėjonė

2009-05-08

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaite

**Linijinio inžinerinio statinio
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Privažiavimo kelio į
naująjį Aukštųjų savartyną I etapo II eilės statyba
(pavadinimas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, unikalus Nr. ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Šiauliai,
(vietovė)

2008 m. gegužės mėn. 08 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorės 2008 m. gegužės mėn. 08 d. potvarkiu Nr. PI-112 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

Komisijos pirmininkas:

Palmira Gedrikienė – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Reginantas Vėgelė – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius;

Arvydas Naradauskas – Šiaulių kelių tarnybos viršininkas;

Saulius Darginavičius – Šiaulių rajono žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas;

Kazimieras Rimantas Dieninis – Projekto vadovas, UAB „Patvanka“;

Vilija Vaičekauskienė – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;

Egidijus Kvasauskas – Šiaulių RAAD Šiaulių rajono agentūros vedėjas.

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) **Reginantas Sedleckas, gamybos direktorius, atestato Nr. 18826**
(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) **Kazimieras Rimantas Dieninis, projekto vadovas, atestato Nr. 3866, 6981**

(v.pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonas Šarakauskas, inžinieriaus atstovas, Nr. 3555**

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“,

apžiūrėjo **Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Privažiavimo kelio į naująjį**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

Aukštųjų savartyną I etapo II eilės statyba patikrino jo statybos techninę bei vykdymo

dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr. **2001/LT/16P/PE008**, kurį parengė **UAB „Hidroprojekta“**
(projektavimo įmonės pavadinimas)

ir patvirtino **VSI „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“** Direktorius Reginantas Vėgelė, 2005-01-19, **įsakymo Nr. 4**

2. Leidimas statyti išduotas **2008 m. gegužės mėn. 29 d. Nr. 71.**

3. Statytojo pavadinimas ir adresas **VSI „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“**, 8.LT-76206, Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbai

rangovas UAB „Kamesta“, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Privažiavimo kelio į naująjį Aukštųjų savartyną I etapo II eilės statyba, kvalifikacijos atestato Nr. 0196.

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)

Subrangovai **UAB „Patvanka“, darbo projektas, kvalifikacijos atestato Nr. 178**

(įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestato Nr.)

ALMIRA GEDRIKIENĖ
Šiaulių apskrities viršininko administracijos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros departamento
Statybos ir statinių naudojimo valstybinės
priežiūros skyriaus vyr. specialistė

6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

PALMIRA GEDRIKIENE
Siaulių apskrities viešąjį administracijos
Territorijų planavimo ir statybos valstybinės
priemonės departamento
Statybos ir statinių naudojimo valstybinės
priemonės skyriaus vyr. specialistė

3.4. vamzdinių rodikliai:

medžiaga
 padavimo vamzdžio skersmuo
 grįžtančio vamzdžio skersmuo

3.5. vamzdinių šilumos izoliacija:

tipas (medžiaga)
 storis

apsaugos sluoksnis

3.6. lovio skersmuo ir medžiaga

3.7. trasos ilgis

3.8. šulinių (kamerų) skaičius

3.9. kiti svarbūs rodikliai:

4. Elektros tiekimo linijos:

4.1. įtampa

4.2. atramų tipas

4.3. laidų (kabelių) tipas ir skersmuo

4.4. linijos ilgis (nuo _____ iki _____)

4.5. inžineriniai statiniai linijoje
(transformatoriai, pastotės)

4.6. kiti svarbūs rodikliai:

5. Kitų linijinių statinių:

(analogiškai surašomi jų pagrindiniai
 rodikliai)

pralaidos prailginimas

antgalių įrengimas

6. Faktiška statybos kaina

3

x

x

mm

mm

x

x

mm

x

cm x cm

m

vnt.

kV

x

x

mm²

m

vnt.

Ø 1,2, 5 m
 2 vnt.

tūkst. Lt

2257,99907

Pagal sutartį su PVM

7. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Užbaigimo laikas



T I K R A

Skyriaus vedėja

Aldona Čepėlienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
 Šarūnė Rožanaitė

PALMIRA GEDRIKIENĖ

Siaulų apskrities viršininko administracijos
 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
 priežiūros departamento
 Statybos ir statinių naudojimo valstybinės
 priežiūros skyriaus vyr. specialistė

4

Komisija pripažįsta, kad Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Privažiavimo kelio į naują Aukštųjų savartyną statyba
(statinio pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 4 tomai;
2. Atitikties deklaracijos 1 byla;
3. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1 byla;
4. Statinių ir jų priklausinių, pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas, 4 lapai;

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Palmira Gedrikienė

(v.pavardė)

PALMIRA GEDRIKIENĖ
Šiaulių apskrities viršininko administracijos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
prižiūros departamentas
Statybos ir statinių naudojimo valstybinės
prižiūros skyriaus vyr. specialistė

Komisijos nariai:

Reginantas Vėgėlė

Arvydas Naradauskas

Saulius Darginavičius

Kazimieras Rimantas Dieninis

Vilija Vaičekauskienė

Egidijus Kvasauskas

Valentinas Marcinkevičius

Kazimieras Rimantas Dieninis

Bronislovas Vepštas

Rangovas

Subrangovai

Techninis prižiūrėtojas

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

Priėmė: Direktorius Reginantas Vėgėlė

(pareigos, v.pavardė, parašas)

Projektų įgyvendinimo
grupės vadovė
Nina Paulauskienė

Perdavė: Gamybės direktorius Reginantas Sedleckas

(pareigos, v.pavardė, parašas)

Data



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

STR 1.11.01:2002
5 priedas

Linijinio inžinerinio statinio Šiaulių miesto savartyno Kairiuose uždarymo I etapo (pilno kaupo šlaitų uždengimo, laikino kaupo šlaitų pridengimo, griovių ir filtrato tvenkinių užpylimo, tranzitinio asfaltuoto kelio perkėlimo, filtrato siurblių) Šiaulių r. sav. Kairių sen. Kairių km. (pavadinimas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, unikalus Nr. ir adresas)

pripažinimo tinkamai naudoti
A K T A S

Šiaulių rajonas

2008m. birželio mėn. 09 d.

(vietovė)

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-05-30 potvarkiu Nr. P1-141
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P. Gedrikienė - Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė),

Nariai:

Regimantas Vėgelė - VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius;
(v.pavardė)

Jonas Matusevičius - Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjas;

Egidijus Kvasauskas - Šiaulių RAAD Šiaulių rajono agentūros vedėjas;

Robertas Pielikys - Projekto vadovas;

Vilija Vaičekauskienė - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;

Janina Tamošiūnienė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus pavaduotoja;

Saulius Darginavičius - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus melioracijos poskyrio vedėjas;

Viktorija Blažienė - Šiaulių RAAD Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) Aivarui Mikšui, kv. atest.. Nr. 2847,

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) Povilui Gabrielaičiui, kv. atest.. Nr. 13785

(v.pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam priežiūretojui Jonui Šarakauskui, kv. atest.. Nr. 355

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“,

apžiūrėjo:

Šiaulių miesto savartyno Kairiuose uždarymo I etapo (pilno kaupo šlaitų uždengimą, laikino kaupo šlaitų pridengimą, griovių ir filtrato tvenkinių užpylimą, tranzitinio asfaltuoto kelio perkėlimą, filtrato siurblius) Šiaulių r. sav. Kairių sen. Kairių k.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:



Savininkas: ...

2009-05-08

Aldona Čepelėjienė

KOPJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

2

1. Statyba vyko pagal individualų projektą, kurį 2005 metais parengė UAB „Statinio projektavimo studija“, kv. atest. Nr. 3504 ir patvirtino Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius 2005-10-05, bei jo pagrindu AB „Šiaulių hidroprojektas“ parengtą darbo projektą Nr. 0064-00-DP.
(projektavimo įmonės pavadinimas)

2. Leidimas statyti išduotas 2006-03-24 Nr. 69

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, į.k. 145787276, Šiauliai, P.Lukšio g. 8, LT 76206

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „Šiaulių plentas“, kv. atest. Nr.0187
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
subrangovai UAB „Žemda“ kv. atest.t. Nr.0638
(įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatų Nr.)

5. Statyba pradėta 2006m. gegužės mėn. 15d.

6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
Pilnai uždengto kaupo šlaitų plotas	M ²	26092	
Laikiniai pridengto kaupo šlaitų plotas	M ²	18047	
Užpilamų griovių ir filtrato tvenkinių plotas	M ²	8600	
Perkeliamo tranzitinio asfaltuoto kelio plotas	M ²	4426	A/betonio danga 0/16Vn
Drenažo vamzdžiai d 110	M	684.64	Polietilenas
Drenažo vamzdžiai d 200	M	1562.04	Polietilenas
Drenažo vamzdžiai d 250	M	250.60	Polietilenas
Drenažo vamzdžiai d 400	M	481.20	Polietilenas
Drenažo vamzdžiai d 500	M	82.53	Polietilenas
Pralaidos d 400	M	481.20	Polietilenas
Atitvarai	M	433	Cinkuotas metalas
Filtrato siurblynės	Vnt	4	
Faktiška statybos darbų kaina	Tūkst. Lt.	7.763	

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 3 priede.

8. Projekte numatytos aplinkos apsaugos priemonės yra įvykdytos.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas



Aldona Cepėlienė

KOPIJA TIKRA

Komisija pripažįsta, kad Šiaulių miesto savivaldybės Kairiuose uždarymo I-as etapas, Šiaulių r. sav. Kairių sen. Kairių k. tenkina nustatytus reikalavimus ir tinkamas naudoti.

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

2009-05-08

9

3

11. Statinio garantinis terminas (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos)- 5 metais, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.)-10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų- 20 metų.

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija	1 tomas(tech., darbo pr.) ;
2. Statybos darbų žurnalai	3 vnt.;
3. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu	1 tomas (3 bylos);
4. Statybos produktų atitikties dokumentai	1 tomas (2 bylos);
5. Statinio kadastrinių matavimo byla	1 tomas (27lap.);
6. Statinio kadastrinių matavimo byla	1 tomas (19lap.);
7. Išpildomoji geodezinė nuotrauka	1 vnt.(plius 1CD);
8. Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas	1 vnt.

Komisijos pirmininkas

B. J. Quatary
(parašas)

P. GEDRIKIS

(v.pavardė)

Komisijos nariai:

[Signatures]

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai
Juozapas Venslovas

R. VĖGELĖ

J. MATUSEVIČIUS

E. KVASAUSKAS

R. PIELIKYS

V. VAIČEKAUSKIENĖ

J. TAMOŠIŪNIENĖ

S. DARGINAVIČIUS

V. BLAŽIENĖ

Rangovas

[Signature]

A. MIKŠYS

Direktoriaus pavaduotojas
Povilas Gabrielaitis

Subrangovai

[Signature]

J. ŠARAKAUSKAS

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiamu nuolat saugoti.

Priėmė:

Projektų gyvendinimo
grupės vadovė
Nina Paulauskienė

(pareigos, v.pavardė, parašas)

Perdavė:

[Signature]
Direktoriaus pavaduotojas
Povilas Gabrielaitis
(pareigos, v.pavardė, parašas)

Data

[Stamp: LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA, KONTROLINIS, KOKIOSIOS SKYRIS]

[Stamp: T U R A, Skystis, Aldona Cepelienė]

KOPIJATIKRA

Biuro administratorė
Saulė Rozanaitė

2009-05-08

10

TVIRTINU RIMYDAS ŠILEIKA

Siaulių apskrities viršininko administracijos
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyriaus vedėjas (parašas, mėnuo, d.)
2005 m. rugsėjo mėn. 22 d.



Žalių atliekų kompostavimo aikštelės ir stoginės Šiaulių rajono Kairių kaime (Kairių savartyno teritorijoje)

**pripažinimo tinkamomis naudoti
AKTAS**

ŠIAULIŲ RAJONAS
(vietovė)

2005 m. rugsėjo mėn. 22 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2005 m. rugsėjo 15 d. potvarkiu Nr. P1-286 šios sudėties:

P. Gedrikienė	- Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros sk. vyr. specialistė Šiaulių rajone (komisijos pirmininkė),
R.Vėgelė	- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
K.Lukšas	- Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius
R. Šablickas	- projekto vadovas
K.Vaičaitis	- Šiaulių miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vyresnysis inžinierius
K.Simanas	- Šiaulių rajono valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
J.Tamošiūnienė	- Šiaulių Visuomenės sveikatos centro direktoriaus pavaduotoja
J.Matusevičius	- LR Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių sk. vedėjas
V.Kozakienė	- Šiaulių RAAD Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja
A.Kairys	- Šiaulių RAAD Šiaulių miesto agentūros vedėjas
Z.Griguola	- Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas

dalyvaujant statybos vadovui Vytautui Bliznikui, kv. atestatas Nr.6940, galioja iki 2008 m.

(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialių darbų vadovams) Edvardui Peleckui, kv. atestatas Nr. 14718, galioja iki 2009 m., Genovaitėi Mockuvienei, kv. atestatas Nr. 905, galioja iki 2007 m., Algimantui Lindešiui, kv. atestatas Nr. 10093, galioja iki 2006 m., Vytautui Damašiui, kv. atestatas Nr. B1445, galioja iki 2008 m. ir techniniam priežiūrotoji J. Šarakauskui, kv. atestatas Nr. 3555, galioja iki 2008 m.

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą

žalių atliekų kompostavimo aikštelės ir stoginę Šiaulių rajono Kairių kaime (Kairių savartyno teritorijoje)

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2005 m. parengė UAB "Šiaulių kelias" kv. atestatas Nr. 1003, galioja iki 2009 m

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas .

Statybos leidimas išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas **VSI ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, kodas 4578727, Šiauliai, Ežero g. 16**

4. Statybos ir montavimo darbus atliko: **UAB "Šiaulių kelias"**, kv. atestatas Nr. 1003, galioja iki 2009 m. statybos- montavimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšys

subrangovai: **UAB "Naska"** – stoginės statybos darbai, kv. atestatas Nr.3631., galioja iki 2006 m.

UAB "Gatvių apšvietimas" – elektros montavimo darbai kv. atestatas Nr.2077., galioja iki 2007 m

UAB "Šiaulių melioracija" – drenažo rekonstrukcija, nuotekų nuvedimas kv. atestatas Nr.0140., galioja iki 2008 m

UAB "Limega" – teritorijos aptvėrimas . kv. atestatas Nr.0436., galioja iki 2008 m

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
L. Rožanaitė

5. Statyba pradėta 2005 m.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai;

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Pagal faktą
1	2	3	4	5
1. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas stoginė-garažas 5Glg		M2	288	299,87
Žalių atliekų kompostavimo aikštelė b1		M2	7000	7092
Statybinis tūris : stoginės- garažo 5Glg		M3	1533	1525
Aukštų skaičius :		vnt.	1	1
Faktiška statybos kaina iš jos statybos ir montavimo darbų		Tūkst. Lt	1035,115	1035,115
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
sienų		W/m2K		
langų		"		
denginio		"		
2. Gyvenamojo namo: viso				
gyvenamasis plotas		m2		
naudingas plotas		m2		
negyvenamųjų patalpų plotas		m2		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių				
3. Visuomeninio objekto: viso				
Bendras plotas		m²		
Bendro naudojimo patalpų		M2		
paslaugų apimtis				
Kiti svarbūs rodikliai				
produkcijos kiekis, pajėgumas				
kiti svarbūs rodikliai				

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika: stoginės-garažo pamatai- betoniniai, sienos- metalo karkasas, apsiūtas metalo lakštais, stogas šlaitinis, metalinė danga.

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, išvardytais statybos darbų žurnale F17.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos bei kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacinių kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių (monių ir pripažinti tinkamai naudoti). Tai liudija patikrinimo aktai, išvardinti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytos darbų saugos, nekilonojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

Biuro administracinė
Sąrašinė Rozanaite

12. Skypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis

Komisija pripažįsta, kad žalių atliekų kompostavimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-0673-8267), stoginė-garažas 5Glg (unikalus Nr. 4400-0673-8245), kiemo aikštelė su (važiavimais (unikalus Nr. 4400-0673-8278), tvora (unikalus Nr. 4400-0673-8290) Šiaulių rajone Kairių kaime (Kairių savivaldybės teritorijoje) . Faktiškai priimamo objekto techniniai rodikliai pagal kadastrinių matavimų bylą Nr. 10504, užfiksuoti 2005 09 09.

(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. - nėra.)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinkamos naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija 1 tomas 154 (lapai).
2. Lauko inžinerinių tinkų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, ____ I.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinkų bei įrangos patikrinimo aktai, ____ I.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos, ____ I.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų - inžinerinių tinkų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, - nėra

Komisijos pirmininkė

Komisijos nariai

P.GEDRIKIENĖ
(v., pavardė)

R. VEGELĖ

R. ŠABLICKAS

K.LUKŠAS

K.VAIČAITIS

J.TAMOŠIŪNIENĖ

K. SIMANAUSKAS

J. MATUSEVIČIUS

V. KOZAKIENĖ

A.KAIRYS
Valstybinė darbo inspekcija
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
2. GRIGUOLA

Stasys Joneikis
V.BLIZNIKAS

J.ŠARAKAUSKAS

Darbų vadovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir joose išvardintais dokumentais priėmiamu nuolat saugoti

Priėmė



TIERA (parašas)

Aldona Čepelienė

(v., pavardė)

KOPIJATIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

2009-05-08

13

P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai 98 bendro naudojimo konteinerių aikštelėse Šiaulių mieste (aikštelių sąrašas išvardintas Priede Nr.1)

Šiauliai

2008 m. sausio mėn. 03 d.

Komisija, paskirta VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2007-12-29 dienos įsakymu Nr.61 šios sudėties:

R.Vėgelė	- VšĮ ŠRATC direktorius (komisijos pirmininkas);
E.Jakaitienė	- Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė;
N.Paulauskienė	- VšĮ ŠRATC projektų valdymo grupės vadovė, kvalifikacijos atestato Nr. 10095 (Užsakovo atstovas);
J.Šarakauskas	- techninis prižiūrėtojas, kvalifikacijos atestato Nr. 3555;
B.Vepštas	- techninis prižiūrėtojas, kvalifikacijos atestato Nr. 396;
V.Pilipuitis	- UAB "NCC titanas" statybos vadovas, kvalifikacijos atestato Nr. 3492;
A.Selevas	- UAB "NCC titanas" statybos projektų vadovas;
M.Šalaviejus	- UAB "NCC titanas" statybos darbų vykdytojas.

Techninis projektas suderintas 2006-09-05 d., išvada dėl nesudėtingo statinio projekto – schemos Nr.15N.

Komisija pripažįsta, kad projekte numatytos bendro naudojimo konteinerių aikštelės, esančios Šiaulių mieste, įrengimo darbai atlikti.


Komisija:



Aldona Čopljienė

2009-05-08

R.Vėgelė
E.Jakaitienė
N.Paulauskienė
J.Šarakauskas
B.Vepštas
V.Pilipuitis
A.Selevas
M.Šalaviejus



141

Priedas Nr.1

BENDRO NAUDOJIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE SĄRAŠAS

A tipo bendro naudojimo konteinerių aikštelės:

1. Draugystės pr. Nr.18.
2. Draugystės pr. Nr.20.
3. Vilniaus g. Nr. 119 ir 121.
4. Ežero g. Nr.15
5. Ežero g. Nr.1 - Dubijos g. Nr. 29. *
6. Prie Dainavos tako Nr. 3b.
7. Dubijos g. prieš Nr.11.
8. Višinskio g. Nr. 12.
9. Višinskio g. Nr. 14.
10. Draugystės pr. prieš Nr. 13.
11. Rūdės g. prieš Nr. 8.
12. Stoties g. Nr. 10.
13. Prie Trakų g. 7.
14. Prie Ežero g. Nr.29. ✓
15. Prie Vilniaus g. Nr. 137.
16. Prie Šalkauskio g. 5.
17. Prie garažų Šalkauskio g.
18. Tarp Talšos g.-4 ir Ežero -65.
19. Prie Aušros t. Nr.7.
20. Žvejų skersg. prie Nr.5.
21. Prie Tilžės 190.
22. Tarp Tilžės 171 ir 173.
23. Vasario 16-osios 49 ir 51 kieme
24. Tarp Tilžės 169 ir 171.
25. Prie Dvaro 74.
26. Prie Dvaro g. Nr.59.
27. Prie Vytauto g. Nr.110.
28. Žemaitės g. Nr.58 teritorijoje.
29. Gegužių g. Nr.65.
30. Gegužių g. Nr.73.
31. Tarp Varpo 17 ir Vilniaus 213a.
32. Lyros g. Nr.5 - Nr.7.
33. Architektų g. Nr.18a - Nr.18b.
34. Dainų g. Nr.44a.
35. Dainų g. Nr.66 ir 68.
36. Gardino g. Nr.21-Nr.27.
37. Architektų g.50.
38. Dainų g. Nr.30-Nr.32.
39. Prieš Dainų g. Nr.20.
40. Aido g. Nr.5-Nr.7.
41. Aido g. Nr.9.
42. Dainų g. Nr.102.
43. Tarp Dainų Nr. 44 - Nr. 46.
44. Lyros g. Nr.14 - Nr.20.
45. Aido g. Nr. 17.
46. Architektų g. 26.
47. Architektų g. 42.



TIKRA
Sąjaukių skyriaus

Aldona Čopliūnienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

49. Lyros g. 10-12.
50. Aido g. 25.
51. Dainų g. 8.
52. Energetikų g. 8.
53. Pirties g. Nr.7-Nr.9.
54. Tarp Karklų ir Lazdynų g.
55. Birutės g. Nr.50.
56. Panevėžio g. Nr. 47.
57. Kalinausko g. prie įvažiavimo į valymo įrengimus.
58. Strazdelio g. Nr.9.
59. Gegužių g. Nr.33 ir 29.
60. Gegužių g. Nr.23 ir 19.
61. Saulės takas Nr.4 ir 3.
62. Sevastopolio g. Nr.9.
63. Gegužių Nr.48 ir 52.
64. Krymo g. Nr.32 ir 36.
65. Dariaus ir Girėno Nr.12 – Nr.16.


B tipo bendro naudojimo konteinerių aikštelės:

1. Vytauto g. Nr. 60 ir 58.
2. Vytauto g. Nr. 50 ir 48.
3. Prieš Dainavos takas Nr.15.
4. Kražių g. prieš Nr. 25.
5. Draugystės pr. prieš Nr 3 ir 5.
6. Dubijos g. prieš Nr.1a.
7. Prieš Stoties g. Nr. 9a.
8. Vytauto g. Nr.107a.
9. Višinskio g. Nr. 17.
10. Prie Vasario 16-osios g. Nr 23.
11. Prie Tilžės g. Nr.148.
12. Prie Vytauto g. Nr 80.
13. Prie Draugystės pr. Nr. 21.
14. Tarp Padirsių ir Ginkūnų g.
15. Prie Vilniaus g. Nr.183a.
16. Prie Višinskio g. Nr.36.
17. Dvaro 48.
18. Vilniaus g. 146 teritorijoje.
19. Prie Vytauto g. Nr. 108a.
20. Prie Žemaitės g. Nr. 56.
21. Prie Dvaro g. Nr.64.
22. Gegužių g. Nr. 81 - Nr.85.
23. Architektų g. Nr.22.
24. Dainų g. 58.
25. Gardino g. Nr. 29.
26. Dainų g.18-16.
27. Tarp Dainų g. Nr.46a - Nr.46.
28. Prie Varpo g. Nr.33 ir 35.
29. Dainų g. 50 ir 72.
30. Tarp Vilniaus 114 ir Trakų 23.
31. Mechanikų g. 13.
32. Ties Geležinkelio ir Birutės g. sankirta
33. Krymo g. Nr.4 ir 6.



T I K R A
Sveikintas

Aldona Čepelienė



P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai 18 bendro naudojimo konteinerių aikštelėse Šiaulių rajone (aikštelių sąrašas išvardintas Priede Nr.1)

Šiauliai

2007 m. gruodžio mėn. 17 d.

Komisija, paskirta VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2007-12-14 dienos įsakymu Nr.60 šios sudėties:

R.Vėgelė	- VšĮ ŠRATC direktorius (komisijos pirmininkas);
T.Plukienė	- Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėja;
N.Paulauskienė	- VšĮ ŠRATC projektų valdymo grupės vadovė, kvalifikacijos atestato Nr. 10095 (Užsakovo atstovas);
J.Šarakauskas	- techninis prižiūrėtojas, kvalifikacijos atestato Nr. 3555;
B.Vepštas	- techninis prižiūrėtojas, kvalifikacijos atestato Nr. 396;
V.Baukys	- UAB "NCC titanas" statybos vadovas, kvalifikacijos atestato Nr. 1383;
A.Selevas	- UAB "NCC titanas" statybos projektų vadovas;
M.Šalaviejus	- UAB "NCC titanas" statybos darbų vykdytojas.

Techninis projektas suderintas 2007-05-29 d., posėdžio protokolas Nr.P-185.

Komisija pripažįsta, kad projekte numatytų bendro naudojimo konteinerių aikštelių įrengimo darbai Šiaulių rajone atlikti.

Komisija:

.....

R.Vėgelė
 T.Plukienė
 N.Paulauskienė
 J.Šarakauskas
 B.Vepštas
 V.Baukys
 A.Selevas
 M.Šalaviejus



T I K R A
 Skyriaus vedėja

Aidona Čopljienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Būro administratorė
 Šarūnė Rozanaitė

Priedas Nr.1

**BENDRO NAUDOJIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO ŠIAULIŲ RAJONE
SĄRAŠAS****A tipo bendro naudojimo konteinerių aikštelės:**

1. Basanavičiaus g., Kuršėnų miestas.
2. Centre prie urėdijos pastato, Kuršėnų miestas.
3. Daugėlių g. 73, Kuršėnų miestas.
4. Basanavičiaus g. 3 kieme, Kuršėnų miestas.
5. Daugėlių g. prie stadiono, Kuršėnų miestas.
6. Dambrausko g., Kuršėnų miestas.
7. Prie politechnikos mokyklos, Kuršėnų miestas.
8. Daugėlių g., Kuršėnų miestas.
9. Papilės g., Kuršėnų miestas.
10. Rūžos-Beržų g., Aukštelkės k.
11. Gruzdžių mstl.
12. Žeimių g. 8b, Ginkūnų k.


B tipo bendro naudojimo konteinerių aikštelės:

1. L.Ivinskio g., Kuršėnų miestas.
2. Pavenčių mikrorajone, Kuršėnų miestas.
3. Drašučių k.
4. Kužių mstl.
5. Ilgoji g., Vijolių k.
6. Poilsio g., Aukštelkės k.

T I E R A
Skyriaus vadovė

Aldona Čepelienė

2009-05-08



182

Bendro naudojimo kontenerių aikštelių įrengimas Radviliškio rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Radviliškis
 (vietovė)

2007 m. spalio mėn. 15 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2007 m. spalio mėn. 08 d. potvarkiu Nr. P1-268

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A. Balsys - Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros vyr. specialistas
 Radviliškio rajone (komisijos pirmininkas),

(v.pavardė)

(pareigos)

M.Saulevičius - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vyr. specialistas *vedėjas*

A.Špokaitė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriaus vedėja

R.Vėgelė - VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, direktorius

R.Dičiūnas - Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriaus specialistas

A.Ubarevičius - UAB „Siena“ projekto vadovas.



A.Valuckas - Radviliškio rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

V.Ivoška - Radviliškio rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

R.Aukštakis - TEO LT, AB Šiaulių PDP centro Radviliškio skyriaus vadovas

D.Simonavičius - AB „VŠĮ“ Radviliškio skyriaus viršininkas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „Šiaulių titanas“ statybos vadovui V.Baukui, kvalifikacijos atestatas Nr. 1383,
 techniniam priežiūretojui J.Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3555,
 vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktas



1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad bendro naudojimo konteinerių aikštelės Radviliškio rajone
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį akta pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdytinė dokumentacija, 7 tomai



pirmininkas



(parašas)

Aldona Cepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė:
Šarūnė Rozanaitė

A. Balsys
(v. pavarde)

ijos

2009-05-08

ka"
10

Bendro naudojimo konteinerių aikštelės Radviliškio rajone: Aukštakiai; Kalnelio Gražonai; Baisiogala; Pakiršynys; Polonai; Valatkoniai; Grinkiškis; Pašušvys; Vaitiekūnai; Kairėnai; Mėnaičiai; Šašiai; Alksnupi; Raudondvaris; Pakalniškiai; Pociūnai; Kutiskiai – 2 vnt.; Karčemos; Daugėlaičiai; Linkaičiai; Sidabravas; Beinorava; Vadaktai; Pociūnėliai; Skėmiai; Šaukotas; Papušynys; Kunigiškiai; Pavartyčiai; Vėriškės; Prastavoniai; Butėnai; Šiaulėnai; Žeimiai; Acokavai; Tyruliai; Polekėlė; Šeduvos miestas.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2006 m. parengė UAB „Siena“, projekto vadovas A. Ubarevičius, kval. atestato Nr. 4646, galioja iki 2008-05-07

ir patvirtino statytojas 2006-08-02
(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas buvo 2006 m. rugpjūčio 02 dienos. Nr.06 – 69.
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono viešojo tvarkymo centras, Lukšio g. 8, Šiauliai.

4. Statybos ir montavimo darbai rangovas UAB „Šiaulių tita“ atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendrieji statybos darbai;

(monės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(monių pavadinimai ir atliktų darbų rūšis, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006m. spalio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1			4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	520	520
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	135,00	120,23
Iš jos statybos ir montavimo darbų			117,95	97,23
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:		W/m ² K		
sienu		“		
langų		“		
denginio		“		



2009-05-08

AKOPIJA TIKRA


Biro administratore
Šarūnė Rozenaitė

Komisijos nariai:



M. Saulevičius

A. Špokaitė



R. Vėgelė



R. Dičiūnas



A. Ubarevičius



A. Valuckas



V. Ivoška



R. Aukštakis

D. Simonavičius

V. Bankys

J. Šarakauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

Projekto įgyvendinimo
grupės vadovė
Nijolė Dešinskienė
(pareigos)

(parašas)

(v. pavardė)

Perdavė

Statybos vadovas
Vigantas Bankys
(pareigos)

(parašas)

(v. pavardė)


2009 10 15
(data)

TIKRA

Aldona Čopelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administravimas
Šarūnė Kozgė

P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai konteinerinių aikštelių Gailių, Maironių, Liolių kaimuose, Liolių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

Kelmė

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007-02-06 potvarkiu Nr.P1-47 šios sudėties:

A.Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr specialistas (komisijos pirmininkas);
R.Atkočaitis	-Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V.Olišauskienė	-Kelmės rajono vyr. architektė;
I.Sirusienė	-Kelmės r.aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A.Monkauskaitė	-Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R.Parnarauskienė	-ŠAVA Kelmės r. Žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V.Ramanauskis	-Kelmės r. PGT viršininkas;
A.Teišerskis	-Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
V.Mikalauskas	-seniūnas;
J.Šarakauskas	-techninis prižiūrėtojas;
R.Vėgelė	-statytojas ŠRATC direktorius;
R.Amthor	-projekto autorius;
V.Baukys	-rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas

Statybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinių aikštelių, esančių Gailių, Maironių, Liolių kaimuose, Liolių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštelės teisinei registracijai)

Komisija:



A.Ramanauskas
R.Atkočaitis
V.Olišauskienė
I.Sirusienė
A.Monkauskaitė
R.Parnarauskienė
V.Ramanauskis
A.Teišerskis
J.Šarakauskas
R.Amthor
R.Vėgelė
V.Mikalauskas
V.Baukys

Perdavė: V.Baukys.

Priėmė: R.Vėgelė.



T I K R A

Aldona Čepėjienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

data

2009-05-08

110

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Aikštelės įrengimo kaina, Lt
3. Kelmės rajonas		
3.1	Kukečių gyv. $3 \times 6,5m^2 + 2 \times 4,5m^2 =$	3196
3.2	Liolių gyv. $3 \times 6,5m^2 + 2 \times 4,5m^2 =$	3196
3.3	Klovainių gyv. $3 \times 6,5m^2 + 2 \times 4,5m^2 =$	3196
3.4	Kražių mstl. $3 \times 6,5m^2 + 2 \times 4,5m^2 =$	3196
3.5	Janaučių gyv. $3 \times 6,5m^2 + 2 \times 4,5m^2 =$	1259
3.6	Užvenčio gyv. $3 \times 6,5m^2 + 2 \times 4,5m^2 =$	1259
3.7	Šaukėlių mstl. $3 \times 6,5m^2 + 2 \times 4,5m^2 =$	1259
Viso 3:		16563

1 viso: plotas $22,5m^2$ + aikštė $4,5m^2$



Generalinis direktorius
Stanislovas Valius

2^o viso: 66 mt. x 4,5m³
26 mt. x 4,5m³



TIKRA
Sąskaitų skyriaus

Aidona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

16.1

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Aikštelės įrengimo kaina, Lt
3. Kelmės rajonas		
3.1	Lupikų gyv.	1571
3.2	Vijurkų gyv.	1571
3.3	Šaltinių gyv. (ŠALTENIŲ)	1571
3.4	Junkilų gyv.	1571
3.5	Pašilėnų gyv.	1571
3.6	Gimikų gyv.	1571
3.7	Kražių mstl.	1571
3.8	Laikšių gyv.	1571
3.9	Grinių gyv.	1571
3.10	Stulgių gyv.	1571
3.11	Šedbarų gyv.	1571
3.12	Gailių gyv.	629
3.13	Pašilės gyv.	629
3.14	Vaiguvos gyv.	629
3.15	Viso 3:	19171

UABO: 45 m² x 4,6 m²



Generalinis direktorius
Stanislavas Valius



TITANAS
Sąjūdių įmonė

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai konteinerinių aikštelių Kukečių, Lupikų, Vijurkų kaimuose, Kukečių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

Kelmė

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007-02-06 potvarkiu Nr.P1-45 šios sudėties:


A.Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr. specialistas (komisijos pirmininkas);
R.Atkočaitis	-Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V.Olišauskienė	-Kelmės rajono vyr. architektė;
I.Sirusienė	-Kelmės r.aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A.Monkauskaitė	-Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R.Parnarauskienė	-ŠAVA Kelmės r. Žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V.Ramanauskis	-Kelmės r. PGT viršininkas;
A.Teišerskis	-Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
M.Masalskienė	-seniūnė;
J.Šarakauskas	-techninis prižiūrėtojas;
R.Vėgelė	-statytojas ŠRATC direktorius;
R.Amthor	-projekto autorius;
V.Baukys	-rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas

Statybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinių aikštelių, esančių Lupikų, Vijurkų, Kukečių kaimuose, Kukečių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštelės teisiškai registruoti)

Komisija:



A.Ramanauskas
R.Atkočaitis
V.Olišauskienė
I.Sirusienė
A.Monkauskaitė
R.Parnarauskienė
V.Ramanauskis
A.Teišerskis
J.Šarakauskas
R.Amthor
R.Vėgelė
M.Masalskienė
V.Baukys

Perdavė: V. Baukys

Priėmė: R.Vėgelė

data



T I M B A

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai konteinerinės aikštelės Šedbarų kaime, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje,
Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

Kelmė

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007- 02- 06 potvarkiu Nr.P1-52 šios sudėties:

A.Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr specialistas (komisijos pirmininkas);
R.Atkočaitis	-Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V.Olišauskienė	-Kelmės rajono vyr. architektė;
I.Sirusienė	-Kelmės r.aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A.Monkauskaitė	-Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R.Parnarauskienė	-ŠAVA Kelmės r. Žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V.Ramanauskis	-Kelmės r. PGT viršininkas;
A.Teišerskis	-Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
S.Baltrušaitis	-seniūnas;
J.Šarakauskas	-techninis prižiūrėtojas;
R.Vėgelė	-statytojas ŠRATC direktorius;
R.Amthor	-projekto autorius;
V.Baukys	-rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas

Statybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinės aikštelės esančios Šedbarų kaime, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštelės teisei registracijai)

Komisija:



A.Ramanauskas
R.Atkočaitis
V.Olišauskienė
I.Sirusienė
A.Monkauskaitė
R.Parnarauskienė
V.Ramanauskis
A.Teišerskis
J.Šarakauskas
R.Amthor
R.Vėgelė
S.Baltrušaitis
V.Baukys

Perdavė: V.Baukys

Priėmė: R.Vėgelė

data



2009-05-08

Aldona Čepičienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

Atlikti visi statybos darbai konteinerinių aikštelių Grinių, Stulgių kaimuose, Pakražančio seniūnijoje,
Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiskai registruoti)

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007- 02- 06 potvarkiu Nr.P1-53 šios sudėties:

A. Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr specialistas (komisijos pirmininkas);
R. Atkočaitis	- Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V. Olišauskienė	- Kelmės rajono vyr. architektė;
I. Sirusienė	- Kelmės r. aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A. Monkauskaitė	- Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R. Parnarauskienė	- ŠAVA Kelmės r. Žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V. Ramanauskis	- Kelmės r. PGT viršininkas;
A. Teišerskis	- Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
A. Sakalauskas	- seniūnas;
J. Šarakauskas	- techninis prižiūrėtojas;
R. Vėgelė	- statytojas ŠRATC direktorius;
R. Amthor	- projekto autorius;
V. Baukys	- rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas

Staybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinių aikštelių, esančių Grinių, Stulgių kaimuose, Pakražančio seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštėms teisei registracijai)

Komisija:

A. Ramanauskas
R. Atkočaitis
V. Olišauskienė
I. Sirusienė
A. Monkauskaitė
R. Parnarauskienė
V. Ramanauskis
A. Teišerskis
J. Šarakauskas
R. Amthor
R. Vėgelė
A. Sakalauskas
V. Baukys

Perdavė: V.Bauk

Priemė: R. Vėgel

data

Aldona Czekielionė

2009 -05- 0 8

KOPIJA ŽIKRA

Biuro administratore
S. Rozanaite

P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai konteinerinių aikštelių Šaltenių, Janaučių kaimuose, Kelmės apylinkių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

Kelmė

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007-02-06 potvarkiu Nr.P1-46 šios sudėties:


A.Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr specialistas (komisijos pirmininkas);
R.Atkočaitis	-Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V.Olišauskienė	-Kelmės rajono vyr. architektė;
I.Sirusienė	-Kelmės r.aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A.Monkauskaitė	-Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R.Parnarauskienė	-ŠAVA Kelmės r. Žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V.Ramanauskis	-Kelmės r. PGT viršininkas;
A.Teišerskis	-Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
A.Sutkus	-seniūnas;
J.Šarakauskas	-techninis prižiūrėtojas;
R.Vėgelė	-statytojas, ŠRATC direktorius;
R.Amthor	-projekto autorius;
V.Baukys	-rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas

Statybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinių aikštelių, esančių Šaltenių, Janaučių kaimuose, Kelmės apylinkių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštelės teisei registruoti)

Komisija:



A.Ramanauskas
R.Atkočaitis
V.Olišauskienė
I.Sirusienė
A.Monkauskaitė
R.Parnarauskienė
V.Ramanauskis
A.Teišerskis
J.Šarakauskas
R.Amthor
R.Vėgelė
A.Sutkus
V.Baukys

Perdavė: V.Baukys...

Priėmė: R.Vėgelė...

data



2009-05-08

T I K R A
Sąlyginti
Aldona Čepičionė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

4.11

P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai konteinerinių aikštelių Laikšių kaime, Šaukėnų mstl., Šaukėnų seniūnijoje,
Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

Kelmė

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007-02-06 potvarkiu Nr.P1-50 šios sudėties:


A.Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr specialistas (komisijos pirmininkas);
R.Atkočaitis	-Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V.Olišauskienė	-Kelmės rajono vyr. architektė;
I.Sirusienė	-Kelmės r.aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A.Monkauskaitė	-Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R.Parnarauskienė	-ŠAVA Kelmės r. Žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V.Ramanauskis	-Kelmės r. PGT viršininkas;
A.Teišerskis	-Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
A.Šukys	-seniūnas;
J.Šarakauskas	-techninis prižiūrėtojas;
R.Vėgelė	-statytojas ŠRATC direktorius;
R.Amthor	-projekto autorius;
V.Baukys	-rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas

Statybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinių aikštelių, esančių Laikšių kaime, Šaukėnų mstl., Šaukėnų seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštelės teisei registracijai)

Komisija:



A.Ramanauskas
R.Atkočaitis
V.Olišauskienė
I.Sirusienė
A.Monkauskaitė
R.Parnarauskienė
V.Ramanauskis
A.Teišerskis
J.Šarakauskas
R.Amthor
R.Vėgelė
A.Šukys
V.Baukys

Perdavė: V.Baukys

Priėmė: R.Vėgelė

data



2009-05-08

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai konteinerinių aikštelių Junkilų, Pašilėnų, Girklių kaimuose, Užvenčio m., Užvenčio seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

Kelmė

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007-02-06 potvarkiu Nr.P1-48 šios sudėties:

A.Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr. specialistas (komisijos pirmininkas);
R.Atkočaitis	-Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V.Olišauskienė	-Kelmės rajono vyr. architektė;
I.Sirusienė	-Kelmės r.aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A.Monkauskaitė	-Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R.Parnauskienė	-ŠAVA Kelmės r. Žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V.Ramanauskis	-Kelmės r. PGT viršininkas;
A.Teišerskis	-Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
Z.Virbalas	-seniūnas;
J.Šarakauskas	-techninis prižiūrėtojas;
R.Vėgelė	-statytojas ŠRATC direktorius;
R.Amthor	-projekto autorius;
V.Baukys	-rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas

Statybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinių aikštelių, esančių Junkilų, Pašilėnų, Girklių kaimuose, Užvenčio m., Užvenčio seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

Komisija



A.Ramanauskas
R.Atkočaitis
V.Olišauskienė
I.Sirusienė
A.Monkauskaitė
R.Parnauskienė
V.Ramanauskis
A.Teišerskis
J.Šarakauskas
R.Amthor
R.Vėgelė
Z.Virbalas
V.Baukys

Perdavė: V.Baukys

Priėmė: R.Vėgelė

data



Aldona Čiuplajonė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

Atlikti visi statybos darbai konteinerinės aikštelės Vaiguvoje, Vaiguvo seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007- 02- 06 potvarkiu Nr.P1-51 šios sudėties:

A. Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr specialistas (komisijos pirmininkas);
R. Atkočaitis	- Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V. Olišauskienė	- Kelmės rajono vyr. architektė;
I. Sirusienė	- Kelmės r. aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A. Monkauskaitė	- Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R. Parnarauskienė	- ŠAVA Kelmės r. žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V. Ramanauskis	- Kelmės r. PGT viršininkas;
A. Teišerskis	- Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
A. Lukošius	- seniūnas;
J. Šarakauskas	- techninis prižiūrėtojas;
R. Vėgelė	- statytojas ŠRATC direktorius;
R. Amthor	- projekto autorius;
V. Baukys	- rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas

Staybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinės aikštelės esančios Vaiguvos kaime, Vaiguvos seniūnijoje, Kauno rajone rengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštelės teisei registracijai).

Komisija

A. Ramanauskas
R. Atkočaitis
V. Olišauskienė
I. Sirusienė
A. Monkauskaitė
R. Parnarauskienė
V. Ramanauskis
A. Teišerskis
J. Šarakauskas
R. Amthor
R. Vėgelė
A. Lukošius
V. Baukys

Perdavė: V.Bat

Priémé: R. Vège

data

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Bluro administratore
Šarūnė Rozanaite

P A Ž Y M A

Atlikti visi statybos darbai konteinerinių aikštelių Pašilės kaime 2 vnt. Kražių mstl., Kražių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimui
(ši pažyma nesuteikia teisės aikštelę teisiškai registruoti)

Kelmė

2007 m. vasario mėn. 22 d.

Komisija, paskirta ŠAVA 2007-02-06 potvarkiu Nr.P1-49 šios sudėties:


A.Ramanauskas	- ŠAVA TPSVPS vyr specialistas (komisijos pirmininkas);
R.Atkočaitis	-Kelmės rajono mero pavaduotojas;
V.Olišauskienė	-Kelmės rajono vyr. architektė;
I.Sirusienė	-Kelmės r.aplinkos apsaugos agentūros vedėja;
A.Monkauskaitė	-Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyr. gydytoja;
R.Parnarauskienė	-ŠAVA Kelmės r. Žemėtvarkos skyriaus vedėja;
V.Ramanauskis	-Kelmės r. PGT viršininkas;
A.Teišerskis	-Kelmės r. maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;
V.Andrulis	-seniūnas;
J.Šarakauskas	-techninis prižiūrėtojas;
R.Vėgelė	-statytojas ŠRATC direktorius;
R.Amthor	-projekto autorius;
V.Baukys	-rangovas, UAB „Šiaulių Titanas“ statybos vadovas;
R.Olišauskas	-KVAĐ Šiaulių padalinio vadovas;

Stybos leidimas Nr.(18.2)-L-69 išduotas 2006-07-31

Projekto vadovas Rudolf Amthor

Komisija pripažįsta, kad projekte numatyti konteinerinių aikštelių, esančių Pašilės kaime, 2vnt. Kražių mstl., Kražių seniūnijoje, Kelmės rajone įrengimo darbai atlikti. (Ši pažyma nesuteikia teisės aikštelės teisei registracijai)

Komisija



A.Ramanauskas
R.Atkočaitis
V.Olišauskienė
I.Sirusienė
A.Monkauskaitė
R.Parnarauskienė
V.Ramanauskis
A.Teišerskis
J.Šarakauskas
R.Amthor
R.Vėgelė
V.Andrulis
R.Olišauskas
V.Baukys

Perdavė: V.Baukys

Priėmė: R.Vėgelė

data



2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

Bendro naudojimo konteinerių aikštelių įrengimas Pakruojo rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Pakruojis
(vietovė)

2007 m. vasario mėn. 09 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2007 m. sausio mėn. 30 d. potvarkiu
 Nr. P1-32

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)


šios sudėties:

- A. Balsys - Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros vyr. specialistas
 Pakruojo rajone (komisijos pirmininkas),
- A. Radeckis - Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Pakruojo rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas
 (v. pavardė) (pareigos)
- A. Šukys - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos skyriaus vyresn. architektūros specialistas
- R. Siritūnaitė - UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ projekto vadovė
- E. Gūra - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos agentūros Pakruojo rajono agentūros vedėjas
- D. Tamulionienė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro Pakruojo filialo vadovė
- R. Vėgelė - VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, direktorius

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „Šiaulių titanas“ statybos vadovui V. Baukiui, kvalifikaciją atestatas Nr. 1383,
 techniniam priežiūretojui J. Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3555,
 vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką apžiūrejo statytojo pateiktas

Bendro naudojimo konteinerių aikštes Pakruojo rajone: Degesių k., Bardiškių k., Guostagalio k., Medikonių k., Pamūšio k., Plaučiškių k., Stačiūnų k., Šukonių k., Ūdekų k., Pašvitinio mstl., Petrašiūnų k., Linkuvos mieste Mūšos g., Pakruojo mieste naujamiestyje ir Statybinių gatvėje, *Balsys k. Pakruojo raj.*

(visas statinio pavadinimas ir adresas)



kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje patikrinamas jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

Aldona Čopelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
 Šarūnė Rozanaitė

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2006 m. parengė UAB „Pakruojo projektavimo biuras“, projekto vadovė R. Sirutėnaitė, kval. atestato Nr. 11, galioja iki 2008-03-03
ir patvirtino statytojas 2006-05-26

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas buvo Pakruojo mieste Statybininkų g. ir Linkuvos mieste Mūšos g. aikštelėms. 2006 m. lapkričio 2 dienos. Nr. 67.

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 16, Šiauliai.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Šiaulių titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendrieji statybos darbai;

(monės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(monių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006m. birželio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	200	200
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	80 480	29806
Iš jos statybos ir montavimo darbų				
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
sienu		W/m ² K		
langų		“		
denginio		“		



T...
Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore

Šarūnė Kuzanauskaitė

2009-05-08

1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti s reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad bendro naudojimo konteinerių aikštelės Pakruojo rajone
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)


tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdomoji dokumentacija, 37 tomų (lapų).

Komisijos pirmininkas



2009-05-08

Antanas Cepkėnas

A. Balsys

(v. parašas)

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaite

33

Komisijos nariai:

A. Radeckis

A. Šukys

R. Siriūnaitė

E. Gūra

D. Tamulionienė

R. Vėgelė

V. Baukys

J. Šarakauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė Inžinierė
Nina Paulauskaitė
 (pareigos)
 Statybos vadovas
 Perdavė Vigantas Baukys
 (pareigos)

(parašas)

(v. pavardė)

(parašas)

(v. pavardė)

(data)



Aldona Čopelienė

KOPIJA TIKRA

2009-05-08

Biuro administracija
Šarūnė R.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Aikštelės įrengimo kaina, Lt
4. Pakruojo rajonas „A“		
4.1	Bardiškių gyv.	1571 $3m \times 4,1m^3$
4.2	Guostagalio gyv.	1571 $3m \times 4,1m^3$
4.3	Medikonių gyv.	1571 $3m \times 4,1m^3$
4.4	Plaučiškių gyv.	1571 $3m \times 4,1m^3$
4.5	Staciūnų gyv.	1571 $3m \times 4,1m^3$
4.6	Šukionių gyv.	1571 $3m \times 4,1m^3$
4.7	Ūdekų gyv.	1571 $3m \times 4,1m^3$
4.8	Degėsių	1571 $3m \times 4,1m^3$
4.9	Balsių gyv.	629 $3m \times 4,1m^3$
4.10	Pamūšio gyv.	629 $3m \times 4,1m^3$
Viso 4:		13829 $\approx 30m \times 4,1m^3$



Generalinis direktorius
Stanislovas Valius



T. J. J. J.
Audėja Čuplajienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaite

48
34

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Aikštelės įrengimo kaina, Lt
4. Pakruojo rajonas .B'		
4.1	Petrašiūnų	3196
4.2	Pašvitinio	3196
4.3	Linkuvos gyv.	3196
4.4	Pakruojo (senamiestyje)	3196
4.5	Pakruojo (naujamiestyje)	3196
Viso 4:		15980

$3 \times 1,1 \text{ m}^3 + 3 \times 1,6 \text{ m}^3$
 $3 \times 1,1 \text{ m}^3 + 3 \times 1,6 \text{ m}^3$
 $3 \times 1,1 \text{ m}^3 + 3 \times 1,6 \text{ m}^3$
 $3 \times 1,1 \text{ m}^3 + 3 \times 1,6 \text{ m}^3$
 $3 \times 1,1 \text{ m}^3 + 3 \times 1,6 \text{ m}^3$
 $15 \times 1,1 \text{ m}^3$
 $15 \times 1,6 \text{ m}^3$

+ 2 ind.



Generalinis direktorius
Stanislovas Valius

(papild.) B nro:

Jovaruž k. - $3 \times 1,1 \text{ m}^3 + 3 \times 1,6 \text{ m}^3$ Pakruojo k. - $3 \times 1,1 \text{ m}^3 + 3 \times 1,6 \text{ m}^3$ $\Sigma = 6 \times 1,1 \text{ m}^3 + 6 \times 1,6 \text{ m}^3$ Viso: $45 \times 1,1 \text{ m}^3 + 15 \times 1,6 \text{ m}^3$ papild. $6 \times 1,1 \text{ m}^3 + 6 \times 1,6 \text{ m}^3$ iš viso: $51 \times 1,1 \text{ m}^3 + 21 \times 1,6 \text{ m}^3$ 

KOPĖJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

Atstovė Čepkijonė

2009-05-08

57
25

Bendro naudojimo konteinerių aikštelių įrengimas Joniškio rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Joniškis
 (vietovė)

2007 m. liepos mėn. 17 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir
 statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2007 m. liepos mėn. 16 d. potvarkiu
 Nr. P1-204

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

G. Čepulis - Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos
 valstybinės priežiūros vyr. specialistas
 Joniškio rajone (komisijos pirmininkas),

(v.pavardė)

(pareigos)

D. Bičkienė -	Joniškio rajono savivaldybės vyr. architektė
V. Marcikonis -	UAB "Joniškio projektas" projekto vadovas.
A. Pundza -	Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūros vyr. specialistas
D. Narušaitė -	Šiaulių visuomenės sveikatos centro Joniškio skyriaus vedėja
M. Balčiūnas -	Žagarės regiono parko direktorius
R. Oliškauskas -	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio vedėjas
R. Vėgelė -	VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, direktorius

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „Šiaulių tinkamas statybos“ vadovui V. Baukiui, kvalifikacijos
 atestatas Nr. 1383,
 techniniam priežiūretojui J. Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 1355,
 vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“
 apžiūrėjo statytojo pateiktas

Bendro naudojimo konteinerių aikštes Joniškio rajone: Kriukų mstl. – 3 vnt., Blauzdžiūnų k. – 1 vnt., Leporių
 k. – 1 vnt., Melnių k. – 1 vnt., Pošupių k. – 1 vnt., Skilvonių k. – 1 vnt., Bariūnų k. – 1 vnt., Mikolaičiūnų k. – 1
 vnt., Ziniūnų k. – 4 vnt., Linkaičių k. – 2 vnt., Joniškio mieste turgelio teritorijoje – 1 vnt., Drasutaičių k. – 1
 vnt., Žvelgaičių k. – 3 vnt., Žagarės miesto turguje – 1 vnt.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

KOPIJA ŽIKRA
 Biuro administratore
 Šarūnė Rozanaitė

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje. patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2006 m. parengė UAB „Joniškio projektas“, projekto vadovas V. Marcikonis, kval. atestato Nr. 13583, galioja iki 2009-02-13
ir patvirtino statytojas 2006-11-28

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas buvo 2006 m. lapkričio 7 dienos. Nr.66.

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Lukšio g. 8, Šiauliai.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Šiaulių titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendrieji statybos darbai;

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006m. lapkričio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	290	290
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	95,51	57,22
Iš jos statybos ir montavimo darbų			83,45	45,94
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
sienu		W/m ² K		
langų		“		
denginio		“		



2009-05-08
Alina Čopčiūnė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad bendro naudojimo konteinerių aikštelės Joniškio rajone
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 1 tomas



(parašas)



G. Čepulis
(pavardė)
KOPILAITIS
Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

Aldona Čupljonė

2009-05-08

38

Komisijos nariai:

D. Bičkienė

V. Marcikonis

A. Pundza

D. Narušaitė

M. Balčiūnas

R. Olišauskas

R. Vėgelė

Inžinierė
Rita Alubickienė

Rangovas

V. Baukys

Techninis prižiūrėtojas

J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

(pareigos)
Valstybės vadovas
Vigantas Baukys

(parašas)

(v.pavardė)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

(v.pavardė)

2007-04-17
(data)

Alicija Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rėzanaitė

**Bendro naudojimo konteinerių aikštelių įrengimas Akmenės rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Akmenė
(vietovė)

2007 m. sausio mėn. 29 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2007 m. vasario mėn. 24 d. potvarkiu
Nr. PI-25

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

V. Kriščiūnas Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros vyr. specialistas
Akmenės rajone (komisijos pirmininkas),

A. Bučys (v. pavardė)	Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pareigos)
V. Buivydas	Akmenės raj. vyr. architektas
J. Bučius	Projektuotojas J. Bučiaus ind. įmonė
V. Adomaitis -	Akmenės PGT VPP inspekcijos vyr. inspektorius
J. Rakauskienė	Šiaulių visuomenės sveikatos centro Akmenės filialo vadovė
A. Puzaras	Valstybinės darbo inspekcijos vyr. darbo inspektorius
J. Katauskis	Akmenės seniūnas
V. Kateivienė	Kruopių seniūnė
A. Vaičius	Papilės seniūnas seniūnas
G. Sungailienė	Ventos seniūnė
R. Kulvinskas	N. Akmenės Kaimiškosios seniūnijos seniūnas
R. Vėgelė	VšĮ „Šiaulių regijono atliekų tvarkymo centras“ direktorius
S. Vilkas	Akmenės raj. ekologas
A. Lenkutis	Šiaulių regijono aplinkos apsaugos departamento Akmenės raj. agentūros vyr. aplinkos apsaugos inspektorius

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „Šiaulių titanas“ statybos vadovui V. Baukiui, kvalifikacijos atestatas Nr. 1383,
techniniam prižiūrėtojui J. Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3555, KOFIJA TIKRA



2009-05-08

Biuro administratore

40

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo patvirtas

Bendro naudojimo konteinerių aikštelės Akmenės rajone.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2006 m. parengė J.Bučiaus įmonė, atestato Nr. 13770 ir patvirtino statytojas: 2006-06-19

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas nebuvo

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 16, Šiauliai.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Šiaulių titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendrieji statybos darbai;

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006m. birželio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	440	440
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	84.887	64.013
Iš jos statybos ir montavimo darbų				
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
sienu				
langų				
denginio				



T I K R A

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJATIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad bendro naudojimo konteinerių aikštelės Akmenės rajone

(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 69 tomas (laipsnis)

Komisijos pirmininkas

(parašas)

V. Krisciūnas

V. Krisciūnas

(v. pavardė)

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė



Aldona Čepčiūnė

2009-05-08

PROJECT: ŠIAULIAI REGION WASTE MANAGEMENT SYSTEM
DEVELOPMENT: THE CONSTRUCTION OF AMENITY
SITES
CONTRACT NO: A/2005/Š10
OBJECT: CIVIC AMENITY SITES, COLLECTION SITES IN
AKMENE DISTRICT
FINANCING ENVIRONMENTAL PROJECTS MANAGEMENT AGENCY
AGENCY:
EMPLOYER: ŠIAULIAI REGIONAL WASTE MANAGEMENT CENTRE
CONTRACTOR: UAB "ŠIAULIŲ TITANAS"
ENGINEER: M&S UMWELTPROJEKT GMBH

TAKING OVER CERTIFICATE

Having received the Contractor's notice (UAB "Šiaulių Titanas" letter of January 8, 2007 Nr.20) under Sub-Clause 10.1 of the FIDIC general Conditions of Conditions of Contract for Plant and Design-Build (1999) we hereby certify that the Works were completed in accordance with the Contract on January 29, 2007.

"A" type sites are built in Ramučiai, Šapnagiai, Šiaudinė, Venta, Spaigiai, Sablauskiai, Padvarėliai, Menčiai, Kairiškiai, Klaišiai, Kivyliai, Kalniškiai, Jučiai, Gumbakiai, Gailaičiai, Eglesiai, Daubiškiai, Dabikinė, Biliūniškiai, Alkiškiai, Agluonai, Klykoliai.

"B" type sites are built in Agluonai, Alkiškiai, Daubiškiai, Jučiai, Kairiškiai, Kivyliai, Paeglesiai, Ramučiai, Sabliauskiai, Šapnagiai, Žerkščiai.

Works handed over by the
Contractor:

Stanislovas Valius
 Managing Director
 UAB "Šiaulių Titanas"

Works taken over by the

Regimantas Vėgė
 Director
 Šiauliai Regional Waste
 Management Center

Approved by Engineer:

Dr. Jonas Šarakauskas
 M&S Umweltprojekt GmbH



Aldona Cepuljienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
 Šarūnė Rožanaite

43

Mažųjų savartynų/ šiukšlynų sutvarkymas Joniškio rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Joniškis
(vietovė)

2007 m. lapkričio mėn. 30 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir
 statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio mėn. 26 d. potvarkiu
 Nr.P1-315
 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

G. Čepulis - Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos
 valstybinės priežiūros vyr. specialistas
 Joniškio rajone (komisijos pirmininkas),

(v.pavardė)

(pareigos)

D. Bičkienė - Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos ir architektūros
 skyriaus vedėja, vyr. architektė

V. Marcikonis - UAB "Joniškio projektas" direktorius, projekto vadovas.

R. Baltramaitis - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūros
 vedėjas

D. Narušaitė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro Joniškio skyriaus vedėja

S. Lelionis - Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus
 vedėjas

R. Vėgelė - VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, direktorius

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „NCC titanas“ statybos vadovui V.Baukiui, kvalifikacijos
 atestatas Nr. 1383,
 techniniam priežiūrėtojui J.Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3555,
 vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“
 apžiūrėjo statytojo pateiktus

Mažuosius savartynus/ šiukšlynus Joniškio rajone. Uždengiami: Dargių, Darginių, Gasčiūnų, Plikiškių, Rengių,
 Žukančių, Alsių, Trumpaičių, Stungių, Kirnaičių, Spindžių, Koriškių, Bileičių, Joniškio/Tubių, Mileikių/
 Padirvonių. Išvežami: Stungių, Daukšių.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje,
 patikrina jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

KOPĖJA TIKRA

Biuro administratore
 Šarūnė Rozanaitė

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2006 m. parengė UAB „Joniškio projektas“, projekto vad. V. Marcikonis, kval. atestato Nr. 13583, galioja iki 2009-02-13
ir patvirtino statytojas 2007-02-01
(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)
2. Leidimas statyti išduotas buvo 2007 m. vasario 5 dienos. Nr.11.
(data)
3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Lukšio g. 8, Šiauliai.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „NCC titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendr. statybos darbai;
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2007m. vasario mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiška
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	257000	257000
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	1920,84	774,42
Iš jos statybos ir montavimo darbų			1616,87	764,39
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
sienu		W/m ² K		
langu		“		
denginio		“		



2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

45

1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Atliktas ir derinamas savarankiškas gerinimo darbas (žr. priedą Nr. 1)			
2008-06-01			

Komisija pripažįsta, kad mažieji savartynai/ šiukšlynai Joniškio rajone

(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 1)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.


Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 1 tomas



(parašas)



G. Čepulis
(v. pavardė)

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

46

Komisijos nariai:

D. Bičkienė

V. Marcikonis

R. Baštramaitis

D. Narušaitė

S. Lelionis

R. Vėgelė

V. Baukys

J. Šarakauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

Projektų įgyvendinimo
grupės vadovė
Nina Paulauskienė

(pareigos)

(parašas)

(v.pavardė)

Perdavė

Statybos vadovas

Vigantas Baukys

(pareigos)

(parašas)

(v.pavardė)

2007.11.30

(data)



T. Čepelienė

Alicia Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

Mažųjų savartynų/ šiukšlynų sutvarkymas Pakruojo rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Pakruojis
(vietovė)

2008 m. sausio mėn. 18 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2008 m. sausio mėn. 07 d. potvarkiu Nr.P1-5

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

D.Pranulienė - Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros vyriausioji specialistė
Pakruojo rajone (komisijos pirmininkas),

(v.pavardė)

(pareigos)

A.Šukys - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos skyriaus vyriausiasis architektas

R.Siriūnaitė - Projekto vadovė, UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ vadovė

E.Gūra - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos agentūros Pakruojo rajono agentūros vedėjas

D.Tamulionienė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro Pakruojo skyriaus vedėja

R.Vėgelė - VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, direktorius

K. Klabienė - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus ekologė

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „NCC titanas“ statybos vadovui V.Pilipuičiui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3492, techniniam priežiūretojui J.Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3555, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrejo statytojo pateiktus

Mažuosius savartynus/ šiukšlynus Pakruojo rajone. Uždengiami: Čelkių; Juškonų; Ramonaičių; Kazokų; Pašvitinio; Mikniūnų; Sodeliškių; Pamušio; Beržynės; Žiurkių; Laipuškių; Lašmenpamušio-1; Lašmenpamušio-2; Gašionių; Megučionių; Tremtinės; Ručinių; Medikonių; Pelaniškių; Klovainių; Belevietinės/ Zeleckynės; Plaučiškių; Diržių; Putrelių; Linkuvos miesto senasis, Gledžiū. Išvežami: Dučių.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)



KOPIJA TIKRA

Aldona Čepelienė Biuro administratore

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2006 m. parengė UAB „Pakruojo projektavimo biuras“, projekto vadovė R.Siriūnaitė, kval. atestato Nr. 11, galioja iki 2008-03-03

2009-05-08

48

ir patvirtino statytojas 2006-08-31

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas nebuvo.

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Lukšio g. 8, Šiauliai.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „NCC titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendrieji statybos darbai;

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	331000	331000
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	1354,856	948,694
Iš jos statybos ir montavimo darbų			1205,92	932,764
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:		W/m ² K		
sienu		"		
langu		"		
denginio		"		



Aldona Čuplėdienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

49

1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
<i>Apieiti 2 ole. sugedusių</i>	<i>vnt.</i>	<i>3</i>	<i>2008-06-01</i>
<i>Patikrinti ir išvalyti</i>			
<i>rengti projektus</i>			

Komisija pripažįsta, kad mažieji savartynai/ šiukšlynai Pakruojo rajone yra sutvarkyti,
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr.5)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turt registre.


Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomai

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Komisijos nariai:



KOPIJA TIKRA

2009-05-08

Biuro administratorė
Šarūnė Pranulienė
(v. pavarde)

A. Šukys l. e. p. vyr. architektas
R. Ališaitė
R. Siriūnaitė

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

E.Gūra

D.Tamulionienė

R.Vėgelė

K. Klabienė

V.Pilipuitis

J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

Projekto įgyvendinimo
grupės vadovė
Nina Paulauskienė
(pareigos)

(parašas)

(v.pavardė)

Perdavė

Statybos vadovas
V.Šarakauskas
(pareigos)

(parašas)

(v.pavardė)

2008-01-18
(data)

Aldona Cepkijonė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

Mažųjų savartynų/ šiukšlynų sutvarkymas Kelmės rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Kelmė
(vietovė)

2008 m. gegužės mėn. 13 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento viršininko 2008 m. balandžio mėn. 29 d. potvarkiu Nr.P1-105
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A.Ramanauskas – Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas, Kelmės rajone (komisijos pirmininkas),

(v.pavardė)

(pareigos).

R.Atkočaitis -	Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas
A.Teišerskis -	Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas
E.Sirusienė -	Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros vedėja
R.Amthor -	Eisenbahn - und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt, projekto vadovas;
A.Monkauskaitė -	Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriaus vedėja
R.Vėgelė -	VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, direktorius
R.Parnarauskienė -	ŠAVA Žemės tvarkymo departamento, Kelmės žemėtvarkos skyriaus vedėja

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „NCC titanas“ statybos vadovui V.Pilipuičiui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3492, techniniam priežiūretojui J.Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3555, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktus

Mažuosius savartynus/ šiukšlynus Kelmės rajone. Užrašant pavadinimus: Liolių; Šaukėnų; Lupikų; Karklėnų; Vašilėnų; Svirnių; Gailių; Žalpių/Orkių; Aunuvenų; Lykšalio; Maudžiūrų; Kiaunorių; Šaltenių.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007 m. parengė Eisenbahn - und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt, projekto vadovas R.Amthor, pažymos Nr. (13-4)-D8-4606, galioja iki 2011-05-22 ir patvirtino statytojas 2006-03-21



KOPĖJA / TIKRA

Biuro administratore
Sąjūnė Rožanaitė

2009-05-08

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2007-01-09 dieną Nr. (18.2)-L-2.

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Lukšio g. 8, Šiauliai.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „NCC titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendrieji statybos darbai;

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2007 m. kovo mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
<u>I. Bendrieji rodikliai</u>				
Bendras plotas		m ²	130300	130300
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	360,039	367,021
Iš jos statybos ir montavimo darbų			327,635	358,171
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
sienu		W/m ² K		
langu		“		
denginio		“		



T. Čepčiūnė
Aldona Čepčiūnė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaite

1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad mažieji savartynai/ šiukšlynai Kelmės rajone *(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr.5)* tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti. Garantinis laikotarpis 5 metai.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir projektinė dokumentacija, 4 tomai.

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:



KOPIJA TIKRA 2009-05-08

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitytė

A. Ramanauskas
(v. pavardė)

R. Atkočaitis

54

Projektų įgyvendinimo Valdovas Riešys

A. Teišerskis

LR AM Šiaulių RAAD

Kelavės raj. vėgėdros

I. Simušienė

Apklausos specialistė

Algirdas Guščikas

R. Amthor

A. Monkauskaitė

R. Vėgelė

R. Parnarauskienė

V. Pilipuitis

J. Šarakauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

Projektų įgyvendinimo

grupės vadovė

Nina Paulauskienė

(pareigos)

Perdavė

Statybos vadovas

Vytautas Pilipuitis

(pareigos)

(v. pavardė)

(v. pavardė)

2008.05.13.

(data)



KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaite

55

Mažųjų savartynų/ šiukšlynų sutvarkymas Šiaulių rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Šiauliai
(vietovė)

2008 m. gegužės mėn. 27 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento viršininko 2008 m gegužės mėn. 15 d. potvarkiu Nr.P1-125

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė – Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, Šiaulių rajone (komisijos pirmininkas),

(v.pavardė)

(pareigos)

T.Plūkienė - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
 E. Kvasauskas - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas
 R.Amthor - Eisenbahn - und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt, projekto vadovas
 J.Tamošiūnienė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus pavaduotoja
 R.Vėgelė - VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, direktorius
 V.Vaičekauskienė - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „NCC titanas“ statybos vadovui V.Pilipuičiui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3492, techniniam priežiūrotoji J.Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 8653, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktus

Mažuosius savartynus/ šiukšlynus Šiaulių rajone. Uždengiami: Raudėnų, Barmancių, Meškuičių, Kairių, Kairių, Šakynos, Bubių, Bubių, Sauginių, Guragių, Aukštelkės, Bubių, Graudžių, Meškuičių, Šakynos.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė: Šarūnė Rožanaitė

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2006 m. parengė Eisenbahn - und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt, projekto vadovas R.Amthor, pažymos Nr. (13-4)-D8-4606, galioja iki 2011-05-22 ir patvirtino statytojas 2006-03-21

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2007-02-08 dieną Nr. 27.

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Lukšio g. 8, Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „NCC titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendriej
statybos darbai;

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2007 m. gegužės mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	353500	353500
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	1320,239	1197,618
Iš jos statybos ir montavimo darbų			1153,550	1188,768
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:		W/m ² K		
stelių		"		
langų		"		
denginio		"		



Aldona Čepkijienė

2009-05-06

KOPIJA TIKRA
Biuro
Šarūnas

1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad mažieji savartynai/ šiukšlynai Šiaulių rajone

(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr.5)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 5 kompiuteriniai diskai

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Komisijos nariai:



2009-05-08

Aldona Čepelienė
PALMIRA GEDRIKIENĖ
Šiaulių apskrities viršininko administracijos
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
prižiūros departamento
Statybos ir statinių naudojimo valstybinės
prižiūros skyriaus vyr. specialistė

(v., pavarde)

T. Plakienė D. Kocienė

KOPIJA TIKRA

E. Kvasauskas

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

57

PROJEKTŲ INŽINIERIUS VALDAS RAIZYS

R. Amthor

J. Tamošiūnienė

R. Vėgelė

V. Vaičekauskienė

V. Pilipuitis

J. Šarakauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

Projekto įgyvendinimo
grupės vadovė
Vita Paulauskienė
(pareigos)

(parašas)

(v. pavardė)

Perdavė

Statybos vadovas
Vytautas Pilipuitis
(pareigos)

(parašas)

(v. pavardė)

2008. 05. 27

(data)



T. 11.12.2008

Aldona Čepkėlienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

Mažųjų savartynų/ šiukšlynų sutvarkymas Akmenės rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Akmenė
(vietovė)

2007 m. gruodžio mėn. 14 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2007 m. gruodžio mėn. 07 d. potvarkiu Nr.P1-354

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

V. Kriščiūnas - Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros vyr. specialistas
Akmenės rajone (komisijos pirmininkas),

(v.pavardė)


(pareigos)

V. Buivydas - Akmenės rajono vyr. architektas
J. Bučius - J. Bučiaus įmonės savininkas, projekto vadovas.
A. Lenkutis - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Akmenės rajono agentūros vedėjas
J. Rakauskienė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro Akmenės skyriaus vedėja
S. Vilkas - Akmenės rajono savivaldybės ekologas
R. Vėgelė - VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, direktorius
I. Pocienė - Statybos ir urbanistikos skyriaus statinių naudojimo priežiūros vyr. specialistė.

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „NCC titanas“ statybos vadovui V.Baukiui, kvalifikacijos atestatas Nr. 1383,
techniniam priežiūretojui J.Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3555,
vadovaudamasi statybos reglamentu S.P.R. 1.11.01-2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“
apžiūrėjo statytojo pateiktus

Uždengiamus mažuosius savartynus/ šiukšlynus Akmenės rajone: Lebeliai; Trikšiai; Kairiščiai; Kruopiai;
Kivyliai; Venta.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)



Albina Čuplojienė

KOPĖJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2006 m. parengė J.Bučiaus įmonė, projekto vadovas J.Bučius, kval. atestato Nr. 13770,

58

ir patvirtino statytojas 2006-10-26
(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas nebuvo
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Lukšio g. 8, Šiauliai.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „NCC titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendrieji
statybos darbai;
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2007m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	78200	78200
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	1147,84	341,16
Iš jos statybos ir montavimo darbų			1021,66	337,62
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
sienu		W/m ² K		
langų		"		
denginio		"		



T I
Savivaldybės
Aldona Čepelienė
2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaite

1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų				
(automobilių saugyklos,		m ²		
sandėliukai) plotas				
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Atsargų ir tinkamų			2008-06-01
atstatymo darbai			
Atsargų			

Komisija pripažįsta, kad mažieji savartynai/ šiukšlynai Akmenės rajone

(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 1)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) pateikė šį akta patvirtinti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdomoji dokumentacija, 1 tomas

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Komisijos nariai:

V. Buivydas

J. Bučius

KOPIJA TIKRA

Aldona Čiuplėnė

2009-05-08

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė
V. Kriščiūnas

(v. pavarde)

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

A. Lenkutis

J. Rakauskienė

S. Vilkas

R. Vėgelė

I. Pocienė

V. Baukys

J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais -oliai saugoti:

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

pavardė)

Perdavė

Statybos vadovas
Viguntis Bujukys

(v.pavardė)

2004 12 14
(data)T. ...
Svydas

Aldona Cepkionė

2009-05-08

KOPUATIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

Mažųjų savartynų/ šiukšlynų sutvarkymas Radviliškio rajone
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Radviliškis
(vietovė)

2008 m. gegužės mėn. 29 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros departamento viršininko 2008 m gegužės mėn. 14 d. potvarkiu
Nr.P1-121

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A.Balsys – Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas, Radviliškio rajone (komisijos pirmininkas),

(v.pavardė)

(pareigos)

R.Dičiūnas - Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriaus specialistas

A.Valuckas - Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

A.Ubarevičius - UAB „Siena“ projekto vadovas

M.Saulevičius - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjas

A.Špokaitė - Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriaus vedėja

P.Kuraitis - Radviliškio rajono savivaldybės vyriausiasis ekologas

R.Vėgelė - VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui): UAB „NCC titanas“ statybos vadovui V.Pilipuičiui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3492, techniniam priežiūroto J.Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr. 3555, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamu naudoti tvarka“ apžiūrejo statytojo pateiktus

Mažuosius savartynus/ šiukšlynus Radviliškio rajone. Uždengiami: Baisiogalės; Rutenaičiai; Grinkiškio; Vėliakiemio; Sidabravo/Pakiršinio; Skėmių; Šaukoto; Šiaulėnų; Tyrulių; Butėnų; Vainiūnų; Valatkonų; Minaičių; Kubiliūnų; Pašušvio; Gujėnų; Vaitiekūnų; Baukų; Alksnupių; Beinoravos; Vadaktų; Mankiškių; Šniūraičių – 2; Pociūnėlių; Papušinio; Kunigiškių; Pavartyčių; Polekėlės; Pociūnų; Daujočių; Varnionių; Mankiškių; Šniūraičių; Acokavų; Veriškių; Diktariškių,



Atliktas patikrinimas

2009-05-08

Biuro administratore

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007 m. parengė TŪB „Siena“, projekto vadovas A. Ubarevičius, kval. atestato Nr. 4646, galioja iki 2008-05-07
ir patvirtino statytojas 2007-05-02
(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2007-05-05 dieną Nr. 07-40.

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Lukšio g. 8, Šiauliai.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „NCC titanas“ kvalifikacijos atestato Nr. 0533, galioja iki 2008 06 30, bendrieji statybos darbai;

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

jo atliktų darbų rūšis)

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2007 m. gegužės mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	264500	264500
Statybinis tūris		m ³		
Aukštų skaičius		vnt.		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	1629,146	852,841
Iš jos statybos ir montavimo darbų			1423,455	831,601
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
sienų		W/m ² K		
langų				
denginio				



Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

2009-05-08

63


1	2	3	4	5
2. Gyvenamojo namo:				
gyvenamasis plotas		m ²		
naudingas plotas		m ²		
negyvenamųjų patalpų (automobilių saugyklos, sandėliukai) plotas		m ²		
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad mažieji savartynai/ šiukšlynai Radviliškio rajone
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba numeras į akto priedą Nr.5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.



Akto priedai:
Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, techniniai
Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

(parašas)



A.Balsys
(v.pavardė)

R.Dičiūnas

2009-05-08
Kopija tikra
Biuro administratore
Santė Rozanaitė

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

A. Valuckas

A. Ubarevičius

M. Saulevičius

A. Špokaitė

P. Kuraitis

R. Vėgelė

V. Pilipuitis

J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

Projektų įgyvendinimo
grupės vadovė
Nina Paulauskienė

(pareigos)

(parašas)

(v.pavardė)

Perdavė

Statybos vadovas
Vytautas Pilipuitis

(pareigos)

(parašas)

(v.pavardė)

2008-05-23

(data)



T

Sąlygos

Aldona Čupikienė

2009-05-08

KOPJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

**Šiaulių kaimiškosios seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Šiaulių kaimiškoji sen.,
Voveriškių k.
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Šiaulių rajonas
(vietovė)

2006 m. 12 mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo
pavadootojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
(v.pavardė) (atstovo pareigos)

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
(komisijos pirmininkas),

L.Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė

E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavadootojas

T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Aplikos apsaugos skyriaus vedėja

J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos

Šiaulių TS vedėjas

E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento

Šiaulių rajono agentūros vedėjas

V.Vyšniauskas - seniūnijų seniūnas

Šiaulių kaimiškosios seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VI „Šiaulių regiono keliai“ keliu ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) P.Karitonui UAB „Šiaulių mechanizacija“ elektos
darbų vadovui

ir techniniam priežiūretojui J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 kontroliuoti pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka” apžiūrėjo statytojo pateiktą Šiaulių kaimiškosios seniūnijos atliekų priėmimo punkta,
Šiaulių kaimiškoji sen., Voveriškių k.,

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės
teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo
dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projekta, kuri 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“
atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

66

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)
ir patvirtino statytojas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2005-11-08
(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-06-27 Nr. 125
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16. LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.
aiškštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai:

UAB "Joniskio mechanizacija", atest. Nr. E-0541", lauko elektros tinklai
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006 m. liepos mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	946	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		371,51
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		144,64
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		100,44

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės pavojaus gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių inžinerinių tinklų tinkamomis priemonėmis. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nelaimingųjų atsitikimų priežasčių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

2009-05-08

Kopija tikra
Biuro administratore
Jarmė Rozanaitė

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Šiaulių kaimiškosios seniūnijos atliekų priėmimo punktas (statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5) tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Komisijos nariai:

(parašas)

Rangovas

Subrangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti

Priėmė

Inžinierė-ekspertė

Liuda Starenkaja

(pareigos)

Perdavė VI "Šiaulių regiono keliai" Šiaulių KT viršininkas

(pareigos)

2006 m.

mėn. d.

(data)

P. Gedrikienė
(v. pavarde)
Šiaulių apskrities viršininko administracijos
statybos ir statybos valstybinės
prižiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone

L. Starenkaja
(v. pavarde)

E. Gudonis
T. Plukienė
J. Matusevičius
E. Kvasauskas
V. Vyšniauskas
J. Vaitiekūnas
P. Karmonas
I. Šarakauskas

LR Valstybinė energetikos inspekcija
Šiaulių skyriaus vyriausiasis
inžinierius-inspektorius
Saulius Anglickis

P. Karmonas
I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

I. Šarakauskas

Meškuičių seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Meškuičių sen., Meškuičių mstl., Šiaulių g. 44
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Šiaulių rajonas
 (vietovė)

2006 m. 12 mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo pavaduotojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
 (v.pavardė) (atstovo pareigos)

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
 (komisijos pirmininkas),

L.Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė

E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas

T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplikos apsaugos skyriaus vedėja

J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių TS vedėjas

E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas

J.Baškienė - seniūnijų seniūnas Šiaulių rajono Meškuičių seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) P.Karitonui UAB „Joniškio mechanizacija“ elektros
darbų vadovui

r techniniam prižiūrėtoji J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Meškuičių seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Meškuičių sen.,
Meškuičių mstl., Šiaulių g. 44,

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatas, turintis nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrinęs jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2005-11-08

2009-05-08

Biuro administratore
 (parašas)

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 31

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.
aikštelės įrengimo darbai(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai:UAB "Joniškio mechanizacija", atest. Nr. E-0541", lauko elektros tinklai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006 m. gegužės mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
<u>I. Bendrieji rodikliai</u>				
Bendras plotas		m ²	759	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		365,23
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		114,88
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		73,88

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti), yra patikrinami valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonė ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamojo turto ir aplinkos apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka

2009-05-08

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

70

suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Meškučių seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

(parašas)

P. Gedrikienė
(v. pavardė)
PALMIRA GEDRIKIENĖ
Šiaulių apskrities viešiniojo administracijos
statybos planavimo ir statybos valstybinės
inspekcijos skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone

Komisijos nariai:

(parašas)

L. Starenkaja
(v. pavardė)

E. Gudonis
T. Plukienė
J. Matusevičius
E. Kvasauskas
J. Baškienė
LR Valstybinė energetikos inspekcija
Šiaulių skyriaus vyriausiasis
inžinierius-inspektorius
Saulius Anglickis

Subsąjūgos
Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nolat saugoti.

Priėmė **Inžinierė-ekspertė**
Liuda Starenkaja
(pareigos)

(parašas)




A. Naradauskas
(v. pavardė)

Perdavė **Viešininkas**
Arvydas Naradauskas
(pareigos)

(parašas)

A. Naradauskas
(v. pavardė)

(data)



Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

2003-05-08

71

**Šakynos seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Šakynos sen., Šakynos mstl., Šiaulių g. 24A
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Šiaulių rajonas
(vietovė)

2006 m. 12 mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo
pavadootojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
(v.pavardė) (atstovo pareigos)

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
(komisijos pirmininkas),

L.Starenkaja - statytojo VŠI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė

E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavadootojas

T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Aplikos apsaugos skyriaus vedėja

J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių TS vedėjas

E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas

A.B.Rudis - seniūnijų seniūnas Šiaulių rajono Šakynos seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) P.Karitonui UAB „Joniškio mechanizacija“ elektos
darbų vadovui

ir techniniam priežiūrėtojai J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Šakynos seniūnijos atliekų priėmimo punkta, Šakynos sen.,
Šakynos mstl., Šiaulių g. 24A,

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba patirtas kultūros vertybės
teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrinęs statybos techninę bei vykdymo
dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“
atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

2009-05-08

KOPIJA TIKRA
Biuro administratore
Elena Rožanaitė

72

ir patvirtino statytojas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2005-11-08

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 37

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VL „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30, aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

subrangovai:

UAB „Joniškio mechanizacija“, atest. Nr. E-0541“, lauko elektros tinklai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006 m. gegužės mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	756	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		358,73
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		121,88
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		82,47

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukreikšminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti) yra patikrinami statybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įrangą ir tinklus, tinkamumu neduoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamojo turto ir aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Šakynos seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

(parašas)

P.Gedrikienė PALMIRA GEDRIKIENĖ

(v.pavardė) Šiaulių apskrities viršininko administracijos
statinių planavimo ir statybos valstybinės
prižiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone

Komisijos nariai:

(parašas)

L.Starenkaja

(v.pavardė)

E.Gudonis

LR Valstybinė energetikos inspekcija

T.Plukienė

Šiaulių skyriaus vyriausiasis

J.Matusevičius

inžinierius-inspektorius

E.Kvasauskas

Saulius Anglickis

A.B.Rudis

J.Vaitiekūnas

P.Karitonas

I.Šarakauskas

Rangovas

Subrangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

Inžinierė-ekspertė
L. Starenkaja
(pareigos)

Perdavė

VI "Šiaulių regiono keliai" Šiaulių KT viršininkas

(pareigos)

2006 m.

(data)



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

(v.pavardė)

A.Naradauskas

(v.pavardė)

(parašas)

Šiaulių

REGIONO

keliai

REPUBLIKA

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė

Šarūnė Rozanaitė

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 30

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis) subrangovai:

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugsėjo mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	907	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		374,22
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		125,26
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		83,85

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fėkalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonės ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamojo turto ir vertingų daiktų apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) matavimų sistemos, Alarms Daikštės. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypūs yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

2009-05-08

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Raudėnų seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Priėmė

Perdavė

2006 m.

(data)

mėn. d.



2009-05-08

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaite

P. Gedrikienė
(v. pavarde)

L. Starenkaja
(v. pavarde)

E. Gudonis
T. Plukienė
J. Matusevičius
E. Kvasauskas
A. Vengkus
J. Vaitiekūnas
J. Šarakauskas

E. Kvasauskas

A. Vengkus

J. Vaitiekūnas

J. Šarakauskas



A. Naradauskas
(v. pavarde)

Kužių seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Kužių sen., Kužių mstl., Žalioji g. 20
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Šiaulių rajonas
(vietovė)

2006 m. 12 mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo pavaduotojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
(v.pavardė) (atstovo pareigos)

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
(komisijos pirmininkas),

L.Starenkaja - statytojo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė

E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas

T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių TS vedėjas

E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas

S.Mickus - seniūnijų seniūnas Šiaulių rajono Kužių seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) P.Karitonui UAB „Joniškio mechanizacija“ elektos
darbų vadovui

ir techniniam priežiūrėtojui J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Kužių seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Kužių sen., Kužių mstl., Žalioji g. 20,

(visas statinio pavadinimą ir adresą)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba kitas vertybės turintis objektas, patikrino statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kuri 2005 m. patvirtė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore

ir patvirtino statytojas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2005-11-08

(parvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 34

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

aiškštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

subrangovai:

UAB "Jonišio mechanizacija", atest. Nr. E-0541", lauko elektros tinklai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. lapkričio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	884	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		357,75
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		134.16
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		92.95

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išpėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių inžinerinių tinklų žinios tinkamas naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamojo turto apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Būro administratorė
arūnė Rožanaite

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Kužių seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).

1. Statybos techninio ir vadybinio konsultavimo, .
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, .
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, .
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekiliojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, .
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, .

(parašas)

(v., pavarde)

PALMIRA GEDRIKIENE
Šiaulių apskrities viršininko administracijoje
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
inspekcijos skyriaus vyr. specialistė. Šiaulių

i: *W. ...*
 (paraís)
...
...
...
...
...
 rretojas

(v.pavardè)

LR Valstybinė energetikos inspekcija

Šiaulių skyriaus vyriausioji

Saulius Anglickis

•

RESUB

Subrangovas

Techninis prižiūrētojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Inžinierē-ekspertē

Liz: Štarenkaja

(pareigos)

Perdavė

VI „Šiaulių regiono keliai” Šiaulių

(pareigos)

2006 m.

(daig)

data _____ mēn. d. _____

**KONTROLĒS,
KORRESPONDENCĪJOS
IR VERTĪŅU
SKYRIUS**

LIETUOVOS RESPUBLIKAS FINANSŲ MINISTERIJA *

TIKRA
Skryliaus vedėja

KOPIJA TIKRA

SKYRIUS
Skylaus vedėia

Biuro administratore
Sargūnė Rozanaite

Aldona Čepļienė

2009 -05- 0 8

**Kairių seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Kairių sen., Kairių mstl., Salduvės g. 8B
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Šiaulių rajonas
(vietovė)

2006 m. 12 mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo
pavadootojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
(v.pavardė) (atstovo pareigos)

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
(komisijos pirmininkas),

L.Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė

E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas

T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplikos apsaugos skyriaus vedėja

J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos

Šiaulių TS vedėjas

E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento

Šiaulių rajono agentūros vedėjas

J.Obrikas - seniūnijų seniūnas

Šiaulių rajono Kairių seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VI „Šiaulių regiono keliai“ keliu ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) P.Karionui UAB „Joniškio mechanizacija“ elektros
darbų vadovui

ir techniniam priežiūretojui J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Kairių seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Kairių sen., Kairių
mstl., Salduvės g. 8B,

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatas, nekilnojamosios kultūros vertybės
teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patvirtino statybos techninę bei vykdymo
dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2004 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“
atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2005-11-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore

2009-05-08

81

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 33

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

subrangovai:

UAB "Joniškio mechanizacija", atest. Nr. E-0541", lauko elektros tinklai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006 m. birželio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	503	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		356,42
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		116,96
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		75,76

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukreipimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių inžinerinių ir technologinių tinklų ir įrangos būklę. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamojo turto ir aplinkos apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra patikrintos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Santė Rozanaite

suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Kairių seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

(parašas)

PALMIRA GEDRIKIENĖ
P.Gedrikiene
(v.pavardė)
Siaulių apskritys viešinio administracijos
statinių planavimo ir statybos valstybinės
inžinerijos skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone

Komisijos nariai:

(parašas)

L.Starenkaja
(v.pavardė)

E.Gudonis
T.Plukienė
J.Matusevičius
E.Kvasauskas
J.Obrikas
P.Kautkus
J.Vaitiekūnas
J.Šarakauskas
LR Valstybinė energetikos inspekcija
Šiaulių skyriaus vyriausiasis
inžinierius-inspektorius
Saulius Anglickis

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja

Priėmė


(pareigos)

Arvydas Naradauskas

Perdavė

(pareigos)

(data)



2009-05-08

Šiaulių rajono atliekų priėmimo punktas, Kuršėnų m. sen., Kuršėnų m., Ventos g. 192
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Šiaulių rajonas
(vietovė)

2006 m. 12 mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo
pavarduotojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
(v.pavardė) (atstovo pareigos)
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
(komisijos pirmininkas),
L.Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė
E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas
T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių TS vedėjas
E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas
V.Gedmonas - seniūnijų seniūnas Kuršėnų miesto seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) P.Karitonui UAB „Joniškio mechanizacija“ elektos
darbų vadovui

ir techniniam priežiūrėtojui J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 (statinio pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka” apžiūrėjo statytojo pateiktą Šiaulių rajono atliekų priėmimo punktą, Kuršėnų miesto sen.,
Kuršėnų m., Ventos g. 192.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatų ir nekilnojamosios kultūros vertybės
teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patvirtino jo statybos techninę bei vykdymo
dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kuri 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“
atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

KOPIJA TIKRA

Siuro administratore

2009-05-08

84

ir patvirtino statytojas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2005-11-08
(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 38
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.
aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai:

UAB "Joniškio mechanizacija", atest. Nr. E-0541", lauko elektros tinklai
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. spalio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
<u>I. Bendrieji rodikliai</u>				
Bendras plotas		m ²		2128,39
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		135,19
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		58,51

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti statybines priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių inžinerinių tinklų ir įrangos naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos

2009-05-08

Biuro administratorė

dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Šiaulių rajono atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Rangovas

Subrangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti

Priėmė Inžinierė-ekspertė
Li: Starenkaja
(pareigos)

Perdavė VI "Šiaulių regiono kelių" Šiaulių KT viršininkas F. K.
(pareigos)

2006 m. mėn. d.
(data)

P. Gedrikienė PALMIRA GEDRIKIENĖ
(v. pavardė) Šiaulių apskrities viršininko administracijos
Techninių planavimo ir statybų valstybinės
inspekcijos skyriaus vyr. specialistė Šiaulių raj.

L. Starenkaja
(v. pavardė)

E. Gudonis LR Valstybinė energetikos inspekcija
T. Plukienė Šiaulių skyriaus vyriausiasis
inžinierius-inspektorius
J. Matusevičius Saulius Anglickis


E. Kvasauskas

V. Gedmonas

J. Vaitiekūnas

P. Karionas

J. Šarakauskas



A. Naradauskas
(v. pavardė)

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

Biuro administratore
Šarūnė Polanaitė

**Ginkūnų seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Saulėtekio g. 11B
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Šiaulių rajonas
(vietovė)

2006 m. 12 mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo
pavadootojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
(v.pavardė) (atstovo pareigos)
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
(komisijos pirmininkas),
L.Starenkaja - statytojo VŠI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė
E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavadootojas
T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių TS vedėjas
E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas
Z.Inda - seniūnijų seniūnas Šiaulių rajono Ginkūnų seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VT „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) P.Karitonui UAB „Jonišio mechanizacija“ elektros
darbų vadovui

ir techniniam prižiūrėtojai J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Ginkūnų seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Ginkūnų sen.,
Ginkūnų k., Saulėtekio g. 11B.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamoji kultūros vertybės
teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), pateiktas Šiaulių regiono kelių ir tiltų
dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projekta, kurį 2004 m. gegužės 11 d. patvirtino „Šiaulių regiono keliai“
atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)
ir patvirtino statytojas VŠI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2005-11-08

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaite

87

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 32

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30, aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

subrangovai:

UAB „Joniškio mechanizacija“, atest. Nr. E-0541“, lauko elektros tinklai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006 m. gegužės mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	858	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		387,33
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		114,67
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		73,46

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių inžinerinių ir prietaisų tinklų ir įrangos naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nelaimės atvejais kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės įgyvendintos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai atitinka projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytos tvarka

2009-05-08

KOPIJŲ TIKRA

Administratore

suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Ginkūnų seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

(parašas)

P. Gedrikienė PALMIRA GEDRIKIEŅĖ
Siaulių apskrities viršininko administracijos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
inspekcijos skyriaus vyriausioji specialistė
(v. pavardė)

Komisijos nariai:

(parašas)

L. Starenkaja
(v. pavardė)

E. Gudonis LR Valstybinė energetikos inspekcija
T. Plukienė Siaulių skyriaus vyriausiasis
inžinierius-inspektorius
J. Matusevičius Saulius Anglickis

E. Kvasauskas

Z. Inda

P. Kavčėnas

J. Vaitiekūnas

J. Šarakauskas

Subraupovas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Priėmė **Inžinierė-ekspertė**
Liuda Starenkaja




(pareigos)
Viršininkas

(parašas)

Perdavė **Arvydas Naradauskas**

(pareigos)

(data)



Biuro administratorė
Šarinė Rožanaitė

2009-05-08

Bubių seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Bubių sen., Bubių mstl., Gluosnių g. 2A
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Šiaulių rajonas
(vietovė)

2006 m. 12 mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo
pavduotojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
(v.pavardė) (atstovo pareigos)

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
(komisijos pirmininkas),

L.Starenkaja - statytojo VŠI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė

E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas

T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplikos apsaugos skyriaus vedėja

J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių TS vedėjas

E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas

V.Slabys - seniūnijų seniūnas Šiaulių rajono Bubių seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VT „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialių darbų vadovams) P.Karitonui UAB „Joniškio mechanizacija“ elektos
darbų vadovui

ir techniniam priežiūretojui J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Bubių seniūnijos atliekų priėmimo punkta, Bubių sen., Bubių
mstl., Gluosnių g. 2A,

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė, ar pastatas / nekilnojamosios kultūros vertybės
teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patalpa / jo statybos techninė bei vykdymo
dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“
atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data) 2009-05-08

KOPIJA TIKRA
šiuo administratorė

ir patvirtino statytojas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2005-11-08

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 35

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30,
aiškštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai:

UAB "Joniškio mechanizacija", atest. Nr. E-0541", lauko elektros tinklai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006 m. birželio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
<u>I. Bendrieji rodikliai</u>				
Bendras plotas		m ²	850	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		361,93
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		127,08
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		85,88

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių inžinerinių tinklų ir įrangos tinkle. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamojo turto apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos

2009-05-08

KOPIJA TIKRA
Biuro administratorė
Jūratė Rozanaite

91

dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Bubių seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

(parašas)

P. Gedrikienė PALMIRA GEDRIKIENĖ
(v. pavardė) Šiaulių apskrities viršininko administracijos
statinių planavimo ir statybos valstybinės
prižiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių r.

Komisijos nariai:

(parašas)

L. Starenkaja
(v. pavardė)

E. Gudonis
T. Plukienė
J. Matusevičius
E. Kvasauskas
V. Slabys
J. Vaitiekūnas
P. Karionas
J. Šarakauskas

Rangovas

Subrangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Priėmė

Inžinierė-ekspertė
Linda Starenkaja
(pareigos)

(parašas)


Perdavė

VI "Šiaulių regiono kelių" Šiaulių KT viršininkas
(pareigos)

2006 m.

(data)

mėn.



TIKRA
Skyriaus vedėja

Būro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

2009-05-08

92

**Gruzdžių seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Gruzdžių sen., Gruzdžių mst., Vaitkaus g. 2
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Šiaulių rajonas
(vietovė)

2006 m. mėn. d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus vedėjo
pavadootojos 2006-09-20 potvarkiu Nr.P1-343
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

P.Gedrikienė - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos
(v.pavardė) (atstovo pareigos)
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė Šiaulių rajone
(komisijos pirmininkas),
L.Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė
E.Gudonis - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavadootojas
T.Plukienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Aplikos apsaugos skyriaus vedėja
J.Matusevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių TS vedėjas
E.Kvasauskas - regioninio aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vedėjas
N.Bagdonavičienė - seniūnijų seniūnas Šiaulių rajono Gruzdžių seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų
priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) P.Karitonui UAB „Jonišio mechanizacija“ elektros
darbų vadovui

ir techniniam priežiūrėtojai J.Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Gruzdžių seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Gruzdžių sen.,
Gruzdžių mst., F.Vaitkaus g. 2.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas, nekilnojamoji kultūros vertybė
teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrinimo metu techninė bei vykdymo
dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projekta, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“
atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2006-11-08

2009-05-08
93
Rajono administratorė
Onė Rozanaitė

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-03-14 Nr. 36

(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

subrangovai:

UAB "Jonišio mechanizacija", atest. Nr. E-0541", lauko elektros tinklai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2006 m. gegužės mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	690	
Iš to skaičiaus asfaltbetonio dangos plotas		m ²		374,38
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		138,23
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbų kaina		tūkst. Lt		95,02

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių inžinerinių ir technologinių tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nelaimingų atsitikimų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuotraukos yra nustatyta tvarka

2009-05-08

KOPIJA TIKRA
Biuro administratorė
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Gruzdžių seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,
4. Dėrų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas

(parašas)

P. Gedrikienė PALMIRA GEDRIKIENĖ
Siaulių apskrities viršininko administracijos
statinių planavimo ir statybos valstybinės
inspekcijos skyriaus vyr. specialistė, Siaulių rajon

(v. pavardė)

Komisijos nariai:

(parašas)

L. Starenkaja
(v. pavardė)

E. Gudonis

LR Valstybinė energetikos inspekcija
Siaulių skyriaus vyriausiasis
inžinierius-inspektorius
Saulius Anglickis

T. Plukienė

J. Matusevičius

E. Kvasauskas

N. Bagdonavičienė

P. Kautonius

J. Vaitiekūnas

J. Šarakauskas

Gruzdžių seniūnas

Nijolė Bagdonavičienė

Sucreizpovos

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja

(pareigos)

Perdavė

Viršininkas
Arvydas Naradauskas

(pareigos)

(data)

(parašas)

Arvydas Naradauskas
(v. pavardė)

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPUJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozan

Šiaulėnų seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Šiaulėnų mstl., Šiaulėnų sen., Radviliškio rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Šiaulėnų mstl.
 (vietovė)

2006 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Komisija, paskirta **ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-05 potvarkiu Nr.P1-321**
 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A.Balsys - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vyr. specialistas Radviliškio r. (komisijos pirmininkas),

A.Vilčinskas - savivaldybės administracijos Radviliškio r. architektūros ir statyb. sk. vedėjas

L.Starenkajai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei

E.Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui

Z.Štikūnienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Radviliškio filialo vyr.gydytoja

- Energetikos valstybinės inspekcijos

M.Saulevičius - regioninio aplinkos apsaugos departamento Radviliškio r. agentūros l.e. vedėjo pareigas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) **J.Vaitiekūnui** VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros tarnybos viršininkui atest.Nr.1346

(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams)

ir techniniam prižiūrėtojui **J.Šarakauskui**

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą **Šiaulėnų seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Šiaulėnų mstl., Šiaulėnų sen., Radviliškio r.**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)


ir patvirtino statytojas

(patvirtinimo data, parašas ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 Nr. 15
 (data)

Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Šiaulių Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:



TIKRA
 Skyriaus vedėja

Adresas: 4578727

2009-05-08

KOPJA TIKRA
 Biuro administratorė
 Šarūnė Rozanaite

96

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.
 aikštelės įrengimo darbai
 (įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
 subrangovai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	993	993
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	191,089	191,089
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamybės, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės statybos plotas		m ²	359,85	359,85
tvarkomas plotas		m ²		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:



TIKRA
 Skyriaus vedėja
 Aldona Čepelienė
 2009-05-08

KOPIJA TIKRA
 Biuro administratore
 Šarūnė Rozanaitė

97

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Šiaulių seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 5 tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.

Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.



Savininkas:

Komisijos nariai:

Rangovas
Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Priėmė Inžinierė-ekspertė
Liuola Starenkajai
(pareigos)

Perdavė (pareigos)

(data)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

A. Balsys
(v. pavarde)

A. Vilčinskas
(v. pavarde)

L. Starenkajai

E. Gudonis

Z. Škikūnienė

M. Saulevičius

I. Vaitiekūnas
J. Štarkauskas



(parašas)

(parašas)

(parašas)

TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore

Barbė Rozanaitė

2009-05-08

Direktoriaus pavaduotojas
techninis direktorius
Evaldas Gudonis
Kv. atestato Nr. 3177

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

(v. pavarde)

Šeduvos seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Šeduvos m. Žveju g. 17A, Radviliškio rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Šeduvos sen.
 (vietovė)

2006 m. rugpjūtio mėn. 28 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-05 potvarkiu Nr. P1-321
 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A. Balsys - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vyr. specialistas Radviliškio r. (komisijos pirmininkas),

A. Vilčinskas - savivaldybės administracijos Radviliškio r. architektūros ir statyb. sk. vedėjas

L. Starenkai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei

E. Gudonini - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui

Z. Štikūnienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Radviliškio filialo vyr. gydytoja

P. Karišonas - Energetikos valstybinės inspekcijos UAB „Joniškio mech.“ elektros d. v.

M. Saulevičius - regioninio aplinkos apsaugos departamento Radviliškio r. agentūros l. e. vedėjo pareigas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) **J. Vaitiekūniui** VT „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros tarnybos viršininkui atest. Nr. 1346

(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams)

ir techniniam priežiūrėtojui **J. Šarakauskui**

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą **Šeduvos seniūnijos atliekų priėmimo punkta, Šeduvos m., Žveju g. 17A, Radviliškio r.**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas

(patvirtinimo dokumento Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 Nr. 05-10

(data)

Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, LT-4578727
Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

KOPIJA TIKRA
 Biuro administratorė
 Šarūnė Rožanaite

2009-05-08

99

aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovaiUAB „Joniskio mechanizacija“ kv. atestato Nr. 3-79
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)
Aikštelių apšvietimo įrengimas

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	914	914
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	117,500	117,500
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamybės, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės sklypo plotas		m ²	382,29	382,29
tvarkomas plotas		m ²		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir techninės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti.



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė

KOPJA TIKRA
Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

2009-05-08

100

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Šeduvos seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 5 tomų (lapų).
 2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
 3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
 4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.
- Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, 1.



Savininkas

Komisijos nariai:

Rangovas
Techninis prižiūrėtojas

A. Balsys

(v. pavardė)

A. Vilčinskas

(v. pavardė)

L. Starenkajai

E. Gudonis

Z. Štikūnienė

P. Kasičionas

M. Saulevičius

J. Vaitiekūnas

J. Šarackas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Priėmė


Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja
(pareigos)

(parašas)

Perdavė

(pareigos)

(data)



(parašas)



Direktorius pavaduotojas
techninis inspektorius

E. Valdas Gaidys

(Kv. atestato Nr. pavardė)

TIKRA

Skyriaus vedėja

Aidona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore

Š. Rozanaitė

Tyrulių seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Polekėlės km., Tyrulių sen., Radviliškio rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Tyrulių sen.
(vietovė)

2006 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-05 potvarkiu Nr. P1-321
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A. Balsys - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vyr. specialistas Radviliškio r. (komisijos pirmininkas),

A. Vilčinskas - savivaldybės administracijos Radviliškio r. architektūros ir statyb. sk. vedėjas

L. Starenkajai - statytojo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieriui-ekspertei

E. Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui

Z. Štikūnienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Radviliškio filialo vyr. gydytoja
 - Energetikos valstybinės inspekcijos

M. Saulevičius - regioninio aplinkos apsaugos departamento Radviliškio r. agentūros vedėjo pareigas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) **J. Vaitiekūnui** VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros tarnybos viršininkui atest. Nr. 1346

(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams)

ir techniniam prižiūrėtojui **J. Šarakauskui**

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą **Tyrulių seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Tyrulių sen., Radviliškio r.**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (*nereikalingus žodžius išbraukti*), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras im. k. 4578727

(patvirtinimo dokumento Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 Nr. 052-01

(data)

Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, P. Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

KOPIJA IKRA
 Biuro administratorė
 Šarūnė Rozanaitė

2009-05-08

102

aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovaiUAB „Joniskio mechanizacija“ kv. atestato Nr. 3-79
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)
Aikštelės apšvietimo įrengimas

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	1000	1000
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	103,570	103,570
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamybos, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės sklypo plotas		m ²	382,04	382,84
tvarkomas plotas		m ²		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti.



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2009-05-08

KOPIJA TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

103

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Tyrulių seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 5 tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.



Savininkas

Komisijos nariai:

Rangovas

Techninis priežiūrėtojas

Priėmė

Perdavė

(data)

Inžinierė-ekspertė
Linda Starenkajai
(pareigos)

(pareigos)



(parašas)

(parašas)



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

A. Balsys

(v. pavardė)

A. Vilčinskas

(v. pavardė)

L. Starenkajai

E. Gudonis

Z. Štikūnienė

M. Saulevičius

J. Vaitiekūnas

J. Šarakauskas



Dirkšpinaus pavaduotojas
techninės inspekcijos
Evaldas Čiškutis
Kv. atstatyto Nr. 3111
(v. pavardė)

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

**Baisogalos seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Baisogalos mstl., Baisogalos sen., Radviliškio
raionas**
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Baisogalos mstl.
(vietovė)

2006 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-05 potvarkiu Nr. P1-321
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A. Balsys - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vyr. specialistas Radviliškio r. (komisijos pirmininkas),

A. Vilčinskas - savivaldybės administracijos Radviliškio r. architektūros ir statyb. sk. vedėjas

L. Starenkajai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei

E. Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui

Z. Škikūnienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Radviliškio filialo vyr. gydytoja
- Energetikos valstybinės inspekcijos

M. Saulevičius - regioninio aplinkos apsaugos departamento Radviliškio r. agentūros l.e. vedėjo pareigas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J. Vaitiekūnui VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros tarnybos viršininkui atest. Nr. 1346

(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams)

ir techniniam prižiūrėtojui J. Šarakauskui

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą **Baisogalos seniūnijos atliekų priėmimo punkta, Baisogalos mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r.**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:


1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)
ir patvirtino statytojas

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 Nr. 05-06
(data)

Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, V.K. 4578727
Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

2009-05-08

105

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.
 aikštelės įrengimo darbai
 (įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
 subrangovai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	840	840
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	121,584	121,584
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamybos, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės statybos plotas		m ²	356,40	356,40
tvarkomas plotas		m ²		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti.



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
 Šarūnė Rožanaitė

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad **Baisogalos seniūnijos atliekų priėmimo punktas**
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 5 tomų (lapų).
 2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
 3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
 4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.
- Statinio ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti,



Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

(parašas)

A. Balsys
(v. pavarde)

A. Vilčinskas
(v. pavarde)

L. Starenkajai

E. Gudonis

Z. Škikūnienė

M. Saulevičius

Rangovas
Techninis prižiūrėtojas

J. Vaitiekūnas

J. Vaitiekūnas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti

Priėmė Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja
(pareigos)

(parašas)

Perdavė

(pareigos)

(data)



Direktorius, pavaldininkas
techninis direktorius
E. Gudonis
Kv. atestato Nr. 5177

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biro administratore
Šarūnė Rožanaite

107

Grinkiškio seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Grinkiškio mstl., Radviliškio rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Grinkiškio mstl.
(vietovė)

2006 m. rugsejo mėn. 28 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-05 potvarkiu Nr. P1-321
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A. Balsys - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vyr. specialistas Radviliškio r. (komisijos pirmininkas),

A. Vilčinskas - savivaldybės administracijos Radviliškio r. architektūros ir statyb. sk. vedėjas

L. Starenkai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei

E. Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui

Z. Štikūnienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Radviliškio filialo vyr. gydytoja

- Energetikos valstybinės inspekcijos

M. Saulevičius - regioninio aplinkos apsaugos departamento Radviliškio r. agentūros l.e. vedėjo pareigas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) **J. Vaitiekūnui** VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros tarnybos viršininkui atest. Nr. 1346

(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams)

ir techniniam priežiūrėtojui **J. Šarakauskui**

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą **Grinkiškio seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Grinkiškio sen., Radviliškio r.**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje *(nereikalingus žodžius išbraukti)*, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas

(patvirtinimo dokumento Nr. ir galiojimo data)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23

(data)

Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, į/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
 J. R. R. R. R. R.

TIKRA

Skyriaus vedėja

2009-05-11 8

Aldona Čepelienė

108

aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
<u>1. Bendrieji rodikliai</u>				
Bendras plotas		m ²	992	992
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	196,242	196,242
Iš jos statybos ir montavimo darbų		"		
<u>4. Gamybos, transporto, ryšių ir kitų statinių:</u>				
pirmos eilės statybos plotas		m ²	381,74	381,74
tvarkomas plotas		m ²		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:



TIKRA
Skyriaus vedėja
2009-05-09
Aldona Čepkelytė
Kopija tikra
Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

109


Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Grinkiškio seniūnijos atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
 tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, *15* tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, 1.



Savininkas

Komisijos nariai:

Rangovas
Techninis prižiūrėtojas

A. Balsys

(v. pavardė)

A. Vilčinskas

(v. pavardė)

L. Starenkajai

E. Gudonis

Z. Štikūnienė

M. Saulevičius

J. Vaitiekūnas

J. Sarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Priėmė *Inžinierė-ekspertė*
Liuđa Starenkaja
(pareigos)

Perdavė

(data)

(parašas)

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Direktoriaus pavaduotojas,
techninis direktorius
Evaldas Čepelienė
Kv. atestato Nr. 3177



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Re. Rozanaite

2009-05-08

110

Radviliškio rajoninis atliekų priėmimo punktas, Radviliškio sen., Žironų km, Radviliškio rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Radviliškio r.
(vietovė)

2006 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-05 potvarkiu Nr. P1-321
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

A. Balsys - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vyr. specialistas Radviliškio r.
(komisijos pirmininkas),

A. Vilčinskis - savivaldybės administracijos Radviliškio r. architektūros ir statyb. sk. vedėjas

L. Starenkajai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei

E. Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui

Z. Štikūnienė - valstybinio visuomenės sveikatos centro Radviliškio filialo vyr. gydytoja

P. Klonitonas - Energetikos valstybinės inspekcijos UAB „Joniškių mech. elektrinės d. v.“

M. Saulevičius - regioninio aplinkos apsaugos departamento Radviliškio r. agentūros l. e. vedėjo pareigas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) **J. Vaitiekūnui** VT „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros tarnybos viršininkui. atest. Nr. 1346

(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams)

ir techniniam priežiūrėtojui **J. Šarakauskui**

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą **Radviliškio rajoninis atliekų priėmimo punktas, Radviliškio sen., Žironų km, Radviliškio r.**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 Nr. 26-07 SKYRIUS (data)

Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, V/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

KOPIJA TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.
 aikštelės įrengimo darbai
 (įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
 subrangovai
 UAB „Joniskio mechanizacija“ atestato Nr. 3-79
 (įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)
 Aikštelės apšvietimo įrengimas

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	1935	1935
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	229,328	229,328
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamybės, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės statybos plotas		m ²	645,98	645,98
tvarkomas plotas		m ²		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti.



TIKRA
 Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
 Šarūnė Rožanaitė

2009-05-08

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Radviliškio rajoninis atliekų priėmimo punktas
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 5 tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.

Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.



Savininkas

Komisijos nariai:

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Priėmė


Perdavė

(data)

Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja

(pareigos)

(pareigos)



A. Balsys

(v. pavardė)

A. Vilčinskas

(v. pavardė)

L. Starenkajai

E. Gudonis

Z. Štikūnienė

P. Karitonas

M. Saulevičius

J. Vaitiekūnas

J. A. Karionas



Direktorius pavaduotojas
techninis direktorius
Evaldas Gudonis
Kv. alėja Nr. 3177

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė
KOPIJUOTI

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

2009-05-08

Inžinerinio statinio: "Rozalimo seniūnijos atliekų priėmimo punktas"
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis- kita, unikalus Nr. 4400-0989-1354
Rozalimo mstl., Pakruojo rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)

pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS

PAKRUOJIS
(vietovė)

2006 m. lapkričio mėn. 30 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2006-10-10 d. potvarkiu Nr.P1-381 šios sudėties:

G.Kiela- Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Pakruojo rajone (komisijos pirmininkas);

A. Šukys - Pakruojo raj. savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos sk. vyresn. architektūros specialistas;

L.Starenkaja - Statytojo atstovas, VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė- ekspertė;

R. Stuopelis - Projekto vadovas, UAB "Archinova";

V.Vilkas - Kv. atestato VEBŠiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius – inspektorius;

E. Gūra - Pakruojo rajono agentūros rajono vyr. valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius;

J.Venckus - Rozalimo seniūnijos seniūnas;

dalyvaujant statybos vadovui – **J.Vaitekūnui**, atestato Nr.1346 ir techninės priežiūros vadovui - **J.Šarakauskui**, atestato Nr. 3555, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą "Rozalimo seniūnijos atliekų priėmimo punktą", kuris nėra nekilnojamos kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę (reg. Nr.44/360572) bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2004 m. parengė UAB "Archinova", (atestato Nr.1785)
2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 d. Nr. 5;
3. Statytojo pavadinimas ir adresas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras; Ežero g.16, Šiauliai.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko: AB Šiaulių regiono kelių, Pakruojo kelių tarnyba.
5. Statyba pradėta 2005 m;
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Aikštelė			
1.1 dangos tipas	x	x	Asfaltbetonio danga
1.2 dangos plotas	m2	385,27	
2 Faktiška statybos kaina	Lt.	107106,89	

3. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, išvardytais šio akto 2 priede.

4. Projekte numatytos darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojiaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

5. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektą ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyti ir suderinti bei nuodiję pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos numatoma leisti atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
			2009-05-08

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

7. Statinio naudojimo garantinis laikas 10 metų.


Komisija pripažįsta, kad "Rozalimo atliekų priėmimo punktas" tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

8. Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:


1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomų (lapų).
2. Inžinerinių statinių bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 1 l.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, 1 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos, 1 l.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inž. tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1 l.

Komisijos pirmininkas


(parašas)

G. Kiela

Komisijos nariai :


(parašas)

A. Šukys


(parašas)

L. Starenkaja


(parašas)

Direktoriaus pavaduotojas
techninis direktorius
Evaldas Gudonis
Kv. atestato Nr. 3177
V. Vilkas

E. Gūra

su posto bo mci


(parašas)

J. Venckus

Statybos vadovas


(parašas)

J. Vaitekūnas

Techninės priež. vadovas


(parašas)

J. Šarakauskas


Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmimui nuolat saugoti:

Priėmė Inžiniere-ekspertė
Liuda Starenkaja
(pareigos)


(parašas)

Perdavė Direktoriaus pavaduotojas
techninis direktorius
Evaldas Gudonis
(data)


(parašas)



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

2009-05-08

Inžinerinio statinio: "Žeimelio seniūnijos atliekų priėmimo punktas"
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis- kita, unikalus Nr. 4400-0976-4094
Žeimelio mstl., Pakruojo rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)

pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS

PAKRUOJIS
(vietovė)

2006 m. lapkričio mėn. 30 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2006-10-10 d. potvarkiu Nr. P1-383 šios sudėties:

G. Kiela- Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Pakruojo rajone (komisijos pirmininkas);

A. Šukys - Pakruojo raj. savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos sk. vyresn. architektūros specialistas;

L. Starenka - Statytojo atstovas, VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro" inžinierė- ekspertė;

R. Stupelis - Projekto vadovas, UAB "Archinova" techninis direktorius

V. Vilka - VėI Šiaulių teritorinio skyriaus vyr. inžinierius - inspektorius;

E. Gura - Pakruojo rajono agentūros rajono vyr. valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius;

A. Budnikas - Žeimelio seniūnijos seniūnas;

dalyvaujant statybos vadovui – J. Vaitekūnui, atestato Nr. 1346 ir techninės priežiūros vadovui -

J. Šarakauskui, atestato Nr. 3555, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą "Žeimelio seniūnijos atliekų priėmimo punktą", kuris nėra nekilnojamos kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę (reg. Nr. 44/360583) bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2004 m. parengė UAB "Archinova", (atestato Nr. 1785)
2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 d. Nr. 7;
3. Statytojo pavadinimas ir adresas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras; Ežero g. 16, Šiauliai.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko: AB Šiaulių regiono kelių, Pakruojo kelių tarnyba.
5. Statyba pradėta 2005 m;
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Aikštelė			
1.1 dangos tipas	x	x	Asfaltbetonio danga
1.2 dangos plotas	m2	355,76	
2. Faktiška statybos kaina	Lt.	119300,61	


3. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, išvardytais šio akto 2 priede.

4. Projekte numatytos darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

5. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaite

2009-05-08

116

7. Statinio naudojimo garantinis laikas 10 metų.

Komisija pripažįsta, kad "Žemelio atliekų priėmimo punktas" tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

8. Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:


1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomų (lapų).
2. Inžinerinių statinių bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inž. tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas



(parašas)

G. Kiela

Komisijos nariai :


(parašas)


A. Šukys


(parašas)

L. Starenkaja
Direktorius pavaduotojas
techninis direktorius
E. Gudonis
Kv. atestato Nr. 3177


(parašas)

V. Vilkas


(parašas)

E. Gūra


(parašas)


A. Budnikas

Statybos vadovas


(parašas)

J. Vaitekūnas

Techninės priež. vadovas


(parašas)


J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmiamam objektui saugoti.

Priėmė Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja
(pareigos)


(parašas)

Perdavė


(data)

Direktorius pavaduotojas
techninis direktorius
E. Gudonis
Kv. atestato Nr. 3177



Inžinerinio statinio: "Pakruojo rajono atliekų priėmimo punktas"
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis- kita, unikalus Nr. 4400-0989-7592
Kuosiškių kaimas, Pakruojo rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)

pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS

PAKRUOJIS
(vietovė)

2006 m. lapkričio mėn. 30 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2006-10-10 d. potvarkiu Nr. P1-379 šios sudėties:

G. Kiela- Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Pakruojo rajone (komisijos pirmininkas);

A. Šukys - Pakruojo raj. savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos sk. vyresn. architektūros specialistas;

L. Starenkaja - direktoriaus pavaduotoja, VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė- ekspertė;

R. Stuopelis - techninis direktorius, projekto vadovas, UAB "Archinova";

V. Vilkas - Kv. atestato Nr. 1177 Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius – inspektorius;

E. Gūra - Pakruojo rajono agentūros rajono vyr. valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius;

V. Grigonis - Pakruojo seniūnijos seniūnas;

dalyvaujant statybos vadovui – **J. Vaitekūnui**, atestato Nr. 1346 ir techninės priežiūros vadovui -

J. Šarakauskui, atestato Nr. 3555, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą "Pakruojo rajono atliekų priėmimo punktą", kuris nėra nekilnojamos kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę (reg. Nr. 44/360549) bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2004 m. parengė UAB "Archinova", (atestato Nr. 1785)
2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 d. Nr. 3;
3. Statytojo pavadinimas ir adresas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras; Ežero g. 16, Šiauliai.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko: AB Šiaulių regiono kelių, Pakruojo kelių tarnyba.
5. Statyba pradėta 2005 m;
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Aikštelė			
1.1 dangos tipas	x	x	Asfaltbetonio danga
1.2 dangos plotas	m2	571,32	
2. Faktiška statybos kaina	Lt.	173096,84	


3. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, išvardytais šio akto 2 priede.

4. Projekte numatytos darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

5. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas



Biuro administratorė
 J. R. Rozanaite

2009-05-08

118

7. Statinio naudojimo garantinis laikas 10 metų.


Komisija pripažįsta, kad " Pakruojo rajono atliekų priėmimo punktas⁴ tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

8. Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:


1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomų (lapų).
2. Inžinerinių statinių bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, - 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inž. tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas


(parašas)

G. Kiela

Komisijos nariai :


(parašas)

A. Šukys


(parašas)

L. Starenkaja


(parašas)


Direktoriaus pavaduotojas
Techninis direktorius
E. Gūra
Kv. atestato Nr. 3177
V. Vilkas

E. Gūra


(parašas)


V. Grigonis

Statybos vadovas


(parašas)

J. Vaitekūnas

Techninės priež. vadovas


(parašas)

J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmimo punkto saugoti.
Inžinierė-ekspertė
Lina Starenkaja

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

Perdavė

(data)

Direktoriaus pavaduotojas
techninis direktorius
E. Gūra
Kv. atestato Nr. 3177



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaite

119

Inžinerinio statinio: "Klovainių seniūnijos atliekų priėmimo punktas"
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis- kita, unikalus Nr. 4400-0976-3720
Klovainių mstl., Pakruojo rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)

**pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS**

PAKRUOJIS
(vietovė)

2006 m. lapkričio mėn. 30 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2006-10-10 d. potvarkiu Nr. P1-380 šios sudėties:

G. Kiela- Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Pakruojo rajone (komisijos pirmininkas);

A. Šukys - Pakruojo raj. savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos sk. vyresn. architektūros specialistas;

L. Starenkaja - Statytojo atstovas, VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė- ekspertė;

R. Stuopelis - Projekto vadovas, UAB "Archinova";

V. Vilkas - VEI Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius – inspektorius;

E. Gūra - Pakruojo rajono agentūros rajono vyr. valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius;

R. Staišiūnas - Klovainių seniūnijos seniūnas;

dalyvaujant statybos vadovui – J. Vaitekūnui, atestato Nr. 1346 ir techninės priežiūros vadovui -

J. Šarakauskui, atestato Nr. 3555, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą "Klovainių seniūnijos atliekų priėmimo punktą", kuris nėra nekilnojamos kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę (reg. Nr. 44/360549) bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2004 m. parengė UAB "Archinova", (atestato Nr. 1785)
2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 d. Nr. 3;
3. Statytojo pavadinimas ir adresas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras; Ežero g. 16, Šiauliai.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko: AB Šiaulių regiono kelių, Pakruojo kelių tarnyba.
5. Statyba pradėta 2005 m;
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Aikštelė			
1.1 dangos tipas	x	x	Asfaltbetonio danga
1.2 dangos plotas	m2	386,27	
2. Faktiška statybos kaina	Lt.	107958,88	


3. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, išvardytais šio akto 2 priede.

4. Projekte numatytos darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

5. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atlikti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Kiekis	Užbaigimo laikas



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

2009-05-08

120

Komisija pripažįsta, kad "Klovainių atliekų priėmimo punktas" tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomų (lapų).
2. Inžinerinių statinių bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, - 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristiko, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inž. tinklų), kurie pripažįstami tinkamai naudoti, sąrašas,

(paraísos)

Komisijos nariai :

О.А.Шамкин

A. Šukys

L. Starenkaja

R.Stuopelis

V.Vilkas

E.Gūra

R. Staišiūnas

Statybos vadovas

[Handwritten signature]

J.Vaitekūnas

Techninės priež. vadovas

1/11/55

J.Šarauškas

Priemė _____
Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja
(pareigos)

Perdayè

(data)

KOPIJA TIŠ...

Biuro administratore
Sarina Rozanaitė

TIKRA
Skyriaus vedė

Aldona Čepelienė

2009-05-08

124

Inžinerinio statinio: "Lygumų seniūnijos atliekų priėmimo punktas"
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis- kita, unikalus Nr. 4400-0976-4018
Lygumų mstl., Pakruojo rajonas
(statinio pavadinimas ir adresas)

**pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS**

PAKRUOJIS
(vietovė)

2006 m. lapkričio mėn. 30 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2006-10-10 d. potvarkiu Nr.P1-382 šios sudėtis:

G.Kiela- Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Pakruojo rajone (komisijos pirmininkas);

A. Šukys - Pakruojo raj. savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos sk. vyresn. architektūros specialistas;

L.Starevičius - Statytojo atstovas, VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė- ekspertė; Danga techninis direktorius

R. Stuoopelis - Projekto vadovas, UAB "Archinova";

V.Vilkas - V. atestato Nr. 3177 VEI Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius – inspektorius;

E. Gūra - Pakruojo rajono agentūros rajono vyr. valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius;

G.Poliakas - Lygumų seniūnijos seniūnas;

dalyvaujant statybos vadovui – **J.Vaitekūnui**, atestato Nr.1346 ir techninės priežiūros vadovui - **J.Šarakauskui**, atestato Nr. 3555, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą "Lygumų seniūnijos atliekų priėmimo punktą", kuris nėra nekilnojamos kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę (reg. Nr.44/360534) bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2004 m. parengė UAB "Archinova", (atestato Nr.1785)
2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-23 d. Nr. 6;
3. Statytojo pavadinimas ir adresas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras; Ežero g.16, Šiauliai.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko: AB Šiaulių regiono kelių, Pakruojo kelių tarnyba.
5. Statyba pradėta 2005 m;
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Aikštelė			
1.1 dangos tipas	x	x	Asfaltbetonio danga
1.2 dangos plotas	m2	365,21	
2.Faktiška statybos kaina	Lt.	104560,64	

3. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais. išvardytais šio akto 2 priede.

4. Projekte numatytos darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

5. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Kiekis	Užbaigimo laikas

Būro administratorė
Safunė Rožanaitė

Aldona Čaplajonė

2009-05-08

1221

7. Statinio naudojimo garantinis laikas 10 metų.


Komisija pripažįsta, kad "Lygumų atliekų priėmimo punktas" tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

8. Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:


1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomų (lapų).
2. Inžinerinių statinių bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, - 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inž. tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas



(parašas)

G. Kiela

Komisijos nariai :


(parašas)


A. Šukys


(parašas)


L. Starenkaja
Direktoriaus pavaduotojas
techninis direktorius
E. Gudonis
Kv. atestato Nr. 3177


(parašas)

V. Vilkas



(parašas)

E. Gūra


(parašas)

G. Poliakas

Statybos vadovas


(parašas)

J. Vaitekūnas

Techninės priež. vadovas



(parašas)

J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priimtas nuolat saugoti.

Priėmė


Inžinierė-ekspertė
Lita Starenkaja
(pareigos)


(parašas)

Perdavė

Direktoriaus pavaduotojas
techninis direktorius
Evaldas Gudonis
Kv. atestato Nr. 3177

(data)



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

123

Linijinio inžinerinio statinio Atliekų priėmimo punktą 6440-0968-
(pavadinimas ir adresas) 2484
pripažinimo tinkamu naudoti Naštonas g. u.
AKTAS Užentis

Užentis
(vietovė)

2006 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrityje viešiniojo administracijos
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)
2006 m. rugpjūčio 28 d. patv. Nr. PA-358

šios sudėties:

R. Štrelis - komisiją paskyrusios institucijos VPSPU skyriaus vedėjas
(v. pavardė) (atstovo pareigos)

Antanas Ramanauskas (komisijos pirmininkas),

Kelmės - savivaldybės TPSPU skyriaus vyr. specialistas
(v. pavardė) (pareigos)

L. Stacevičius - statytojo VST Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
E. Gudonavičius - projektuotojo UAB Šiaulių regiono kelių "Tech. dirbtuvės"
V. Ramanauskas - Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos Kelmės raj. PST v. k. a. s.
A. Monkevičius - Valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių USC Kelmės f. vyr. gydytojas
S. Angliakas - Energetikos valstybinės inspekcijos LR VET Šiaulių f. sk. vyr. inžinierius
J. Štrelis - Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių apskr.
Kelmės raj. aplinkos apsaugos agentūros
vedėjas

2. Virbalas - Užentis - remiantis

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) E. Gudonavičius tech. direkt. Nr. 3177
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB "Joniskio mechanizacija"
(v. pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

objektui darbų vadovui - P. Krasauskas
ir techniniam priežiūretojui J. Štrelis Nr. 3555
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo Užentis m. atliekų priėmimo p. Naštonas g. u.
(visas statinio pavadinimas ir adresas)

patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr. _____, kurį parengė

UAB Šiaulių regiono kelių
(projektavimo įmonės pavadinimas)
KOPJAVARA KONTROLINIS
KORRESPONDENCijos
Biuro administracijos
Šarūnė Rožaitė
2009-05-08
1241

- ir patvirtino 15. Šilumai regiono atliktas techninio centro darbai
(Kas, kada, dokumento Nr.) R. Vytis
2. Leidimas statyti išduotas 2004 m. 12.21 d. Nr. (18.2)-L-71 jun. k.
3. Statytojo pavadinimas ir adresas Šilumai regiono atliktas pr. centras
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
- rangovas 15. Šilumai regiono keliai" ki. at. Nr. 0814
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
- subrangovai VAB - Joniškio miškininkai 2004-9
(įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatai Nr.)
5. Statyba pradėta 2005 m. 11.07 mėn.
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Gatvės, kelio:			
1.1. kategorija	x	x	
1.2. važiuojamosios dalies dangos tipas	x	x	
1.3. ilgis (nuo piketo ar šulinio Nr. _____ iki Nr. _____)	m		
1.4. šaligatvių/kelkraščių plotis	m		
1.5. bordiūrų tipas	x	x	
1.6. želdinių plotas	m ²		
1.7. lietaus vandens surinkimo šulinėlių skaičius	vnt.		
1.8. šulinių skaičius važiuojamoje dalyje	vnt.		
1.9. drenazo vamzdinių skersmuo/ilgis	mm/m		
1.10. pralaidų skaičius	vnt.		
1.11. kiti rodikliai:			
2. Vandentiekio, kanalizacijos:			
2.1. tipas (slėginė, savitakinė)	x	x	
2.2. vamzdinių medžiaga	x	x	
2.3. vamzdinių skersmuo	mm		
2.4. vamzdinių ilgis (nuo šulinio Nr. _____ iki šulinio Nr. _____)	m		
2.5. šulinių skaičius	vnt.		
2.6. kiti svarbūs rodikliai:			
3. Šilumos perdavimo trasos:			
3.1. tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas į statinį)	x	x	
3.2. šilumos nešėjas: (vanduo, garas)		x	
3.3. šilumos nešėjo parametrai: slėgis			
temperatūra padavimo vamzdyne			
temperatūra grįžtančio nešėjo			



KOPĖJA TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Cepėlienė
2009-05-08

125

1	2	3	4
3.4. vamzdinių rodikliai: medžiaga padavimo vamzdinio skersmuo grįžtančio vamzdinio skersmuo	x mm mm	x	
3.5. vamzdinių šilumos izoliacija: tipas (medžiaga) storis apsaugos sluoksnis	x mm x cm x cm	x x	
3.6. lovio skersmuo ir medžiaga	m		
3.7. trasos ilgis	vnt.		
3.8. šulinių (kamerų) skaičius			
3.9. kiti svarbūs rodikliai:			
4. Elektros tiekimo linijos:			
4.1. įtampa	kV		
4.2. atramų tipas	x	x	
4.3. laidų (kabelių) tipas ir skersmuo	mm ²		
4.4. linijos ilgis (nuo _____ iki _____)	m		
4.5. inžineriniai statiniai linijoje (transformatoriai, pastotės)	vnt.		
4.6. kiti svarbūs rodikliai:			
5. Kitų linijinių statinių: (analogiškai surašomi jų pagrindiniai rodikliai)	m ²	360	372, 94
6. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt		100,122

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.


KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTINIMO SKYRIUS
 KONTROLINIS TIKRA
 Biuro administratorė
 Šešėnė Rozanaitė

TIKRA
 Skyriaus vedėja
 Aldona Čepelienė
 2009-05-08

126

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad atliktas paviršinio nuvalymo 64400-0888-
(statinio pavadinimas) 2464

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1
3. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai, 1
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų saugos priemonių charakteristika, 1
5. Statinių ir jų priklausinių, pripažintamų tinkamais naudoti, sąrašas, 1

Komisijos pirmininkas

(parašas)

A. Ramanauskas
(v.pavardė)

Komisijos nariai:

[parašas]
[parašas]
[parašas]
[parašas]
[parašas]

L. Stancienė
E. Gudonienė
V. Radvilaitis
A. Monkevičiūtė
S. Anglickas
J. Skurdius

Rangovas

[parašas]
[parašas]

Z. Virbala
E. Gudonienė
P. Kocienas

Subrangovai

Techninis prižiūrėtojas

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines medžiagas, nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiamą nuolat saugoti.

Priėmė: Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja
(pareigos, v.pavardė, parašas)

Perdavė: V. Stancienė
(pareigos, v.pavardė, parašas)

Data




TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJĄ TIKRA

[parašas]
Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė



2009-05-08

124

Linijinio inžinerinio statinio Atliekų priėmimo punktas 54400 -
(pavadinimas ir adresas) 0974-9222
pripažinimo tinkamu naudoti Kelmenų 90-9
AKTAS Kelmenė

Kelmenė
(vietovė)

2006 m. rugpjūtio mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaurės apskritys viešiniojo administracijos
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties: 2006 m. rugpjūtio 28 d. Kelmenų Nr. PA-357

R. Šilakos - komisiją paskyrusios institucijos TPSVP, byrėjas vedėjas
(v. pavardė) (atstovo pareigos)

Kelmenė - komisijos pirmininkas,

Kelmenė - savivaldybės TPSVP ugdymo specialistas
(v. pavardė) (pareigos)

L. Stazekas - statytojo UAB "Šiaurės regiono atliekų tvarkymo centras"

E. Gudonis - projektuotojo UAB "Šiaurės regiono keliai techn. architektūros"

A. Romanavskis - Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos Kelmenų raj. PST v. k. a. s.

A. Monkevičius - Valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaurės visuomenės sveikatos apg. s.

A. Monkevičius - Energetikos valstybinės inspekcijos LR R. T. Šiaurės techn. skyriaus ins.

J. Gražulis - Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaurės apsk.

Kelmenų raj. aplinkos apsaugos agentūros inspektorius

J. Baranavičius - techn. patikrinimo inspektorius

A. Kocijavičius - Kelmenų m. seniūnas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) E. Gudonis techn. direktorius Atst. Nr. 3.
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB "Jonitės uždaviniai"
(v. pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

Elektron. darbų vadovas Barbaros Kocijavičius

ir techniniam prižiūrėtojui J. Baranavičius techn. p. ins. Atst. Nr. 8552
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo Atliekų priėmimo punktas Kelmenų 90-9
(visas statinio pavadinimas, v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją Šiaurės regiono keliai
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

1. Statyba vyko pagal projektą Nr. Šiaurės regiono keliai
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

KOPIJA

Biuro administratorė

2009-05-08

128

- ir patvirtino UAB "Graulaj" atliekų tvarkymo centro direktoriaus
(kas, kada, dokumento Nr.) R. Diželis
2. Leidimas statyti išduotas 2004 m. 12.21 d. Nr. (18.2)-L-69
3. Statytojo pavadinimas ir adresas UAB "Graulaj" ugdymo atliekų tv. centras
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
- rangovas UAB "Graulaj" ugdymo keliai" kv. ad. N10514
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
- subrangovai UAB "Tomio" mechanizacija
(įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatai Nr.)
5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūtio 30 dien.
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Gatvės, kelio:			
1.1. kategorija	x	x	
1.2. važiuojamosios dalies dangos tipas	x	x	
1.3. ilgis (nuo piketo ar šulinio Nr. _____ iki Nr. _____)	m		
1.4. šaligatvių/kelkraščių plotis	m		
1.5. bordiūrų tipas	x	x	
1.6. želdinių plotas	m ²		
1.7. lietaus vandens surinkimo šulinėlių skaičius	vnt.		
1.8. šulinių skaičius važiuojamoje dalyje	vnt.		
1.9. drenazo vamzdinių skersmuo/ilgis	mm/m		
1.10. pralaidų skaičius	vnt.		
1.11. kiti rodikliai:			
2. Vandentiekio, kanalizacijos:			
2.1. tipas (slėginė, savitakinė)	x	x	
2.2. vamzdinių medžiaga	x	x	
2.3. vamzdinių skersmuo	mm		
2.4. vamzdinių ilgis (nuo šulinio Nr. _____ iki šulinio Nr. _____)	m		
2.5. šulinių skaičius	vnt.		
2.6. kiti svarbūs rodikliai:			
3. Šilumos perdavimo trasos:			
3.1. tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas į statinį)	x	x	
3.2. šilumos nešėjas: (vanduo, garas)	x	x	
3.3. šilumos nešėjo parametrai: slėgis			
temperatūra padavimo vamzdyne			
temperatūra grįžtančio nešėjo			



KOPIJA

Biuro administratorė
Šarūnė RozanaitėTIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

129

1	2	3	4
3.4. vamzdinių rodikliai:			
medžiaga	x	x	
padavimo vamzdinio skersmuo	mm		
grįžtančio vamzdinio skersmuo	mm		
3.5. vamzdinių šilumos izoliacija:			
tipas (medžiaga)	x	x	
storis	mm		
apsaugos sluoksnis	x	x	
3.6. lovio skersmuo ir medžiaga	cm x cm		
3.7. trasos ilgis	m		
3.8. šulinių (kamerų) skaičius	vnt.		
3.9. kiti svarbūs rodikliai:			

4. Elektros tiekimo linijos:			
4.1. įtampa	kV		
4.2. atramų tipas	x	x	
4.3. laidų (kabelių) tipas ir skersmuo	mm ²		
4.4. linijos ilgis (nuo _____ iki _____)	m		
4.5. inžineriniai statiniai linijoje (transformatoriai, pastotės)	vnt.		
4.6. kiti svarbūs rodikliai:			

5. Kitų linijinių statinių:			
(analogiškai surašomi jų pagrindiniai rodikliai)			
_____ <i>Ar. Galbaltėtonio pl.</i>	m ²		621,73
_____ <i>Enn. kelių plotas</i>	m ²		33,13

6. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt		168,814

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.


TIKRA
 Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė
 2009-05-08
 Biuro administratore
 Šarūnė Rozanaitė

130

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Atliekų priėmimo punkto b 4400-0874 -
(statinio pavadinimas) 9222

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, l.
3. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai, l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisr: saugos priemonių charakteristika, l.
5. Statinių ir jų priklausinių pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas, l.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

A. Ramanauskas
(v.pavardė)

Komisijos nariai:

[parašas]
[parašas]
[parašas]
[parašas]
[parašas]

L. Stasėnka
E. Gudonis
V. Ramanauskas
A. Markauskaitė
J. Sigitavienė
J. Šeštokaitė

Rangovas

[parašas]

J. Mačiūnas

Subrangovai

[parašas]
[parašas]

E. Gudonis
P. Kociūnas
S. Anglickas

Techninis prižiūrėtojas

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

Priėmė:

Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja

(pareigos, v.pavardė, parašas)

Perdavė:

Užstatytojas
(pareigos, v.pavardė, parašas)

Data



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

Linijinio inžinerinio statinio Atliekų priėmimo punktas b Kuršių, Tytuvėnų
(pavadinimas ir adresas) aplinkos s. serv., Kelmenės
pripažinimo tinkamu naudoti un. Nr. 4400-0964-8619
A K T A S

Tytuvėnai
(vietovė)

2006 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiurkščių apskrities viešiniojo administracijos
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)
2006 rugpjūčio 28 d. Nr. 131-356

šios sudėties:

A. Šilėla - komisiją paskyrusios institucijos UPSUP skyriaus vedėjas
(v. pavardė) (atstovo pareigos)

Artūras Ramanauskas (komisijos pirmininkas),
Kelmenės - savivaldybės
(v. pavardė) (pareigos)

L. Stancikajis statytojo UAB "Šiurkščių regiono atliekų tvarkymo centras"
E. Gudonavičius - projektuotojo UAB "Šiurkščių regiono atliekų" techn. direktoriaus
V. Ramanauskas Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos Kelmenės raj. PST v. k.
A. Merkys Valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiurkščių visuomenės sveikatos centro
S. Naglė Energetikos valstybinės inspekcijos LR VĮ Šiurkščių energetinis ir
J. Sereika Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Šiurkščių apskr.
Kelmenės raj. aplinkos apsaugos agentūros vedėjas
J. Šeštokas techn. priežiūros inžinierius?
S. Baltušonaitis Tytuvėnų apskr. seniūnas
V. Stonys Tytuvėnų apskr. seniūno pavaduotojas

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) UAB "SRK" techn. direktoriaus E. Gudonavičiaus
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.) Nr. 3147

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB "Techninės mechanizacijos"
(v. pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

Elektron. darbų vadovams P. Kazimieris
ir techniniam prižiūrėtojui J. Barakauskas Nr. 3555
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo Atliekų priėmimo punktas Kuršių km. Tytuvėnų
(visas statinio pavadinimas ir adresas) apskr. sen.

patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba Kelmenės raj. atliekų priėmimo punktas UAB "Šiurkščių regiono atliekų"
(projektavimo įmonės pavadinimas)



Alona Čaplejonė
2009-05-08

BIURO ADMINISTRATORĖ
SARŪNĖ ROZANAITĖ

- ir patvirtino 15. Šilumos perdavimo sistemos tvarkymo centro direktorius
(kas, kada, dokumento Nr.) 18.05.2009
2. Leidimas statyti išduotas 2009 m. 12.21 d. Nr. (18.2)-4-70
3. Statytojo pavadinimas ir adresas 15. Šilumos perdavimo sistemos centro
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB "Šilumos perdavimo centras" Nr. 0514 457892
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
- subrangovai UAB "Tehnologijos" 2009.05.19
(įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatų Nr.)
5. Statyba pradėta 2009 m. 09.05 mėn.
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Gatvės, kelio:			
1.1. kategorija	x	x	
1.2. važiuojamosios dalies dangos tipas	x	x	
1.3. ilgis (nuo piketo ar šulinio Nr. ____ iki Nr. ____)	m		
1.4. šaligatvių/kelkraščių plotis	m		
1.5. bordiūrų tipas	x	x	
1.6. želdinių plotas	m ²		
1.7. lietaus vandens surinkimo šulinėlių skaičius	vnt.		
1.8. šulinių skaičius važiuojamoje dalyje	vnt.		
1.9. drenažo vamzdinių skersmuo/ilgis	mm/m		
1.10. pralaidų skaičius	vnt.		
1.11. kiti rodikliai:			
2. Vandentiekio, kanalizacijos:			
2.1. tipas (slėginė, savitakinė)	x	x	
2.2. vamzdinių medžiaga	x	x	
2.3. vamzdinių skersmuo	mm		
2.4. vamzdinių ilgis (nuo šulinio Nr. ____ iki šulinio Nr. ____)	m		
2.5. šulinių skaičius	vnt.		
2.6. kiti svarbūs rodikliai:			
3. Šilumos perdavimo trasos:			
3.1. tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas į statinį)	x		
3.2. šilumos nešėjas: (vanduo, garas)			
3.3. šilumos nešėjo parametrai: slėgis			
temperatūra padavimo vamzdyne			
temperatūra grįžtančio nešėjo			



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė

KOPIJA TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rožanaite

2009-05-08

133

1	2	3	4
3.4. vamzdynų rodikliai:			
medžiaga	x	x	
padavimo vamzdyno skersmuo	mm		
grįžtančio vamzdyno skersmuo	mm		
3.5. vamzdynų šilumos izoliacija:			
tipas (medžiaga)	x	x	
storis	mm		
apsaugos sluoksnis	x	x	
3.6. lovio skersmuo ir medžiaga	cm x cm		
3.7. trasos ilgis	m		
3.8. šulinių (kamerų) skaičius	vnt.		
3.9. kiti svarbūs rodikliai:			

4. Elektros tiekimo linijos:			
4.1. įtampa	kV		
4.2. atramų tipas	x	x	
4.3. laidų (kabelių) tipas ir skersmuo	mm ²		
4.4. linijos ilgis (nuo _____ iki _____)	m		
4.5. inžineriniai statiniai linijoje (transformatoriai, pastotės)	vnt.		
4.6. kiti svarbūs rodikliai:			

5. Kitų linijinių statinių:			
(analogiškai surašomi jų pagrindiniai rodikliai)			
_____ <i>plėšas</i>	m ²	375	382,36

6. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt		103,170

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektu ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.



KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

134

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Atliekų priėmimo punktą Kuršių, Tytuvėnų ap. r.
(statinio pavadinimas) Kelmės raj. 4400-0904-861

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

12. Naudojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 1 tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1
3. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai, 1
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų saugos priemonių charakteristika, 1
5. Statinių ir jų priklausinių, pripažintamų tinkamais naudoti, sąrašas, 1

Komisijos pirmininkas

(parašas)

A. Ramanauskas
(v.pavardė)

Komisijos nariai:

L. Stasėnkaitytė
E. Sudoraitis
V. Ramanauskas
D. Mončiūnaitė
S. Nagličkius
J. Biuzienė

Rangovas

J. Balčiūnaitis

Subrangovai

E. Sudoraitis
D. Kozlovskis

Techninis priežiūrėtojas

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiamą nuolat saugoti.

Priėmė:

Inžinierė-ekspertė
Linda Starenkajė

(pareigos, v.pavardė, parašas)

Perdavė:

dech. direktoriui E. Čiulėnui
(pareigos, v.pavardė, parašas)


Data



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2000 m. m. m.



KOPIJA TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rozenaitė

135

Žagarės seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Joniškio raj. Žvelgaičių km.
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Žagarės sen.
 (vietovė)

2006 m. rugsėjo mėn. 29 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-26 potvarkiu Nr.PI-351
 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

G.Čepulis - komisiją paskyrusios institucijos ŠAVA TPSVP skyriaus vyr. specialistas Joniškio raj.
 (atstovo pareigos)

(komisijos pirmininkas),

D.Bičkienė - Joniškio raj. savivaldybės vyr. architektė.
 (v.pavardė)

L.Starenkajai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei
E.Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui
D.Narušaiti - valstybinio visuomenės sveikatos centro Joniškio filialo vadovėi
R.Ramanauskui - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių teritorinio sk.vyresn.inž.insp.
R.Baltramaičiu - regioninio aplinkos apsaugos departamento Joniškio raj. agentūros viršininkui
G.Butkui - Joniškio PGT Valst.priešgaistrinės priež. Inspekcijos viršininkui

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui KTPS viršininkui Nr. 1346 2003-01-18
 (v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB „Joniškio mechanizacija“ P.Karitonui
 ir techniniam prižiūrėtojui J.Šarakauskui
 vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Žagarės seniūnijos atliekų priėmimo punktą Joniškio raj. Žvelgaičių km.
 (visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas



TIKRA

Skynaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPJA TIKRA

Biuro administratorė
 Šarūnė Rozanaitė

136

(parvartavimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas startyti išduotas 2005-02-22 Nr. 8

(data)

Statytojo pavadinimas ir adresas VŠI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, LK 4578727
Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.
aikštelės įrengimo darbai(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai

UAB „Joniškio mechanizacija“ Nr. 3633

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	900	900
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	94,595	94,595
Iš jos statybos ir montavimo darbų		..		
4. Gamtūros, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės sklypo plotas		m ²	354,99	354,99
tvarkomas plotas		..		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika
atliekų priėmimo aikštelė su a/b danga

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų tūpavimo ir apsaugos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinamos valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių priemonės tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktais, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonės yra įvykdytos. Ju

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

137

charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Žagarės sen. atlieku priėmimo punktas Joniškio raj. Žvelgaičių km.
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas

Komisijos narys

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugomi.

Priėmė

Inžinierė-ekspertė
Linda Starenkaja
(pareigos)

Perdavė

(pareigos)

(data)

G. Čepulis
(v. pavardė)

D. Bičkienė
(v. pavardė)

L. Starenkaja

E. Gudonis

D. Narušaitė

R. Ramanauskas

R. Baltramaitis

K. Butkus

J. Vaitiekūnas

L. Šarūnas

Filialo vadovė
Donata Norušaitė



2009-05-08
KOPIJA TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rozanaite

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė

2009-05-08
KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaite

Linijinio inžinerinio statinio Atliekų priėmimo punktas 64400-0988
(pavadinimas ir adresas) 1885
pripažinimo tinkamu naudoti Smiltynių k.
AKTAS Kraštyje sen. kelias

Kraštyje
(vietovė)

2006 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Komisija, paskirta Šiaurės apskritys viešiniojo administracija
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)
2006 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 134-589

šios sudėties:

A. J. Petka - komisiją paskyrusios institucijos VPSPR skyriaus vadovė
(v. pavardė) (atstovo pareigos)

Artūras Ramanauskas (komisijos pirmininkas),

Kelmės - savivaldybės TPSPR 2/2 ugd. priežiūros tarybos
(v. pavardė) (pareigos)

L. Stasėnka - statytojo UAB "Šiaurės regiono atliekų tvarkymo centras"

E. Gudonavičius - projektuotojo UAB "Šiaurės regiono kelias techn. dirbt."

V. Ramanauskas - Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos Kelmės r. PRT v. k.

A. Monkevičius - Valstybinio visuomenės sveikatos centro Šiaurės VSC Kelmės r. ugd. 84

S. Angličius - Energetikos valstybinės inspekcijos LR V&T Šiaurės r. ugd. 12 ugd. inž.

J. Haurane - Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaurės apskr.

Kelmės r. aplinkos apsaugos departamentas

J. Šarūnas - techn. priežiūros inspektorius

V. Andriulis - kraštyje sen. kelias

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) E. Gudonavičius techn. dirbt. Nr. 3192
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB "Jaukštis mechanizacija"
(v. pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

elektron. darbai vadovui P. Monkevičius
ir techniniam prižiūrėtojui J. Šarūnas techn. Nr. 3555
(v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo Kraštyje atliekų priėmimo punktas Smiltynių k.
(visas statinio pavadinimas ir adresas) Kraštyje sen.

patikrino jo statybos techninį bei vadybos dokumentaciją ir nustatė:

1. Statybos vykdymo projekto Nr. 16. Šiaurės regiono kelias kuri parengė
(projektavimo įmonės pavadinimas)



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

KOPIJĄ TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rožanaite

139

- ir patvirtino VĮ Šilumų regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
(kas, kada, dokumento Nr.) R. Depelė
2. Leidimas statyti išduotas 2004 m. 12. 21 d. Nr. (18.2)-L-72
3. Statytojo pavadinimas ir adresas VĮ Šilumų regiono atliekų tvarkymo centras
45780727
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas VĮ Šilumų regiono k. l. p. m. k. v. 0514
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
- subrangovai UAB Joniškio mechanizacija
(įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatų Nr.)
5. Statyba pradėta 2005 m. 10 10 mėn.
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Gatvės, kelio:			
1.1. kategorija	x	x	
1.2. važiuojamosios dalies dangos tipas	x	x	
1.3. ilgis (nuo piketo ar šulinio Nr. ____ iki Nr. ____)	m		
1.4. šaligatvių/kelkraščių plotis	m		
1.5. bordiūrų tipas	x	x	
1.6. želdinių plotas	m ²		
1.7. lietaus vandens surinkimo šulinėlių skaičius	vnt.		
1.8. šulinių skaičius važiuojamoje dalyje	vnt.		
1.9. drenazo vamzdynų skersmuo/ilgis	mm/m		
1.10. pralaidų skaičius	vnt.		
1.11. kiti rodikliai:			
2. Vandentiekio, kanalizacijos:			
2.1. tipas (slėginė, savitakinė)	x	x	
2.2. vamzdynų medžiaga	x	x	
2.3. vamzdynų skersmuo	mm		
2.4. vamzdynų ilgis (nuo šulinio Nr. ____ iki šulinio Nr. ____)	m		
2.5. šulinių skaičius	vnt.		
2.6. kiti svarbūs rodikliai:			
3. Šilumos perdavimo trasos:			
3.1. tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas į statinį)			
3.2. šilumos nešėjas: (vanduo, garas)			
3.3. šilumos nešėjo parametrai:			
slėgis			
temperatūra padavimo vamzdyne			
temperatūra grįžtančio nešėjo			



TIKRA

Skyriaus vedėja

2009-05-08

Aldona Cepėlienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Irena Ržanaite

140

1	2	3	4
3.4. vamzdynų rodikliai: medžiaga padavimo vamzdyno skersmuo grįžtančio vamzdyno skersmuo	x mm mm	x	
3.5. vamzdynų šilumos izoliacija: tipas (medžiaga) storis apsaugos sluoksnis	x mm x cm x cm	x x	
3.6. lovio skersmuo ir medžiaga	m vnt.		
3.7. trasos ilgis			
3.8. šulinių (kamerų) skaičius			
3.9. kiti svarbūs rodikliai:			
4. Elektros tiekimo linijos:			
4.1. įtampa	kV		
4.2. atramų tipas	x mm ²	x	
4.3. laidų (kabelių) tipas ir skersmuo			
4.4. linijos ilgis (nuo _____ iki _____)	m vnt.		
4.5. inžineriniai statiniai linijoje (transformatoriai, pastotės)			
4.6. kiti svarbūs rodikliai:			
5. Kitų linijinių statinių: (analogiškai surašomi jų pagrindiniai rodikliai)			
<i>plotas</i>	m ²	375	380,29
6. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt		109,437

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.



TIKRA
Skyriaus vedėja

KOPIJA TIKRA

2009-05-08

Biuro administratore
arūnė Rožulaitė

141

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Aliekų pavilnimo projektas, b. 4400-0988-126.
(statinio pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisr. saugos priemonių charakteristika, 1.
5. Statinių ir jų priklausinių pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

A. Ramanauskas
(v.pavardė)

Komisijos nariai:

(parašas)

L. Stoeckhauser

E. Gudonius

V. Ramanauskas

A. Monkevičiūtė

J. Barakauskas

S. Anglickas

Rangovas

(parašas)

T. Sereikis

V. Andrius

Subrangovai

(parašas)

E. Gudonius

P. Karlauskas

Techninis prižiūrėtojas

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmė nuo laiko saugoti.

Priėmė:

Inžinierė ekspertė
Linda Stoeckhauser

(pareigos, v.pavardė, parašas)

Perdavė:

tech. direkt.

E. Gudonius

(pareigos, v.pavardė, parašas)


Data



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Cepelienė

2009-05-08



Kopijuoti
Biuro administratorė
Šarūnė Šlaitė

Žagarės seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Joniškio raj. Žvelgaičių km.
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Žagarės sen.
 (vietovė)

2006 m. rugsėjo mėn. 29 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-26 potvarkiu Nr.PI-351
 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

G.Čepulis - komisiją paskyrusios institucijos ŠAVA TPSVP skyriaus vyr.specialistas Joniškio raj.
 (atstovo pareigos)

(komisijos pirmininkas),

D.Bičkienė - Joniškio raj.savivaldybės vyr. architektė.
 (v.pavardė)

L.Starenkajai - statytojo VŠI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei
E.Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui
D.Narušaiti - valstybinio visuomenės sveikatos centro Joniškio filialo vadovėi
R.Ramanauskui - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių teritorinio sk.vyresn.inž.insp.
R.Baltramaičiui - regioninio aplinkos apsaugos departamento Joniškio raj. agentūros viršininkui
G.Butkui - Joniškio PGT Valst.priešgaistrinės priež. Inspekcijos viršininkui

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui KTPS viršininkui Nr. 1346 2003-01-18
 (v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB „Joniškio mechanizacija“ P.Karitonui
 ir techniniam prižiūrėtojui J.Šarakauskui
 vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Žagarės seniūnijos atliekų priėmimo punktą Joniškio raj. Žvelgaičių km.
 (visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)
 ir patvirtino statytojas



TIKRA
 Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
 Šarūnė Rėžanaitytė

2009-05-08



(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-22 Nr. 8
(data). Statytojo pavadinimas ir adresas VSI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, į/k 4578727
Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

aikštelės įrengimo darbai

(monės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai

UAB „Joniškio mechanizacija“ Nr. 3633

(monių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	900	900
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	94,595	94,595
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamybės, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės sklypo plotas		m ²	354,99	354,99
tvarkomas plotas		“		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

atliekų priėmimo aikštelė su a/b danga

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti aktyvines priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių šiuos tinkamus įrengimus. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Ju

KOPIJA, TIKRA
Biuro administratorė
Šarūnė Rėzanaitė

2009-05-08

charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Žagarės sen. atliekų priėmimo punktas Joniškio raj. Žvelgaičių km.

(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas

Komisijos narys

Rangovas

Techninis priežiūrėtojas

G.Čepulis
(v.pavardė)

D.Bičkienė
(v.pavardė)

L.Starenkaja

E.Gudonis

D.Narušaitė Filialo vadovė

R.Ramanauskas

R.Baltramaitis

K.Čepulis

J. Vaitiekūnas

I.Šarūnas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoma.

Priėmė

Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja
(pareigos)

Perdavė

(pareigos)

(data)

Aldona Čepelienė
Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

Skaistgirio seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Joniškio raj., Skaistgirio mstl.**(statinio pavadinimas ir adresas)****pripažinimo tinkamu naudoti****A K T A S****Skaistgirio sen.****(vietovė)****2006 m. rugsėjo mėn. 29 d.****Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-26 potvarkiu Nr.PI-351**
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

G.Čepulis - komisiją paskyrusios institucijos ŠAVA TPSVP skyriaus vyr.specialistas Joniškio raj.
(atstovo pareigos)**(komisijos pirmininkas),****D.Bičkienė - Joniškio raj.savivaldybės vyr. architektė.**
(v.pavardė)**L.Starenkajai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei**
E.Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui
D.Narušaiti - valstybinio visuomenės sveikatos centro Joniškio filialo vadovėi
R.Ramanauskui - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių teritorinio sk.vyresn.inž.insp.
R.Baltramaičiui - regioninio aplinkos apsaugos departamento Joniškio raj. agentūros viršininkui
G.Butkui - Joniškio PGT Valst.priešgaistrinės priež. Inspekcijos viršininkui**dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui KTPS viršininkui Nr. 1346 2003-01-18**
(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)**subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB „Joniškio mechanizacija“ P.Karitonui**
ir techniniam prižiūrėtojui J.Šarakauskui
vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Skaistgirio seniūnijos atliekų priėmimo punktą Joniškio raj.
Skaistgirio mstl.
(visas statinio pavadinimas ir adresas)**kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės**
teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo
dokumentaciją ir nustatė:**1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“**
atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.**(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)****ir patvirtino statytojas****TIKRA**
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė
Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitytė

2009-05-08

146

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-22 Nr. 7

(data)

. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727 Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.

aikštelės įrengimo darbai

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

subrangovai

UAB „Jonišio mechanizacija“ Nr. 3633

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	981	981
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	126,699	126,699
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamybos, transporto, rvšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės sklypo plotas		m ²	388,13	388,13
tvarkomas plotas		“		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

atliekų priėmimo aikštelė su a/b danga

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išpėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinami Valstybinės priešgaisrinės institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

2009-05-08

Būre administratorė
Šarūnė Rozanaite

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Skaistgirio sen. atliekų priėmimo punktas Joniškio raj. Skaistgirio mstl. (statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5) tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas

Komisijos

Rangovas

Techninis priežiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti

Priėmė

Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja

(pareigos)

Perdavė

(pareigos)

(data)

G.Čepulis
(v.pavardė)

D.Bičkienė
(v.pavardė)

L.Starenkaja

E.Gudonis

D.Narušaitė

R.Ramanauskas

R.Baltramaitis

K.Čutkus

J.Vaitiekūnas

J.Šarakauskas

Filialo vadovė
Donata Norušaitė

ŠIAULIŲ
REGIONO
ATLIEKŲ
TVARKYMO
CENTRAS

Techninio pavado (v.pavardė)
Evaldas Gudonis
K. a. 3177
(v.pavardė)
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08 Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

Joniškio rajono atliekų priėmimo punktas, Kepalių sen., Bariūnų km.
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Kepalių sen.
 (vietovė)

2006 m. rugsėjo mėn. 29 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-26 potvarkiu Nr.PI-351
 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

G.Čepulis - komisiją paskyrusios institucijos ŠAVA TPSVP skyriaus vyr.specialistas Joniškio raj.
 (atstovo pareigos)

(komisijos pirmininkas),

D.Bičkienė - Joniškio raj.savivaldybės vyr. architektė.
 (v.pavardė)

L.Starenkajai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierei-ekspertei
E.Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui
D.Narušaiti - valstybinio visuomenės sveikatos centro Joniškio filialo vadovėi
R.Ramanauskui - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių teritorinio sk.vyresn.inž.insp.
R.Baltramaičiu - regioninio aplinkos apsaugos departamento Joniškio raj. agentūros viršininkui
G.Butkui - Joniškio PGT Valst.priešgaistrinės priež. Inspekcijos viršininkui

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui KTPS viršininkui Nr. 1346 2003-01-18
 (v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB „Joniškio mechanizacija“ P.Karitonui
 ir techniniam prižiūrėtojui J.Šarakauskui
 vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Joniškio rajono atliekų priėmimo punktą Kepalių sen., Bariūnų km.
 (visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kuri 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)
 ir patvirtino statytojas _____



TIKRA
 Skyriaus vedėja

(Signature)
 Biuro administratore
 Šarūnė Rozanaite

2009-05-08

149

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-22 Nr. 5
(data). Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, į/k 4578727
Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.aiškštelės įrengimo darbai(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovaiUAB „Jonišio mechanizacija“ Nr. 3633

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	1780	1780
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	208,075	208,075
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamtūros, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės sklypo plotas		m ²	807,49	807,49
tvarkomas plotas		“		

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika
atliekų priėmimo aikštelė su a/b danga

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinamos valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamos naudoti. Tai liudija patikrinimo aktais, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nelaimingųjų atsitikimų prevencijos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Ju

2009-05-08

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas


Komisija pripažįsta, kad Joniškio rajono „atliekų priėmimo punktas Kepalių sen. Bariūnų km.“
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas



Komisijos narys



Rangovas

Techninis priežiūrėtojas

G.Čepulis
(v.pavardė)

D.Bičkienė
(v.pavardė)

L.Starenkaja

E.Gudonis

D.Narušaitė

R.Ramanauskas

R.Baltramaitis

K.Čutkus

J. Vaitiekūnas

J.Šarakauskas

Filialo vadovė
Donata Norušaitė

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Priėmė


Inžinierė-ekspertė
Liuda Starenkaja
(pareigos)

(parašas)

Perdavė

(pareigos)

(data)



(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)



(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

AKMENĖS SENIŪNIJOS ATLIEKU PRIĖMIMO PUNKTAS
(statinio pavadinimas ir adresas)

**pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Naujoji Akmenė
(vietovė)

2006 m. 11 mėn. 03 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2006 m. lapkričio mėn. 2 d. potvarkiu

Nr.PI-416

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

() šios sudėties:

- V.Kriščiūnas - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Akmenės rajone (komisijos pirmininkas),
- L. Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė (v.pavardė) (pareigos)
- A. Bučys - Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
- V.Buivydas - Akmenės raj. vyr. architektas
- E.Gudonis - Projektuotojo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas
- J. Katauskis - Akmenės m. seniūnas
- A.Lenkutis - Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros vedėjas
- S.Vilkas - Akmenės rajono savivaldybės administracijos ekologas
- A.Puzaras - Valstybinės darbo inspekcijos vyr. darbo inspektorius
- J.Matusevičius - LR Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus direktorius


Dalyvaujant:

rangovui (statybos vadovui) - VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros skyriaus viršininkas J.Vaitiekūnas, kv. atestato Nr. 1346

(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams - UAB „Joniškio mechanizacija“ Plikarionas kv. pažymėjimo Nr. 498213

techniniam priežiūretojui - J.Šarakauskas kv. atestato Nr. 3532



TIKRA

Skyriaus vedėja

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 5 sk. 19p. „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo statytojo pateiktą Akmenės seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Statybininkų g. Akmenė

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2005 m. parengė

VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

2. Leidimas statyti išduotas 2005-05-10 Nr 06
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, I/k 4578727, Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30. Aikštelės įrengimo darbai.
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

Subrangovai UAB „Joniškio mechanizacija“

5. Statyba pradėta 2006m. gegužės mėn. 25 d.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Bendrieji rodikliai				
Asfaltuota aikštelė		m ²	374,87	374,87
Atliekų konteineriai 1,1m ³		vnt	3	3
Atliekų konteineriai 3,0m ³		vnt	2	2
Atliekų konteineriai 3,2m ³		vnt	4	4
Atliekų konteineriai 5,0m ³		vnt.	2	2
Metalinio tinklo tvora		m	88	88
Faktiška statybos kaina		tūkst.Lt.	147,663	147,663



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė
2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administracijos
Šarūnė Rožanaitė

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažinti tinkamais naudoti.

10. Projekte numatytos darbų saugos priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Akmenės seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Statybininkų g., Akmenė
(statinio ir priklausinių pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su ayrašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos priemonių charakteristikos, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė



Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

L. STARENKAJA

V. Kriščiūnas
(v., pavardė)
A. Bučys

V. Buivydas

A. Puzaras

J. Matusevičius

E. Gudonis

J. Katauskis

A. Lenkutis

S. Vilkas

P. Karitonas

J. Šarakauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

J. Vaitiekūnas

J. Šarakauskas


Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmiamu nuolat saugoti:

Priėmė: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
(pareigos)

Statybos vadovas

R. Vėgelė
(v., pavardė)

J. Vaitiekūnas



TIKRA

Skyriaus vedėja

2009-05-08

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

Kriuku seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Joniškio raj. sav. Kriukų mstl.
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

Kriukų sen.
 (vietovė)

2006 m. rugsėjo mėn. 29 d.

Komisija, paskirta ŠAVA TPSVP skyriaus vedėjo 2006-09-26 potvarkiu Nr.PI-351
 (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

G.Čepulis - komisiją paskyrusios institucijos ŠAVA TPSVP skyriaus vyr.specialistas Joniškio raj.
 (atstovo pareigos)

(komisijos pirmininkas),

D.Bičkienė - Joniškio raj.savivaldybės vyr. architektė.
 (v.pavardė)

L.Starenkajai - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinieri-ekspertei
E.Gudoniui - projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojui
D.Narušaiti - valstybinio visuomenės sveikatos centro Joniškio filialo vadovėi
R.Ramanauskui - Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių teritorinio sk.vyresn.inž.insp.
R.Baltramaičiui - regioninio aplinkos apsaugos departamento Joniškio raj. agentūros viršininkui
G.Butkui - Joniškio PGT Valst.priešgaistrinės priež. Inspekcijos viršininkui

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) J.Vaitiekūnui KTPS viršininkui Nr. 1346 2003-01-18
 (v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB "Joniškio mechanizacija" P.Karitonui
 ir techniniam prižiūrėtojui J.Šarakauskui
 vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą Kriukų seniūnijos atliekų priėmimo punktą Joniškio sav. Kriukų mstl.
 (visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra / nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal darbo projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr.0514, galioja iki 2008-06-30.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)
 ir patvirtino statytojas _____



TIKRA
 Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
 Šarūnė Rozanaite



(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2005-02-22 Nr. 6

(data)

. Statytojo pavadinimas ir adresas VSI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, i/k 4578727
Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30.
aikštelės įrengimo darbai(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai

UAB „Joniškio mechanizacija“ Nr. 3633

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m ²	776	776
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	123,813	123,813
Iš jos statybos ir montavimo darbų		“		
4. Gamvbos, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pirmos eilės sklypo plotas		m ²	383,28	383,28
tvarkomas plotas		“		


7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika
atliekų priėmimo aikštelė su a/b danga

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių išėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbu saugos, nelaimojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų

2009-05-08



Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

AKMENĖS RAJONO ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAS*(statinio pavadinimas ir adresas)***pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**Naujoji Akmenė
(vietovė)

2006 m. 11 mėn. 03 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2006 m. lapkričio mėn. 2 d. potvarkiu**Nr.PI-416***(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)*

šios sudėties:

- V.Kriščiūnas - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Akmenės rajone (komisijos pirmininkas),
- L. Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė *(v.pavardė)* *(pareigos)*
- A. Bučys - Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
- V.Buivydas - Akmenės raj. vyr. architektas
- E.Gudonis - Projektuotojo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas
- K. Inta - Naujosios Akmenės m. seniūnas
- A.Lenkutis - Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros vedėjas
- S.Vilkas - Akmenės rajono savivaldybės administracijos ekologas
- A.Puzaras - Valstybinės darbo inspekcijos vyr. darbo inspektorius
- J.Matusevičius - LR Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus direktorius

Dalyvaujant:

rangovui (statybos vadovui) - VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros skyriaus viršininkas J.Vaitiekūnas, kv. atestato Nr. 1346*(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)*subrangovams - UAB „Joniškio mechanizacija“ P. Karionas kv. pažymėjimo Nr. 198213techniniam priežiūrotui - I.Sarakauskas kv. atestato Nr. 3555

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA
Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaite

2009-05-08

159

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 5 sk. 19p. „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo statytojo pateiktą **Akmenės rajono atliekų priėmimo punktą, Eibučių g. Naujoji Akmenė**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2005 m. parengė

VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

2. Leidimas statyti išduotas 2005-05-10 Nr 05
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, I/k 4578727, Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30. Aikštelės įrengimo darbai.
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

Subrangovai UAB „Joniškio mechanizacija“

5. Statyba pradėta 2006m. gegužės mėn. 25 d.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Bendrieji rodikliai				
Pavojingų atliekų pastatas		m ²	28	28
Asfaltuota aikštelė		m ²	645,37	645,37
Atliekų konteineriai 1,1m ³		vnt	3	3
Atliekų konteineriai 3,2m ³		vnt	3	3
Atliekų konteineriai 5,0m ³		vnt	3	3
Atliekų konteineriai 10,0m ³		vnt.	5	5
Metalinio tinklo tvora		m	112	112
Faktiška statybos kaina		tūkst.Lt.	176,092	176,092



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čeplėjienė

2006-05-11 R

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

160

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažinti tinkamais naudoti.

10. Projekte numatytos darbų saugos priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Akmenės rajono atliekų priėmimo punktas, Eibučių g., Naujoji Akmenė
(statinio ir priklausinių pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su ayrašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos priemonių charakteristikos, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.




TIKRA
Skyriaus vadėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

2009-05-08

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė



161

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

L. STARENKATA

V. Kriščiūnas
(v., pavardė)
A. Bučys

V. Buivydas

A. Puzaras

J. Matusevičius

E. Gudonis

K. Inta
~~J. Kataras~~

A. Lenkutis

S. Vilkas

P. Karitonas

Rangovas

J. Vaitiekūnas

Techninis prižiūrėtojas

J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmiau nuolat saugoti:

Priėmė: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
(pareigos)

Statybos vadovas

R. Vėgelė
(v., pavardė)

J. Vaitiekūnas

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Sėdėnė Rozanaitė

1624

KRUOPIŲ SENIŪNIJOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAS*(statinio pavadinimas ir adresas)***pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**Naujoji Akmenė
(vietovė)

2006 m. 11 mėn. 03 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2006 m. lapkričio mėn. 2 d. potvarkiu**Nr.PI-416***(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)*

šios sudėties:

- V.Kriščiūnas - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Akmenės rajone (komisijos pirmininkas),
- L. Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė *(v.pavardė)* *(pareigos)*
- A. Bučys - Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
- V.Buivydas - Akmenės raj. vyr. architektas
- E.Gudonis - Projektuotojo VI „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas
- V. Kateivienė - Kruopių mstl. seniūnas
- A.Lenkutis - Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros vedėjas
- S.Vilkas - Akmenės rajono savivaldybės administracijos ekologas
- A.Puzaras - Valstybinės darbo inspekcijos vyr. darbo inspektorius
- J.Matusevičius - LR Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus direktorius

Dalyvaujant:

rangovui (statybos vadovui) - VI „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros skyriaus viršininkas J.Vaitiekūnas, kv. atestato Nr. 1346*(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)*subrangovams - UAB „Joniško mechanizacija“ P. Karionas kv. pažymėjimo Nr. 198213techniniam priežiūrui - S.Šarakauskas kv. atestato Nr. 3555

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė
2006-11-03

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 5 sk. 19p. „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo statytojo pateiktą **Kruopių seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Kruopiai**

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2005 m. parengė

VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

2. Leidimas statyti išduotas 2005-05-10 Nr. 07
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, I/k 4578727, Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30. Aikštelės įrengimo darbai.
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

Subrangovai UAB „Joniškio mechanizacija“

5. Statyba pradėta 2006m. gegužės mėn. 25 d.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Bendrieji rodikliai				
Asfaltuota aikštelė		m ²	383,07	383,07
Atliekų konteineriai 1,1m ³		vnt	3	3
Atliekų konteineriai 3,0m ³		vnt	2	2
Atliekų konteineriai 3,2m ³		vnt	4	4
Atliekų konteineriai 5,0m ³		vnt.	2	2
Metalinio tinklo tvora		m	88	88
Faktiška statybos kaina		tūkst.Lt.	127,211	127,211



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepėlionė

2009-05-11

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažinti tinkamais naudoti.

10. Projekte numatytos darbų saugos priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Kruopių seniūnijos atlieku priėmimo punktas, Kruopiai
(statinio ir priklausinių pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su ayrašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos priemonių charakteristikos, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų -- inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė
2009-05-08

KOPIJA TIKRA
Šarūnė Rožanaitė
Biuro administratore

165

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

L. STARENKAJA

V.Kriščiūnas

(v., pavardė)

A.Bučys

V.Buivydas

J.Matusevičius

A.Puzaras

E.Gudonis

V.Kateivienė

A.Lenkutis

S.Vilkas

P.Karionas

J.Vaitiekūnas

J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmiamu nuolat saugoti:

Priėmė: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

(pareigos)

Statybos vadovas

(parašas)

R.Vėgelė

(v., pavardė)

J.Vaitiekūnas



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaite

PAPILĖS SENIŪNIJOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAS
(statinio pavadinimas ir adresas)

**pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**

Naujoji Akmenė
(vietovė)

2006 m. 11 mėn. 03 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2006 m. lapkričio mėn. 2 d. potvarkiu

Nr.PI-416

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

- V.Kriščiūnas - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Akmenės rajone (komisijos pirmininkas),
- L. Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė
- A. Bučys - Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
(v.pavardė) (pareigos)
- V.Buivydas - Akmenės raj. vyr. architektas
- E.Gudonis - Projektuotojo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas
- A. Vaičius - Papilės mstl. seniūnas
- A.Lenkutis - Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros vedėjas
- S.Vilkas - Akmenės rajono savivaldybės administracijos ekologas
- A.Puzaras - Valstybinės darbo inspekcijos vyr. darbo inspektorius
- J.Matusevičius - LR Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus direktorius

Dalyvaujant:

rangovui (statybos vadovui) - VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros skyriaus viršininkas J.Vaitiekūnas, kv. atestato Nr. 1346

(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovui - UAB „Joniškio mechanizacija“ R. Karionas kv. pažymėjimo Nr. 002213

techniniam prižiūrėtojui - J.Sarakauskas kv. atestato Nr. 3555



TIKRA
Skyriaus vedėja

KOPJA TIKRA
Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

2009-05-08

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 5 sk. 19p. „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo statytojo pateiktą **Papildės seniūnijos atliekų priėmimo punktą, Papildė** (visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė, patikrino jo statybos techninę bei vykdomo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2005 m. parengė

VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

2. Leidimas statyti išduotas 2005-05-10 Nr 08
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, I/k 4578727, Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30. Aikštelės įrengimo darbai.
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

Subrangovai UAB „Joniškio mechanizacija“

5. Statyba pradėta 2006m. gegužės mėn. 25 d.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Bendrieji rodikliai				
Asfaltuota aikštelė		m ²	383,35	383,35
Atliekų konteineriai 1,1m ³		vnt	3	3
Atliekų konteineriai 3,0m ³		vnt	2	2
Atliekų konteineriai 3,2m ³		vnt	4	4
Atliekų konteineriai 5,0m ³		vnt.	2	2
Metalinio tinklo tvora		m	88	88
Faktiška statybos kaina		tūkst.Lt.	99,023	99,023



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA
Šiuo administratorė
Rozinaite

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažinti tinkamais naudoti.

10. Projekte numatytos darbų saugos priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Papildės seniūnijos atlieku priėmimo punktas, Papildė (statinio ir priklausinių pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su ayašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos priemonių charakteristikos, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.




TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

2009-05-08



163

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

L. STARENKAJA

V. Kriščiūnas

(v., pavardė)

A. Bučys

V. Buivydas

J. Matusevičius

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Vyriausiasis darbo inspektorius

A. Puzaras

Albėrtas Puzaras

E. Gudonis

A. Vaičius

A. Lenkutis

S. Vilkas

P. Karitonas

J. Vaitiekūnas

J. Šarakauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmiau nuolat saugoti:

Priėmė:

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus

(pareigos)

Statybos vadovas

R. Vėgelė

(v., pavardė)

J. Vaitiekūnas



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

VENTOS SENIŪNIJOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAS*(statinio pavadinimas ir adresas)***pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S**Naujoji Akmenė
(vietovė)

2006 m. 11 mėn. 03 d.

Komisija, paskirta Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus viršininko 2006 m. lapkričio mėn. 2 d. potvarkiu

Nr.PI-416*(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)*

šios sudėties:

- V.Kriščiūnas - komisiją paskyrusios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas Akmenės rajone (komisijos pirmininkas),
- L. Starenkaja - statytojo VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inžinierė-ekspertė
(v.pavardė) (pareigos)
- A. Bučys - Akmenės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
- V.Buivydas - Akmenės raj. vyr. architektas
- E.Gudonis - Projektuotojo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas
- G.Sungailienė - Ventos m. seniūnė
- A.Lenkutis - Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros vedėjas
- S.Vilkas - Akmenės rajono savivaldybės administracijos ekologas
- A.Puzaras - Valstybinės darbo inspekcijos vyr. darbo inspektorius
- J.Matusevičius - LR Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus direktorius

Dalyvaujant:

rangovui (statybos vadovui) - VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kelių ir tiltų priežiūros skyriaus viršininkas J.Vaitiekūnas, kv. atestato Nr. 1346*(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)*subrangovams - UAB „Joniskio mechanizacija“ P. Karionas kv. pažymėjimo Nr. 198213techniniam priežiūrui - UAB „Sarakauskas“ kv. atestato Nr. 3555**TIKRA**
Skyriaus vedėja

Aldona Čeplyienė

KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 5 sk. 19p. „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo statytojo pateiktą Ventos seniūnijos atliekų priėmimo punktą Venta, Miško g.

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2005 m. parengė VI „Šiaulių regiono keliai“ atestatas Nr. 0514, galioja iki 2008-06-30.
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

2. Leidimas statyti išduotas 2005-05-10 Nr 09
(data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, I/k 4578727, Ežero g. 16, LT-76536 Šiauliai

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas VI „Šiaulių regiono keliai“, atestatas Nr. 05614 galioja iki 2008-07-30. Aikštelės įrengimo darbai.

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

Subrangovai UAB „Joniškio mechanizacija“

5. Statyba pradėta 2006m. gegužės mėn. 25 d.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Bendrieji rodikliai				
Asfaltuota aikštelė		m ²	379,62	379,62
Atliekų konteineriai 1,1m ³		vnt	3	3
Atliekų konteineriai 3,0m ³		vnt	2	2
Atliekų konteineriai 3,2m ³		vnt	4	4
Atliekų konteineriai 5,0m ³		vnt.	2	2
Metalinio tinklo tvora		m	88	88
Faktiška statybos kaina		tūkst.Lt.	115,048	115,048



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė
2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaite

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažinti tinkamais naudoti.

10. Projekte numatytos darbų saugos priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Ventos seniūnijos atliekų priėmimo punktas, Venta Miško g.
(statinio ir priklausinių pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su ayrašu, 1.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, 1.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos priemonių charakteristikos, 1.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 1.



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė
2009-05-08

KOPIJA TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

173

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

L. STAREHKAJA

V.Kriščiūnas
(v., pavardė)

A.Bučys

V.Buivydas

J.Matusevičius

A.Puzaras

E.Gudonis

G.Sungailienė

A.Lenkutis

S.Vilkas

P.Karionas

J.Vaitiekūnas

J. Šarakauskas

Rangovas

Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmiau nuolat saugoti:


Priėmė: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
(parašas)

Statybos vadovas

(parašas)

R.Vėgelė
(v., pavardė)

J.Vaitiekūnas



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitytė

KOPIJA**VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

Įmonės kodas 145787276, PVM mokėtojo kodas LT457872716

Korespondencijai: P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai, tel./faks. (8-41) 520002, el. p. info@sratc.lt

A.s. LT624010044200021860 AB DnB NORD bankas; A.s. LT700075800001345575 AB bankas Snoras

Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, buveinės adresas: Aukštakių km., LT-81402 Šiaulių rajonas Šiaulių r. sav.

Projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
Nr. 2001/LT/16/P/PE/008

*Priėmimo perdavimo aktų kopijos***II priedas****TIKRA**
Skyriaus vedėja

Aldona Čepėlienė

2009-05-08

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB „Oksata“, įm. k. 181308989 Riomerio g.8 Trakai
 Sutarties Nr.:2006/5/A/PT/LT
 Sutarties pavadinimas:Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas : Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Atliekų tankintuvo įsigijimas . TANA G 290

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos .data: 2006-07-10....., įdiegtos data.2006-07-12....., pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Užsakovas pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, [personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų] (jei numatyta sutartyje), [laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)] (jei numatyta sutartyje).

Šiuo aktu Užsakovas, patvirtina, kad prekės priimtos data 2006-07-12....., ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

Tiekėjas UAB „Oksata“

Riomerio g.8 Trakai

įm.k.1810308989, PVM LT 813089811

(Parašas)

Gintautas Čemiaskas

(Vardas, pavardė)

(Pareigos) Direktorius



Priėmė:

Užsakovas VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" Ežero g.16 Šiauliai

įm.k 145787276 PVM LT 457872716

(Parašas)

Algimantas Buivydas

(Vardas, pavardė)


(Pareigos) Savarankų eksploatacijos grupės vadovas



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepeljanė

2009-05-08



KOPIJUOTI KRA
Biuro administratorė
Sarūnė Rožanaite
77

I priedas Nr. 8

ĮRANGOS/PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA

Priėmimo-perdavimo aktas – tiekiamų prekių/įrangos sąrašas

Tiekėjas: UAB „Oksata“, įm k. 181308989 Riomerio g.8 Trakai

Sutarties Nr.: 2006/5/A/PT/LT

Sutarties pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas.

1.dalis Atliekų tankintuvo įsigijimas. Atliekų tankintuvas Tana G 290.

Dalies Nr.	Pristatymo data	Aprašymas	Prekės numeris	Pardavėjas	Kiekis	Vieneto kaina LTL	Suma LTL	Garantinis terminas	Vietos adresas
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10
1	2006-07-12	Atliekų tankintuvas TANA G 290	060861	UAB "Oksata"	1	759930	759930	1 metai arba 2000 d.val. kas pirmiau	Kairių sąvartynas: Kairių k., Šiauliai
Viso pristatyta (perduota):					1	759930	759930		

Priedai: buhalteriniai dokumentai pristatomoms prekėms, atitinkantys nacionalinius standartus ir t. t. aktais.

Patvirtinta Tiekėjo: UAB "Oksata"
Direktoriaus Gintautas Černiauskas

Birojo administratorė
Sąrašė Rožanaite

Patvirtinta Užsakovų: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Sąvartynų eksploatavimo ir likvidavimo Alginantų Buivydas

TIKRA
Skaitymas vedėja

2009-05-08

Aldona Čopljienė

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB „Silberauto“

Sutarties Nr.: 2006/9/A/PT/LT

Sutarties pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Sunkvežimio su priekaba įsigijimas

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos 2006 m. gruodžio 14 d., įdiegtos 2006 m. gruodžio 18 d., pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Užsakovas pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, [personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų] (jei numatyta sutartyje), [laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)] (jei numatyta sutartyje).

Šiuo aktu Užsakovas, patvirtina, kad prekės priimtos 2006 m. gruodžio 18 d., ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

Tiekėjas UAB „Silberauto“

(Parašas)

Saulius Kvedaras

Krovininių automobilių pardavimo
vadybininkas



Priėmė:

Užsakovas VŠĮ „Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo centras“

(Parašas)

Algimantas Buivydas

Sąvartynų eksploatacijos grupės
vadovas


(Antspaudas)



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čopelienė

2009-05-08



3

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB „Silberauto“

Sutarties Nr.: 2006/9/A/PT/LT

Sutarties pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Sunkvežimio su priekaba įsigijimas

2 Dalis	Kiekis	Objekto apibūdinimas	Vieneto kaina su pristatymu į aikštelę (LTL)	Viso (be PVM) LTL
3.	Atsarginės dalys			
3.1	2	Tepalo filtras	99,51	199,02
3.2	6	Vožtuvų dangtelio tarpinė	23,97	143,82
3.3	2	Kuro filtras	85,49	170,98
3.4	2	Kuro filtras su pašildymu	291,42	582,84
3.5	1	Stabdžių sistemos džiovintuvas	90,47	90,47
3.6	1	Salono filtras	61,38	61,38
3.7	2	Stebulės riebokščių rink. pr. ašiai	100,32	200,64
3.8	2	Stebulės riebokščių rink. gal. ašiai	253,43	506,86
3.9	2	Hidraulinės alyvos filtras	215,00	430,00
3.10	2	Alyvos bako oro filtras	155,00	310,00
Atsarginės dalys viso : 22vnt				2696,01
4.	Vartojimo reikmenys			
4.1	64 l	Tepalas varikliui 5W-30	16,95	1084,80
4.2	18,5 l	Tepalas galiniam tiltui	21,70	401,45
4.3	1 kg	Konsistencinis tepalas	20,43	20,43
4.4	0,4	Tepalas stebulių guoliams	303,69	121,48
4.5	1	Tepimo švirkštas	70,00	70,00
4.6	4l	Tepimo švirkšto antgalis	10,00	40,00
Vartojimo dalys viso:				1738,16

Perdavė:

Tiekėjas UAB „Silberauto“

(Parašas) *Gautius KVEDARAS*

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

UAB

SILBERAUTO

VILNIAUS

LIEKIMO

KONTROLINIS

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

SĄJŪDŲ

Priėmė:

Užsakovas

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

ŠIAULIŲ

REGIONO

ATLIEKŲ

TVARKYMO

CENTRAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ RAJONAS

TIKRA

Skynaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPKATIKRA
Biuro administratorė
Šarūnė Rozanaitė

4

IRANGOS/PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA

Priėmimo-perdavimo aktas – tiekiamų prekių/irangos sąrašas

Tiekėjas: UAB „Silberauto“ įm. k. 111748996 Pirklių g. 9 Vilnius

Sutarties Nr.: 2006/9/A/PT/LT

Sutarties pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas.

Sunkvežimio su priekaba įsigijimas

Dalis Nr.	Pristatymo data	Aprašymas	Prekės numeris	Pardavėjas	Kiekis	Vieneto kaina LTL	Suma LTL	Garantinis terminas	Vietos adresas
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10
2	2006-12-18	MB Actros 2536 su Multilift sistema		UAB „Silberauto“	1	326200	329220	1 metai ir 36 mėn.- 250 tkm agregatams	Kairių sąvartynas Kairių k. Šiauliai
2	2006-12-18	Priekaba LVS-20		UAB „Silberauto“	1	75220	75220	1 metai	Kairių sąvartynas Kairių k. Šiauliai
	2006-12-18	Atsarginės dalys ir vartojimo reikmenys		UAB „Silberauto“	1	4434,17	4434,17		Kairių sąvartynas Kairių k. Šiauliai
Viso pristatyta (perduota):							408874,17		

Priedai: buhalteriniai dokumentai pristatomoms prekėms, atitinkantys nacionalinius standartus ir teisės aktus.

Parvairinta Prieš UAB „Silberauto“

Krovinių automobilių pardavimo vadybininkas

Parvairinta Užsakovo:

VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

Savartynų grupės vadovas



PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2006-07-31

Šiauliai

Tiekėjas: UAB „ARGO EKSPRESAS“

Sutarties Nr.:2006/6/A/PT/LT

Sutarties pavadinimas: „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Konteinerių įsigijimas.“

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos iki 2006-07-31, įdiegtos iki 2006-07-31, pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaita, sertifikatai, konteinerių eksploatavimo taisyklės).

Užsakovas pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, personalo mokymas bus atliktas laikantis sutarties sąlygų kai pagal kitą sutarties dalį „Sunkvežimio su priekaba įsigijimas“ bus pristatyta mašina su „Multilift“ krovimo įrenginiu; laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).

Šiuo aktu Užsakovas, patvirtina, kad prekės priimtos 2006-07-31, ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

Tiekėjas



Jevgenij Cifirov

Direktorius

**Priėmė:**

Užsakovas

Regimantas Vagelis

Direktorius

**TIKRA**
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė 2009-05-08

TIKRA
Biuro administratorė
Sąrašė Rožanaitė

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS Nr.255/06

Gargždai
2006-07-28

Tiekėjas: UAB „ARGO EKSPRESAS“

Sutarties Nr.:2006/6/A/PT/LT

Sutarties pavadinimas: „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Konteinerių įsigijimas.“

Mes, žemiau pasirašę, šiuo aktu patvirtiname, kad UAB „ARGO EKSPRESAS“ perdavė, o VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ priėmė šiuos dokumentus:

1. 6 (šešių) 30 m³ talpos atvirų GAK tipo metalinių konteinerių, kurių numeriai AE 2138 ÷ AE 2143, gaminio pasus (sertifikatus);
2. 2006-07-28 Gamintojo deklaraciją;
3. bendras GAK tipo konteinerių eksploatavimo taisyklės.

Aktas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Perdavė:

Tiekėjas


Jevgenij Cifirov

Direktorius



Priėmė:

Užsakovas

Regimantas Vėgolis

TIKRA
Skyriaus vedėjaAldona Čepaitienė
2009-05-08
KOPJA TIKRA
Biuro administratore
Sėrūnė Ruzanaitė

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.251/06

Šiauliai
2006-07-28

Užsakovas: VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
Pristatymo aikštelės adresas: Šiaulių raj., Kairių sąvartynas
Tiekėjas: UAB „ARGO EKSPRESAS“
Sutarties Nr.:2006/6/A/PT/LT
Sutarties pavadinimas: „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Konteinerių įsigijimas.“

Mes, žemiau pasirašę, šiuo aktu patvirtiname, kad UAB „ARGO EKSPRESAS“ perdavė, o VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ priėmė:

- du 30 m³ talpos atvirus GAK tipo metalinius konteinerius su informaciniais užrašais, skirtus darbui su „Multilift“ krovimo įrenginiu (numeriai AE 2138, AE 2139).

VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ atstovas, priimdamas konteinerius ir pasirašydamas šį aktą, patvirtina jam perduodamų konteinerių komplektiškumą bei kokybę.

Aktą pasirašė:

Tiekėjas:
UAB „ARGO EKSPRESAS“Įm. kodas 140519858,
Statybininkų g.1,
LT-96155 GargždaiUžsakovas:
VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“
Įm. kodas 145787276,
Ežero g.16,
LT-76356 Šiauliai

Gamybos vadovas Alvydas Šeferis



RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLINIS
KORUPCINIŲ RIZIKŲ
VADOVAVIMAS
Meistras
Stasys Jonkus
SKYRIUS
T I K R A
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė
(pareigos, parašas, pavarde parašas)

2009-05-08
A.V. DOKUMENTAM.
2
KOPJA TIKRA
Biuro administratore
Irena Rožanaitė

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.250/06

Šiauliai
2006-07-26

Užsakovas: VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
Pristatymo aikštelės adresas: Šiaulių raj., Kairių sąvartynas
Tiekėjas: UAB „ARGO EKSPRESAS“
Sutarties Nr.: 2006/6/A/PT/LT
Sutarties pavadinimas: „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Konteinerių įsigijimas.“

Mes, žemiau pasirašę, šiuo aktu patvirtiname, kad UAB „ARGO EKSPRESAS“ perdavė, o VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ priėmė:

- du 30 m³ talpos atvirus GAK tipo metalinius konteinerius su informaciniais užrašais, skirtus darbui su „Multilift“ krovimo įrenginiu (numeriai AE 2142, AE 2143).

VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ atstovas, priimdamas konteinerius ir pasirašydamas šį aktą, patvirtina jam perduodamų konteinerių komplektiškumą bei kokybę.

Aktą pasirašė:

Tiekėjas:
UAB „ARGO EKSPRESAS“

Įm. kodas 140519858,
Statybininkų g. 1,
LT-96155 Gargždai

Užsakovas:
VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Įm. kodas 145787276,
Ežero g. 16,
LT-76356 Šiauliai



AV
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelajienė

Meistras
Stasys Jonkus

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



OPNĖ TIKRA
Biuro administratore
Sąrašė Rozanaitė

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.249/06

Šiauliai
2006-07-24

Užsakovas: VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Pristatymo aikštelės adresas: Šiaulių raj., Kairių sąvartynas

Tiekėjas: UAB „ARGO EKSPRESAS“

Sutarties Nr.:2006/6/A/PT/LT

Sutarties pavadinimas: „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų tvarkymo įrangos tiekimas. Konteinerių įsigijimas.“

Mes, žemiau pasirašę, šiuo aktu patvirtiname, kad UAB „ARGO EKSPRESAS“ perdavė, o VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ priėmė:

- du 30 m³ talpos atvirus GAK tipo metalinius konteinerius su informaciniais užrašais, skirtus darbui su „Multilift“ krovimo įrenginiu (numeriai AE 2140, AE 2141).

VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ atstovas, priimdamas konteinerius ir pasirašydamas šį aktą, patvirtina jam perduodamų konteinerių komplektiškumą bei kokybę.

Aktą pasirašė:

Tiekėjas:
UAB „ARGO EKSPRESAS“Įm. kodas 140519858,
Statybininkų g. 1,
LT-96155 GargždaiUžsakovas:
VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“
Įm. kodas 145787276,
Ežero g. 16,
LT-76356 Šiauliai

Gamybos vadovas Alvydas Šeferis


Sąvartynų eksploatacijos
grupės vadovas
Algimantas BUTVYDAS

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJOS
TIKRA
Biuro administratorė
Sąjūnė Rozanaitė

4/7



CASE 695SR
PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr. 06/09/11 -ŠRATC

2006 m. 09 mėn. 18 d.

UAB "Intrac Lietuva" perdavė, o Šiaulių Regiono atliekų tvarkymo centras, pagal 2006 m. sutartį nr.: 2006/7/A/PT/LT priėmė šią techniką:

Case 695SR2, kurio ser. Nr.: N5GH04343
(mašina priduodama su: a) standartiniu kaušu 1m³ talpos su šakėmis paletėms; b) 2m³ aukšto išvertimo kaušu; c) greito keitimo įrenginiu; d) sniego peiliu; e) medžiagų tvarkymo strėle;)


Pastaba: technika nauja, nenaudota, tvarkingos techninės būklės, pilnai atitinka sutarties ir kitų pirkimo dokumentų reikalavimus.

PERDAVĖ
UAB "Intrac Lietuva"



PRIĖMĖ
Šiaulių Regiono Atliekų tvarkymo centras 2009-05-08

Sąvartynų eksploatacijos
grupės vadovas:
Algimantas BUIVYDA



OPINATIKRA
Biuro administratorė
Sąrūnė Rozanaitė

MODELIS... Case 695SR.II..... SERIJOS NR. N5GH04343..... PARDAVIMO DATA 2006.09.13.....
 Šiaulių Regiono Atliekų
 PIRKEJAS... tvarkymo centras..... ADRESAS..... TELEFONAS.....
 PASTO INDEKSAS..... VIETOVĖ Šiauliai..... REGIONAS..... VALSTYBĖ Lietuva.....
 UAB Intrac Lietuva
 PLATINTOJAS.....



A – PRISTATYMO KUPONAS

MIELAS PIRKEJAU,
 PRISTATANT MASINĄ KARTU SU PLATINTOJO TECHNIKU REIKETU ATLIKTI ŠIAS OPERACIJAS IR ISISAVINTI ŠIAS PROCEDURAS,
 ESANT REIKALUI PAPRASANT PAPILDOMOS INFORMACIJOS

1. Ištikinti, jog masinoje yra Naudotojo vadovas
2. Issiaiskinti neaiškius Vadovo turinio aspektus
3. Patikrinti bendrą masinos būklę (skysčių tekejimas ir pan.)
4. Issiaiskinti neaiškius masinoje įrengtos saugos įrangos aspektus
5. Patikrinti masinos valdymo įrangos veikimą, patikrinant pagal Naudotojo vadovą.
6. Susipažinti su Vadove nurodytais priežiūros ir derinimo intervalais
7. Ištikinti, jog susipažinote su nurodytais skirtingais tepamųjų medžiagų tipais
8. Paklausti kada turės būti atlikta pirmoji privaloma priežiūra
9. Pasiklausti kaip teisingai patikrinti alyvos lygį transmisijoje
10. Patikrinti aušinimo skysčio lygį radiatoriuje
11. Patikrinti alyvos lygį variklyje
12. Patikrinti hidraulines alyvos lygį
13. Susipažinti su kuro užpildymo procedūra, užduoti klausimus apie elektrinės-hidraulines kuro perdavimo sistemos veikimą (jei įrengta)
14. Užduoti klausimus apie masinos idirbimo laikotarpio metu būtinas laikytis atsargumo priemones
15. Ištikinti, jog po pirmųjų kelių darbo valandų stegis ratinės masinos padangose ir ratų disku tvirtinimo varžtų priveržimas atitinka nustatytas normas
16. Užduoti klausimus apie saugumo įrenginius pritaikant masiną naudojimui keliuose
17. Pasizymėti sutartinius išsipareigojimus dėl garantijos masinai
18. Abejonių atveju patikslinti Naudotojo vadovą
19. Patikrinti variklio sukįs
20. Patikrinti ar teisingai veikia stabdžiai ir vairo mechanizmas
21. Patikrinti alyvos lygį asyse / galutinėse pavarose ir transmisijoje
22. Sutepti jungtis.
23. Patikrinti apšvietimo sistemą ir akumuliatorių

PASTABOS

Prieš pradėdami priežiūros operacijas, dėl kurių abejojate, susiekite su Jums masina pardavusiu platintoju.

Gerb. pone,

Maloniai prasome patvirtinti pasirasant žemiau, jog aukščiau išvardintos operacijos buvo atliktos, Jus gavote paaiskinimus apie masinos veikimą ir priežiūrą, taip pat Jums buvo paaiskinti sutartiniai išsipareigojimai ir garantijos sąlygos ir Jus su jomis sutinkate, ypač akcentuojant punktą C.

Apmokyma atliko.....

Data 2006.09.13.....

Platintojo kognas.....

Pirkejas.....
 Pirkejas.....



TIKRA
 Skyriaus vedėja
 Aldona Čepelienė

Squaryny eksploatacijos
 grupės vadovas
 Algimantas BUIVYDA
 Biuro administratorė
 Šarūnė Rožanai

2006-09-13

121

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB Balžuva

Sutarties Nr.: 2006/17/A/PT/LT

Sutarties pavadinimas: Alytaus ir Šiaulių regionų atliekų tvarkymo sistemų sukūrimas: Mobilios technikos sąvartynui (įskaitant mobilią kompostavimo techniką) įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas Jenz AZ 30"

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąrašė, buvo pristatytos 2007-03-21, įdiegtos 2007-03-21, pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Užsakovas pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų (jei numatyta sutartyje), laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai) (jei numatyta sutartyje).

Šiuo aktu Užsakovas, patvirtina, kad prekės priimtos 2007-03-21, ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

Tiekėjas

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

(Antspaudas)



Priėmė:


Užsakovas

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

(Antspaudas)



Energetikas

Juozapas Venslovas



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelajienė

2009-05-08

KOPIJA TIKRA
Biuro administratorė
Sąjūnė Rožanaitė

**Energetikas
Išsprendžia Vėšlos**

TIKRA
Skių ir slidžių sporto
renginių organizavimas


Aldona Čepelienė
2009-05-08



Šiaulių regionų atliekų tvarkymo sistemų sukūrimas:
Mobilių technikos sąvartynams įsigijimas



Priedas Nr. 8

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB "Kelių mašinos"

Sutarties Nr.: A/2007/S/27 2007-06-20

Sutarties pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas; mobilios technikos sąvartynui įsigijimas. Komposto vartytuvas kaušas ALLU SC 2-20. (Nr. SC 22007005)

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos <2007-08-31>, įdiegtos <2007-08-31>, pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Užsakovas pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, [personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų] (jei numatyta sutartyje), [laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)] (jei numatyta sutartyje).

Šiuo aktu Užsakovas, patvirtina, kad prekės priimtos <2007-08-31>, ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

Tiekėjas: UAB „Kelių mašinos“

įmk.126107416

Kauno g.36-221 Vilnius

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Česlavas Taraškevičius

(Pareigos) Direktorius

(Antspaudas)



Priėmė:

Užsakovas: VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras"

įmk.145787276

.Ežero g.16 Šiauliai

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Rėgimantas Vėgelė

(Pareigos) Direktorius


(Antspaudas)



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemų sukūrimas:
Mobilios technikos sąvartynams įsigijimas



IRANGOS/PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA

Priėmimo-perdavimo aktas – tiekiamų prekių/irangos sąrašas

Tiekėjas: UAB "Kelių mašinos" įm.k 126107416 Kauno g.36-221 LT -03202 Vilnius

Sutarties Nr.: A/2007/S/27 2007-06-20

Sutarties pavadinimas: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas; mobilios technikos sąvartynui įsigijimas.


Komposto vartytuvas kaušas ALLU SC 2-20

Dalies Nr.	Pristatymo data	Aprašymas	Prekės numeris	Pardavėjas	Kiekis	Vieeto kaina LTL	Suma LTL	Garantinis terminas	Vietos adresas
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10
1	2007-08-31	Komposto vartytuvas - kaušas ALLU SC 2-20.	SC22007005	UAB "Kelių mašinos"	1	97200,00	97200,00	24 mėnesiai	Kairių sąvartynas Kairių k. Šiauliai
Viso pristatyta (perduota):						1	97200,00	97200,00	

Priedai: buhalteriniai dokumentai pristatomoms prekėms, atitinkantys nacionalinius standartus ir teises aktus.

Patvirtintą Tiekėjo: UAB „Kelių mašinos“ įm. 126107416-Kauno 36-221 Vilnius
Direktorius Čestavas Tarskevičius

Patvirtinta Užsakovo: VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" įm.k. 145787276 Ežero g.16 Šiauliai
Direktorius Regimantas Vėgelė



T I K R A
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



*Šiaulių regionų atliekų tvarkymo sistemų sukūrimas:
Mobilių technikos sąvartynams įsigijimas. Ekskavatoriaus pirkimas.*



PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB „Mecro Technikonas“

Sutarties Nr.: S-08-240

Sutarties pavadinimas: „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Mobilių technikos sąvartynui įsigijimas. Ekskavatoriaus pirkimas“. JCB 3CX SUPER

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos 2008-10-31, įdiegtos 2008-10-31, pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Perkančioji organizacija/Užsakovas pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų.

Šiuo aktu Perkančioji organizacija/Užsakovas, patvirtina, kad prekės priimtos 2008-10-31, ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

Tiekėjas: UAB „Mecro Technikonas“
į/k 211660860
Islandijos pl. 5, LT - 49187, Kaunas

(Parašas)


Jonas Povilonis

(Vardas, pavardė)

Projekto vadovas

(Pareigos)

A.V.



Priėmė:

Perkančioji organizacija/ Užsakovas:
VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“
Įs./k 145787276
P. Lukšio g. 8, LT - 76206, Šiauliai

(Parašas)

Juozapas Venslovas

(Vardas, pavardė)

Direktorius pavaduotojas gamybai

(Pareigos)



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



TIKRA
Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

17

Priedas prie Pirkimo-Pardavimo sutarties Nr. R5108
Tarp UAB ENAX ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr. KF003

Vilnius

2008-10-31

1. Šiuo aktu UAB "ENAX" perduoda, o VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras priima kaušą KINSHOFER KM604-350 su rotatorium KM04F, pakaba KM501 ir visomis hidraulinėmis žarnos ir jungtimis sumontuotą ant manipulatoriaus Palfinger PK12000A, – viso 1 kompl.
2. Pirkėjas patvirtina, kad su eksploatacijos instrukcijomis Pardavėjas jį supažindino.
3. Pardavėjas patvirtina, o Pirkėjas sutinka, kad kaušas naujas, neapgadintas, atitinka įmonės gamintojos kokybės reikalavimus, su visa standartine ir papildoma įranga.
4. Pirkėjas pretenzijų dėl perduodamos įrangos techninės būklės, komplektacijos neturi.
5. Perdavimas atliktas 2008 m. spalio 31 d., adresu: Aukštutinė...
6. Šis aktas pasirašytas dviem egzemplioriais po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui.

PERDAVIAU:

UAB ENAX

Metalo g. 9
LT-02190 Vilnius
Įm. kodas 211681840

Egidijus Kontravičius, pardavinėtojas
(pareigos, varda, pavardė)
.....
(parašas)

PRIĖMIAU:

VšĮ Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centras
Ežero g. 16,
LT-76356 Šiauliai
Įm. kodas 145787276

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai
(pareigos, varda, pavardė)
.....
(parašas)



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



KOPIJA TIKRA

Biuro administratore
Saulė Rėzanaitė

18

„Mobilios technikos savarankiškas įsigijimas“ - „Ekskavatoriaus pirkimas“

IRANGOS/PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA


Priėmimo-perdavimo aktas – tiekiamų prekių/įrangos sąrašas

Tiekėjas: UAB „Mecro Technikonas“

Sutarties Nr.: S-08-240

Sutarties pavadinimas: „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Mobilios technikos savarankiškas įsigijimas. Ekskavatoriaus pirkimas“.
JCB 3CX SUPER

Dalies Nr.	Pristatymo data	Aprašymas	Prekės numeris	Pardavėjas	Kiekis	Vieneto kaina LTL	Suma LTL	Garantinis terminas	Vietos adresas
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10
1.	2008-10-31	Ekskavatorinis krautuvys JCB 3CX Super	Pagal sąskaitą faktūrą	UAB „Mecro Technikonas“	1	212 500,00	212 500,00	1 metai arba 1500 moto valandų	Aukštrakių savartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
2.	2008-10-31	Du hidro išvadai ant ekskavatorinės strėlės		UAB „Mecro Technikonas“	1	17 000,00	17 000,00	1 metai	Aukštrakių savartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
3.	2008-10-31	Kėlimo šakės atskirai nuo kaušo		UAB „Mecro Technikonas“	1	6 000,00	6 000,00	1 metai	Aukštrakių savartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
4.	2008-10-31	Šluota su bunkeriu		UAB „Mecro Technikonas“	1	17 000,00	17 000,00	1 metai	Aukštrakių savartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
5.	2008-10-31	Sniego peltis su hidrauliškai valdomu pasukimo kampu		UAB „Mecro Technikonas“	1	12 000,00	12 000,00	1 metai	Aukštrakių savartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas



TIKRA

Skyriaus vedėja

2009-05-08

Aldona Čepelienė

TIKRA
Biuro administratorė
Sąrašė Rozanaitė



Mobilios technikos įsigijimo ir eksploatacijos pirkimas.

6.	2008-10-31	Greiferinis kaušas su rotatoriumi	UAB „Mecro Technikonas“	1	21 000,00	21000,00	1 metai	Aukštrakių sąvartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
7.	2008-10-31	Amortizacinė kaušo stabilumo sistema	UAB „Mecro Technikonas“	1	9 000,00	9000,00	1 metai	Aukštrakių sąvartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
8.	2008-10-31	Oro kondicionavimo sistema	UAB „Mecro Technikonas“	1	6 500,00	6 500,00	1 metai	Aukštrakių sąvartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
9.	2008-10-31	Priekinio kaušo greito pakeitimo mechanizmas	UAB „Mecro Technikonas“	1	12 000,00	12000,00	1 metai	Aukštrakių sąvartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
10.	2008-10-31	Apmokymai, instrukcijos	UAB „Mecro Technikonas“	1	2 000,00	2000,00	1 metai	Aukštrakių sąvartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
11.	2008-10-31	Techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvėjusias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu.	UAB „Mecro Technikonas“	1	20 000,00	20000,00	1 metai	Aukštrakių sąvartynas, Aukštrakių kaimas, Šiaulių rajonas
Viso pristatyta (perduota):				11	335 000,00	335 000,00		

Priedai: buhalteriniai dokumentai pristatomoms prekėms, atitinkantys nacionalinius standartus ir teisės aktus.

Patvirtinta Tiekėjo: UAB „Mecro Technikonas“
 į/k 214600000-Islandijos pl. 5, LT - 49187, Kaunas
 Projektų vadovas: Jonas Povilonis

Patvirtinta Perkančiosios organizacijos/Užsakovo:
 VSL - Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“
 VSL-143787276. P. Lukšio g. 8, LT - 76206, Šiauliai
 Direktoriaus pavaduotojas gamybai Juozapas Venšlovas



TIKRA
 Skyriaus vedėja
 Aldona Čepelienė

2009-05-08

KOPIJA

**VIEŠOJI ISTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

Įmonės kodas 145787276, PVM mokėtojo kodas LT457872716

Korespondencijai: P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai, tel./faks. (8-41) 520002, el. p. info@sratc.lt

A.s. LT624010044200021860 AB DnB NORD bankas; A.s. LT700075800001345575 AB bankas Snoras

Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, buveinės adresas: Aukštakių km., LT-81402 Šiaulių rajonas Šiaulių r. sav.

Projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“


Nr. 2001/LT/16/P/PE/008

Projekto viešinimo priemonės

III priedas**TIKRA**
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



**ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRO
ĮGYVENDINTI IR
ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI**

- Šiaulių regiono senų savartynų ir šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas
- Šiaulių regiono Kairių savartyno uždarymo II etapas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdavimo sričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucijų pajėgumų stiprinimas
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas
- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas


KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšo g. 8, LT-76206 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El. paštas: info@sratc.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJIENŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas

REGISTRUOTIS



EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDAS: ŽINGSNIS Į MŪSŲ GEROVĘ

**ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO
SISTEMOS SUKŪRIMAS**

Projekto Nr. 2003/LT/16/P/PE/008

Projekto finansavimas:

- Projekto vertė - 32 463 225,60 Lt, iš kurių:
- ES Sanglaudos fondo paramos dalis - 18 179 406,34 Lt (56 proc.),
 - Bendrojo finansavimo dalis - 14 283 819,26 Lt (44 proc.), iš kurių:
 - 22 proc. - Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos,
 - 22 proc. - SRATC lėšos.

Projekto tikslai ir rezultatai:

- Aukštakiuose (Šiaulių r.) pastatyti naują regioninę savartyną.
- Rekonstruoti privažavimo kelią į Aukštakių savartyną.
- Šiaulių apskrityje įrengti 34 atliekų priėmimo punktus.
- Šiaulių apskrityje įrengti 247 bendro naudojimo konteinerinių aikštelių.
- Kairiuose (Šiaulių r.) įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių.
- Uždaryti Šiaulių miesto senąjį savartyną Kairiuose.
- Šiaulių apskrityje uždaryti ir sutvarkyti 116 mažųjų savartynų (šiukšlynų).
- Įsigyti atliekų tvarkymo įrangą.

Uždarius Šiaulių apskrityje visus senuosius, šiandieninių aplinkosaugos reikalavimų nebeatitinkančius savartynus ir vietoj jų atidarius modernų griežčiausius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos reikalavimus atitinkantį savartyną Aukštakiuose - vieną visai apskrityje, savartynų į aplinką skleidžiama tarša Šiaulių apskrityje bus maksimaliai sumažinta. Taip Šiaulių apskrityje gyventojams bus užtikrinta švaresnė ir saugesnė aplinka. Atliekų priėmimo punktai ir konteinerinės aikštelės padės sumažinti atliekų kiekius, patenkančius į savartyną, ir padidins atliekų kiekius, skirtus perdirbti. Tai padės tausoti gamtos išteklius ir energiją, prailginti naujojo savartyno eksploatacijos laiką.

Projekto įgyvendinimo terminas:

Pradžia - 2003 m. gruodžio 21 d.
Pabaiga - 2008 m. gruodžio 31 d.

Projekto įgyvendinimo eiga:

- 2005 m. rugsėjo 29 d. baigta įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Kairiuose. **Daugiau...**
- 2006 m. rugsėjo - gruodžio mėn. baigti įrengti 34 atliekų priėmimo punktai. **Daugiau...**
- 2007 m. vasario 23 d. baigta Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartyno Aukštakiuose statyba. **Daugiau...**
- 2007 m. baigtos įrengti 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės. **Daugiau...**
- 2008 m. gegužės 29 d. baigta privažavimo kelio į naują Aukštakių savartyną I etapo II eilės statyba. **Daugiau...**
- 2008 m. gegužės 29 d. baigta tvarkyti 116 mažųjų savartynų/šiukšlynų. **Daugiau...**
- 2008 m. birželio 9 d. baigti Kairių savartyno uždarymo I-ojo etapo darbai. **Daugiau...**
- Įsigyta atliekų tvarkymo įrangos. **Daugiau...**

KOPIMATIKRA
Biuro administracija
Šarūnė R. Čaplajienė

Pagrindinis | Apie mus | Daininkų | Paslaugos | Nuorodos | Elektroninės | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai

Visos teisės saugomos 2005-2009 m. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras




TIKRA
Skyriaus vedėja

2009-05-08

http://www.sratc.lt/apva_pagr.php

Aidona Čaplajienė

2009.01.28



ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮGYVENDINTI IR ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas;
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucijų pajėgumų stiprinimas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas

KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšo g. 8, LT-76206 Šiauliai,
Tel./faks. 5206002
El. paštas: info@sratc.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJIEŲ GAVIMAS


Jūsų elektroninis paštas

REGISTRUOTIS

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖ KAIRIULOSE


Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pagal 2004 m. liepos 14 d. su UAB "Šiaulių kėlas" pasirašytą sutartį Kairiuose prie Šiaulių miesto senjojo savitarnos 2005 m. rugpjūčio 29 d. buvo baigta įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Joje iš tvarkymo reikalaujančių žaliųjų atliekų, taikant nesudėtingą technologiją, gaminamas kompostas, kuris po to naudojamas uždarytam senajam Šiaulių miesto savitarnui reikultuoti. Jam reikultuoti reikalingi labai dideli derlingo grunto kiekiai. Toks gruntas brangus, todėl patiens jį gamintis, sumažinant savitarnos reikultavimo kaštus.

Kita vertus, pradėjus eksploatuoti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Kairiuose, Šiaulių apskrityje pradėtas įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano reikalavimas palaipsniui mažinti į savitarną patenkančių biologiškai suyrančių atliekų kiekį. Kaip žinoma, dėl didelės įtakos klimato kaitai (šių atliekų anaerobinio skaidymo metu susidaro metanas, turintis įtakos klimato šilumai) biologiškai suyrančios atliekos pagal Europos Sąjungos savitarnų direktyvos reikalavimus turi būti išskirtos į atskirą atliekų tvarkymo sritį.



Pagrindinis | Apie mus | Dalininkai | Paslaugos | Nuorodos | Aktualijos | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai

Visos teisės saugomos 2005 - 2008 VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras




<http://www.sratc.lt/zaliu.php>

Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė

2009-05-08

2009.01.28



ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮGYVENDINTI IR ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas;
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas;
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione;
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas.

KONTAKTAI

Viešojo įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšo g. 8, LT- 76206 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El.paštas: info@srac.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas

RĖGISTRUOTIS

ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAI


Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pagal 2005 m. liepos 8 d. su VI "Šiaulių regiono keliai" pasirašytą sutartį Šiaulių apskrityje rajonuose vietoj ūdaronų savartynų 2006 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais buvo baigta įrengti 34 atliekų priėmimo punktai:

- 6 rajoniniai atliekų priėmimo punktai (po vieną Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonuose).
- 28 seniūnijų atliekų priėmimo punktai (4 - Akmenės rajone, 3 - Joniškio rajone, 3 - Kelmės rajone, 4 - Pakruojo rajone, 5 - Radviliškio rajone ir 9 - Šiaulių rajone).

Atliekų priėmimo punktuose pastatyti konteineriniai buityje susidarantys biologiškai suyrančios atliekos, medienos atliekos, metalui, naudotoms padangoms, plastikams, popieriui, stambiagabaritėms atliekoms, statybos atliekoms, atliekai iš gyventojų surinkti.

Atliekų priėmimo punktų paskirtis - užtikrinti antrinių žaliavų, biodegraduojančių ir kitų atliekų surinkimą ir tvarkymą ūdarybų savartynų aptarnavimo zonoje. Iš gyventojų surinktos atliekos tvarkomos punkte ir vežamos arba perdirbėjams (tinkamos perdirbti), arba į savartyną (netinkamos perdirbti). Apie 90 procentų buityje susidaranti atliekų, jas perdirbus, galima dar kartą panaudoti. Rūšiuojant atliekas išsaugoma švėri ir sveika aplinka, sukaupiamos antrinės žaliavos, tausojami gamtos ištekliai ir energija, prailginamas naujojo Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartyno Aukštakruose eksploatacijos laikas.

Ginkūnų seniūnijos atliekų priėmimo punktas



TIKRA
Skynaus vedėja

Aldona Čeplėjanė

<http://www.srac.lt/app.php>

2009-05-08

2009.01.28

3.

Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras


Page 2 of 2

Pagrindinis | Apie mus | Dalininkai | Paslaugos | Nuorodos | Aktualijos | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai

Visos teisės saugomos 2005 - 2006 vs. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras



<http://www.sratc.lt/app.php>




Biuro administratore
Šarūnė Rozanaitė

TIKRA
Skyriaus vadėja

Aldona Čepėlienė

2009-05-08 2009.01.28

4,



ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮGYVENDINTI IR ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas:
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucijų pajėgumų stiprinimas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo priemonių įgyvendinimo kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas

KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El. paštas: info@sratc.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas

REGISTRUOTIS


ŠIAULIŲ REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS AUKŠTRAKIUOSE

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas pastatytas pagal ŠRATC-o įgyvendinamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". 9,4 milijono eurų vertės projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga (skirta 56% projekto lėšų), Lietuvos Respublikos Vyriausybė (22 %) ir ŠRATC-as (22 %). Pabios sąvartyno statyba kainavo 9,8 milijono litų.

Regioninį sąvartyną Aukštrakiuose statė Estijos bendrovė "Merko Ehitus" filialas Lietuvoje, su kuriuo sutartis buvo pasirašyta 2005 m. liepos 8 d. 2007 m. vasario 23 d. Valstybinė komisija Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną pripažino tinkamu naudoti, o 2007 m. balandžio 2 d. jį pradėtos velti atliekos.

Šiaulių regiono sąvartynas - tai pirmasis baigtas statyti toks modernus sąvartynas Lietuvoje iš statomų daiktų.

ES Atliekų sąvartynų direktyva reikalauja mažinti sąvartynų į aplinką skleidžiamą taršą. Uždarius visus senuosius aplinkosaugos reikalavimų nebeatitinkančius sąvartynus ir vietoj jų atidarius naują sąvartyną Aukštrakiuose - vieną visai apskrityje, sąvartynų į aplinką skleidžiamą taršą Šiaulių apskrityje maksimaliai sumažinta. Iš naujojo sąvartyno bet koks taršos pateikimas į paviršinius ar požeminius vandenis, dirvožemį, orą yra neįmanomas, todėl nėra žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Sąvartynas pastatytas vadovaujantis griežčiausiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos reikalavimais. Nors sąvartyno teritorijoje yra 11,5 - 14 metrų stono smėlingo priemolito grunto, kuriame neaptikta gruntinio vandens, grunto apsaugai nuo taršos užkrinti sąvartyno atliekų kaupimo dugnas sandarinamas naudojant sintetines medžiagas (geomembraną, geotekstilę). Sąvartyno dugno konstrukcija:

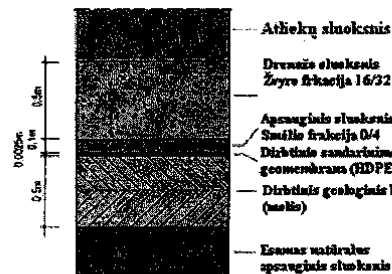

Sąvartyno atliekų kaupimo įrengta filtrato drenažo ir surinkimo sistema. Jame susidarantis filtratas surenkamas ir nukreipiamas į sandarų (dugnuo sandarinti panaudota geotekstilė, ultravioletiniams spinduliams atspari plėvelė) 4030 m³ talpos filtrato sukauptimo rezervuarą, iš kurio filtratas keliauja į atvirkštinio osmoso būdu veikiančius valymo įrenginius. Juose filtratas išvalomas taip, kad atitektų į paviršinio vandens telkinius išleidžiamoms išvalytoms nuotekoms aplinkos apsaugos įstatymuose nustatytus reikalavimus.


Įrenginių išvalytas vanduo naudojamas sąvartyno priešgaisriniam rezervuarui užpildyti bei ploviklyje. Tai leidžia šioms poreikiams nenaudoti vandens iš nulesto vandentiekio tinku.

Naujas regioninis sąvartynas aptvertas, todėl jame nebėra seniesiems sąvartynams būdingų pavojų bei kitų pašalinių besidarbujančių asmenų.

Uždaryto sąvartyno atliekų kaupimo aukštis preliminariai bus 20 m aukštesnė, o šiuo metu maždaug 18 m sudarys atliekos. Maksimalus šlaito nuolydis numatytas - 1:1,5, išvengiant rizikos dėl šlaito gruvimo ir paviršiaus sandarinimo pažeidimų.



TIKRA
Skyriaus vedėja



<http://www.sratc.lt/aukstrakai.php>

Aldona Čepelienė

2009-05-08

2009-05-28

Šiaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 2 of 2

Naujojo sąvartyno kaupo paviršius numatytas taip pat sandarus, su metano dujų surinkimo ir utilizavimo sistema.

Dabar pastatytos sąvartyno atliekų kaupo pirmosios sekcijos plotas - 4,17 ha, o talpa - 300 tūkstančių tonų atliekų. Iš viso bus 4 sekcijos (II sekcijos plotas - 2,7 ha, III sekcijos - 1,9 ha, IV sekcijos - 2,8 ha). Viso kaupo numatomas plotas - 11,5 ha, o talpa - 1,5 milijono tonų atliekų. Prognozuojama, kad toks sąvartynas atliekomis bus užpildytas per 15 metų.

Bendras sąvartyno teritorijos plotas - 21,22 ha, iš kurių 9,7 ha užima sąvartyno aptarnavimo teritorija. Joje yra automatizuotos autosvarstyklės, 550 m³ talpos priešgaisrinis vandens rezervuaras, dezinfekavimo duobė, plovykla, 4030 m³ talpos filtrato kaupimo rezervuaras, filtrato valymo įrenginiai, tarnybinis pastatas ir kiti statiniai. Aptarnavimo teritorijoje numatyta vieta ir atliekų rūšiavimo barui.

Nuotraukų galerija ...

Pagrindinis | Apie mus | Daliininkai | Paslaugos | Nuorodos | Aktualijos | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai

Visos teisės saugomos 2005 - 2006 VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras




TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepėlienė

2009-05-08




<http://www.sratc.lt/aukstrakiai.php>

2009.01.28

6.

Šiaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 1 of 4



ŠIAULIŲ REGIONO ATLIKŲ TVARKYMO CENTRO ĮGYVENDINAMI IR ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas:
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbtos sričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas


KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšio g. 8, LT- 76206 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El. paštas: info@sratc.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716


NAUJŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas
REGISTRUOTIS


Nuotraukų galerija

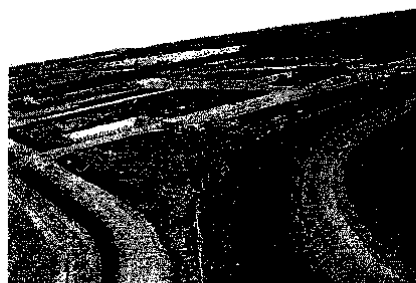

Iš paukščio skrydžio: sąvartyno aptarnavimo teritorija (9,7 ha), kurioje yra tarnybinis pastatas, autosavanstyklės, priešgaisrinis vandens rezervuaras, dezinfekavimo duobė, plovykla, filtrato kaupimo rezervuaras ir kiti statiniai.

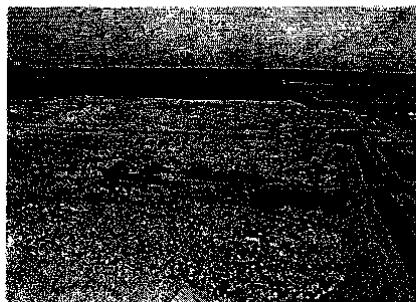

Iš paukščio skrydžio: sąvartyno atliekų kaupas.

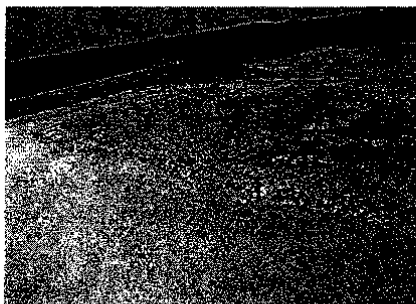

TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

KOPIJA TIKRA

Viešojo administravimo
inspektorė Rozanaitė



<http://www.sratc.lt/aufoto.php>

2009-05-08

7.

Šiaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 2 of 4



Pastatytos atliekų kaupimo pirmosios sekcijos plotas - 4,147 ha, o talpa - 300 tūkstančių tonų atliekų.



Filtrato kaupimo rezervuaro kaupimo talpa - 4030 m³.



Priešgaisriniame rezervuare saugoma 550 m³ vandens.




Į savarakių išvažiuojančių šukšlavežių ratams dezinfekuoti įrengta dezinfekavimo duobė



TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čaplajienė

2009-05-08




2009.01.28

<http://www.sratc.lt/aufoto.php>

p.

Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 3 of 4

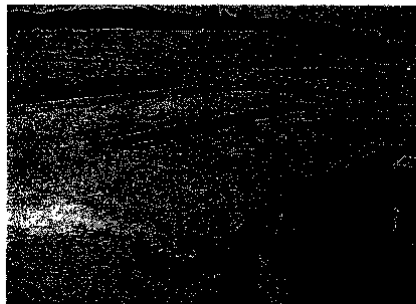

Savartyno technikai nuplauti įrengta plovykla, kurioje naudojamas filtrato valymo įrenginių išvalytas vanduo. Nešvarus vanduo iš plovyklos vėl nukreipiamas į valymo įrenginius.





Tarnybiniam pastate įrengtos patalpos biurui, persirengimo kambariai, valgomasis, salė, tualetai, patalpa atliekų priėmimo-svėrimo operatoriui.



Į savartyną įvažiuojantis atliekoms sverti įrengtos automatinės svarstyklės, sujungtos su kompiuterine duomenų baze ir internetiniu tinklu.

Savartyno statybos vaizdai



<http://www.sratc.lt/aufoto.php>

K O P I J A T I K R A
Būro administracijos
Šarūnė Ruzanaitė




2009-05-08

2009.01.28

9.


Šiaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 4 of 4

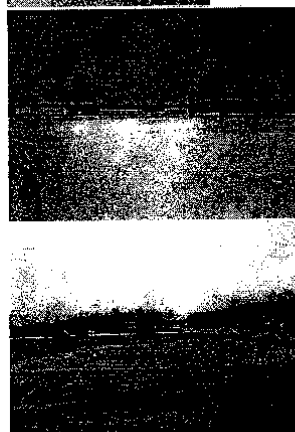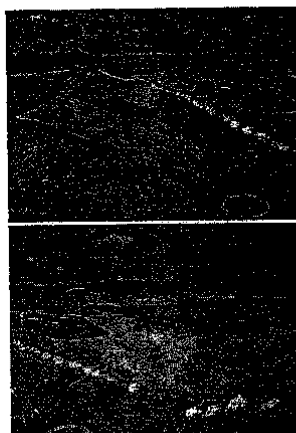

Pagrindinis | Apie mus | Dalininkai | Paslaugos | Nuotraukos | Aktualijos | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai

Visos teisės saugomos 2005 - 2009 m. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras



TIKRA
Skyriaus vadėja

Aldona Čepelėjienė

<http://www.srate.lt/aufoto.php>

2009-05-08

2009.01.28

10.

Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 1 of 4



**ŠIAULIŲ REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

PAIEŠKA PIRMŲ

APIE MŪS RINKLIARA ĮMONES VALDYMAS PASLAUGOS NUORODOS VISUOMENES SVIETIMAS AKTUALIOS KONTAKTAI

Pagrindinis | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai | Viešieji pirkimai

ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮGYVENDINAMI IR ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas;
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucijų pajėgumų stiprinimas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo aričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas

KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšo g. 8, LT- 76206 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El.paštas: info@srac.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJINIŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas

REGISTRUOTIS

BENDRO NAUDOJIMO KONTEINERINĖS AIKŠTELĖS

Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pagal 2005 m. gruodžio 15 d. su UAB "Šiaulių titanas" pasirašytą sutartį 2007 m. Šiaulių apskrityje baigtos įrengti 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės su 987 konteineriais jose. Šios aikštelės skirtos buitiniams atliekoms ir antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui, plastmasai) surinkti.

Bendro naudojimo konteinerinių aikštelių tinklas įrengtas vietoj uždarytų kaimo sąvartynų. Tai pagerins bendrą atliekų surinkimo tvarką ir estetinį vaizdą, paspartins atliekų išvežimo operaciją.

Aikštelės įrengtos miestų vietovėse (didesnio tankumo gyvenamosiose teritorijose ir padidinto žmonių susibūrimo vietose) bei didesnėse kaimo gyvenvietėse. Įrengtos dviejų tipų konteinerinės aikštelės:


- A tipo konteinerinėse aikštelėse pastatyti 3 po 1,1 m³ talpos skardiniai konteineriai. Šiaulių mieste, Joniškio, Radviliškio ir Šiaulių rajonuose įrengtos aikštelėse yra tik antrinėms žaliavoms surinkti skirti konteineriai, Akmenės, Kelmės ir Pakruojo rajonuose - tik mišrioms atliekoms.
- B tipo konteinerinėse aikštelėse pastatyti 6 po 1,1 m³ talpos skardiniai konteineriai. Jos įrengtos padidinto žmonių susibūrimo vietose. Šiaulių mieste, Joniškio ir Radviliškio rajonuose įrengtos aikštelėse yra tik antrinėms žaliavoms surinkti skirti konteineriai, Šiaulių rajone - 5 konteineriai antrinėms žaliavoms ir 1 konteineris mišrioms atliekoms, Akmenės, Kelmės ir Pakruojo rajonuose - 3 konteineriai antrinėms žaliavoms ir 3 konteineriai mišrioms atliekoms.

Kur kokius konteinerius statyti lėmė, kiek toje vietovėje iki tol buvo išplėta atliekų surinkimo sistema.

Bendro naudojimo konteinerinių aikštelių išdėstymas

Vietos Tipas	Šiaulių mieste	Šiaulių rajone	Radviliškio rajone	Pakruojo rajone	Kelmės rajone	Joniškio rajone	Akmenės rajone	IŠ VISŲ
A tipo (3/ 1,1 m ³)	65	12	26	10	15	15	22	165
B tipo (6/1,1 m ³)	33	6	13	5	7	7	11	82

Bendro naudojimo konteinerinėse aikštelėse pastatyti antrinėms žaliavoms surinkti skirti konteineriai perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamas atliekas iš bendro atliekų srauto leis atskirti jų susidarymo vietoje. Apie 90 procentų biutyje susidarantių atliekų, jas perdirbus, galima dar kartą panaudoti. Rūšiuojant atliekas bus ne tik prailgintas naujojo Šiaulių regiono sąvartyno eksploatacijos laikas, bet ir bus tausojami gamtos ištekliai ir energija, saugoma žvėri ir sveika aplinka.

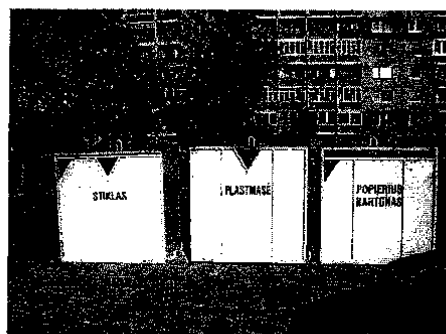

A tipo aikštelė Šiauliuose, Daugų g. 44


TIKRA
Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė
2009-05-08

KOPIJA TIKRA ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Biuro administratore
Šarūnė Rozanauskaitė


<http://www.srac.lt/ka.php>



AA

Šiaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 2 of 4

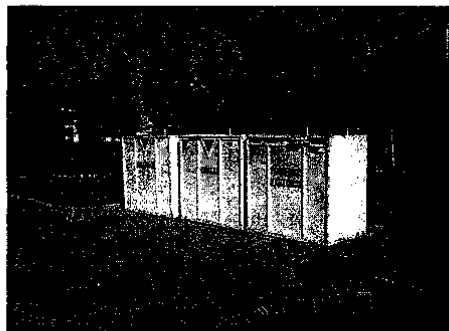

A tipo aikštelė Šiauliuose, Aido g. 25.



A tipo aikštelė Šiauliuose, Vytauto g. -18-50.




B tipo aikštelė Šiauliuose, Vytauto g. 58-60.


<http://www.sratc.lt/ka.php>

T I K R A

Škyniaus vedėja

Aigona Čepelienė

Biuro administratorė
Šarūnė Rožanaitė

2009-05-08

2009.01.28

19

Šiaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras


Page 3 of 4



A tipo aikštelė Šiauliuose, S. Salkauskio g. 5.



B tipo aikštelė Šiauliuose, Staties 9a.

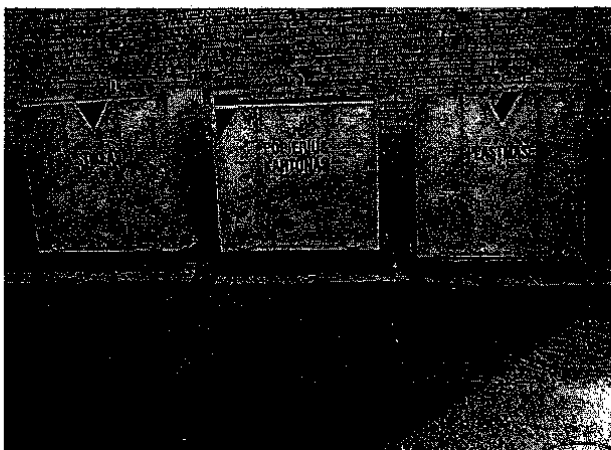

A tipo aikštelė Šiauliuose, Draugystės pr. 18.


Pagrindinis | Apie mus | Darbininkai | Paslaugos | Kontaktas | Aktualijos | Partneriai | Normatyviniai aktastrankiai



Savininkas vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08



2009.01.28


<http://www.sratc.lt/ka.php>

13.

Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 4 of 4

Visos teisės saugomos 2005 - 2006 VŲŠĮ Siaulių regiono atliekų tvarkymo centras

<http://www.sratc.lt/ka.php>T I K R A
Skyriaus vadėja

Aldona Čeplėdienė

2009-05-08

2009.01.28

14.

Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 1 of 1



**ŠIAULIŲ REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

PAIEŠKA

PIRMYN

APIE MŪS | KINKLIAVA | ĮMONĖS VALDYMAS | PASLAUGOS | NUORODOS | VISUOMENĖS SVIETIMAS | AKTUALIJOS | KONTAKTAI

Pagrindinis | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai | Viešieji pirkimai

**ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRO
ĮGYVENDINTI IR
ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI**

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas:
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucijų pajėgumų stiprinimas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas

KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšo g. 8, LT-76208 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El. paštas: info@srtc.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJIENŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas

REGISTRUOTIS


**PRIVAŽIAVIMO KELIO Į NAUJĄJĄ AUKŠTRAKIŲ SAVARTYNĄ I ETAPU II EILĖS
STATYBA**

Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pagal 2006 m. rugpjūčio 11 d. su UAB "Kamesta" pasirašytą sutartį 2008 m. gegužės 29 d. baigta privažiavimo kelio į naująjį Aukštrakių savartyną I etapo II eilės statyba.

Aukštrakių kaime pastatius Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartyną ir į jį pradėjus vežti komunalines atliekas iš visos apskritys, ušamas privažiavimo kelias nuo Šiaulių - Naujosios Akmenės plento nebeatitiko pakitusių sąlygų. Asfaltu buvo padengta tik 2,97 km šio kelio atkarpa, likusioji 2,05 km atkarpa tebuvo žvyruota. Pastaroji kelio atkarpa buvo ir per siaura suintensyvjusiam transporto eismui, deranti pavojingus labai staigius posūkius.


Kelio rekonstrukcijos metu kelias išplatinas iki 8 m (važiuojamosios dalies plotis - 6 m, kelkraščių plotis - 1m), pašalinę pavojingieji staigūs posūkiai, važiuojamoji kelio dalis padengta asfalto danga.

2004 m. rekonstruotoji privažiavimo kelio atkarpa dabar atitinka I kategorijos kelių nustatytus reikalavimus. Tai užtikrina visiškai saugias eismo sąlygas atliekas vežančiam sunkiasvoriam transportui.



Pagrindinis | Apie mus | Pirkimai | Paslaugos | Nuorodos | Aktualijos | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai

Viešųjų paslaugų saugomos 2008-05-06 vieš. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras



TIKRA
Skyriaus vedėja


Aldona Čepelajienė

2009-05-08

2009.01.28

<http://www.srtc.lt/kelias.php>

15.



ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮGYVENDINAMI IR ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas;
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucijų pajėgumų stiprinimas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas

KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšo g. 8, LT-76206 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El.paštas: info@srtc.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJINIŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas

REGISTRUOTIS

MAŽŪJŲ SAVARTYŲ/ŠIUKŠLYNŲ SUTVARKYMAS

Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pagal 2005 m. gruodžio 15 d. su UAB "Šiaulių dtanas" pasirašytą sutartį 2008 m. gegužės 29 d. baigta tvarkyti 116 mažųjų savartynų/šiukslynų.

2007 m. lapkričio 30 d. baigta tvarkyti 17 mažųjų savartynų/šiukslynų Joniškio rajone. Uždengti Aisių, Bikačių, Dargių, Darginių, Dvarelių, Gesdrių, Joniškio/Tublių, Kimaičių, Mileikių/Padirvonių, Pikiškių, Rengių, Spirakių, Stungių, Trumpančių, Žukančių savartynai. Išvežti Dūkšų ir Stungių savartynai.

2007 m. gruodžio 14 d. baigti tvarkyti 6 mažieji savartynai/šiukslynai Akmenės rajone. Uždengti Kainiškių, Kivilių, Kruopių, Lebelių, Triškių, Ventos savartynai.

2008 m. sausio 18 d. baigti tvarkyti 27 mažieji savartynai/šiukslynai Pakruojo rajone. Uždengti Beilevičėnės/Zeilevičėnės, Beržynės, Čelkių, Dirbių, Gačionių, Juškonų, Kazokų, Klovainių, Laipuškių, Lašmenpaniūšio-1, Lašmenpaniūšio-2, Linkuvos miesto senasis, Medikinių, Megužonių, Mikniūnų, Pamūšio, Pašvitinio, Pelaniškių, Plaučiškių, Putrių, Ramonaičių, Ručinių, Sodeiškių, Tremlinės, Ūdekų, Žurkių savartynai. Išvežtas Dučių savartynas.

2008 m. gegužės 13 d. baigta tvarkyti 15 mažųjų savartynų/šiukslynų Kelmės rajone. Uždengti Aunuvėnių, Gadų, Junkių, Karkienų, Klaurių, Liolių, Lykslio, Lupikų, Maudžionių, Pašlėnų, Svinių, Šaltenių, Šaukėnų, Vaiguvo, Žalpių/Orkių savartynai.

2008 m. gegužės 27 d. baigta tvarkyti 15 mažųjų savartynų/šiukslynų Šiaulių rajone. Uždengti Aukštėlės, Bubių (trys), Gruzdžių, Guragių, Kairių (du), Meškučių (du), Normančių, Raudėnų, Sauginių, Šakynos (du) savartynai.

2008 m. gegužės 29 d. baigti tvarkyti 36 mažieji savartynai/šiukslynai Radviliškio rajone. Uždengti Acokavų, Aikšniupių, Aukštelkų, Baisogalos, Baukų, Beinoravos, Butėnų, Daujočių, Diktariškių, Grinkiškio, Gujėnų, Kubiliūnų, Kunigiškių, Mankišio, Mankiškių, Minalių, Papušio, Pašušio, Pavartyčių, Pociūnėlių, Pociūnų, Poiekelės, Sidabravo/Pakiršinio, Skėnių, Šaukoto, Šiaulėnų, Šniūraičių - 2, Tyručių, Vadėkų, Vainiūnų, Vaitiekūnų, Valatkonų, Varnionių, Vėlekėmių, Veniškių savartynai.

Lietuva stojimo į Europos Sąjungą sąlygose įsipareigojo visus ES reikalavimų neatitinkančius savartynus uždaryti iki 2009 m. liepos 16 d.

Uždarydami mažieji kaimų savartynai neatitiko jokių šiandieninių aplinkosaugos reikalavimų. Juose nebuvo jokių inžinerinių įrenginių, nebuvo surankamas filtratas. Nors juose buvo šalinamos daugiausia buitinės atliekos, atliekų šalinimas juose nebuvo kontroliuojamas, nebuvo vedama šalinamųjų atliekų apskaita. Tai kėlė grėsmę aplinkai.

113 šių šiukslynų sutvarkyta naudojant uždengimo būdą ir 3 savartynai - naudojant išvežimo būdą.

Tvarkant uždengimo būdu, atliekos sustumtos į vieną plotą. Iš aplinkinių teritorijų surinktos vėjo išnešotos atliekos. Iš sustumtų į kriuvą atliekų suformuotas optimalios formos nuožulniais šlaitais kaupas. Jis sunkia technika, pajėgiančia sumažinti atliekų kaupą tūrį iki 3 kartų, sutankintas ir uždengtas mažiausiai 0,5 m stono grunto sluoksniu. Visa teritorija sutvarkyta bei užsėta žole, kad būtų išvengta erozijos ir būtų sukurtas patrauklus kraštovaizdis. Prie įvažiavimo į buvusius šiukslynus pastatyti atliekas pilti draudžiantys ženklai.

Tvarkant išvežimo būdu, visos atliekos iš šiukslyno išvežtos, o teritorija išplanuota ir užsėta žole. Prie buvusio įvažiavimo kelių taip pat pastatyti įspėjamieji ženklai, jog atliekas pilti draudžiama.

116 šiukslynų Šiaulių apskrityje uždarymas leido sustabdyti nekontroliuojamą atskratymą atliekomis, o jų sutvarkymas - sustabdyti šių šiukslynų į aplinką skleidžiamą taršą.


Dargių šiukslynas Joniškio rajone



TIKRA

Skyriaus vadėja

Aldona Ceplojienė



Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

<http://www.srtc.lt/116.php>

2009-05-08

2009.01.28

16.


Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 2 of 2



iki sutvarkymo ir po sutvarkymo

Gasčiūnų šiukšlynas Joniškio rajone



iki sutvarkymo ir po sutvarkymo

Sidabravo / Pakiršinio šiukšlynas Radviliškio rajone



iki sutvarkymo ir po sutvarkymo


Meškutių šiukšlynas Šiaulių rajone



iki sutvarkymo ir po sutvarkymo

Pagrindinis | Apie mus | Dalininkai | Paslaugos | Nuorodos | Aktualijos | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai


Visos teisės saugomos 2005 - 2006 VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras



<http://www.sratc.lt/116.php>


K R A
 Paklaus vedėja
 A. Iona Čepelienė

2009-05-08



KOPIJA
 Biuro administratore
 Šarūnė Rozena

2009.01.28



PAIEŠKA

PIRMYN

APIE MŪS

RINKLIAVA

ĮMONĖS VALDYMAS

PASLAUGOS

NUORODOS

VISUOMENĖS SVIETIMAS

AKTUALIJOS

KONTAKTAI

Pagrindinis

Mūsų partneriai

Normatyviniai aktai

Viešieji pirkimai

ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas:
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo priemonių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas

KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšo g. 8, LT-76206 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El. paštas: info@sratc.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJINIŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas

REGISTRUOTIS

KAIRIŲ SĄVARTYNO UŽDARYMO I-ASIS ETAPAS

Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pagal 2006 m. gegužės 4 d. su UAB "Šiaulių plantos" pasirašytą sutartį 2008 m. birželio 9 d. baigti Kairių sąvartyno uždarymo I-ojo etapo darbai.

Kaip ir numatyta valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, 2007 m. vasario 23 d. baigus statyti modernų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną Aukštakruose, Šiaulių apskrityje visai senieji komunalinių atliekų sąvartynai, tarp jų ir Šiaulių miesto senasis sąvartynas Kairiuose, uždarymi. Lietuva stojimo į Europos Sąjungą sąlygose įsipareigojo visus ES reikalavimų neatitinkančius sąvartynus uždaryti iki 2009 m. liepos 16 d.

Kairių sąvartynas, kuriame buvo šalinamos Šiaulių miesto ir dalies Šiaulių rajono atliekos, pradėtas eksploatuoti 1965 m. Tik nuo 1999 m. pradėta vesti šalinamų atliekų apskaita, todėl tikslių duomenų apie sąvartyne sukaupytų atliekų kiekį nėra. Manoma, kad jame galėtų būti sukaupta nuo 1,3 iki 1,6 milijono tonų atliekų.

Nuo 2003 metų sausio mėnesio Kairių sąvartyno eksploataciją perėmė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Jau 2006 metais buvo pradėti sąvartyno uždarymo darbai. 2007 m. balandžio 2 d. pradėjus eksploatuoti naująjį regiono sąvartyną Aukštakruose, atliekų šalinimas Kairių sąvartyne nutrauktas.

Per I-ąjį sąvartyno uždarymo etapą buvo perkeltas tranzitinis asfaltuotas kelias, įrengta filtrato surinkimo sistema su žiedine kaupo drena ir siurblinėmis. Siekiant išvengti ateiityje grūties rizikos, atliktas sąvartyno kaupo šlaitų lėkštinimas iki santykio 1:3. Gruntu uždengti sąvartyno kaupo apatinės dalies vakarinis, pietinis ir pietrytinis šlaitai. Laikinai pridengta viršutinio kaupo pietinė dalis.

Kairių sąvartyno uždarymas bei reikultivavimas bus tęsiamas ir toliau. II-ajame etape, kuris kaip manoma, užtruks ne trumpiau kaip 3 metus, bus įrengta biudujų surinkimo sistema. Bus baigti formuoti ir uždengti kaupo šiaurinis ir šiaurinis šlaitai, pakitina uždengta kaupo viršūnė. Kaupas bus reikultivuotas jį užsėjant žole. Taip pat bus pastatyti filtrato valymo įrenginiai bei suvairkti esami filtrato baseinai.


Ir pabaigus Kairių sąvartyno uždarymo ir reikultivavimo darbus bus tęsiamas aplinkos monitoringas - bus nuolat stebimas filtrato debitas ir sudėtis, paviršinio vanduo, dujų emisija.

Prie uždaryto Kairių sąvartyno planuojama pastatyti 800 kw pajėgumo elektros jėgainę, kuri elektros energijai gaminti naudotų sąvartyne susidarantį biudują.



TIKRA
Skaitymo vedėja

Aldona Čepelienė



2009-05-08

2009.01.28

<http://www.sratc.lt/kairiai.php>


17.



Karių sąvartynas 2008 m. balandį.



Sąvartyno kaupo apatinės dalies vakarinis, pietinis ir pietrytinis šlaitai jau už dengti, o kaupo viršutinė dalis laikinai pridengta.

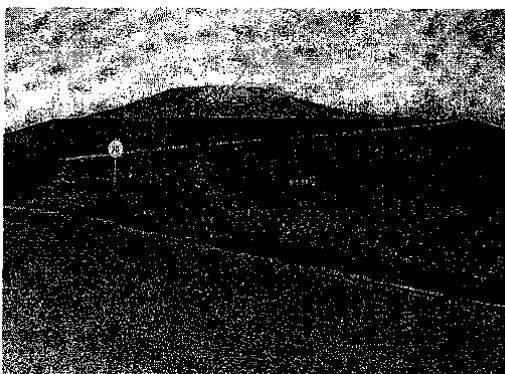


Sąvartyno kaupo pietinis šlaitas.



<http://www.sratc.lt/kairiai.php>

TIKRA
Skryniaus vedėja

Aldona Čepelienė



2009-05-08

2009.01.28

19

Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras


Page 3 of 5



Kaupo rytinis šlaitas.



Gruntu uždengta kaupo vakarinio šlaito apatinė dalis ir perkeltas tranzitinis kelias.

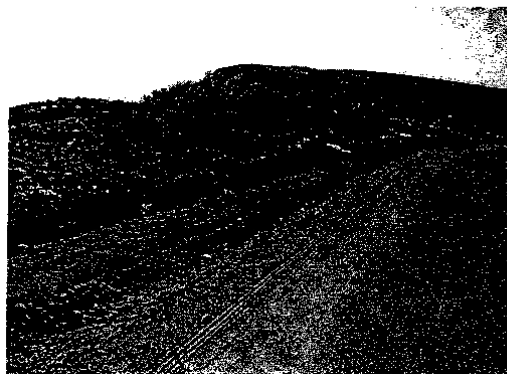


Kaupo šiaurinis šlaitas bus uždengtas antrajame etape.


<http://www.sratc.lt/kairiai.php>
TIKRA
 Skyriaus vadovė

Aldona Čepelėjanė

2009-05-08




2009.01.28

20

Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 4 of 5

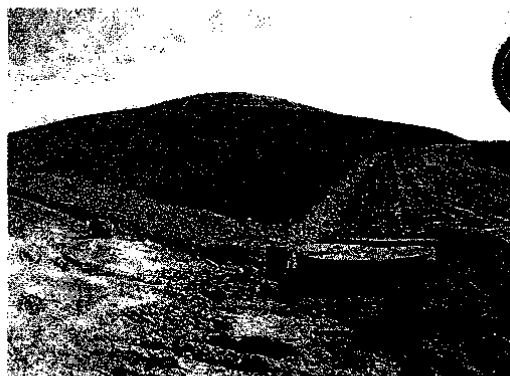


Kaupo pietinis slaitas.



Ant sąvartyno kaupo užvažiuojama iš pietų pusės.



Kaupo vakarinės dalies rytinis slaitas.

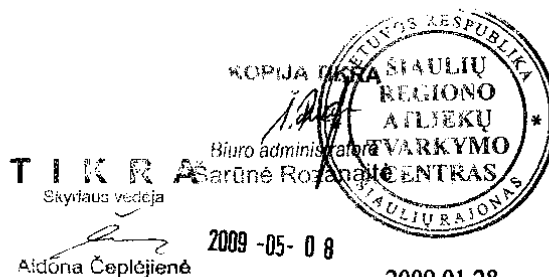
<http://www.sratc.lt/kairiai.php>


Aldona Čepelienė

2009.01.28

21



Kaupo viršutinės dalies rytinis slėitas.



Kaupo viršutinės pietinė dalis.



Likusi nesurinkta kaupo viršutinės šlaitinė dalis bus uždengta sąvartyno uždarymo antrajame etape.


Pagrindinis | Apie mus | Dalininkai | Paslaugos | Nuorodos | Aktualijos | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai

Visos teisės saugomos 2015 - 2016 VSI Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras



TIKRA
Skynaus vaizdas

Aldona Čoplašienė



<http://www.sratc.lt/kairiai.php>


2009-05-08

2009.01.28

11.

Šiaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 1 of 2



ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮGYVENDINTI IR ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

- Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas;
- Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas
- Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione
- Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas

KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
P. Lukšio g. 8, LT- 76206 Šiauliai,
Tel./faks. 520002
El.paštas: info@sratc.lt
Įmonės kodas 145787276
PVM mok. kodas LT457872716

NAUJINIŲ GAVIMAS

Jūsų elektroninis paštas

REGISTRUOTIS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS


Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įsigyta technikos atliekoms transportuoti ir tvarkyti.

2006 m. įsigyta:


- 29 tonas sveriantis atliekų tankintuvas atliekoms naujajame Šiaulių regiono sąvartyne susiegti.



- Daugiafunkcinis traktorius, smulkioms atliekoms perstumdyti bei sąvartyno teritorijai valyti.
- Šeši didžiakrūviai 30 m3 talpos konteineriai rūšiuotoms atliekoms po pirminio rūšiavimo iš rajonų atliekų priėmimo punktų išvežti.



- Sukvežimas su priekaba didžiakrūviams atliekų konteineriams gabenti, vienu metu galintis vežti 2 tokius konteinerius.



<http://www.sratc.lt/iranga.php>

Mobilus biodegraduojančių atliekų smulkintuvas, skirtas medžių šakoms, medienai, šienams, augalų likučių, smulkių, susmulkintų šiurkščių atliekų smulkinimui.

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

Biuro administratore
Šarūnė Rožanaitė

2009-05-08



23

Siaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras

Page 2 of 2

gaminti.

2007 m. įsigytas:

- Komposto vertytuvas.

2008 m. įsigytas:

- Ekskavatorius JCB grunto ir atliekų perdengimo darbams savartyne.

Pagrindinis | Apie mus | Dalininkai | Paslaugos | Nuorodos | Aktualijos | Kontaktai | Mūsų partneriai | Normatyviniai aktai


Visos teisės saugomos 2005 - 2006 VŠĮ Siaulių regiono atliekų tvarkymo centras



<http://www.sratc.lt/iranga.php>

T I K R A
Skynaus vedėja

Aldona Čepelienė



2009-05-08

2009.01.28

24.

Pranešimas žiniasklaidai

sanglaudos
fondas



Projektas bus baigtas įgyvendinti kitamet

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) įgyvendina projektą „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008), kurio bendra vertė - 32 463 225,60 Lt. 56 proc. lėšų (18 179 406,34 Lt) kaip negrąžintina paramą skyrė Europos Sąjunga iš Sanglaudos fondo. Bendrojo finansavimo dalis - 44 proc. (14 283 819,26 Lt), iš kurių 22 proc. yra Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos ir 22 proc. - ŠRATC lėšos.

Projekto tikslas - pastatyti naują regioninį savartyną Aukštakiuose (Šiaulių rj.), rekonstruoti privažiavimo kelią į Aukštakių savartyną, Šiaulių apskrityje įrengti 34 atliekų priėmimo punktus, 247 bendro naudojimo konteinerinių aikštelių, uždaryti ir sutvarkyti 116 mažųjų savartynų (šiukšlynų), Kairiuose (Šiaulių rj.) įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, uždaryti Šiaulių miesto senąjį savartyną Kairiuose, įsigyti atliekų tvarkymo įrangos.

Projekto įgyvendinimo terminas - 2001 m. gruodžio 21 d. - 2008 m. gruodžio 31 d. Per 2007-uosius metus apskrityje baigtos įrengti 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės, skirtos antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui, plastikui) surinkti. Iš esmės baigta privažiavimo kelio į Aukštakių savartyną rekonstrukcija (artimiausiu metu planuojama pasirašyti šių darbų priėmimo aktą). Buvo tęsiami Šiaulių miesto senojo savartyno Kairiuose uždarymo pirmo etapo darbai, mažųjų savartynų (šiukšlynų) uždarymo ir sutvarkymo darbai (Joniškio rajone jau baigti sutvarkyti visi 17 tokių savartynų, Akmenės rajone - 6 savartynai). Įsigyta atliekų tvarkymo įrangos (komposto vartytuvas). 2007-aisiais metais buvo baigta sudėtingiausia projekto dalis - Aukštakiuose baigtas statyti Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartynas - pirmas toks modernus savartynas Lietuvoje iš statomų dešimties. 2007 m. vasario 23 d. Valstybinė komisija savartyną pripažino tinkamu naudoti, o 2007 m. balandžio 2 d. į jį pradėtos vežti atliekos.

Uždarius Šiaulių apskrityje visus senuosius, šiandieninių aplinkosaugos reikalavimų nebeatitinkančius savartynus ir vietoj jų atidarius modernų griežčiausius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos reikalavimus atitinkantį savartyną Aukštakiuose - vieną visai apskričiai, savartynų į aplinką skleidžiama tarša Šiaulių apskrityje bus maksimaliai sumažinta. Taip Šiaulių apskrities gyventojams bus užtikrinta švaresnė ir saugesnė aplinka. Atliekų priėmimo punktai ir konteinerinės aikštelės padės sumažinti atliekų kiekius, patenkančius į savartyną, ir padidins atliekų kiekius, skirtus perdirbti. Tai padės tausoti gamtos išteklius, prailgins naujojo savartyno eksploatacijos laiką.

Įgyvendinus projektą „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Šiaulių regione bus dar labiau užtikrintas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas, jos visuotinumas, nepriklausomai nuo asmenų gyvenamosios vietos, pajamų ir paslaugos sąnaudų. Tai padės dar labiau mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus regione.

Zenonas Kučinskas
VšĮ ŠRATC viešųjų ryšių specialistas



TIKRA

Skyriaus vertėja

Aldona Čaplėdienė

KOPIJUOTI

Bilno informacijos skaidrė
Šarūnė Prošaitė

2009-05-08

Pranešimas žiniasklaidai išplatintas šiais adresais:

Ūkininko patarėjas <upbiuras@splus.lt>;
 Šiaulių televizija <zinios@stv.lt>;
 Šiaulių naujienos <snaujienos@takas.lt>;
 Šiauliai plus <šiauliaiplus@splus.lt>;
 Savaitė Šiauliuose <info@sava.lt>;
 Saulės radijas <info@saulesradijas.lt>;
 S plus <zinios@splus.lt>;
 Šiaulių kraštas <ruta@skrastas.lt>;
 @žinios <info@etazinios.lt>;
 www.InfoSiauliai.lt <aiste@infosiauliai.lt>;
 Respublika <sidasa@republika.net>;
 L.T. <iparafinavicius@lt24.lt>;
 Lietuvos televizija <redsle@lrt.lt>;
 Verslo žinios <marius.danazas@vzinios.lt>;
 LNK <siauliai@lnk.lt>;
 Lietuvos radijas <lnsiauliai@lrt.lt>;
 Lietuvos rytas <siupury@lrytas.lt>;
 Lietuvos žinios <zemulis@lzinios.lt>;
 BNS <verslas@bns.lt>;
 ELTA <verslas@elta.lt>;
 Vienybė <vienybe@akmene.net>;
 Joniškis <redakcija@laikrastisjoniskis.w3.lt>;
 Bičiulis <biciulis.kelme@mail.lt>;
 Auksinė varpa <auksinevarpa@takas.lt>;
 Radviliškio naujienos <radviliskionaujienos@yahoo.com>



TIKRA

Skyriaus vedėja

Aldona Čepelienė

2009-05-08

KODUJA TIKRA

Patvirtina: *[Signature]*
 Serija: P/2009/08

26.

Pranešimas žiniasklaidai

sanglaudos
fondas



Naujos investicijos į atliekų tvarkymo sistemą

Šiais metais VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras baigs įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008), kurio bendra vertė - 32 milijonai litų. 56 proc. lėšų (18 179 406,34 Lt) kaip negražintiną paramą skyrė Europos Sąjunga iš Sanglaudos fondo. Bendrojo finansavimo dalis - 44 proc. (14 283 819,26 Lt), iš kurių 22 proc. yra Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos ir 22 proc. - ŠRATC lėšos.

Pagal šį projektą jau pastatytas naujas regioninis nepavojingų atliekų savartynas Aukštrakiuose (Šiaulių rj.), pirmas toks modernus iš dešimties statomų Lietuvoje. Apskirtyje įrengti 34 atliekų priėmimo punktai, 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės, skirtos antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui, plastikui) surinkti. Kairiuose (Šiaulių rj.) – žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, įsigyta atliekų tvarkymo įrangos. Iš esmės baigta ir privažiavimo kelio į Aukštrakių savartyną rekonstrukcija. Dar šių metų pirmajame ketvirtyje bus baigti Šiaulių miesto senjojo savartyno Kairiuose uždarymo pirmojo etapo darbai. Tada kaip pagrindinis uždavinys telieka pabaigti sutvarkyti 116 mažųjų savartynų (šiukšlynų). Nors ir šiuose darbuose žymiai pasistūmėta, pavyzdžiui, visi tokie savartynai jau sutvarkyti Joniškio ir Akmenės rajonuose, nemažai darbų atlikta ir kituose rajonuose. Tačiau su šio projekto įgyvendinimu nesibaigia investicijos šiuolaikiškai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemai sukurti.

Pernai Europos Komisija pavirtino Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir šią strategiją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, pagal kurią numatyta teikti ES struktūrinę paramą. Kaip informavo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, pagal Sanglaudos fondo veiksmų programos uždavinį „Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Šiaulių regione planuojama finansuoti keletą projektų, kurių bendra vertė siekia 138 milijonus litų (projektų vertė dar tikslinama). Pagal šiuos projektus bus vykdomi Kairių savartyno uždarymo antrojo etapo, 13 rajoninių ir 56 kaimų savartynų uždarymo darbai, įrengtos 9 stambiagabaričių atliekų aikštelės ir 7 kompostavimo aikštelės, pastatyti mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiai, įrengta antrinių žaliavų rūšiavimo linija.

Įgyvendinus naujus projektus Šiaulių regione dar labiau pagerės viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas, bus užtikrintas jos visuotinumas; nepriklausomai nuo asmenų gyvenamosios vietos, pajamų ir paslaugos sąnaudų. Tai padės dar labiau mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus regione.

Zenonas Kučinskas
VšĮ ŠRATC viešųjų ryšių specialistas



U K R A
Atnešus vadėja
na Čepelėnė

U K R A TIKSIA
Elum a. Informatore
Santine 0122. 0122.

2009 -05- 0 8

27.

Pranešimas žiniasklaidai išplatintas šiais adresais:


Ūkininko patarėjas <upbiuras@splus.lt>;
 Šiaulių televizija <zinios@stv.lt>;
 Šiaulių naujienos <snaujienos@takas.lt>;
 Šiauliai plus <šiauliaiplus@splus.lt>;
 Savaitė Šiauliuose <info@sava.lt>;
 Saulės radijas <info@saulėsradijas.lt>;
 S plus <zinios@splus.lt>;
 Šiaulių kraštas <ruta@skrastas.lt>;
 @Zinios <info@etazinios.lt>;
 www.infošiauliai.lt <aiste@infosiauliai.lt>;
 Respublika <sidasa@respublika.net>;
 L.T. <parafinavicius@lt24.lt>;
 Lietuvos televizija <redse@lt.lt>;
 Verslo žinios <marius.danazas@vzinios.lt>;
 LNK <šiauliai@lnk.lt>;
 Lietuvos radijas <lnsiauliai@lrt.lt>;
 Lietuvos rytas <siuparys@lrytas.lt>;
 Lietuvos žinios <zemulis@lzinios.lt>;
 BNS <verslas@bns.lt>;
 ELTA <verslas@elta.lt>;
 Vienybė <vienybe@akmene.net>;
 Joniškis <redakcija@laikrastisjoniskis.w3.lt>;
 Bičiulis <bičialis.kelme@mail.lt>;
 Auksinė varpa <auksinėvarpa@takas.lt>;
 Radviliskio naujienos <radviliskionaujienos@yahoo.com>



TIKRA
 Skyriaus vedėja

Aldona Čepelėdienė

2009-05-08



29.

Pranešimas žiniasklaidai

sanglaudos
fondas

**Projektas baigtas, darbai tęsiasi**

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) baigė įgyvendinti vieną didžiausių Šiaulių apskrityje aplinkosaugos projektų - projektą „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008), kurio bendra vertė - 32 milijonai litų. 56 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų kaip negražintina parama skyrė Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 22 proc. lėšų buvo gauta iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir 22 proc. prisidėjo ŠRATC.

Sukurti regioninės sistemos pagrindai

Projektas įgyvendinti buvo pradėtas 2001 m. gruodžio 21 d. Per septynerius metus projekto lėšomis Šiaulių apskrityje sukurti vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pagrindai. Pastatytas griežčiausias aplinkosaugos reikalavimus atitinkantis regioninis nepavojingų atliekų savartynas Aukštakiuose - pirmas toks modernus Lietuvoje. Rekonstruotas privažiavimo kelias į savartyną. Siekiant, kad į naująjį savartyną kuo mažiau pakliūtų perdirtbti tinkamų atliekų, visoje apskrityje įrengti 34 atliekų priėmimo punktai, skirti rūšiuotoms 10 frakcijų atliekoms surinkti. Taip pat visoje apskrityje įrengtos 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės, skirtos antrinėms žaliavoms (popieriui, plastikui, stiklui) surinkti. Prie senojo Šiaulių miesto savartyno Kairiuose įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, kurioje pagamintas kompostas naudojamas uždarytam Kairių savartymui rekultivuoti. Įsigyta atliekų tvarkymo įrangos (atliekų tankintuvas, bioskaidžių atliekų smulkintuvas, komposto vartytuvas, ekskavatorius, daugiafunkcinis traktorius ir kt.). Atlikti Kairių savartyno uždarymo pirmojo etapo darbai. Sutvarkyti 116 mažųjų kaimo savartynų (šiukšlynų), kurie kėlė grėsmę aplinkai, nes juose nebuvo jokių inžinerinių įrenginių, nebuvo surenkamas filtratas, atliekų šalinimas vyko nekontroliuojamai.


Aplinka bus švaresnė

Dabar netinkamos perdirtbti komunalinės atliekos iš visos Šiaulių apskrities vežamos tik į naująjį Aukštakių savartyną. Iš šio savartyno taršos patekimas į aplinką yra neįmanomas. Savartyno atliekų kaupimo dugnui sandarinti panaudotos sintetinės medžiagos. Įrengta filtrato surinkimo sistema. Atvirkstinio osmoso būdu veikiančios filtrato valymo įrenginiai išleidžiamajame vandenyje palieka tik vandens molekules. Tokį vandenį galima išleisti į aplinką nedarant jai žalos.

Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pagrindų sukūrimas sudarė sąlygas Šiaulių apskrčiai pirmajai iš šalies apskričių įsivesti rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava - privaloma visiems komunalinių atliekų turėtojams. Dabar kiekvienas atliekų turėtojas aprūpinamas konteineriais atliekoms šalinti. Jiems nebeliko tikslo vežti atliekas į mišką. Taip apskrities visuomenei užtikrinama švari ir sveika aplinka.

Plėtra nesustoja

Nors projektas „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ baigtas įgyvendinti, sistemos plėtra nesustoja. Sudarius sąlygas surinkti visas komunalines atliekas ŠRATC-o pagrindinis siekis yra surinkti kuo daugiau perdirtbti tinkamų atliekų, kad savartyne būtų šalinamos tik tos, kurių šiuo metu negalima perdirbti. Tam ir bus nukreipta didžioji dalis investicijų antrajame regioninės



T I K R A
Skyriaus vedėja

KOPUJA TIKRA

Glav. administr. atstovė

2009-05-08 Sarūnė Rozenaitė
Aldona Čepelienė


29

Igyvendinus projektą „Šiaulių regione atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Šiaulių regione bus dar labiau užtikrintas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas, jos visuotinumas, nepriklausomai nuo asmenų gyvenamosios vietos, pajamų ir paslaugos sąnaudų. Tai padės dar labiau mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus regione.

30.

Pranešimas žiniasklaidai išplatintas šiais adresais:


BNS <verslas@bns.lt>;
 ELTA <verslas@elta.lt>;
 Radviliškio naujienos <info@radviliskionaujienos.lt>;
 Auksinė varpa <auksinevarpa@takas.lt>;
 Bičiulis <biciulis.kelme@mail.lt>;
 Joniškis <redakcija@laikrastisjoniskis.w3.lt>;
 Vienybė <vienybe@akmene.net>;
 Ūkininko patarėjas <opbiuras@splus.lt>;
 www.infošiauliai.lt <redakcija@infosiauliai.lt>;
 Šiaulių televizija <zinios@stv.lt>;
 Šiaulių naujienos <snaujienos@takas.lt>;
 Saulės radijas <info@saulėsradijas.lt>;
 S plus <zinios@splus.lt>;
 Šiaulių kraštas <ruta@skraštas.lt>;
 radijas RS2 <info@rs2.lt>;
 Šiauliai plus <jurate.sobutiene@splus.lt>;
 @žinios <info@etazinios.lt>;
 Šiaurės kryptis <redakcija@skryptis.info>;
 Respublika <sidasa@respublika.net>;
 Lietuvos televizija <redsle@lrt.lt>;
 Verslo žinios <marius.danazas@vzinios.lt>;
 LNK <siauliai@lnk.lt>;
 Lietuvos radijas <ltusiauliai@lrt.lt>;
 Lietuvos rytas <siuparys@lrytas.lt>;
 Lietuvos žinios <alvydasj@lzinios.lt>



TIKRA
 Skyriaus vadova

Aldona Čepelėienė

2009-05-08





ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

„NEBŪKIME ABEJINGI APLINKAI“

Regimantas Vėgelė
Viešosios įstaigos „Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo centras“ direktorius



Prieš šešerius metus iškylus būtinybei sukurti šiuolaikinę regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos reikalavimus, septynios Šiaulių apskrities savivaldybės įsteigė viešąją įstaigą Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą. Veiklai koordinuoti sukurtos pelno nesiekiančios įstaigos funkcijos yra regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas, rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

Sąvartynas Aukštrakiuose

Šiandien Šiauliai – vienintelė Lietuvoje apskritys, kurioje visi – ir fiziniai, ir juridiniai asmenys – moka rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Paskaičiuota, kad jei Lietuvoje atliekų niekas nesurinktų ir netvarkytų, mūsų šalis būtų padengta 10–15 cm atliekų sluoksniu. Atliekose gausu kenksmingų, žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų, kurios atliekas išmetant kur papuola, patenka į aplinką, o iš jos per vandenį, į orą ir į žmogaus organizmą. Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą, įsipareigojo sukurti tokią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų šiuolaikinius standartus. Todėl kai po 2001-iais parengtos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros galimybių studijos buvo įkurta viešoji įstaiga, prasidėjo projektinių darbų įgyvendinimas.

2007-ieji metai centrui reikšmingi tuo, kad praktiškai baigtas pirmasis sistemos sukūrimo etapas. Praėjusiais metais Aukštrakiuose baigtas statyti regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas. Tai pirmasis modernus sąvartynas iš vienuolikos statomų Lietuvoje. Nuo praėjusių metų balandžio jį pradėtos vežti atliekos. Iš naujojo sąvartyno bet koks taršos patekimas į paviršinius, požeminius vandenis ar dirvožemį bei orą yra neįmanomas. Jis įrengtas ant 11,5 – 14 m storio smėlingo priemolio grunto, dugno izoliacijai nuo taršos panaudotos sintetinės medžiagos, įrengta filtrato surinkimo sistema. Atvirkštinio osmoso būdu veikiantys filtrato valymo įrenginiai išleidžiamajame vandenyje palieka tik vandens molekules. Tokį vandenį galima išleisti į aplinką nedarant jai žalos, tačiau vanduo panaudojamas savo poreikiams – priešgaisriniam vandens rezervuarui užpildyti, autoplovykloje, sąvartyno technikai plauti.

Be sąvartyno, apskrityje pagal projektą įrengti 34 atliekų priėmimo punktai stiklui, popieriui, plastikui, metalui, naudotoms padangoms, medienos, statybos, biologiskai skaidžioms ir didžiosioms atliekoms iš gyventojų surinkti, sukurtas 247 bendro naudojimo kontenerinių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, tinklas, atliekamų Šiaulių miesto senosios sąvartyno Kairiuose uždarymo darbai, šalia jo pastatyta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Joje pagamintas kompos-

tas naudojamas Kairių sąvartynui reiklėti, taip atpiginant darbus. Visi senieji sąvartynai Šiaulių regione jau uždaryti – šiemet bus baigta sutvarkyti 116 mažųjų sąvartynų-šiukšlynų, buvusių aplinkos taršos židiniais. Teritorija bus pritaikyta rekreacijai.

Lietuvoje vis dar šlubuoja atliekų surinkimas. Žmonės atliekų tvarkymo sąskaita stengiasi taupyti, linkę vertiau teršti miškus, pakrūmes nei sudaryti sutartis dėl atliekų išvežimo. Pernai Šiaulių apskrityje įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – privaloma visiems. Žmonėms neliko tikslu vežti atliekas į mišką, kiekvienas atliekų turėtojas aprūpinamas konteneriais, taip užtikrinama švari ir saugi aplinka.

Ateities darbai

Nors atliekų tvarkymo srityje Lietuvai iki Vakarų Europos dar toli – visuomenė atliekas mažai rūšiuoja, todėl daug atliekų patenka į sąvartyną, mažai perdirbama. Sprendžiant šią problemą, jau pernai pradėti antrojo etapo, truksiančio iki 2013 m., parengiamieji darbai. Antrajame etape įmonė tikisi sulaukti ne mažiau kaip 138 mln. litų investicijų, kurių daugumą sudarys Europos Sąjungos parama iš Sanglaudos fondo.

Skyriaus vedėja

2009-05-08


32

„Sėkmes metei“

APŽVALGA ŠIAULIŲ APSKRITIS



Visuotinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą visiems užtikrina tvarkingą ir švarią aplinką.

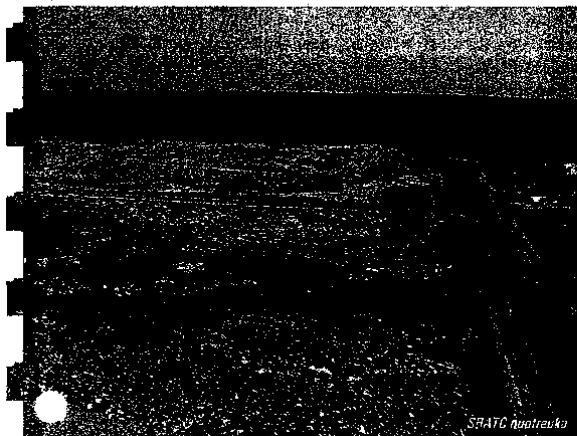

I naująjį Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną Aukštakiuose atliekos pradėtos vežti 2007 metų balandžio 2 dieną.

Toliau bus vykdomi Kairių sąvartyno reikultivavimo darbai, bus reikultivuoti uždarytieji 13 rajoninių ir 56 kaimo sąvartynai, visoje apskrityje bus įrengta 14 stambiagabaričių atliekų surinkimo ir 8 kompostavimo aikštelės. Aukštakių sąvartyną numatoma pastatyti atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius ir antrinių žaliavų rūšiavimo liniją.



Naujame sąvartynė atvirkštinio osmoso būdu veikiančios filtrato valymo įrenginiai išleidžiamajame vandenyje palieka tik vandens molekules. Toks vanduo aplinkai jokios žalos nedaro.

„Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ sėkmė – savivaldybių noras rasti teisingą sprendimą ir bendrą kalbą apskrityje kuriant vieningą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Kaip funkcionuos kuriama sistema – priklauso ir nuo kiekvieno piliečio sąmoningumo. Iškelę tikslą – tai, ką priešukšliname, patys ir sutvarkykime, nes sąlygos tam sudarytos, įmonės darbuotojai daug ką nuveikė visuomenės švietimo srityje. Šviečiant visuomenę stengiamasi pirmiausia skatinti žmogų mąstyti, ką jis daro išmesdamas atliekas, kur papuola, kad tai kenkia jo paties sveikatai. Žadinant žmonių sąmoningumą, siekiama apsaugoti aplinką nuo taršos ir išsaugoti ją šviesa ateinančioms kartoms. Jau pastebimas visuomenės susidomėjimas atliekų tvarkymu, rūšiuoti, išskirti atliekas ateityje gyventi tvarkingoje aplinkoje.

LIETUVOS RESPUBLIKA
ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
2009-05-08
Biuro administracijos informacija
Šarūnė Rožanaitė
Skyriaus vedėja

33.

ANALIZAVIMAS

Šiauliai Region Leading in Waste Management

After joining European Union Lithuania undertook to establish the utility waste management system in compliance with modern European standards. Therefore, in 2002 seven municipalities of Šiauliai Region established the public enterprise "Šiauliai region waste management centre" (ŠRATC). Functions of this enterprise include development and operation of the regional utility waste treatment system, administration of utility waste fee collection and handling.

Dump in Aukštakiai

The year of 2007 was significant for the centre as then the first stage of the system establishment was completed: the construction of the regional nonhazardous waste dump, the first one among eleven dumps being built in Lithuania, was over in Aukštakiai and waste bringing here was started. „Any contamination of surface-water, underwater or soil and air from the dump is impossible. The dump is built on the clayey soil - thickness 11,5 - 14 m, synthetic material was used for insulation of underneath contamination, and the filtrate collection system was installed", said Regimantas Vėgelė, Director of the public enterprise ŠRATC.

Besides the dump, there were 34 waste-acceptance points equipped in the region for collection of glass, paper, plastic, metal, used tires, wood, building waste, biologically dis-

soluble and gross waste from inhabitants. The chain of 247 container grounds of common consumption intended for salvage, closedown of the old dump of Šiauliai City in Kairiai was started and the ground of green waste digesting was built nearby. The compost comprised here is used for recultivation of the Kairiai dump what results in cheaper works. The closing and recultivation works of 116 dumps in the countryside are in the final stage. 25 mln Lt of funds from EU and the Government of the Republic of Lithuania will be spend within 5 years.

General levy – for public

Implementing the principle „a polluter pays“, in 2007 the local levy for utility waste collection and handling in Šiauliai region was introduced – is compulsory for everybody. Each consumer is supplied with containers; also a safe and clean environment is secured. The functioning of the established system de-

pends on consciousness of every citizen. The enterprise staffs have their objective to handle with their own waste, therefore they arrange public information campaigns encouraging people to save their environment.


Future works

In 2007 the preparation works of the second stage scheduled till 2013 were started. Recultivation and closure works of Kairiai, 14 district and 44 rural dumps-dustholes shall be continued, it is planned to equip 4 grounds of gross waste collection and 6 digesting points in the entire district. In Aukštakiai dump, mechanical-biological processing equipment and secondary waste sorting line are planning.


The enterprise expectations within the second stage are related to getting at least 65 million litas of investments the major share of which will be support of European Union and 13 million litas of own funds.



In the new nonhazardous waste dump in Aukštakiai started in April 2007.

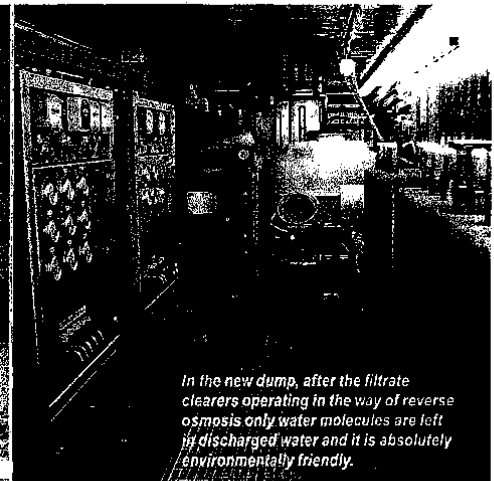

In the new dump, after the filtrate clearers operating in the way of reverse osmosis only water molecules are left in discharged water and it is absolutely environmentally friendly.



TIKRA

Skyriaus vadovas

Aldona Čepelienė

2009-05-08

Biuro administratore
Šarūnė Rožinskaitė

KOPIJA TIKRA

ŠIAULIŲ REGIONO

ATLIETŲ

TVARKYMO

CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKA

53

34.
