



VERTINIMO ATASKAITA

**LIETUVOS EKONOMIKOS
GAIVINIMO IR ATSPARUMO
DIDINIMO PLANO RODIKLIŲ
PASIEKIMO RIZIKŲ
VALDYMAS**

2024 m. gruodžio 20 d.

Nr. VRE-6

Vertinimą atliko: Emilija Jasaitienė (departamento vadovė), Augustė Purlienė (grupės vadovė), Ernesta Sakalauskienė, Arūnas Juozas Gabrielavičius, Justyna Sabinienė.

Vertinimo ataskaita pateikta: Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Energetikos ministerijai, Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

TURINYS

TURINYS	3
PAGRINDINIAI FAKTAI	4
SANTRAUKA	5
ĮŽANGA	8
VERTINIMO REZULTATAI	10
1. DĖL 6 NEPASIEKTŲ RODIKLIŲ 9 MĖN. VĒLUOJAMA PATEIKTI 477,5 MLN. EUR MOKĖJIMO PRAŠYMĄ.....	10
2. SUDARYTOS SUTARTYS DĖL 93 PROC. INVESTICIJŲ, TAČIAU JŲ ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOS NESIEKIA 30 PROC. PLANO	13
3. MINISTERIJOS IMASI VEIKSMŲ RIZIKOMS VALDYTI, TAČIAU PASIEKTA RODIKLIŲ BŪKLĖ RODO, KAD PLANUOTI POKYČIAI BUS ĮVYKDYTI NE VISA APIMTIMI	17
3.1. 12 iš 45 vertintų rodiklių nebus pasiekti planuota apimtimi	18
3.1.1. Taikytos rizikos valdymo priemonės nepadėjo pasiekti reformos „Judame neteršdami aplinkos“ tikslų (6 rodikliai)	18
3.1.2. Nepavykus rodiklių pasiekti visa apimtimi, deramasi su Europos Komisija dėl rodiklių tikslinimo (6 rodikliai)	21
3.2. 2 iš 45 vertintų rodiklių nebus pasiekti laiku, tačiau tikėtina, kad galutiniai priemonių tikslai bus įgyvendinti	24
3.3. 17 iš 45 vertintų rodiklių pasiekimo eiga rodo rizikas plano įgyvendinimui laiku ar visa apimtimi	25
3.3.1. Rizikingi sveikatos priežiūros sistemos investiciniai rodikliai (3 rodikliai)	25
3.3.2. Rizikingi rodikliai, susiję su misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimu (2 rodikliai)	27
3.3.3. Rizikingi rodikliai, susiję su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų didinimu (5 rodikliai)	28
3.3.4. Kiti rizikingi rodikliai (7 rodikliai)	30
PRIEDAI	34

PAGRINDINIAI FAKTAI

3 849,2 mln. Eur

finansinis įnašas skirtas Lietuvai pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. 2 297,5 mln. Eur sudaro negrąžintina parama, 1 551,7 mln. Eur – paskola.

218 rodiklių

turi būti pasiekta iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendinant nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. 198 rodikliai susiję su negrąžintina parama, 20 – su paskola.

66 proc.

nacionalinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo laiko praėjo iki 2024 m. lapkričio 30 d.

1 819,4 mln. Eur

arba 47 proc. Lietuvai skirto finansinio įnašo gauta, iš jų: 862,6 mln. Eur negrąžintinos paramos už pasiektus 57 rodiklius, 698,2 mln. Eur paskolos – už 9 rodiklių pasiekimą, likusi suma – avansas.

17 rodiklių

iš 98 (kurie turėjo būti pasiekti iki 2024 m. III ketv.) pasiekimas atsiliko iki 18 mėn. nuo orientacinių terminų, nustatytų nacionaliniame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane.

477,5 mln. Eur

vertės negrąžintinos paramos daliai nepateiktas mokėjimo prašymas dėl vėluojamų pasiekti 6 rodiklių.

~ 74 proc.

Lietuvai skirto finansavimo vertės investicijų reikės įgyvendinti per likusį 34 proc. nacionalinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo laikotarpį.

12 rodiklių

iš vertintų 45 nebus pasiekti planuota apimtimi.

19 rodiklių

iš vertintų 45 – rizikingi, nes gali būti nepasiekti laiku arba pasiekti ne visa planuota apimtimi.

SANTRAUKA

Vertinimo svarba

Lietuvai skirta 3 849,2 mln. Eur (5,37 proc. šalies BVP) ES paramos nacionalinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ priemonėms įgyvendinti. 2 297,5 mln. Eur šios paramos sudaro negrąžintina parama, 1 551,7 mln. Eur – paskola. Lietuva, siekdama gauti finansinę paramą, įsipareigojo iki 2026-08-31 pagal nustatytą orientacinį tvarkaraštį pasiekti 218 rodiklių: 198 – negrąžintinai paramai ir 20 – paskolai gauti. 49 proc. visų rodiklių numatyta pasiekti plano įgyvendinimo pabaigoje – 2025–2026 m.

Plane numatytų priemonių įgyvendinimas turėtų prisidėti prie reikšmingų šalies pokyčių, susijusių su švietimu, sveikata, žaliaja pertvarka, skaitmenizacija, inovacijomis ir mokslu, viešojo sektoriaus pertvarka ir socialine apsauga. Laiku nepasiekus rodiklių arba pasiekus ne visa suplanuota apimtimi, Lietuva gali gauti ne visą jai skirtą finansinį įnašą, be kurio kiltų rizika neįgyvendinti šaliai svarbių reformų ir investicijų.

Vertinimo tikslas ir apimtis

Vertinimo tikslas – įvertinti pažangą įgyvendinant Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir rizikas, siekiant vėliausio plano laikotarpio rodiklių.

Pagrindinės vertinimo kryptys:

- ✓ plano įgyvendinimo pažanga;
- ✓ vėliausio plano laikotarpio – 2025–2026 m. – rodiklių pasiekimo užtikrinimas.

Vertinamieji subjektai: Finansų ministerija – plano „Naujos kartos Lietuva“ vadovaujančioji institucija, Energetikos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – atsakingos už 75 proc. vėliausio plano laikotarpio rodiklių pasiekimą.

Vertinamas laikotarpis: nuo plano patvirtinimo 2021-07-28 iki 2024-09-30. Siekdami įvertinti pokyčius, naudojome ir vėlesnių laikotarpių gautus duomenis.

Vertinimo apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Vertinimo apimtis ir metodai“ (35 psl.).

Pagrindiniai vertinimo rezultatai

Dėl laiku nepasiektų rodiklių ir nepateiktų mokėjimo prašymų, vėluojama įgyvendinti planą. Per likusį 34 proc. plano įgyvendinimo laiką reikės atlikti investicijų, kurių vertė

sudaro ne mažiau kaip 2 848 mln. Eur arba 74 proc. Lietuvai skirto plano finansavimo. Neįgyvendinus plano visa apimtimi, rizikuojama nepasiekti nacionalinių tikslų.

Dėl 6 nepasiektų rodiklių 9 mėn. vėluojama pateikti 477,5 mln. Eur mokėjimo prašymą

Praėjus 66 proc. plano įgyvendinimo laiko, pasiekti 92 iš 218 arba 42 proc. rodiklių. Atsižvelgiant į plane nustatytus orientacinius terminus, iki 2024-09-30 vėlavo 17 iš 98 rodiklių pasiekimas. Dėl 6 iki šiol nepasiektų rodiklių vėluojama pateikti mokėjimo prašymą trečiai 477,5 mln. Eur vertės negrąžintinos paramos daliai gauti. 4 rodikliai susiję su mokesčių pakeitimais, kurie svarstomi Seime nuo 2023 m. birželio mėn., 1 rodiklis susijęs su nebaigta kurti vieno langelio principu veikiančia mokymosi visą gyvenimą informacine sistema, dar vienas – su priimtais ne visais teisės aktais dėl ilgalaikių strateginių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų naudojimo. Mokėjimo prašymas antrai 221,8 mln. Eur vertės negrąžintinos paramos daliai gauti pateiktas 2024-09-16, vėluojant 9 mėn., tačiau anksčiau, nei planuota, pateiktas mokėjimo prašymas antrai 310,3 mln. Eur vertės paskolos daliai gauti, todėl iš viso iki 2024-09-30 pateikta mokėjimo prašymų 167,2 mln. Eur mažesnei sumai, nei planuota (1 skyrius, 10 psl.).

Sudarytos sutartys dėl 93 proc. investicijų, tačiau jų įgyvendinimo išlaidos nesiekia 30 proc. plano

Investicijos, siekiant plano rodiklių, auga, tačiau atsilieka nuo suplanuotų terminų:

- ✓ Paskelbta kvietimų 99 proc., sudaryta projektų sutarčių 88 proc., projektų vykdytojams išmokėta 24 proc. šaliai skirtos negrąžintinos paramos. Dėl laiku nepasiektų rodiklių ir dėl to vėluojamų pateikti mokėjimo prašymų, Lietuva gavo 419,9 mln. Eur arba 28 proc. mažiau negrąžintinos paramos, nei planuota. Projektų vykdytojams pervesta 51 proc. gautos paramos arba 66 proc. mažiau, nei planuota iki 2024-12-31. Išmokėjimai projektų vykdytojams rodo investicijų įgyvendinimo intensyvumą, nes pinigai išmokami už patirtas išlaidas arba kaip avansiniai mokėjimai.
- ✓ Visai paskolos sumai sudaryti finansavimo susitarimai su Nacionaline plėtros įstaiga, Vyriausybės nutarimu padidintas jos įstatinis kapitalas ir įstaigai pervesta 30 proc. šaliai skirtos paskolos. Gauta 1,6 karto didesnė paskolos suma, nei planuota, ir Nacionalinei plėtros įstaigai išmokėta 96 proc. išlaidų plano, tačiau faktiškai patirtos išlaidos rodikliams pasiekti sudarė 45 proc. išmokėtos sumos (2 skyrius, 13 psl.).

Ministerijos imasi veiksmų rizikoms valdyti, tačiau pasiekta rodiklių būklė rodo, kad planuoti pokyčiai bus įvykdyti ne visa apimtimi

Planuota apimtimi nebus pasiekti 12 iš 45 vertintų rodiklių, susijusių su netaršių transporto priemonių įsigijimu, viešų ir privačių įkrovimo prieigų įrengimu, startuolių ekosistemos plėtros skatinimu, mokslo ir verslo skatinimu dalyvauti tarptautinėse mokslo ir inovacijų programose, centralizuotų viešųjų pirkimų gerinimu ir užimtumo rėmimo

priemonių didinimu, orientuojantis į aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, skaitmeninę ir žaliąją transformaciją. Nepasiekus rodiklių visa apimtimi, deramasi su Europos Komisija dėl rodiklių tikslinimo, siūlant alternatyvius rodiklių pasiekimo būdus arba mažinant siektinas reikšmes. Sumažinus planuotas apimtis, gali tekti ieškoti kitų priemonių nacionaliniams tikslams pasiekti, nes plano rodikliai ir jiems suplanuota finansinė parama prisideda siekiant Nacionalinio pažangos plano tikslų (3.1 poskyris, 18 psl.).

Priemonių, susijusių su individualių elektros energijos kaupimo įrenginių montavimu ir netaršių viešojo transporto priemonių įsigijimu, 2 tarpiniai rodikliai nebus pasiekti suplanuotu laiku, nors galutinius siektinus rodiklius planuojama pasiekti laiku (3.2 poskyris, 24 psl.).

17 iš 45 vertintų rodiklių pasiekimo eiga rodo rizikas, kad planas nebus įgyvendintas laiku ir (arba) visa apimtimi. Rodikliai susiję: su pažangios terapijos centro sukūrimu ir sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimu, misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimu, elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų didinimu, jūrinių vėjo elektrinių plėtros ir infrastruktūros įrengimo darbais, elektroninės kelių rinkliavos sistemos įdiegimu, elektrinių autobusų surinkimu ir modifikavimu, biometano dujų gamybos įrenginių statyba, lietuvių kalbos išteklių, reikalingų kuriant dirbtinio intelekto sprendimus, kūrimo ir kolegijų pertvarkos projektų įgyvendinimu (3.3 poskyris, 25 psl.).

12 iš 45 vertintų rodiklių nebus pasiekti planuota apimtimi, nes įgyvendinamos priemonės nesulaukė pakankamo kiekio tinkamų paraiškų, o pasiūlytos atnaujintos finansavimo sąlygos nepaskatino jomis naudotis. 19 iš 45 vertintų rodiklių vėluojama pasiekti dėl pernelyg optimistinių terminų, kurie nustatyti neįvertinus su plano įgyvendinimo pradžia pradėtos diegti naujos strateginio planavimo sistemos, prie kurios pereiti reikėjo laiko, todėl ilgiau, nei planuota, truko plėtros programų ir pažangos priemonių aprašų rengimas. Užsitęsęs šioms veikloms, vėlavo kitų pradžia. Taip pat ilgiau, nei planuota, truko projektų finansavimo sąlygų ir projekto įgyvendinimo planų parengimas, derinant šiuos dokumentus su kitomis įstaigomis ir institucijomis. Rodikliams, susijusiems su statyba ir rekonstrukcija, suplanuotas per trumpas laikas, ypač tais atvejais, kai reikia parengti techninį projektą. Pagrindinės ministerijų rizikų valdymo priemonės: projektų finansavimo sąlygų tikslinimas, skatinant naudotis siūlomomis priemonėmis ir pratęsiant įgyvendinimo terminus; papildomo finansavimo paieška; derėjimasis su Europos Komisija dėl rodiklių apimčių, turinio ir terminų tikslinimo (3 skyrius, 17 psl.).

ĮŽANGA

Siekiant sušvelninti ekonominį ir socialinį COVID-19 pandemijos poveikį ir užtikrinti, kad Europos ekonomika ir visuomenė taptų tvaresnės, atsparesnės ir geriau pasirengusios pereiti prie žaliosios pertvarkos ir skaitmeninės transformacijos, 2021 m. vasario mėn. Europos Parlamentas ir ES Taryba nustatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę¹.

Minėtos priemonės lėšomis finansuojamos reformos ir investicijos, kurias valstybės narės įsipareigojo įgyvendinti iki 2026-08-31. Reformos ir investicijos turi būti suplanuotos prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, jos turi derėti su nacionaliniuose planavimo dokumentuose nustatytais tikslais, taip pat turi būti atsižvelgta į konkrečiai šaliai 2019 ir 2020 m. teiktas ES Tarybos rekomendacijas.

Norėdama pasinaudoti šios priemonės parama, Lietuva parengė ir Europos Komisijai pateikė planą „Naujos kartos Lietuva“², kurį Europos Komisija įvertino³ ir ES Taryba patvirtino⁴. Atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją, kai dėl karo Ukrainoje padidėjo poreikis panaikinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro, į 2022 m. patirtą didelę infliaciją, pagal reglamentą⁵ sumažintą negrąžintinos paramos dalį, taip pat siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą, planas patikslintas ir papildytas naujomis priemonėmis. Be to, 1 625,2 mln. Eur arba 73 proc. padidintas finansavimas,⁶ kurio 95,5 proc. sudaro paskola.

Iš viso Lietuvai skirta 3 849,2 mln. Eur finansinė parama (2 297,5 mln. Eur negrąžintina parama ir 1 551,7 mln. Eur paskola)⁷. Šiai paramai gauti Lietuva turi pasiekti 218 rodiklių: 198 – negrąžintinos paramos ir 20 – paskolos⁸. Rodiklių siekiama įgyvendinant šaliai svarbias reformas ir investicijas pagal 8 komponentus, susijusius su žaliąja pertvarka, skaitmenine transformacija, švietimu, sveikata, inovacijomis ir mokslu, socialine apsauga, viešojo sektoriaus pertvarka ir „REPowerEU“. Plane nustatyti rodikliai papildomi kitiems įgyvendinant numatytas reformas ir investicijas. Siekiant laiku jį įgyvendinti ir gauti visą šaliai skirtą paramą, plane nustatyti orientaciniai rodiklių pasiekimo terminai.

¹ Europos Parlamento ir ES Tarybos 2021-02-12 reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė.

² Europos Komisijos 2021-05-15 spaudos pranešimas: [Lietuva pateikė ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą](#) (žiūrėta 2024-10-30).

³ Europos Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano analizė“, pridamas prie ES Tarybos sprendimo dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, 2021-07-02 SWD(2021) 187 *final*.

⁴ ES Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, 2021-07-20 Nr. 20477/21.

⁵ Europos Parlamento ir ES Tarybos 2021-02-12 reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, 11 str. 1 d. b) p. ir 12 str. 3 d.


⁶ ES Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2021-07-28 įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, 2023-11-08 Nr. 14637/23.

⁷ Ten pat, 1 str.

⁸ Priedas prie ES Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2021-07-28 įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, 2023-10-27 Nr. 14637/23.

Rodikliai suskirstyti į 12 paramos dalių: 8 negražintinos paramos ir 4 paskolos⁹. Visas paramos dalies finansavimas išmokamas pasiekus visus jai priskirtus rodiklius. Mokėjimo prašymų sumokėti atitinkamas paramos dalis orientacinis tvarkaraštis nustatytas veiklos susitarime su Europos Komisija¹⁰ (1 pav.). Pateikus mokėjimo prašymą, Europos Komisija įvertina, ar deklaruojami rodikliai pasiekti tinkamai, ir priima sprendimą dėl pinigų išmokėjimo¹¹.

1 pav. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo grafikas

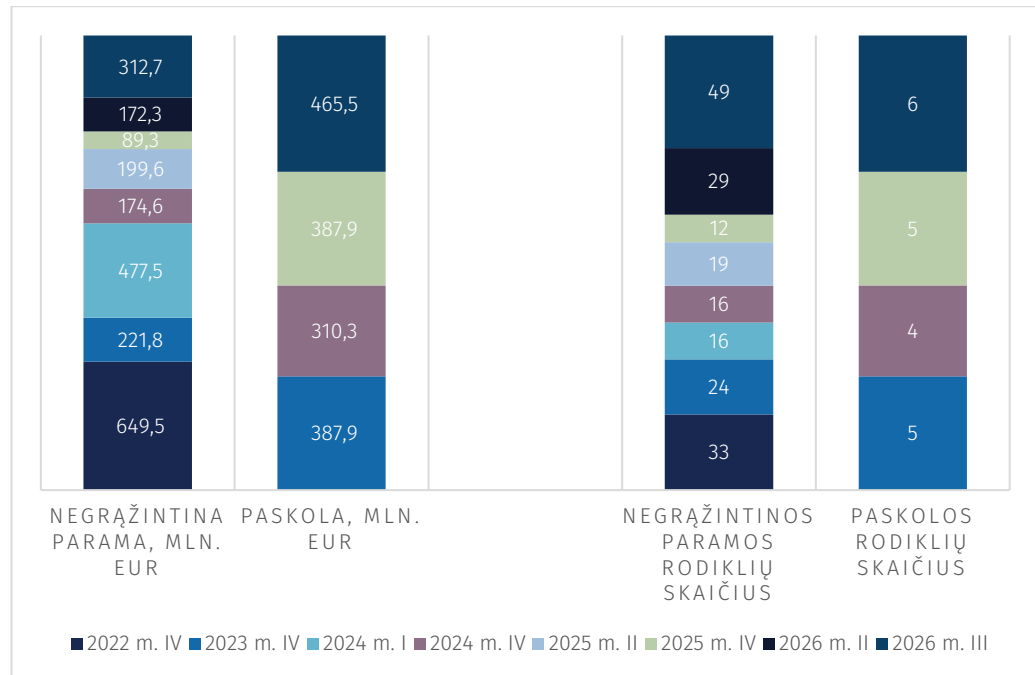

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir veiklos susitarimo su EK duomenis

Vadovaujantis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentu¹² ir siekiant užtikrinti plano įgyvendinimo kontrolę, kaip numatyta ES Tarybos sprendime¹³, sukurta plano valdymo ir kontrolės sistema¹⁴. Plano įgyvendinimo kontrolės funkcijos pavestos vadovaujančiajai institucijai (FM) ir administruojančiajai institucijai – CPVA, plano audito funkcijos – FM¹⁵. Už rodiklių pasiekimą atsakingos ministerijos ir jų kontroliuojamos įstaigos¹⁶.

⁹ Ten pat, 2 skirsnis.

¹⁰ Europos Komisijos 2022-05-05 įgyvendinimo sprendimu patvirtintas Europos Komisijos ir Lietuvos veiklos susitarimas pagal Reglamentą (ES) 2021/241, 3 d. (patikslintas 2024-01-17).

¹¹ Europos Parlamento ir ES Tarybos 2021-02-12 reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, 24 str.

¹² Europos Parlamento ir ES Tarybos 2021-02-12 reglamentas (ES) 2021/241, 22 str. 1 d.

¹³ ES Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, 2021-07-20 Nr. 20477/21, priedo 3 sk.

¹⁴ Vyriausybės 2020-11-25 nutarimu Nr. 1322 patvirtintos Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės.

¹⁵ Vyriausybės 2020-11-25 nutarimas Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“, 5.2 p.

¹⁶ Europos Komisijos 2022-05-05 įgyvendinimo sprendimu patvirtintas Europos Komisijos ir Lietuvos veiklos susitarimas pagal Reglamentą (ES) 2021/241, 1 priedas (patikslintas 2024-01-17).

VERTINIMO REZULTATAI

1. DĖL 6 NEPASIEKTŲ RODIKLIŲ 9 MĖN. VĒLUOJAMA PATEIKTI 477,5 MLN. EUR MOKĖJIMO PRAŠYMĄ

1. Pagal Planą, iki 2024-12-31 turėtų būti pasiekta 51 proc. iš 218 rodiklių. 2024-11-26, praėjus 66 proc. Plano įgyvendinimo laiko, pasiekti 42 proc. rodiklių. Iki 2024-09-30 buvo numatyta pasiekti 45 proc. rodiklių, faktiškai pasiekta 38 proc., 17 rodiklių nebuvo pasiekti (1 lentelė, 3 priedas).

1 lentelė. Rodiklių pasiekimo statistika

Rodiklių pasiekimo būklė	Iš viso	Negrąžintinai paramai gauti	Paskolai gauti
2024-09-30			
Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą turėjo būti pasiekta	98	89	9
Pasiekti rodikliai	81*	72	9
<i>Pateiktas mokėjimo prašymas EK atsiskaitant už rodiklių pasiekimą</i>	66	57	9
<i>Nepateiktas mokėjimo prašymas EK atsiskaitant už rodiklių pasiekimą</i>	15	15	0
Nepasiekti rodikliai	17	17	0
2024-11-26			
Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą turėtų būti pasiekta iki 2024-12-31	112	102	10
Pasiekti rodikliai	91**	81	10
<i>Pateiktas mokėjimo prašymas EK atsiskaitant už rodiklių pasiekimą</i>	66	57	9
<i>Nepateiktas mokėjimo prašymas EK atsiskaitant už rodiklių pasiekimą</i>	25	24	1
Nepasiekti rodikliai	21	21	0

* Iki 2024-09-30 pasiekti 83 rodikliai. 81 rodiklio numatyti orientaciniai pasiekimo terminai – iki 2024-09-30, 2 rodiklių negrąžintinai paramai gauti terminas – 2024-12-31.

** Iki 2024-11-26 pasiekti 92 rodikliai. 91 rodiklio numatyti orientaciniai pasiekimo terminai – iki 2024-12-31, 1 rodiklio paskolai gauti terminas – 2025-03-31.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos pateiktus duomenis

2. Dėl 6 nepasiektų rodiklių vėluojama pateikti mokėjimo prašymą trečiai 477,5 mln. Eur vertės negrąžintinos paramos daliai (2 ir 3 lentelės). 4 rodikliai susiję su mokesčių pakeitimais. Atitinkami teisės aktų projektai 2023-06-21 pateikti svarstyti Seimui¹⁷, tačiau iki šiol jie nebuvo patvirtinti visa apimtimi. Be to, svarstomų teisės aktų pakeitimų turinys gali būti nepakankamas rodiklių pasiekimui visa apimtimi, nes EK įvertino su rodikliu

¹⁷ Vyriausybės 2024-06-21 nutarimai Nr. 463 ir 464.

Nr. 143 susijusį rodiklį Nr. 142¹⁸, pasiektą iš dalies, ir pritaikė 8,7 mln. Eur finansinę korekciją¹⁹. Taip pat nepasiektas rodiklis, susijęs su nebaigta kurti vieno langelio principu veikiančia mokymosi visą gyvenimą informacinė sistema, dar vienas – su priimtais ne visais teisės aktais, kurie turėtų nustatyti sąlygas ir nuostatas dėl ilgalaikių strateginių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų naudojimo.

2 lentelė. Rodikliai, kurie nepasiekti iki 2024-09-30 pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus orientacinius terminus

Pasiekimo terminas Plane*	Paramos dalis** ir mokėjimo prašymo pateikimo terminas	Rodiklių Nr. ir pavadinimai	Atsakinga ministerija
2023 m. I ketv.	III 2024 m. I ketv.	Nr. 108 „Pradėjusi veikti vieno langelio principu veikianči mokymosi visą gyvenimą informacinė sistema“. Investicinis rodiklis.	ŠMSM
		Nr. 143 „Įsigalioję mokesčių teisės aktų pakeitimai dėl mokesčių lengvatų ir specialių apmokestinimo režimų atsisakymo“.	FM
		Nr. 145 „Įsigalioję akcizų ir aplinkosauginių mokesčių bei turto mokesčių teisės aktų pakeitimai“.	FM
		Nr. 147 „Įsigalioję teisės aktų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai, numatant jų taikymą ne anksčiau kaip 2024 m.“.***	FM
		Nr. 183 „Įsigaliojęs Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo padidinama nedarbo socialinio draudimo sistemos aprėptis“.	FM
2023 m. IV ketv.	III 2024 m. I ketv.	Nr. 153 „Įsigaliojęs teisės aktų paketas, įtvirtinantis sąlygas ir nuostatas dėl ilgalaikių strateginių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų naudojimo“.	FM
2024 m. I ketv.	IV 2024 m. IV ketv.	Nr. 15 „Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimą“.	SAM
		Nr. 124 „Aukštųjų mokyklų įgyvendintų tarptautinimo projektų skaičius“, siektina reikšmė – 5. Investicinis rodiklis. 2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.	ŠMSM
		Nr. 181 „Įsigalioję atitinkamų minimalių pajamų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai“.	SADM
2024 II ketv.	IV 2024 m. IV ketv.	Nr. 79 „Pradėtos taikyti skaitmeninės mokymosi priemonės“, siektina reikšmė – 1704. Investicinis rodiklis. 2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.	ŠMSM
		Nr. 104 „Pedagogų, įgijusių IT mokytojo kvalifikaciją arba IT magistro laipsnį, skaičius“, siektina reikšmė – 500. Investicinis rodiklis. 2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.	ŠMSM
		Nr. 148 „Įsigaliojęs vidutinės trukmės biudžeto sudarymo metodika, bazinių išlaidų apskaičiavimo metodika ir Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai, susiję su valstybės biudžeto tikslinimu“.	FM
		Nr. 81 „Įsigaliojęs sutartys dėl finansinių paskatų kurti verslą ir skaitmenines inovacijas“, siektina reikšmė – 184. Investicinis rodiklis.	EIM
2024 m. III ketv.	IV 2024 m. IV ketv.	Nr. 139 „Strateginės gairės ir mokymo modulis“. Investicinis rodiklis. 2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.	VRM
		Nr. 149 „Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas, kuriuo pritariama pirmajam detaliam laikotarpiu nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. vidutinės trukmės biudžeto projektui“. 2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.	FM
		Nr. 159 „1–12 klasių mokinių, kuriems išduoti elektroniniai mokinio pažymėjimai su mokėjimo funkcija, skaičius“, siektina reikšmė – 90 000. 2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.	FM
		Nr. 160 „Bendrojo ugdymo įstaigų (pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų), kuriose įdiegta arba atnaujinta	FM

¹⁸ Rodiklis Nr. 142 „Seimui pateikti išsamios analizės pagrindu parengti pasiūlymai dėl mokesčių lengvatų ar specialių apmokestinimo režimų atsisakymo“.

¹⁹ EK 2024-05-06 įgyvendinimo sprendimas Nr. C(2024) 3171 dėl negrąžintinos paramos pirmosios dalies sumos sumažinimo Lietuvai.

Pasiekimo terminas Plane*	Paramos dalis** ir mokėjimo prašymo pateikimo terminas	Rodiklių Nr. ir pavadinimai	Atsakinga ministerija
		mokėjimo negrynaisiais pinigais infrastruktūra, skaičius", siektina reikšmė – 240. 2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.	

* Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas su patvirtintais pakeitimais nuo 2024-09-30.

** Visi nepasiekti rodikliai yra negrąžintinos paramos.

*** 2024-09-30 patikslinus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, rodiklio terminas iš 2022 m. IV ketv. nukeltas į 2023 m. I ketv., rodiklis perkeltas iš II į III paramos dalį.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK duomenis, Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos pateiktus duomenis

3. Iki 2024-09-30 EK pateikti mokėjimo prašymai 1 569,6 mln. Eur arba 90 proc. planuotos sumos (1 736,7 mln. Eur), bet anksčiau, nei planuota, pateiktas mokėjimo prašymas antrai 310,3 mln. Eur paskolos daliai gauti (3 lentelė).

3 lentelė. Atsiskaitymo už pasiektus rodiklius plano ir fakto palyginimas iki 2024-11-30

Paramos dalis	Pateikimo Europos Komisijai orientacinis terminas	Rodiklių skaičius		Paramos vertė neatskaičius avanso, mln. Eur		Pateiktas Europos Komisijai	Rodiklių skaičius	Paramos vertė neatskaičius avanso, mln. Eur
		Iki 2024-09-30 pakeitimo	Po 2024-09-30 pakeitimo	Iki 2024-09-30 pakeitimo	Po 2024-09-30 pakeitimo			
		PLANAS				FAKTAS		
Negrąžintina parama								
I	2022 m. IV	33	33	649,5	649,5	2022 m. IV	33	649,5
II	2023 m. IV	19	24	221,8	221,8	2024 m. III	24	221,8
III	2024 m. I	20	16	452,5	477,5	Nepateiktas		
IV	2024 m. IV	17	16	199,6	174,6	Terminas nesuėjo		
	Iš viso:	89	89	1523,4	1523,4	Iš viso:	57	871,4
Paskola								
I	2023 m. IV	5	5	387,9	387,9	2023 m. IV	5	387,9
II	2024 m. IV	4	4	310,3	310,3	2024 m. III	4	310,3
	Iš viso:	9	9	698,2	698,2	Iš viso:	9	698,2
	Iš viso parama:	98	98	2221,6	2221,6	Iš viso parama:	66	1569,6

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, veiklos susitarimą su EK ir viešai prieinamą oficialią informaciją Europos Komisijos tinklalapyje

4. Mokėjimo prašymas pirmai negrąžintinos paramos daliai gauti pateiktas laiku, nes 2023-11-08 pakeistas Planas²⁰ ir atitinkamai 2024-01-17 patikslintas veiklos susitarimas su EK, nukeliant mokėjimo prašymo terminą iš 2022 m. III ketv. į 2022 m. IV ketv. Mokėjimo prašymas antrai negrąžintinai paramos daliai gauti pateiktas 2024-09-16, vėluojant 9 mėn. Siekdama pateikti šį mokėjimo prašymą, Finansų ministerija 2024-07-25 pateikė siūlymą EK keisti Planą, nukeliant rodiklio Nr. 147 „Įsigalioję teisės aktų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai, numatant jų taikymą ne anksčiau kaip 2024 m.“ terminą iš 2022 m. IV ketv. į 2023 m. I ketv. Termino nukėlimas grįstas siekiu mažinti administracinę našta ir nustatyti vienodą terminą visiems su mokesčių reforma

²⁰ ES Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2021-07-28 įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, 2023-11-08 Nr. 14637/23.

susijusiems rodikliams. Taip pat pasiūlyta pakeisti rodiklių paskirstymą paramos dalims, perkeliant rodiklį Nr. 147 iš antros į trečią negražintinos paramos dalį, taip pat į antrą paramos dalį perkelti 6 rodiklius²¹ iš vėlesnių dalių. EK pritarė pasiūlymams 2024-09-17²² ir ES Taryba pakeitimus patvirtino 2024-09-30²³.

2. SUDARYTOS SUTARTYS DĖL 93 PROC. INVESTICIJŲ, TAČIAU JŲ ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOS NESIEKIA 30 PROC. PLANO

5. Investicijos, siekiant Plano rodiklių, auga, tačiau atsilieka nuo suplanuotų terminų. Iki 2024 m. lapkričio mėn. pabaigos paskelbta kvietimų 99 proc. ir sudaryta projektų sutarčių 88 proc. skirto negražintinos paramos finansavimo, projektų vykdytojams išmokėta 24 proc. Su Nacionaline plėtros įstaiga sudaryti finansavimo susitarimai²⁴ ir Vyriausybės nutarimu²⁵ padidintas jos įstatinis kapitalas visai paskolos sumai, pervesta 30 proc. paskolos (4 lentelė).

4 lentelė. Iki 2024-11-30 paskelbti kvietimai, sudarytos sutartys, išmokėti pinigai projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai

	Negražintina parama		Paskola	
	mln. Eur	proc.	mln. Eur	proc.
Skirta Lietuvai	2 297,6	-	1 551,7	-
Paskelbta kvietimų	2 273,5	99,0	-	-
Sudaryta sutarčių su projektų vykdytojais arba Nacionaline plėtros įstaiga	2 017,7	87,8	1 551,7*	100
Išmokėjimai projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai	542,8	23,6	458,9	29,6

* 150 mln. Eur skirta Vyriausybės 2024-05-29 nutarimu Nr. 420 Nacionalinės plėtros įstaigos įstatiniam kapitalui didinti.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Centrinės projektų valdymo agentūros projektų registro ir VBAMS duomenis

6. Išmokėjimai projektų vykdytojams rodo investicijų įgyvendinimo intensyvumą, nes pinigai išmokami už patirtas išlaidas arba kaip avansiniai mokėjimai. Negražintinos paramos išmokėjimo lygis reikšmingai atsilieka nuo planuotų išlaidų, pateiktų EK prieš tvirtinant ir tikslinant Planą. Iki 2023-12-31 planuota patirti 976,6 mln. Eur, o iki 2024-12-31 – 1 606,5 mln. Eur išlaidų. VBAMS duomenimis, iki 2023-12-31 projektų vykdytojams išmokėta

²¹ Nr. 60a, 69, 106, 151, 156 – iš trečios negražintinos paramos dalies, Nr. 68 – iš ketvirtos negražintinos paramos dalies.

²² EK 2024-09-17 pasiūlymas Nr. COM(2024) 421 *final* dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2021-07-28 įgyvendinimo sprendimas (ES) (ST 10477/21 INIT; ST 10477/21 ADD 1) dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.

²³ Tarybos 2024-09-30 įgyvendinimo sprendimas (ST 13498 2024 INIT; ST 13498 2024 ADD 1), kuriuo iš dalies keičiamas 2021-07-28 įgyvendinimo sprendimas (ES) dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.

²⁴ 2024-04-26 susitarimas Nr. 5 „Dėl 2020-12-30 fondų fondo „Inovacijų skatinimo fondas“ steigimo ir finansavimo sutarties pakeitimo“, 2023-12-27 susitarimas Nr. 7, 2024-03-29 susitarimas Nr. 8 ir 2024-06-26 susitarimas Nr. 9 „Dėl 2015-02-18 Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, steigimo ir finansavimo sutarties Nr. 1S-12/2015/19-10/8-5 pakeitimo“.

²⁵ Vyriausybės 2024-05-29 nutarimas Nr. 420 „Dėl valstybės turto investavimo ir uždarnosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įstatinio kapitalo didinimo“.

246,4 mln. Eur arba 25 proc. išlaidų plano, o iki 2024-11-30 – 542,8 mln. Eur arba 34 proc. 2024-12-31 išlaidų plano (2 pav.).

7. Valstybės biudžete kasmet planuojamos mažesnės negrąžintinos paramos išlaidos, nei pateiktos EK prieš tvirtinant ir tikslinant Planą. Be to, kasmet išlaidų planas neįvykdomas: 2022 m. – 23,1 proc., 2023 m. – 39,1 proc. (5 lentelė).

5 lentelė. Valstybės biudžete planuojamos negrąžintinos paramos išlaidos, jų įvykdymas ir palyginimas su EK pateiktu išlaidų planu 2021–2024 m.

Metai	Valstybės biudžete				EK pateiktas išlaidų planas (kaupiamasis**), mln. Eur	Skirtumas (5–6)	
	Planuojamos išlaidos, mln. Eur	Patirtos išlaidos, mln. Eur	Išlaidų plano vykdymas, proc.	Planuojamos išlaidos (kaupiamasis*), mln. Eur		mln. Eur	proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	149,3	0,0	0,0	149,3	112,0	37,3	33
2022	227,0	52,3	23,1	227,0	434,5	-207,4	-48
2023	496,6	194,0	39,1	548,9	976,6	-427,7	-44
2024	606,6	296,4	48,9	852,9	1 606,5	-735,5	-47

* Einamųjų metų išlaidų planas, pridėdant ankstesnių metų patirtas išlaidas.


** Einamųjų ir ankstesnių metų išlaidų planų suma.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal VBAMS duomenis ir Europos Komisijai pateiktą išlaidų planą

8. Per visą Plano įgyvendinimo laikotarpį gauta 1 060,7 mln. Eur arba 72 proc. 2024-12-31 planuotos gauti negrąžintinos paramos. Negauta suma sudaro 420,0 mln. Eur. Vėluoja 2024 m. plano įvykdymas, nes iki 2023-12-31 gauta 97 proc. planuotų negrąžintinos paramos finansinių įnašų (2 pav.). Negauti 3 proc. arba 23,6 mln. Eur dėl ne visa apimtimi pasiektų rodiklių, susijusių su mokesčių pakeitimu²⁶.
9. Nors 2024 m. negrąžintinos paramos finansinių įnašų gauta mažiau, nei planuota, tačiau dėl vėluojančio investicijų įgyvendinimo, projektų vykdytojams pervesta 51 proc. gautų pinigų, o tai sudaro tik 34 proc. planuotų išlaidų (2 pav.).

²⁶ EK 2023-04-28 įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2023) 2956 sustabdyti 22,3 mln. Eur (26,2 mln. Eur neatskaičius išankstinių mokėjimų) dėl dviejų ne visa apimtimi pasiektų rodiklių (Nr. 142 ir Nr. 144), susijusių su mokesčių pakeitimu. Lietuvai pateikus papildomus įrodymus, 14,9 mln. Eur šios sumos (17,5 mln. Eur neatskaičius išankstinių mokėjimų) buvo išmokėta 2024 m. Dėl likusios 8,7 mln. Eur sumos (neatskaičius išankstinių mokėjimų) EK 2024-05-06 priėmė įgyvendinimo sprendimą Nr. C(2024) 3171, kuriuo sumažintas finansavimas dėl netinkamai pasiekto rodiklio (Nr. 142), susijusio su mokesčių lengvatomis. Lietuva dėl neišmokėtos 8,7 mln. Eur sumos 2024-07-16 pateikė ieškinį ES Bendrajam Teismui „Dėl dalinio negrąžintinos paramos dalies išmokėjimo sustabdymo“.

2 pav. Negrąžintinos paramos pinigų gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu projektų vykdytojams 2021–2026 m., mln. Eur*

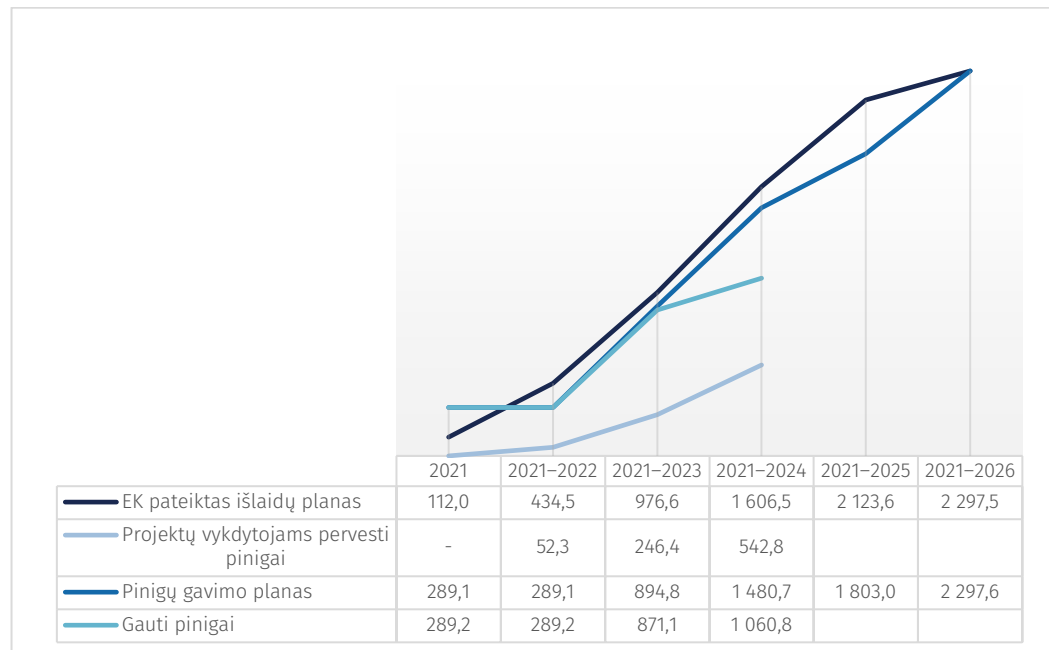

* Pinigų gavimo planas po Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pakeitimo 2024-09-30, projektų vykdytojams pervesti pinigai iki 2024-11-30, gauti pinigai iki 2024-12-17.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK, VBAMS duomenis, reglamento Nr. (ES) 2021/241 nuostatas, susijusias su finansinio įnašo išmokėjimu ir viešai prieinama informacija EK tinklalapyje apie atliktus išmokėjimus

10. Paskolos išmokėjimai Nacionalinei plėtros įstaigai atitinka išlaidų planą 96 proc. (2 pav.), tačiau faktiškai patirtos išlaidos rodikliams pasiekti sudaro 45 proc. išmokėtos sumos (6 lentelė). Pervesti pinigai Nacionalinei plėtros įstaigai dar nėra patirtos išlaidos rodikliams pasiekti.

6 lentelė. Paskolos panaudojimas iki 2024-11-30


Paskolos paskirtis	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano priemonė ir rodiklių Nr.	Skirta paskola, mln. Eur	Išmokėta paskola, mln. Eur	Patirtos išlaidos rodikliams pasiekti, mln. Eur
Skatinamoji finansinė priemonė „Milijardas verslui“	Paskolos įmonėms, skirtos žaliosioms ir didelės pridėtinės vertės technologijoms kurti, siekiant pramonės plėtros Nr. 137b–137f	850,0	250,0	52,64 Priimti teigiami sprendimai dėl 4 paraiškų 151,0 mln. Eur. Pasirašytos 2 paskolų sutartys 52,64 mln. Eur.
Skatinamoji finansinė priemonė „AEI paskolos juridiniams asmenims“	Parama AEI elektrinėms (saulės ir vėjo elektrinėms sausumoje) Nr. 204–208	549,1	58,2	3,9 2024-10-22 pasirašyta paskolos sutartis.
Projektas „Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro įsteigimas ir įveiklinimas“	Žaliųjų finansinių produktų kūrimas Nr. 58b	2,5	0,7	0,7 Rodiklis pasiektas įsteigtas ir pradėjo veikti Žaliųjų finansų institutas.

Paskolos paskirtis	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano priemonė ir rodiklių Nr.	Skirta paskola, mln. Eur	Išmokėta paskola, mln. Eur	Patirtos išlaidos rodikliams pasiekti, mln. Eur
UAB ILTE įstatinio kapitalo didinimas pagal Vyriausybės 2024-05-29 nutarimą Nr. 420	Nacionalinės plėtros įstaigos kapitalizacija ir finansinis atsparumas Nr. 180c	150,0	150,0	150,0 Rodiklis pasiektas UAB ILTE pervesti pinigai įstatinio kapitalo didinimui.
IŠ viso:		1551,7	458,9	207,2

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, Centrinės projektų valdymo agentūros projektų registro duomenis, Finansų ministerijos ir UAB ILTE pateiktus duomenis

11. Paskolos pervedimas Lietuvai viršija planą 61 proc. Nacionalinei plėtros įstaigai pervesta 60 proc. gautų pinigų (3 pav.).

3 pav. Paskolos gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu Nacionalinei plėtros įstaigai 2021–2026 m., mln. Eur*

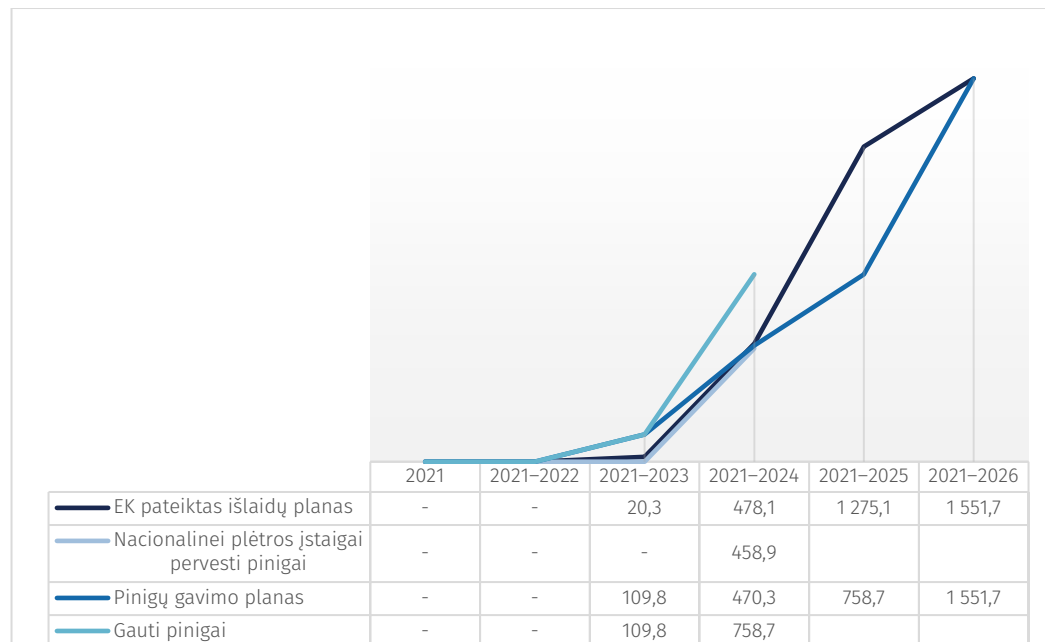


* Pinigų gavimas 2024-12-17, Nacionalinei plėtros įstaigai pervesti pinigai iki 2024-11-30.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK, VBAMS duomenis, Reglamento Nr. (ES) 2021/241 nuostatas, susijusias su finansinio įnašo išmokėjimu ir viešai prieinama informacija EK tinklalapyje apie atliktus išmokėjimus

12. 2024-12-17 EK pervedė Lietuvai 463 mln. Eur finansinį įnašą. Visa iki šiol gauta suma – 1 819,4 mln. Eur. Tai sudaro 47 proc. šaliai numatyto finansavimo ir 93 proc. iki 2024-12-31 planuotos gauti sumos (4 pav.). Toks finansavimo lygis pasiektas todėl, kad anksčiau, nei planuota, atsiskaityta už antros paskolos dalies rodiklius ir dėl to gauta daugiau paskolos, nei planuota. Negrąžintinos paramos gavimas atsilieka nuo plano 420 mln. Eur arba 28 proc.
13. Pinigų gavimas atsilieka nuo plano, nes vėluojama pasiekti rodiklius ir atitinkamai pateikti mokėjimo prašymus negrąžintinai paramai gauti. Vis dėlto iki šiol tai neturėjo įtakos investicijoms, nes jų įgyvendinimas atsilieka nuo plano ne dėl pinigų trūkumo, o dėl kitų priežasčių (3 skyrius). Norint Planą įgyvendinti laiku ir gauti visą Lietuvai skirtą finansavimą, per likusį 34 proc. Plano įgyvendinimo laiką reikės atlikti investicijų, kurių vertė sudaro ne mažiau kaip 74 proc. Lietuvai skirto finansavimo (4 pav.).

4 pav. Pinigų gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai 2021–2026 m., mln. Eur*

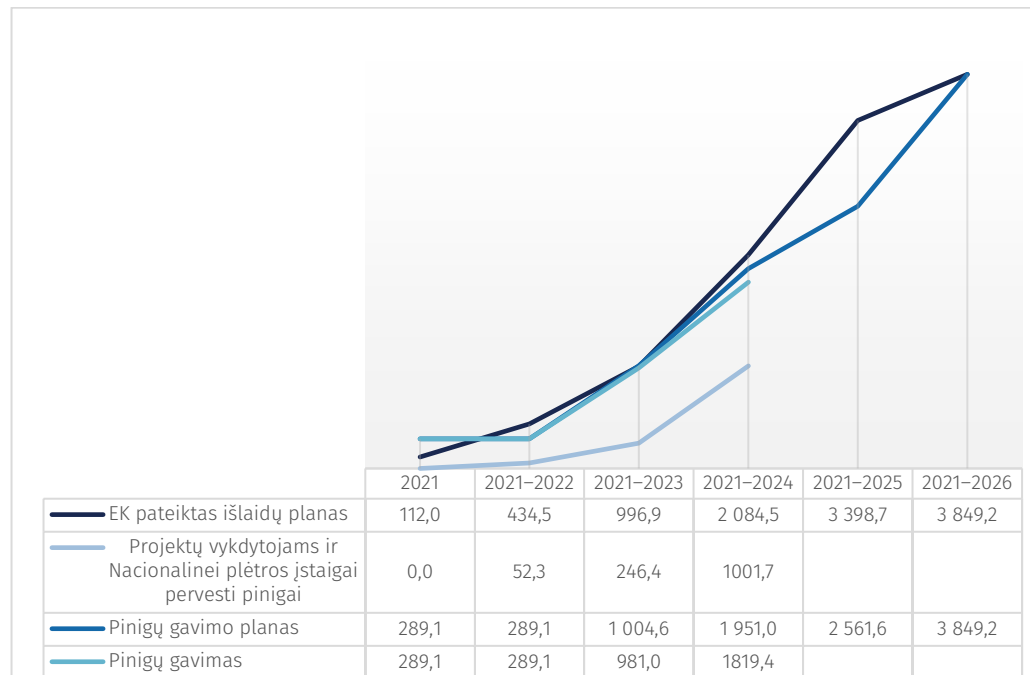

* Pinigų gavimo planas po Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pakeitimo 2024-09-30, projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai pervesti pinigai iki 2024-11-30, gauti pinigai iki 2024-12-17.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK, VBAMS duomenis, Reglamento Nr. (ES) 2021/241 nuostatas, susijusias su finansinio įnašo išmokėjimu ir viešai prieinama informacija EK tinklalapyje apie atliktus išmokėjimus

3. MINISTERIJOS IMASI VEIKSMŲ RIZIKOMS VALDYTI, TAČIAU PASIEKTA RODIKLIŲ BŪKLĖ RODO, KAD PLANUOTI POKYČIAI BUS ĮVYKDYTI NE VISA APIMTIMI

- 2024 m. lapkričio mėn. duomenimis, CPVA vertinimu – 63, o FM vertinimu – 43 iš 126 nepasiektų rodiklių yra didelės rizikos, iš jų apie du trečdalius (CPVA – 70 proc., FM – 72 proc.) – rodikliai, kurie pagal Planą turėtų būti pasiekti 2025–2026 m. Pagrindinė priežastis, kodėl skiriasi CPVA ir FM vertinimas, yra ta, kad CPVA remiasi rodiklių veiksmų planais, kuriuose taikomas griežtas algoritmas, skaičiuojant rodiklio vėlavimą. Jei rodiklio veiksmų plano etapo įgyvendinimas vėluoja 15 proc., rodiklis tampa didelės rizikos. Todėl rodikliai, kurių pasiekimas suplanuotas detalesniais etapais, greičiau tampa didelės rizikos. FM, kiekvieną mėnesį gavusi CPVA informaciją apie rodiklių rizikingumą²⁷, aptaria šias rizikas kartu su CPVA atstovais ir nusprendžia dėl rodiklio rizikos lygio, atsižvelgdama į kiekvieno rodiklio aplinkybes. Nustatant rodiklių rizikingumą, vertinama, ar rodiklio pasiekimo vėlavimai turi įtakos mokėjimo prašymų pateikimui laiku, ar gauta pakankamai paraiškų arba įgyvendinama projektų rodikliui pasiekti, ar imamasi reikalingų veiksmų rodikliui

²⁷ Finansų ministro 2022-06-22 įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintų 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių 70 p.

pasiekti, ar yra pokytis nuo ankstesnio mėnesio rodiklio pasiekimo lygio ir kitos svarbios aplinkybės.

15. Iš viso Plane nustatyti 106 rodikliai, kurių orientacinis pasiekimo terminas – 2025–2026 m. Įvertinome 45 šio laikotarpio rodiklių arba 42 proc. rizikingumą. Mūsų vertinimu, 31 iš 45 arba 69 proc. vertintų rodiklių yra rizikingi. Iš jų 2 susiję su reformomis ir 29 – su investicijomis, 27 yra negražintinos paramos ir 4 – paskolos rodikliai (4 ir 5 priedai).

3.1. 12 iš 45 vertintų rodiklių nebus pasiekti planuota apimtimi

3.1.1. Taikytos rizikos valdymo priemonės nepadėjo pasiekti reformos „Judame neteršdami aplinkos“ tikslų (6 rodikliai)

16. Rodikliai, susiję su netaršių (varomų elektra, vandeniliu, biodujomis, pagamintomis iš AIED II reikalavimus atitinkančių žaliavų) transporto priemonių įsigijimu, viešai prieinamų bei privačių įkrovimo prieigų įrengimu, nebus pasiekti, kaip planuota, nes priemonės nėra paklausios.

Rodikliai Nr. 31 ir 32 „Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius“, iki 2025 m. II ketv. – 6 625 vnt., iki 2026 m. II ketv. – 13 250 vnt.

- ✓ Dėl 12 250 lengvųjų transporto priemonių. Iki 2024-09-30 praėjus 44 proc. projekto įgyvendinimo laiko, gauta paraiškų 57, o patvirtinta paraiškų 18 lengvųjų transporto priemonių įsigijimui kompensuoti. Tai sudaro tik 0,15 proc. siektinos rodiklio reikšmės. Pagal projekto vykdytojo APVA prognozes, atsižvelgiant į dabartinį paraiškų teikimo intensyvumą ir jų tinkamumą, iki rodiklio termino – 2026 II ketv. – galėtų būti kompensuotas 154 lengvųjų transporto priemonių įsigijimas arba 1,3 proc. siektinos rodiklio reikšmės.
- ✓ Dėl 1 000 sunkiasvorių transporto priemonių, mikroautobusų ir autobusų. 2024 m. kovo mėn. paskelbti visi kvietimai teikti PĮP iki 2025 m. kovo mėn., tačiau iki 2024-09-30 sudarytos projektų sutartys tik dėl 21 transporto priemonės (N3 klasės). Tai sudaro tik 2,1 proc. siektinos rodiklio reikšmės.

Rodikliai Nr. 38 ir 39 „Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos kroviniam transportui ir autobusams“, iki 2025 m. II ketv. – 2 770 vnt., iki 2026 m. II ketv. – 5 540 vnt.

- ✓ Dėl 5 240 įkrovimo prieigų lengviesiems automobiliams. Iki 2024-09-30 praėjus 39 proc. projektų įgyvendinimo laiko, gauta paraiškų 843, o patvirtinta paraiškų 432 įkrovimo prieigoms įrengti. Tai sudaro 8 proc. siektinos rodiklio reikšmės. Rodikliui pasiekti įkrovimo prieigos turi būti įrengtos ir veikiančios, tačiau iki 2024-09-30 patvirtintų išmokėjimų nėra. Pagal projekto vykdytojo APVA prognozes, atsižvelgiant į dabartinį paraiškų teikimo intensyvumą ir jų tinkamumą, iki rodiklio termino – 2026 m. II ketv. – galėtų būti įrengtos 757 įkrovimo prieigos, tai sudarytų 14 proc. siektinos rodiklio reikšmės.

- ✓ Dėl 300 labai didelės galios įkrovimo priegų kroviniam transportui ir (arba) autobusams. Iki 2024-09-30 nesudaryta projekto sutartis su projekto vykdytoju APVA.

Rodikliai Nr. 40 ir 41 „Pradėjusios veikti privačios įkrovimo priegos“, iki 2025 m. I ketv. – 26 600 vnt., iki 2026 m. I ketv. – 53 200 vnt.

- ✓ Iki 2024-09-30 praėjus 58 proc. projekto įgyvendinimo laiko, gauta paraiškų 11 393, o patvirtinta 6 475 privačioms elektromobilių įkrovimo priegoms įrengti. Tai sudaro 12 proc. siektinos rodiklio reikšmės. Rodikliui pasiekti įkrovimo priegos turi būti įrengtos ir veikiančios, tačiau iki 2024-09-30 patvirtinta apmokėti 2 238 įkrovimo priegų įrengimą arba 4 proc. siektinos rodiklio reikšmės.
17. Kai kurių rodiklių (Nr. 31, 32, 38 ir 39) PPA ir PFSA parengimas truko iki 15 mėn. arba 3,5 karto ilgiau, nei planuota, taip pat stebimas nedidelis pareiškėjų susidomėjimas netaršiomis transporto priemonėmis ir įkrovimo infrastruktūra. Elektra varomų transporto priemonių augimas atsilieka nuo plano²⁸. Nuo šio augimo priklauso privačių įkrovimo priegų plėtra, nes apie pusė naujų elektra varomų lengvųjų transporto priemonių (M1 ir N1 klasės) savininkų kreipiasi finansavimo įkrovimo priegai įsirengti²⁹. VĮ „Regitra“ duomenimis³⁰, nuo 2022 m. III ketv. iki 2024 m. III ketv. užregistruota 14 557 elektra varomų lengvųjų transporto priemonių (M1 ir N1 klasės).
18. SM ir EM 2024 m. liepos mėn. pasiūlė FM³¹ tikslinti rodiklius, sumažinant siektinas jų reikšmes. FM užsakymu³² 2024-09-27 atliktas Plano keitimo pasiūlymų įvertinimas, kuris parodė, kad, net pritaikius geriausią siūlomą alternatyvą, rodikliai nebus pasiekti visa apimtimi. 2024-11-29 pateikti siūlymai EK keisti Planą ir mažinti siektinas rodiklių reikšmes (7 lentelė ir 6 priedas).

7 lentelė. Siūlymai tikslinti siektinas rodiklių reikšmes

Rodiklis	Siektinos rodiklio reikšmės	Susisiekimo ir Energetikos ministerijų siūlymai Finansų ministerijai	Finansų ministerijos užsakymu atliktas vertinimas		Europos Komisijai pateikti siūlymai
			Alternatyva be pakeitimų	Siūloma rinktis alternatyva	
Nr. 32 „Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius“, iš jų:	13 250	1 240	-	-	3 600
<i>netaršių (varomų elektra ir vandeniliu) lengvųjų transporto priemonių (M1 ir N1 klasės)</i>	12 250	240	80	6 767	2 600
<i>sunkiasvorių transporto priemonių, mikroautobusų ir</i>	1 000	1 000*	-	-	1 000

²⁸ Valstybinio audito ataskaita „Energetinės nepriklausomybės tikslų įgyvendinimas transporto sektoriuje“, 2024-05-09 Nr. VAE-3, 1.2 poskyris.

²⁹ Lietuvos energetikos agentūros atstovų 2024-09-09 el. paštu ir Energetikos ministerijos 2024-10-11 el. paštu pateikta informacija.

³⁰ Elektromobilių skaičius Lietuvoje, prieiga per internetą [Elektromobilių skaičius Lietuvoje – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija](#) (žiūrėta 2024-11-05).

³¹ Susisiekimo ministerijos 2024-07-01 raštas Nr. 2-2207 ir Energetikos ministerijos 2024-07-05 raštas Nr. 3-966.

³² 2024-03-18 paslaugų sutartis Nr. 14P-24/17 tarp Finansų ministerijos ir ūkio subjektų grupės VŠĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, Advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai ir UAB „Ernst & Young Baltic“.

Rodiklis	Siekimos rodiklio reikšmės	Susisiekimo ir Energetikos ministerijų siūlymai Finansų ministerijai	Finansų ministerijos užsakymu atliktas vertinimas		Europos Komisijai pateikti siūlymai
			Alternatyva be pakeitimų	Siūloma rinktis alternatyva	
<i>autobusų (N2, N3, M2 ir M3 klasės)</i>					
Nr. 39 „Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo priegios ir labai didelės galios įkrovimo priegios kroviniam transportui ir autobusams“, iš jų:	5 540	4 580	-	-	4 650
<i>elektromobilių įkrovimo priegios lengviesiems automobiliams</i>	5 240	4 280	1 856**	1 856**	4 350
<i>labai didelės galios įkrovimo priegios kroviniam transportui ir (arba) autobusams.</i>	300	300	-	-	300
Nr. 41 „Pradėjusios veikti privačios įkrovimo priegios“	53 200	18 910	18 756	19 978	18 910
* Siūloma nenurodyti, kiek ir kokios klasės transporto priemonių turi būti įsigyta.					
** Vertinta tik pagal susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 5.3 veiklą „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo priegių planuose)“, pagal kurią planuojama 3 840 elektromobilių įkrovimo priegių. - Nevertinta					
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Susisiekimo ministerijos, Energetikos ministerijos pateiktus duomenis ir Finansų ministerijos užsakymu atliktą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ keitimų siūlymų įvertinimą					

19. Nepasiekus rodiklių su EK sutarta apimtimi, rizikuojama nepasiekti ir nacionalinių tikslų, susijusių su energijos iš AEI dalies didinimu transporto sektoriuje ir šio sektoriaus sukeliama taršos mažinimu (8 lentelė). Alternatyviųjų degalų įstatyme³³ nustatyta, kad iki 2030 m. turi būti įrengta 60 000 elektromobilių įkrovimo priegių, iš kurių 6 000 – viešųjų ir pusiau viešųjų. 98 proc. šio tikslo sudaro Plano siektini rodikliai.

8 lentelė. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių įtaka nacionaliniams tikslams

Plėtros programa	Nacionalinio pažangos plano uždavinys	Rezultato rodiklis ir jo reikšmės	Pažangos priemonė	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodikliai ir jų reikšmingumas siekiant rezultato rodiklio
Susisiekimo	6.1 Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliama aplinkos taršą	Elektromobilių ir kitų nulinės taršos lengvųjų automobilių dalis lengvųjų automobilių parke, proc. 2020 m. – 0,3 2025 m. – 2,7 2030 m. – 20	Nr. 10-001-06-01-01 Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje	Nr. 31, 32. Šiems rodikliams pasiekti suplanuotos veiklos, kurioms skirta 41 proc. pažangos priemonėje rezultato rodikliui suplanuoto finansavimo.
Energetikos	6.3 Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos	AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir	Nr. 03-001-06-03-03 Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos	Nr. 40 ir 41 Šiems rodikliams pasiekti suplanuotos

³³ Alternatyviųjų degalų įstatymas, 23 str. 1 d.

Plėtros programa	Nacionalinio pažangos plano uždavinys	Rezultato rodiklis ir jo reikšmės	Pažangos priemonė	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodikliai ir jų reikšmingumas siekiant rezultato rodiklio
	sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo AEI dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje	geležinkelių transporto energijos suvartojimu, proc. 2019 m. – 4,04 2030 m. – 15	priemonės ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje	veiklos, kurioms skirta 59 proc. pažangos priemonėje rezultato rodikliui suplanuoto finansavimo.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal susisiekimo ir energetikos plėtros programas ir atitinkamų pažangos priemonių aprašus

20. Už rodiklių pasiekimą atsakingos SM ir EM imasi rizikos valdymo priemonių rodikliams pasiekti: PFSA tikslinimas pagerinant sąlygas pareiškėjams, susitikimai su potencialiais pareiškėjais. Lietuvos energetikos agentūra vykdė aktyvius viešinimo veiksmus, informuodama apie galimybes įsirengti privačias įkrovimo prieigas: informavimas žiniasklaidoje, nuotoliniai mokymai, potencialių pareiškėjų informavimas el. paštu, pristatymai Lietuvos saulės energetikos asociacijos organizuojamuose renginiuose, bendra komunikacija su Energijos skirstymo operatoriumi gaminantiems vartotojams, žinutė kvietimuose gauti dotaciją elektromobiliams įsigyti, informacija VĮ „Regitra“ laukimo ekranuose, raštai VĮ Turto bankui, savivaldybių asociacijai su prašymu paraginti institucijas ir įstaigas įsirengti įkrovimo prieigas.

3.1.2. Nepavykus rodiklių pasiekti visa apimtimi, deramasi su Europos Komisija dėl rodiklių tikslinimo (6 rodikliai)

21. Rodikliai, susiję su startuolių ekosistemos plėtros skatinimu, mokslo ir verslo skatinimu dalyvauti tarptautinėse mokslo ir inovacijų programose, centralizuotų viešųjų pirkimų gerinimu ir užimtumo rėmimo priemonių didinimu, orientuojantis į aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, skaitmeninę ir žaliąją transformaciją, nebus pasiekti, kaip suplanuota, todėl su EK deramasi dėl mažesnių siekių arba alternatyvių rodiklių pasiekimo būdų.

Rodiklis Nr. 131 „Investicijas gavusių startuolių skaičius“, iki 2026 m. I ketv. – 172 startuoliai.

22. Veikla, kuria siekiama, kad 20 startuolių gautų investicijų iš Europos kosmoso agentūros, gali būti įgyvendinta ne visa apimtimi. Iki 2024-09-30 praėjus 44 proc. projekto įgyvendinimo laiko, sudarytos 7 sutartys su startuoliais dėl jų inkubavimo. Pagal susitarimą³⁴ su Europos kosmoso agentūra, siekdamas neprarasti jos finansavimo, VŠĮ Visorių informacinių technologijų parkas įsipareigojo iki 2024-12-31 atrinkti ir paremti 10 startuolių.
23. Projekto vykdytojo teigimu, mažiau sutarčių, nei planuota, sudaryta dėl prastos pateiktų paraiškų kokybės. Kokybei užtikrinti pareiškėjams reikalinga pagalba vertinant verslo idėjos galimybes, rengiant verslo planą, prieinant prie mokymų ir metodikų, padėsiančių

³⁴ 2022-12-20 sutartis Nr. 4000140200/22/UK/AL/an.

sparčiai įgyvendinti naujas idėjas, verslus, sukurti produktus ir paslaugas. Šiai pagalbai suteikti reikalingas finansavimas, kuris projekto vykdytojui neskirtas. Įžvelgiant riziką, kad šios rodiklio veiklos nepavyks įgyvendinti visa planuota apimtimi ir siekiant gerinti paraiškų kokybę, EK pateiktas siūlymas neformaliai derinimui sumažinti rodiklio siektiną reikšmę iki 15 startuolių, o 5 startuolių paramai numatytą finansavimą perkelti į pasirengimą inkubacinei veiklai.

Rodikliai Nr. 135 ir 136 „Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažų ir vidutinių įmonių potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams“, iki 2025 m. I ketv. – 200 projektų, iki 2026 m. II ketv. – 477 projektai.

24. Iki rodiklio termino nebus įgyvendintos šios rodiklio veiklos:
- ✓ „Paremta ne mažiau kaip 240 konsultavimo, ekspertų paslaugų, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose“, nes priemonė nepopuliari. Praėjus 41 proc. projekto įgyvendinimo laiko, parama skirta 14 individualių konsultacijų atlyginimui. Tai sudaro tik 8,8 proc. 135 rodiklio arba 5,8 proc. 136 rodiklio reikšmės.
 - ✓ „Paremti ne mažiau kaip 24 projektai – mokslo ir studijų institucijų ir MVĮ projektai, teigiamai įvertinti pagal programą „Europos horizontas“, bet dėl biudžeto trūkumo negavę finansavimo (įskaitant projektus, kuriems suteiktas pažangumo ženklas)“, nes iki 2024-09-30 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos skirtos 7 finansavimo negavusiems projektams. Daugiau projektų nebus remiama, nes nėra galimybės jų įgyvendinti per likusį laikotarpį iki rodiklio pasiekimo termino.
 - ✓ „Paremti ne mažiau kaip 24 tarpvalstybiniai ES koordinavimo iniciatyvų projektai“, kvietimas teikti PJP paskelbtas 2023 m. kovo mėn., tačiau iki 2024-09-30 negautas nė vienas PJP. PJP teikimas 2024 m. iki rugsėjo mėn. buvo sustabdytas, laukiant EK išaiškinimo dėl *pro rata* principo taikymo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės sinergijai su kitomis ES priemonėmis (7 priedas).
25. Siekdama valdyti su rodiklio pasiekimu susijusias rizikas, ŠMSM patikslino PFSA, skatindama pareiškėjus kreiptis dėl individualių konsultavimo, ekspertų paslaugų, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose. 2023 m. rudens–2024 m. pavasario laikotarpiu surengė daugiau nei 10 seminarų MTEPI institucijoms ir MVĮ apie programos „Europos horizontas“ spartinimo veiklą, kvietimų sąlygas ir paraiškų teikimo instrukcijas. ŠMSM ir CPVA darbuotojai nuolat konsultuoja potencialius pareiškėjus. Programos „Europos horizontas“ nacionaliniai kontaktiniai asmenys taip pat viešina šią veiklą susitikimuose su mokslo ir studijų institucijomis ir MVĮ.
26. Kadangi ne visas rodiklių veiklas pavyks įgyvendinti suplanuota apimtimi, 2024-11-29 EK pateiktas siūlymas tikslinti rodiklius mažinant nesėkmingų ir didinant sėkmingų veiklų siektinas reikšmes. Bendrą remiamų projektų skaičių siūloma išlaikyti (7 priedas).

Paskolos rodiklis Nr. 180b „Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) katalogo išplėtimas“, iki 2025 m. IV ketv. – 22 nauji moduliai.

27. Atsižvelgdama į perkančiųjų organizacijų poreikius ir turimus savus išteklius, CPO LT 2023–2025 m. suplanavo sukurti 20, o ne 22 modulius, kaip numatyta Plane. Papildomai šiuo

laikotarpiu suplanuota sukurti 12 modulių, finansuojamų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir ES fondų lėšomis³⁵. Nustatant Plane rodiklio reikšmę „22 nauji moduliai“, neįvertinta, kad ES fondų lėšomis sukurti moduliai negalės būti 180b rodiklio pasiekimo rezultatas. FM kreipėsi į EK, prašydama išaiškinti, ar būtina inicijuoti rodiklio keitimą, Plane sumažinant kuriamų modulių skaičių nuo 22 iki 20. Po EK, FM, EIM ir CPO LT techninio susitikimo nutarta, kad CPO LT sieks savais ištekliais sukurti papildomus 2 modulius.

Rodikliai Nr. 190 ir 191 „Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas“, iki 2025 m. II ketv. – 14 985, iki 2026 m. II ketv. – 19 350 paramą gavusių dalyvių.

28. Nuo projekto veiklų vykdymo pradžios praėjo 75 proc. laiko iki 190 rodiklio termino, 56 proc. laiko – iki 191 rodiklio termino. Mokymus baigė 52 proc. asmenų nuo 190 rodiklio siektinos reikšmės arba 41 proc. nuo 191 rodiklio siektinos reikšmės. Pagal Planą, 51 proc. mokymuose dalyvaujančių dalyvių turėtų įgyti skaitmeninių įgūdžių, 49 proc. – kitų didelės pridėtinės vertės kvalifikacijų ir (arba) kompetencijų. Vis dėlto iki 2024-09-30 skaitmeninių įgūdžių mokymus baigė 86 proc., o kitos didelės pridėtinės vertės kvalifikacijų ir (arba) kompetencijų – 14 proc.
29. Užimtumo tarnybos atstovų paaiškinimu, didesnę susidomėjimą įgyti informacinių technologijų srities profesijas lemia darbo rinkos poreikiai ir technologijų pažanga, diegiama darbo vietose. Be to, Užimtumo tarnybos duomenimis, daugiau yra laisvų darbo vietų su reikalingomis informacinių technologijų kompetencijomis. Regionuose mokymo programų pasiūla yra kur kas mažesnė nei didmiesčiuose. IT programų galima mokytis nuotoliu, o inžinerinėse programose taikomas praktinis mokymas, kuriam reikalinga specializuota mokymo bazė ir mokymasis darbo vietoje. Be to, rinkoje nėra pakankamos pasiūlos inžineriniams mokymams. Inžinerinės kvalifikacijos įgijimas dėl savo sudėtingumo ir specifikos trunka ilgiau, jį sudėtinga adaptuoti trumpesniam laikotarpiui per neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Taip pat dėl padidėjusios mokymo programos trukmės ir pasikeitusios mokymo programų struktūros išaugo vidutinės vieno dalyvio išlaidos.
30. 2024-11-29 EK pateiktas siūlymas mažinti rodiklių reikšmes. Nustatyti 190 rodiklio siektiną reikšmę – 9 597 dalyviai, o 191 rodiklio – 15 078 dalyviai. Taip pat siūloma neišskirti, kiek dalyvių turėtų baigti mokymo programas, suteikiančias kitų didelės pridėtinės vertės kvalifikacijų ir (arba) kompetencijų, tačiau 190 rodiklio aprašyme siūloma nurodyti, kad ne mažiau kaip 5 643, o 191 rodiklio aprašyme – ne mažiau kaip 10 000 dalyvių įgytų skaitmeninių įgūdžių kvalifikacijų ir (arba) kompetencijų.

³⁵ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamas projektas Nr. 02-022-P-007 „Viešosios įstaigos CPO LT elektroninio katalogo plėtra“ – 10 modulių (73 plano rodiklis) ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas Nr. 10.1.2-ESFA-916-01-0007 „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VŠĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ – 2 moduliai.

3.2. 2 iš 45 vertintų rodiklių nebus pasiekti laiku, tačiau tikėtina, kad galutiniai priemonių tikslai bus įgyvendinti

Rodikliai Nr. 25 ir 26 „Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh)“, iki 2025 m. I ketv. – 7,6 MWh, iki 2026 m. II ketv. – 15,2 MWh.

31. Iki 2024-09-30 gauta 116 paraiškų 21,9 MWh, įvertintos 85 paraiškos 14,8 MWh, patvirtinta 51 paraiška 7,94 MWh. Nors iki rodiklio termino likus pusei metų patvirtintas pakankamas kiekis paraiškų, tačiau rodikliui pasiekti nepakanka skirti finansavimą – elektros energijos kaupimo įrenginiai turi būti įrengti ir prijungti prie elektrinės. Pagal reikalavimus, nustatytus kvietimuose³⁶, projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti tik nuo paraiškos pateikimo projekto vykdytojui. Paraiškos buvo pateiktos nuo 2024-04-04 iki 2024-05-10. Kadangi kaupimo įrenginiams instaliuoti reikia 12 mėn.³⁷, geriausiu atveju jie galėtų būti instaliuoti 2025 m. II ketv.
32. Rodiklį vėluojama pasiekti dėl nesėkmingo pirmojo kvietimo³⁸, kurio metu gautos 8 paraiškos 0,66 MWh, patvirtinta 1 paraiška 0,015 MWh. Atsižvelgiant į nedidelį pareiškėjų susidomėjimą, EM patikslino PFSA³⁹, nustatydamas, kad paraiškas gali teikti ne tik gamintojai, tik mažos ir labai mažos įmonės, bet ir gaminantys vartotojai bei vidutinės įmonės. Nuo pirmojo iki antrojo kvietimo paskelbimo praėjo pusė metų.
33. Kadangi rodiklio Nr. 25 nepavyks pasiekti laiku, 2024-11-29 EK pateiktas siūlymas pakeisti rodiklio aprašymą – iki 2025 m. III ketv. agentūra patvirtina sprendimus įrengti 134 MWh individualius energijos kaupiklius. Atsižvelgiant į priemonės populiarumą po antrojo kvietimo, taip pat siūloma tikslinti rodiklį Nr. 26, padidinant kaupiklių talpą nuo 15,2 iki 132 MWh. Siūloma finansavimą skirti perskirstant kitų komponento „Žalioji Lietuvos transformacija“ priemonių, kurios nesulaukė pakankamo pareiškėjų susidomėjimo, lėšas: iš pelkėdaros procesų atkūrimo (rodikliai Nr. 55 ir 56) ir privačių įkrovimo priegių (rodiklis Nr. 41).

Rodikliai Nr. 35 ir 36 „Pristatyta elektra varomų viešojo transporto priemonių (autobusų)“, iki 2025 m. II ketv. – 115 vnt., iki 2026 m. II ketv. – 260 vnt.

34. Iki 2024-09-30 skirtas finansavimas⁴⁰ 20 projektų įgyvendinti, pagal kuriuos planuojama įsigyti 275 autobusus, tačiau iki 2024 m. lapkričio vidurio sudaryta 16 projektų sutarčių dėl 203 autobusų. Visų projektų veiklų pabaiga – nuo 2025-12-31 iki 2026-04-30 – yra vėlesnė nei rodiklio Nr. 35 terminas. Iki 2024-09-30 nesudaryta nė viena autobusų pirkimo sutartis, nors pirmojo kvietimo projektų sutartys sudarytos 2024 m. vasario, kovo ir gegužės mėn.
35. SM pateikė FM pasiūlymą⁴¹ pakoreguoti siekiamą rodiklį Nr. 35, sumažinant autobusų skaičių nuo 115 iki 10, o rodikliui Nr. 36 – padidinti autobusų skaičių nuo 260 iki 460. 2024-

³⁶ 2024-04-04 kvietimai Nr. 03-009-J-0001-J02 ir Nr. 03-009-J-0001-J03.

³⁷ Finansų ministerijos 2024 m. rugsėjo mėn. atliktas rodiklių rizikų vertinimas.

³⁸ 2023-10-06 kvietimas Nr. 03-009-J-0001.

³⁹ Energetikos ministro 2024-02-27 įsakymas Nr. 1-42.

⁴⁰ Susisiekimo ministro 2024-01-15 įsakymas Nr. 3-18 ir 2024-08-05 įsakymas Nr. 3-268.

⁴¹ Susisiekimo ministerijos 2024-07-01 raštas Nr. 2-2270.

11-29 EK pateiktas siūlymas tikslinti Planą, nustatant rodiklio Nr. 35 aprašymą „Pasirašytos sutartys su miesto ir priemiesčio viešojo transporto operatoriais dėl 260 (M2 ir M3 klasės) žemagrindžių elektrinių ir vandeniliu varomų autobusų įsigijimo finansavimo“.

36. Stebint pirmojo kvietimo projektų sutarčių įgyvendinimą, didinti rodiklio Nr. 36 reikšmę būtų rizikinga. Iki rodiklio termino lieka 21 mėn., o pirmojo kvietimo projektų sutarčių įgyvendinimas rodo, kad pirkimo sutartims sudaryti nepakanka 4–7 mėn., autobusams pagaminti ir pristatyti reikia dar 12–16 mėn.⁴²
37. Rodiklį vėluojama pasiekti dėl 3,3 karto ilgiau užtrukusio PPA ir PFSA rengimo: PPA parengimas truko 8 mėn., o PFSA – net 12 mėn. ilgiau, nei planuota.

3.3. 17 iš 45 vertintų rodiklių pasiekimo eiga rodo rizikas plano įgyvendinimui laiku ar visa apimtimi

3.3.1. Rizikingi sveikatos priežiūros sistemos investiciniai rodikliai (3 rodikliai)

38. Mažai tikėtina, kad rodikliai, susiję su pažangios terapijos centro sukūrimu ir sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimu, bus pasiekti iki Plane nustatyto termino. Galima rizika, kad jie nebus pasiekti iki mokėjimo prašymo pateikimo termino – 2026 II ketv.

Rodiklis Nr. 7 „Sukurtas pažangios terapijos centras“, 2025 m. IV ketv.

39. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų pažangios terapijos pastato statybos I etapo darbų sutarties terminas su pratęsimu viršija rodiklio terminą, o II etapo darbų – „švarių“ ir laboratorijos patalpų įrengimas – viešieji pirkimai iki 2024-09-30 nepradėti (8 priedas). Sudarytos rangos sutarties trukmė – 15 mėn. (be pratęsimo) ir 19 mėn. (su pratęsimu). Vis dėlto, remiantis ankstesnių projektų patirtimi, statyba trunka apie 18–24 mėnesius.⁴³ Neįrengus „švarių“ ir laboratorijos patalpų, rodiklis nebus pasiektas tinkamai ir nebus įgyvendintas pagrindinis pažangios terapijos centro sukūrimo tikslas – sudaryti sąlygas rengti pažangiosios terapijos vaistinius preparatus ir užtikrinti inovatyvių ląstelių terapijos paslaugų teikimą visos šalies gyventojams.
40. Pusę metų ilgiau, nei planuota, užtruko investicinio projekto derinimas su projekto vykdytoju ir SAM, nes reikėjo parengti naują investicijų projektą, sujungiant 2 projektus. Taip pat 13 mėn. ilgiau, nei planuota, vykdytas viešųjų pirkimų etapas, nes užtruko techninio projekto parengimas dėl objekto techninio sudėtingumo ir parengto techninio projekto koregavimo atsižvelgiant į naują reikalavimą pakeisti energetinę klasę iš projektuojamos A+ į A++.

⁴² Pagal informaciją, pateiktą EK, siūlant tikslinti rodiklį Nr. 35.

⁴³ Rodiklio termino nukėlimo pagrindimas, teiktas EK prieš tikslinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 2023 m.

Rodiklis Nr. 19 „Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius“, iki 2025 m. IV ketv. – 5 modernizuotos įstaigos.

41. Gali vėluoti 3 iš 5 sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas, nes VŠĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės, VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės sudarytų statybos darbų sutarčių terminai viršija rodiklio terminą (8 priedas).
42. Projektų įgyvendinimas vėluoja, nes ilgiau, nei planuota, užtruko procesas iki projektų sutarčių sudarymo, techninių projektų parengimas ir jų ekspertizės atlikimas, statybos leidimo gavimas, viešųjų pirkimų procedūrų atlikimas.

Rodiklis Nr. 20 „Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius“, iki 2025 m. IV ketv. – 7 modernizuotos ligoninės.

43. Gali vėluoti 4 iš 7 ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir (arba) reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių infrastruktūros objektų modernizavimas, nes:
 - vėluoja VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ir VŠĮ Utenos ligoninės patalpų arba pastatų rekonstrukcijos sutarčių sudarymas. Nors viešieji pirkimai vykdomi, tačiau pagal investicijų projektus darbams atlikti reikia daugiau laiko, nei liko iki rodiklio termino. Siekiant darbus atlikti iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė sutartį turėtų sudaryti iki 2025-02-28, o VŠĮ Utenos ligoninė – iki 2025-04-30. VŠĮ Utenos ligoninės viešieji pirkimai 2 kartus buvo nesėkmingi dėl pasiūlytos per didelės kainos;
 - VŠĮ Regioninė Telšių ligoninė nėra sudariusi sutarties dėl dviejų priestatų statybos ir patalpų modernizavimo. Atsižvelgiant į investicijų projekte suplanuotą 10 mėn. darbų trukmę, sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-02-28, siekiant darbus įvykdyti iki rodiklio termino, tačiau ši darbų trukmė neįprastai maža, palyginti su kituose projektuose priestatų statyboms suplanuota trukme. Be to, EK pateiktame pagrindime dėl rodiklio termino nukėlimo, tikslinant Planą 2023 m., nurodyta, kad, remiantis ankstesnių projektų patirtimi, statyba trunka apie 18–24 mėn.;
 - VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų skubiosios medicinos pagalbos infrastruktūros modernizavimo sutarties terminas viršija rodiklio terminą (8 priedas).
44. Projektų vėlavimą lėmė ilgiau, nei planuota, trukęs techninių projektų parengimas. Kai techniniai projektai pradėti rengti iki projekto sutarties sudarymo, pastebimas mažesnis vėlavimas. Dviejų projektų įgyvendinimo vėlavimui įtakos turėjo nesėkmingi viešieji pirkimai dėl pasiūlytos per didelės kainos. Finansavimo trūkumo problemą VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos išsprendė patikslindama techninį projektą ir dalį projekto darbų perkeldama į II etapą, kuris bus vykdomas ateityje gavus finansavimą. VŠĮ Utenos ligoninės finansavimo problema iki 2024-09-30 nebuvo išspręsta,

tačiau 2024-10-31 SAM informavo ⁴⁴ ligoninę apie papildomą finansavimo skyrimą projektui įgyvendinti.

45. Įgyvendinant visus (rodiklių Nr. 7, 19 ir 20) projektus, turėtų būti įsigyta medicininė įranga, tačiau dėl finansavimo trūkumo (rodikliai Nr. 19 ir 20) jai skirtas finansavimas perkeliamas statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbams atlikti. Dėl to 2023 m. patikslinus Planą, neliko reikalavimo, siekiant rodiklio Nr. 20, įsigyti medicininę įrangą, o EK neformaliam derinimui pateiktas siūlymas, susijęs su rodikliui Nr. 19 suplanuotų lėšų perskirstymu, 73 proc. įrangai skirto finansavimo skirti statybai. Projektams įgyvendinti reikalingą medicininę įrangą planuojama įsigyti iš kitų ES fondų.
46. Matydama, kad ne visus projektus pavyks įgyvendinti iki rodiklių termino 2025-12-31, SAM 2024-08-01 patikslino PFSA ⁴⁵, nukeldama projektų veiklų įgyvendinimo terminą iki 2026-04-30, su sąlyga, kad projektų išlaidos bus deklaruotos ne vėliau negu 2026-06-01. Be to, SAM, informuodama apie būsimus PFSA pakeitimus ⁴⁶, rengiant pirkimų dokumentus, rekomendavo įtraukti nuostatas dėl galimybės pratęsti rangos darbų sutarties vykdymo terminus iki 2026-05-31. Projekto Nr. 09-002-P-0001 „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės skubios pagalbos užtikrinimui ir pavojingų infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtimas“ apimtis sumažinta atsisakant priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus rekonstrukcijos ⁴⁷.

3.3.2. Rizikingi rodikliai, susiję su misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimu (2 rodikliai)

47. Rizikuojama dviejų rodiklių nepasiekti laiku, nes atsiliekama nuo planuoto grafiko, kuriant tris kompetencijų centrus ⁴⁸. Šių centrų tikslas – skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą sumaniosios specializacijos srityse, skatinti MTEP, kad įvairiose srityse būtų vystomos ir rinkai parengiamos technologijos, produktai ir paslaugos, taip pat skatinti idėjų, žinių ir investicijų mainus. Rodiklių siekiama įgyvendinant projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“.

Rodiklis Nr. 82 „Pradėjęs veikti IRT kompetencijų centras“, 2025 m. IV ketv.

48. Iki 2024-09-30 nebuvo pradėti IRT kompetencijų centro remonto darbų viešieji pirkimai, o pagal projekto įgyvendinimo grafiką viešiesiems pirkimams ir remonto darbams atlikti reikia 2 mėn. daugiau laiko, nei liko iki rodiklio termino (9 priedas). Siekiant darbus atlikti iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, viešieji pirkimai turėtų būti pradėti iki 2025-01-31. Pirkimas dėl patalpų, adresu Saulėtekio al. 11, Vilnius, remonto darbų paskelbtas 2024-

⁴⁴ Sveikatos apsaugos ministerijos 2024-10-31 raštas Nr. 10-3587 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 09-008-P-0005“.

⁴⁵ Sveikatos apsaugos ministro 2024-08-01 įsakymas Nr. V-793, 7, 10 ir 11 p.

⁴⁶ Sveikatos apsaugos ministerijos 2024-05-13 raštas Nr. (11.1.3-20) 10-1684 „Dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo termino“.

⁴⁷ Centrinės projektų valdymo agentūros 2024-11-18 raštas „Dėl projekto Nr. 09-002-P-0001 „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės skubios pagalbos užtikrinimui ir pavojingų infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtimas“ sutarties keitimo.“

⁴⁸ Kompetencijų centras – viešoji MTEPI infrastruktūra, sutelkta ne daugiau kaip dviejose fizinėse vietose (t. y. turinti 1–2 registracijos adresus), skirta aukšto tarptautinio lygio MTEP veiklai vykdyti, nukreiptai misijos tikslams pasiekti, tarpdisciplininiam ir (arba) tarpsektoriniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui, MTEPI rezultatų (nuo idėjos iki produkto) komercinimui ir (ar) atžalinių įmonių inkubavimui, ir (ar) technologijų prototipavimui, ir (ar) bandomosios gamybos linijoms, ir (ar) bendroms mokslo ir verslo veikloms atviros prieigos principu skatinti.

11-05. Tačiau pirkimas dėl patalpų, adresu Studentų g. 48A, Kaunas, remonto darbų iki 2024-12-10 nebuvo pradėtas, techninis projektas rengiamas. .

Rodiklis Nr. 133 „Veikiančių kompetencijų centrų skaičius“, iki 2025 m. IV ketv. – 2 kompetencijų centrai.

49. Vėluoja dviejų kompetencijų centrų sukūrimas:
- atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo grafike suplanuotą veiklų trukmę, likusio laiko nuo 2024-09-30 iki rodiklio pasiekimo termino nepakaks kompetencijų centrui, adresu Tunelio g. 60, Kaunas, sukurti. Nepradėtiems viešiesiems pirkimams įvykdyti ir rekonstrukcijos darbams atlikti reikia 3 mėn. daugiau laiko, nei liko iki rodiklio termino. Siekiant darbus atlikti iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, viešieji pirkimai turėtų prasidėti iki 2024-12-31, o rekonstrukcijos darbai – iki 2025-04-30. Viešiesiems pirkimams reikalingas techninis projektas perduotas ekspertizei;
 - pastato, adresu Saulėtekio g. 9, Vilnius, kuriame numatyta pritaikyti patalpas kompetencijų centrui, statybos darbų terminas pagal rangos sutartį viršija rodiklio terminą 6,5 mėn., mokėjimo prašymo terminą – 0,5 mėn. (9 priedas).
50. Rodiklių vėlavimas susijęs su ilgiau, nei planuota, trukusiu PPA, PFSA ir techninių projektų parengimu. EIM atstovų teigimu, nepakankamai įvertinti IRT kompetencijų centro remonto ir kompetencijų centro, esančio adresu Tunelio g. 60, Kaunas, rekonstrukcijos techninių projektų rengimo paslaugų terminai.
51. Siekiant valdyti rizikas, projekto įgyvendinimui prižiūrėti sukurtas priežiūros komitetas⁴⁹, sudarytas iš aukščiausio lygio EIM, ŠMSM, CPVA ir Inovacijų agentūros vadovų, Lietuvos mokslo tarybos atstovų. Dėl kompetencijų centro patalpų, adresu Saulėtekio g. 9, Vilnius, statybos, priežiūros komitete aptarta galima alternatyva kompetencijų centrui naujame pastate numatytas patalpas pakeisti kitomis partnerio turimomis laikinomis patalpomis, kuriose iki naujojo kompetencijų centro įrengimo bus laikoma MTEP infrastruktūrai skirta įranga.

3.3.3. Rizikingi rodikliai, susiję su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų didinimu (5 rodikliai)

52. Plano tikslai, susiję su AEI dalies padidinimu galutiniame energijos suvartojime, gali būti nepasiekti planuota apimtimi, nes juridiniai asmenys vangiai naudojami ne tik siūlomomis paskolomis, bet ir negražintina parama, skirta saulės ir vėjo elektrinėms įsirengti.

Rodikliai Nr. 202 ir Nr. 203 „Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai“, iki 2025 m. I ketv. – 120 MW, iki 2026 m. II ketv. – 225 MW.

53. Projektas „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“ nutrauktas negavus nė vienos paraiškos. Projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ ne toks

⁴⁹ Ekonomikos ir inovacijų ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-10-18 įsakymas Nr. 4-1073/V-1650 „Dėl pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programos“ priežiūros komiteto sudarymo“.

rezultatyvus, kaip tikėtasi, nes, praėjus 15 mėn. nuo pirmojo kvietimo paskelbimo arba 45 proc. projekto įgyvendinimo laiko, patvirtinta paraiškų 17,98 MW, atmesta arba atsiimta – 23,1 MW, o liko įvertinti – 65,02 MW saulės elektrinėms įrengti. Iš viso patvirtinta ir vertinama paraiškų dėl 83 MW arba 69 proc. rodiklio Nr. 202 ir 37 proc. rodiklio Nr. 203 siektinos reikšmės. Pusė vertintų paraiškų buvo atmestos arba pareiškėjai jas atsiėmė. Be to, rodikliui pasiekti būtina įrengti elektrines, tačiau iki 2024-09-30 įrengtų elektrinių pajėgumai sudaro tik 0,96 MW (10 priedas).

54. Siekiant gauti daugiau paraiškų, patikslintas PFSA⁵⁰, papildant galimų pareiškėjų sąrašą gaminančiais vartotojais ir vidutinėmis įmonėmis, o nuo 2024-12-04 – ir didelėmis įmonėmis, nustatant galimybę teikti nereikšmingą (*de minimis*) pagalbą. Matant didelę riziką laiku nepasiekti rodiklio Nr. 202, 2024-11-29 pateiktas siūlymas EK tikslinti rodiklį, pakeičiant jo aprašymą į „Agentūros sprendimais patvirtintos paraiškos dėl 225,38 MW saulės energijos gamybos pajėgumų įrengimo“ ir nukeliant terminą į 2025 m. III ketv.

Paskolos rodikliai Nr. 206 ir Nr. 207 „Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai“, iki 2025 m. II ketv. – 20 proc., iki 2026 m. II ketv. – 100 proc. skirto finansavimo ir rodiklis Nr. 208 „Priemonei skirtų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės investicijų pervedimų užbaigimas“, 2026 m. II ketv.

55. Paskolos juridiniams asmenims saulės ir vėjo elektrinėms įsirengti arba įsigyti teikiamos įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „AEI paskolos juridiniams asmenims“ iš Energijos efektyvumo fondo lėšų, kurias sudaro 549,1 mln. Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 22,6 mln. Eur valstybės biudžeto lėšos.
56. Praėjus 6 mėn. nuo kvietimo paskelbimo arba 22 proc. finansinės priemonės įgyvendinimo laiko, gauta paraiškų 52,8 mln. Eur, patvirtinta – 3,9 mln. Eur, atmesta – 42,4 mln. Eur, vertinama – 6,4 mln. Eur. Patvirtintų ir vertinamų paraiškų vertė sudaro 10,3 mln. Eur arba 9,4 proc. rodiklio Nr. 206 ir 1,9 proc. rodiklio Nr. 207 siektinos reikšmės. 2024-09-30 nebuvo pasirašytų paskolų sutarčių. 2024-10-22 pasirašyta pirmoji 3,9 mln. Eur sutartis. Tai sudaro 3,5 proc. rodiklio Nr. 206 ir 0,7 proc. rodiklio Nr. 207 siektinos reikšmės (10 priedas).
57. Finansinei priemonei įgyvendinti lieka dar 21 mėn., tačiau lygiagrečiai įgyvendinamo projekto „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ rezultatai rodo, kad juridiniai asmenys mažiau, nei tikėtasi, suinteresuoti negrąžintina parama, todėl didelė rizika, kad jie nesidomės ir paskolos gavimu.
58. Valdant rizikas, patikslintos priemonės finansavimo sąlygos⁵¹, papildant galimus pareiškėjus įmonių grupėmis, statančiomis ar įsigyjančiomis elektrines savo reikmėms ir ūkio poreikiams, priemonės įgyvendintoja UAB ILTE kas savaitę atnaujinama priemonės progresą, kuris reguliariai aptariamas su energetikos ministru. 2024-12-06 instituciniam

⁵⁰ Energetikos ministro 2022-09-07 įsakymu Nr. 1-265 patvirtinto 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo 2 priedo pakeitimai: 2024-01-25 Nr. 1-12, 2024-07-08 Nr. 1-131, 2024-12-04 Nr. 1-216.

⁵¹ UAB ILTE generalinio direktoriaus 2024-03-27 įsakymu Nr. B-57 patvirtinto Skatinamosios finansinės priemonės „AEI paskolos juridiniams asmenims“ aprašymo 2024-07-01 įsakymo Nr. B-151 redakcija.

derinimui pateiktas priemonės valstybės pagalbos teikimo schemos pakeitimas dėl saulės ir (ar) vėjo elektrinių parkų vystytojų įtraukimo į galimų pareiškėjų sąrašą⁵².

59. Žemą juridinių asmenų susidomėjimą negrąžintina parama ir paskolomis AEI elektrinėms lemia keletas priežasčių, nurodytų EK siūlant rodiklio Nr. 202 pakeitimą. Viena jų – nuo 2024 m. juridiniams asmenims privaloma grynojo atsiskaitymo apskaita, pagal kurią už iš tinklo suvartotą perteklinę energiją atsiskaitoma su nepriklausomu energijos tiekėju sutarta fiksuota arba kintama elektros energijos kaina⁵³. Dažniausiai perteklinė energija pagaminama esant mažesnėms, o suvartojama iš tinklo esant didesnėms (fiksuotoms arba kintamoms) kainoms. Kita priežastis – dėl ribotų tinklo pajėgumų pareiškėjai turi apmokėti investicijas į jų padidinimą. Dėl šių priežasčių ilgėja elektrinės atsipirkimo laikotarpis.

3.3.4. Kiti rizikingi rodikliai (7 rodikliai)

Rodiklis Nr. 22 „Atlikti ir užbaigti parengiamieji jūrinių vėjo elektrinių plėtros ir infrastruktūros įrengimo darbai“, 2025 m. II ketv.

60. Rodikliui pasiekti liko atlikti 3 iš 9 įsipareigotų darbų, susijusių su pasirengimu jūrinio vėjo elektrinių plėtrai ir infrastruktūros įrengimui. Dar neparengti ir neįgyvendinti jūrinio vėjo elektrinių parkų jungties su sausumos tinklu teritorijų planavimo dokumentai, neatlikti jūrinio vėjo elektrinių parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimai. Pagal sutartis ir papildomus jų susitarimus, jūros dugno tyrimai turėtų būti atlikti iki 2025 m. gegužės mėn., o teritorijų planavimo dokumentai parengti ir įgyvendinti iki 2025-10-24. Šis terminas viršija rodiklio pasiekimo terminą, tačiau dar neviršija mokėjimo prašymo pateikimo termino.
61. EM kreipėsi⁵⁴ į FM dėl šio rodiklio peržiūros ir termino nukėlimo į 2026 m. I ketv., argumentuodama, kad užsitęsė teritorijų planavimo dokumentų derinimas su suinteresuotomis institucijomis, todėl sutartį reikėtų pratęsti iki 2026-01-24. Nuspręsta EK pateikti siūlymą 2025 m., jei vis dar bus aktualu.

Rodiklis Nr. 30 „Įsigaliojęs teisės aktas, kuriuo įdiegiama elektroninė kelių rinkliavos sistema, pagrįsta principais „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“, 2025 m. IV ketv.

62. Rodiklis rizikingas, nes užtruko Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo⁵⁵ įsigaliojimui reikalingos elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos įdiegimas. Įstatymo pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad kelių rinkliavos dydžiai turi būti proporcingi keliais nuvažiuotam atstumui, o ne kelyje praleistam laikui, turėjo įsigalioti

⁵² Energetikos ministro įsakymo „Dėl energetikos ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-390 „Dėl Energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 11 „Privačių ir juridinių asmenų investicijas į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 2024-12-06 Nr. 24-19841.

⁵³ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 20⁴ str.

⁵⁴ Energetikos ministerijos 2024-07-05 raštas Nr. 3-966 „Dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ peržiūros ir keitimo“.

⁵⁵ Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 6¹ straipsniu įstatymas, 2022-12-20 Nr. XIV-1702 redakcija su vėlesniais pakeitimais.

2023-01-01, tačiau šis pakeitimas tikslintas 4 kartus, jo įsigaliojimo terminą nukeliant į 2026-01-01.

63. Nors įstatymo pakeitimo įsigaliojimo terminas neviršija rodiklio termino, tačiau sutartis dėl elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos įdiegimo nesudaryta. Konkursas sistemai įsigyti paskelbtas 2021 m., nustatytas laimėtojas, tačiau antroje vietoje likusi įmonė pateikė ieškinį ir iki šiol vyksta teisiniai ginčai, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, viešųjų pirkimų procedūros sustabdytos.
64. Rodiklio pasiekimo rizikai valdyti nuspręsta elektroninę kelių rinkliavos informacinę sistemą ne kurti, o įsigyti sukurtos sistemos nuomos paslaugas. Nuomos konkursas paskelbtas 2024-08-26, pasiūlymų laukta iki 2024-10-11, tačiau šis pirkimas taip pat apskųstas teismui ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pagal pirkimo dokumentus, konkurso laimėtojas sistemą turėtų pritaikyti Lietuvos rinkai per 6–12 mėn., pagal rinkos konsultacijose dalyvavusių dalyvių vertinimus – per 9–10 mėn. Akivaizdu, kad nepavyks įdiegti sistemos iki įstatymo pakeitime nustatyto termino. Siekiant ją įdiegti iki rodiklio termino, nuomos sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025 m. kovo mėn. arba iki 2025 m. rugsėjo mėn., jeigu sistemą siekiama įdiegti iki mokėjimo prašymo pateikimo termino.
65. Šios sistemos įdiegimas svarbus ne tik siekiant rodiklio, bet ir renkant kelių rinkliavą, kuri yra finansavimo šaltinis valstybinės reikšmės kelių plėtros, atkūrimo ir priežiūros projektams įgyvendinti. Pagal SM pateiktus duomenis, nuo 2023-01-01 vėluojant įdiegti sistemą iki 2026-01-01, nebus gauta 174 mln. Eur.

Rodiklis Nr. 33 „Lietuvoje pagamintų (surinktų) elektrinių autobusų skaičius“, iki 2026 m. II ketv. – 35 vnt.

66. Iki rodiklio termino reikia modifikuoti ne mažiau kaip 25 elektrinius autobusus, kad jie būtų laikomi netaršiais, ir surinkti ne mažiau kaip 10 elektrinių autobusų, tačiau iki 2024-09-30:
 - praėjus 9 mėn. arba 39 proc. pasiūlymų pateikimo laiko, negautas nė vienas PJP dėl autobusų modifikavimo;
 - praėjus 1,5 mėn. arba 30 proc. pasiūlymų pateikimo termino, negautas nė vienas PJP dėl autobusų surinkimo.
67. PFSA rengimas dėl autobusų modifikavimo truko 11 mėn., o dėl autobusų surinkimo – 19 mėn. ilgiau, nei planuota, dėl užsitęsusio PPA pakeitimo, PFSA derinimo su CPVA, FM, Konkurencijos taryba, aptarimo su galimais pareiškėjais.
68. Negaunant PJP, SM 2024-04-24 kreipėsi į Lietuvos keleivių vežimo asociaciją su prašymu paskatinti vežėjus modifikuoti turimus autobusus. 2024-10-16 parengtas PFSA dėl autobusų surinkimo pakeitimo projektas, siekiant paskatinti pareiškėjus dalyvauti priemonėje.

Rodiklis Nr. 45 „Instaliuotas suminis naujų biometano dujų gamybos įrenginių pajėgumas“, iki 2025 m. IV ketv. – 27,1 MW.

69. Energetikos ministro įsakymais⁵⁶ finansavimas skirtas 6 projektams, kuriuos įgyvendinus bus instaliuotas 27,99 MW suminis naujų biometano gamybos įrenginių pajėgumas, reikalingas rodiklio reikšmei pasiekti. Iki 2024-09-30 sudarytos 5 projektų sutartys 25,09 MW pajėgumams įrengti. Vienos projekto sutarties terminas 3 mėn. viršija rodiklio terminą. CPVA 2024-12-05 informavo EM, kad likusi 1 projekto sutartis dėl 2,9 MW pajėgumų nebus sudaroma⁵⁷. Taigi, pagal įgyvendinamus projektus trūksta 2,01 MW iki rodiklio siektinos reikšmės.
70. Įgyvendinant projektus, sudarytos 3 gamybos įrenginių statybos sutartys 11,56 MW pajėgumams įrengti. Kitos sutartys nesudarytos ir viešieji pirkimai nepradėti, o veiklos susitarime su EK numatyta gamybos įrenginių statybos viešojo pirkimo procedūras pabaigti iki 2023-09-30 (11 priedas). Sudarytų gamybos įrenginių statybos sutarčių trukmė yra nuo 15 iki 22 mėn., todėl yra rizika, kad likę gamybos pajėgumai nebus sukurti ne tik iki rodiklio termino, bet ir iki mokėjimo prašymo pateikimo termino 2026-06-30.
71. Vėlavimą lėmė užtrukęs projektų vykdytojų atrankos ir sutarčių su jais sudarymo etapas, kurį planuota baigti iki 2023 m. kovo mėn. Pirmu kvietimu gauta nepakankamai PJP, o gauti – ne visi tinkami. Vienas pareiškėjas apskundė CPVA sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai, o viena projekto sutartis buvo nutraukta pareiškėjui nepateikus pasirašytos paskolos sutarties dėl nuosavos dalies lėšų kredito suteikimo. Dėl to reikėjo skelbti antrą kvietimą.
72. EM patikslino PFSA⁵⁸, nukeldama projektų įgyvendinimo terminą į 2026-03-31, kuris viršija rodiklio terminą, bet neviršija mokėjimo prašymo termino. Be to, EM pasiūlė⁵⁹ FM tikslinti rodiklį, nukeliant jo terminą į 2026 m. II ketv. Nuspręsta EK pateikti siūlymą 2025 m., jei vis dar bus aktualu.

Rodikliai Nr. 74 „Pateikti lietuvių kalbos išteklių, skirti DI ir inovatyvioms technologijoms plėtoti“ ir Nr. 75 „Įgyvendinti lietuvių kalbos išteklių, reikalingų kuriant DI sprendimus, kūrimo projektai“, iki 2026 m. II ketv. – 5 grupės išteklių.

73. Iki 2024-09-30 nesudarytos 6 iš 16 projektų sutarčių. PJP gauti 2024 m. spalio mėn. viduryje, tačiau likusio 20,5 mėn. laiko iki rodiklio pasiekimo termino gali nepakakti projektams įgyvendinti. Remiantis ankstesne praktika, 10 vykdomų projektų PJP buvo vertinami mažiausiai 2,5 mėn., sudarytų projektų sutarčių trukmė – vidutiniškai 20 mėn. Taigi, įžvelgiama rizika dėl 6 projektų įgyvendinimo iki rodiklio termino, tačiau jie galėtų būti įgyvendinti iki galutinio Plano reformų ir investicijų įgyvendinimo termino – 2026-08-31.

⁵⁶ Energetikos ministro įsakymai „Dėl finansavimo skyrimo“: 2023-02-22 Nr. 1-50, 2024-03-21 Nr. 1-58 ir 2024-08-21 Nr. 1-153.

⁵⁷ Centrinės projektų valdymo agentūros 2024-12-04 raštas Nr. 2024/2-15687 „Dėl projekto Nr. 03-016-K-0001 „Biometano gamybos įrenginių statyba Pasvalio rajone“ sutarties nesudarymo.

⁵⁸ Energetikos ministro įsakymai: 2024-01-15 Nr. 1-2, 4 p., 2024-03-29 Nr. 1-68, 3 p.

⁵⁹ Energetikos ministerijos 2024-07-05 raštas Nr. 3-966 „Dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ peržiūros ir keitimo“.

74. Iki 23 mėn. ilgiau, nei planuota, užtruko PFSA rengimas⁶⁰. Šis procesas užsitęsė EIM ieškant optimaliausių būdų rodikliams pasiekti. Derėtasi su EK dėl rodiklių tikslinimo Plane, pasitelkti ekspertai, kurie vertino projektų aktualumą, įgyvendinimo terminus, biudžetą ir priėmė sprendimus dėl tam tikrų projektų atsisakymo, naujų lietuvių kalbos išteklių kūrimo, sąmatos perskaičiavimo ar projektų techninių aprašymų tikslinimo, sumažinant ar kitaip tikslinant reikalavimus ištekliams. 2023 m. keičiant Planą, patikslintas rodiklio aprašymas, sujungiant 23 projektus į 5 grupes ir 6 mėn. pratęsiant rodiklio terminą.

Rodiklis Nr. 123 „Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai“, iki 2025 m. IV ketv. – 5 projektai.

75. Rodiklis rizikingas, nes:
- iki rodiklio termino likus 15 mėn., projektų sutartys su kolegijomis nesudarytos, o pagal EK pateiktus argumentus, prašant rodiklio termino pratęsimo 2023 m., ši trukmė nepakankama projektams įgyvendinti;
 - 3 iš 5 planuojami kolegijų pertvarkos projektai vyksta ne pagal ekspertų parengtas tinklo optimizavimo rekomendacijas⁶¹. Nors Plane nenurodyta, kad kolegijų pertvarka turėtų vykti pagal šias rekomendacijas, tačiau galima rizika, kad EK dėl šio neatitikimo įvertins rodiklį kaip pasiektą ne visos apimties.
76. Užtruko PFSA parengimas, nes reikėjo priimti su kolegijų reorganizavimu susijusius teisės aktus⁶², kurių rengimas pareikalavo daugiau laiko, nei planuota. Rodiklio rizikai valdyti ŠMSM ėmėsi veiksmų: 2024-09-30 patikslintas PFSA, nukeliant projekto veiklų įgyvendinimo terminą iš 2025-10-31 į 2025-12-31, sudarytas su kolegijų tinklo pertvarka susijusių projektų priežiūros komitetas⁶³. Bendradarbiaujama su EK atstovais, siekiant pagrįsti, kad planuojami įgyvendinti projektai atitinka rodiklio aprašyme nustatytus reikalavimus.

Atitikties audito departamento vadovė

Emilija Jasaitienė

Atitikties audito departamento auditorė-grupės vadovė

Augustė Purlienė

⁶⁰ Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-07-12 įsakymu Nr. 4-869 patvirtinto 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo pakeitimai, patvirtinti įsakymais 2024-02-20 Nr. 4-84, 2024-04-11 Nr. 4-201 ir 2024-08-22 Nr. 4-443.

⁶¹ Valstybinių kolegijų veiklos analizė, II dalis: Tinklo optimizavimo rekomendacijos, 2022 m.

⁶² Vyriausybės 2023-01-18 nutarimu Nr. 46 patvirtintas 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų planas ir 2023-07-12 nutarimais Nr. 565–571 patvirtintos šio plano įgyvendinimo priemonės.

⁶³ Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024-05-30 įsakymas Nr. V-632 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ aprašo veiklos „Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius“ projektų priežiūros komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“.

PRIEDAI

Vertinimo ataskaitos
„Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo plano rodiklių
pasiekimo rizikų valdymas“

1 priedas

Santrumpos ir sąvokos

AEI – atsinaujinantys energijos ištekliai.

APVA – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

CPVA – Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

DI – dirbtinis intelektas.

EIM – Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

FM – Finansų ministerija.

IRT – informatikos ir ryšių technologijos.

MTEPI – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra ir inovacijos.

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

MTTP – moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.

MVĮ – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

PFSA – projektų finansavimo sąlygų aprašas.

PĮP – projekto įgyvendinimo planas.

Planas – Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas.

PPA – pažangos priemonės aprašas.

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija.

SM – Susisiekimo ministerija.

ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

VBAMS – Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema.

Vertinimo ataskaitos
„Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo plano rodiklių
pasiekimo rizikų valdymas“
2 priedas

Vertinimo apimtis ir metodai

Vertinimo apimtis

Vertinimo tikslas – įvertinti pažangą įgyvendinant Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir rizikas, siekiant vėliausio plano laikotarpio rodiklių.

Pagrindiniai vertinimo klausimai:

- ✓ Nustatyti rodiklių pasiekimo mastą: kiek rodiklių pasiekta, kiek vėluojama pasiekti ir kiek rodiklių yra didelės rizikos.
- ✓ Nustatyti, kiek mokėjimo prašymų už pasiektus rodiklius turėjo būti pateikta EK pagal sutartą orientacinį grafiką ir kiek faktiškai jų buvo pateikta.
- ✓ Nustatyti už rodiklių pasiekimą gautą, rodiklių pasiekimui panaudotą finansavimą ir galimą jo trūkumą pradėtoms investicijoms pabaigti, atsiliekant nuo planuoto grafiko.
- ✓ Išanalizuoti, ar kyla rizikos tinkamai ir laiku pasiekti rodiklius pagal Plane nustatytą rodiklio aprašymą ir orientacinį pasiekimo terminą.
- ✓ Išanalizuoti, kokių priemonių imasi ministerijos, siekdamos, kad rizikingi rodikliai būtų pasiekti laiku ir tinkamai pagal Planą.

Vertinimo subjektai:

- ✓ Finansų ministerija, kuri yra Plano vadovaujanti institucija.
- ✓ Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kurios atsakingos už rodiklių pasiekimą.

Vertinamas laikotarpis: Plano įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021-07-28 iki 2024-09-30. Siekdami įvertinti pokyčius, naudojome ir vėlesnių laikotarpių gautus duomenis.

Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai

Ataskaitos skyrius / poskyris	Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
1. Dėl 6 nepasiektų rodiklių 9 mėn. vėluojama pateikti 477,5 mln. Eur mokėjimo prašymą	<p><u>Dokumentų peržiūra</u></p> <p>Nagrinėjome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė; • EK pateiktą planą „Naujos kartos Lietuva“; • ES Tarybos patvirtintą Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą su jo pakeitimais, įskaitant EK atliktus jo vertinimus; 	Nustatyti rodiklių pasiekimo mastą: kiek rodiklių pasiekta, kiek vėluojama pasiekti. Taip pat nustatyti, kiek mokėjimo prašymų už pasiektus rodiklius turėjo būti pateikta EK pagal sutartą orientacinį grafiką

Ataskaitos skyrius / poskyris	Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
	<ul style="list-style-type: none"> • veiklos susitarimą su EK ir jo pakeitimus; • pateiktus mokėjimo prašymus EK ir jos vertinimus bei sprendimus, susijusius su rodiklių pasiekimu ir finansavimo skyrimu, finansinių sankcijų taikymu; • metodiką, pagal kurią nustatomas mokėjimo sustabdymas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą. <p><u>Duomenų analizė</u> Analizavome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rodiklių pasiekimo veiksmy planus; • CPVA parengtas rodiklių rizikų vertinimo ataskaitas, pateiktas FM; • FM parengtas ir ministerijoms pateiktas ataskaitas apie artimiausių mokėjimo prašymų rodiklių rizikingumą ir vėlesnių mokėjimo prašymų didelės rizikos rodiklius; • CPVA duomenis apie pasiektus rodiklius, už kuriuos dar neatsiskaityta EK. <p><u>Palyginamoji analizė</u> taikyta siekiant įvertinti Lietuvos Plano įgyvendinimo pažangos lygį kitų ES šalių kontekste.</p> <p><u>Pokalbiai su</u> CPVA ir FM atstovais.</p>	<p>ir kiek faktiškai jų buvo pateikta.</p>
<p>2. Sudarytos sutartys dėl 93 proc. investicijų, tačiau jų įgyvendinimo išlaidos nesiekia 30 proc. plano</p>	<p><u>Dokumentų peržiūra</u> Nagrinėjome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė; • ES Tarybos patvirtintą Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą su jo pakeitimais, įskaitant EK atliktus jo vertinimus; • veiklos susitarimą, finansavimo susitarimą ir paskolos susitarimą su EK; • pateiktus mokėjimo prašymus EK ir jos vertinimus bei sprendimus, susijusius su rodiklių pasiekimu ir finansavimo skyrimu, finansinių sankcijų taikymu; • su paskolos planuojamu panaudojimu susijusius dokumentus: Inovacijų skatinimo fondo sutarties ir Energijos efektyvumo fondo sutarties patikslinimus, Vyriausybės nutarimą dėl UAB ILTE įstatinio kapitalo didinimo. <p><u>Duomenų analizė</u> Analizavome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPVA projektų registrą apie paskelbtus kvietimus teikti PJP, pateiktus ir vertinamus PJP, sudarytas projektų sutartis; • VBAMS duomenis apie Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės pinigus, suplanuotus ir faktinius išmokėjimus projektų vykdytojams 2021–2024 m.; • išlaidų planus 2021–2026 m., pateiktus EK prieš tvirtinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir jį keičiant 2023 m. <p><u>Palyginamoji analizė</u> taikyta analizuojant išlaidų ir pinigų plano įvykdymą. Išlaidų planas nustatytas remiantis išlaidų pagrindimo lentelėmis, pateiktomis EK prieš tvirtinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir jį tikslinant 2023 m. Faktinės išlaidos yra projektų vykdytojams pervesti pinigai. Pinigų planas nustatytas remiantis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytais paramos dalių sumomis, Veiklos susitarime su EK nustatytu orientaciniu mokėjimo prašymų pateikimo tvarkaraščiu, Reglamento</p>	<p>Nustatyti už rodiklių pasiekimą gautą, rodiklių pasiekimui panaudotą finansavimą ir galimą jo trūkumą pradėtoms investicijoms pabaigti, atsiliekant nuo planuoto grafiko.</p>

Ataskaitos skyrius / poskyris	Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
	<p>nuostatomis, susijusiomis su mokėjimo prašymų vertinimo procedūromis ir įvykusia praktika, EK vertinant mokėjimo prašymus.</p> <p><u>Pokalbiai su CPVA ir FM atstovais.</u></p>	
<p>3. Ministerijos imasi veiksmų rizikoms valdyti, tačiau pasiekta rodiklių būklė rodo, kad planuoti pokyčiai bus įvykdyti ne visa apimtimi</p>	<p>Atsirinkome įvertinti 45 iš 106 arba 42 proc. rodiklių, kurių orientacinis terminas pagal Planą yra 2025–2026 m. Toliau pateikiami duomenų rinkimo ir vertinimo metodai, taikyti vertinant kiekvieno pasirinkto rodiklio pasiekimo laiku ir tinkamai pagal Planą riziką.</p> <p><u>Dokumentų peržiūra</u></p> <p>Nagrinėjome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EK pateiktą planą „Naujos kartos Lietuva“; • ES Tarybos patvirtintą Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą su jo pakeitimais, įskaitant EK atliktus jo vertinimus; • veiklos susitarimą su EK ir jo pakeitimus; • PPA, PFSA ir kitus teisės aktus, susijusius su kiekvieno rodiklio pasiekimu; • atliktas analizes, vertinimus, studijas, susijusias su kiekvieno rodiklio pasiekimu. <p><u>Duomenų analizė</u></p> <p>Analizavome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rodiklių pasiekimo veiksmų planus; • CPVA parengtas rodiklių rizikų vertinimo ataskaitas, pateiktas FM; • FM parengtas ir ministerijoms pateiktas ataskaitas apie artimiausių mokėjimo prašymų rodiklių rizikingumą ir vėlesnių mokėjimo prašymų didelės rizikos rodiklius; • CPVA duomenis apie pasiektus rodiklius, už kuriuos dar neatsiskaityta EK; • CPVA projektų registrą apie paskelbtus kvietimus teikti PJP, pateiktus ir vertinamus PJP, sudarytas projektų sutartis, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, projektų vykdytojams išmokėtus pinigus; • su projekto vykdymo būklės įvertinimu susijusių informaciją, gautą iš projektų vykdytojų, CPVA arba ministerijų: PJP, investicijų projektus, projektų įgyvendinimo grafikus, paskelbtus kvietimus teikti paraiškas, gautas paraiškas, pavirtintas arba atmetas paraiškas, sudarytas finansavimo skyrimo sutartis, viešųjų pirkimų sutartis arba vykdomus viešuosius pirkimus, išmokėtus pinigus; • EK pateiktus siūlymus keisti rodiklio turinį ir pasiekimo laiką; • ministerijų pateiktus siūlymus FM keisti rodiklio turinį ir pasiekimo laiką. <p><u>Pokalbiai su CPVA, ministerijomis ir projektų vykdytojais.</u></p>	<p>Išanalizuoti, ar kyla rizikos tinkamai ir laiku pasiekti rodiklius pagal Planą nustatytą rodiklio aprašymą ir orientacinį pasiekimo terminą. Taip pat išanalizuoti, kokių priemonių imasi ministerijos, siekdamas, kad rizikingi rodikliai būtų pasiekti laiku ir tinkamai pagal Planą.</p>

Vertinimo ataskaitos
„Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo plano rodiklių pasiekimo rizikų valdymas“
3 priedas

Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimo būklė

		NEGRAŽINTINOS PARAMOS RODIKLIAI																													
Mokėjimo pateikimo terminas	Paramos prašymo dalys	2024-09-30										2024-11-26																			
		Rodiklių Nr.										Rodiklių Nr.																			
2022 m. IV ketv.	I	21	28	29	37	43	44	70	83	84	89											21	28	29	37	43	44	70	83	84	89
		91	93	94	95	105	110	112	116	126	127											91	93	94	95	105	110	112	116	126	127
		128	132	142	144	146	152	155	168	179	182											128	132	142	144	146	152	155	168	179	182
		185	186	188																		185	186	188							
2023 m. IV ketv.	II	1	2	3	27	50	57	60a	64	68	69											1	2	3	27	50	57	60a	64	68	69
		76	80	92	99	106	107	115	129	151	156											76	80	92	99	106	107	115	129	151	156
		158	180	184	201																	158	180	184	201						
2024 m. I ketv.	III	4	5	6	18	48	58	108	121	122	143											4	5	6	18	48	58	108	121	122	143
		145	147	153	154	177	183															145	147	153	154	177	183				
2024 m. IV ketv.	IV	15	67	79	81	103	104	124	139	148	149											15	67	79	81	103	104	124	139	148	149
		150	157	159	160	169	181															150	157	159	160	169	181				
2025 m. II ketv.	V	10	25	34	40	55	62	65	71	102	111											10	25	34	40	55	62	65	71	102	111
		125	135	148a	162	172	175	197	198	202													125	135	148a	162	172	175	197	198	202
2025 m. IV ketv.	VI	8	11	16	22	31	35	38	51	53	96											8	11	16	22	31	35	38	51	53	96
		176	190																				176	190							
2026 m. II ketv.	VII	7	9	12	13	14	17	19	20	30	41											7	9	12	13	14	17	19	20	30	41
		45	52	72	78	82	85	123	130	131	133											45	52	72	78	82	85	123	130	131	133
		141	163	164	170	171	173	174	187	199													141	163	164	170	171	173	174	187	199
2026 m. III ketv.	VIII	13a	26	32	33	36	39	42	46	47	54											13a	26	32	33	36	39	42	46	47	54
		56	59	60b	60c	61	63	66	73	74	75											56	59	60b	60c	61	63	66	73	74	75
		77	88	90	97	98	100	101	109	113	114											77	88	90	97	98	100	101	109	113	114
		117	118	119	120	134	136	137	138	161	165											117	118	119	120	134	136	137	138	161	165
		166	167	178	189	191	195	196	200	203													166	167	178	189	191	195	196	200	203

PASKOLOS RODIKLIAI													
Mokėjimo prašymo pateikimo terminas	Paramos dalys	2024-09-30					2024-11-26						
		Rodiklių Nr.					Rodiklių Nr.						
2023 m. IV ketv.	I	58a	137a	180a	192	194	58a	137a	180a	192	194		
2024 m. IV ketv.	II	58b	180c	204	205		58b	180c	204	205			
2025 m. IV ketv.	III	137b	137c	137d	180d	206	137b	137c	137d	180d	206		
2026 m. III ketv.	IV	180b	193	137e	137f	207	208	180b	193	137e	137f	207	208
		Pasiekti rodikliai ir EK pateiktas mokėjimo prašymas.											
		Rodiklis pasiektas ne visa apimtimi su finansine korekcija.											
		Pasiekti rodikliai, bet mokėjimo prašymas EK dar nepateiktas.											
		Siekiami rodikliai											

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK duomenis, Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos pateiktus duomenis.

Vertinimo ataskaitos

„Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimo rizikų valdymas“

4 priedas

Vertinti Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodikliai

Vertinto rodiklio Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio siektina reikšmė	Orientacinis rodiklio pasiekimo terminas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą	Orientacinis mokėjimo prašymo pateikimo terminas, su kuriuo deklaruojamas rodiklio pasiekimas	Už rodiklio pasiekimą atsakinga ministerija	Ar rodiklis didelės rizikos pagal		Ar, auditorių vertinimu, rodiklis rizikingas?
						CPVA	FM	
Nr. 7	Sukurtas pažangios terapijos centras	Sukurtas pažangios terapijos centras	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	SAM	Ne	Ne	Taip
Nr. 11	Sveikatos priežiūros įstaigų, įtrauktų į veiklos rezultatų rodiklių rinkiniu grindžiamą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos švieslentę, dalis	100 %	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	SAM	Ne	Ne	Ne
Nr. 14	Sveikatos priežiūros specialistų, kurių licencija įregistruota ir jos priežiūra vykdoma skaitmeniniu būdu, dalis	50 %	2026 m. I ketv.	2026 m. III ketv.	SAM	Taip*	Ne	Ne
Nr. 19	Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius	5 vnt.	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	SAM	Ne	Ne	Taip
Nr. 20	Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius	7 vnt.	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	SAM	Ne	Ne	Taip
Nr. 22	Atlikti ir užbaigti parengiamieji jūrinio vėjo elektrinių plėtros ir infrastruktūros įrengimo darbai	Atitinkamų institucijų užbaigti parengiamieji darbai	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	EM	Taip	Taip	Taip
Nr. 25	Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh)	7,6 MWh	2025 m. I ketv.	2025 m. II ketv.	EM	Taip	Taip	Taip
Nr. 26	Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh)	15,2 MWh	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	EM	Ne	Ne	Ne
Nr. 30	Įsigaliojęs teisės aktas, kuriuo įdiegiama elektroninė kelių rinkliavos sistema, pagrįsta principais „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“	Įsigalioję teisės aktai	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	SM	Taip	Taip	Taip
Nr. 31	Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius	6 625 vnt.	2025 m. II ketv.	2025 m. III ketv.	SM	Taip	Taip	Taip

Vertinto rodiklio Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio siektina reikšmė	Orientacinis rodiklio pasiekimo terminas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą	Orientacinis mokėjimo prašymo pateikimo terminas, su kuriuo deklaruojamas rodiklio pasiekimas	Už rodiklio pasiekimą atsakinga ministerija	Ar rodiklis didelės rizikos pagal		Ar, auditorių vertinimu, rodiklis rizikingas?
						CPVA	FM	
Nr. 32	Išgytų ir Lietuvoje registruotų netaaršių transporto priemonių skaičius	13 250 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	SM	Taip	Taip	Taip
Nr. 33	Lietuvoje pagamintų (surinktų) ir modifikuotų elektrinių autobusų skaičius	35 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	SM	Taip	Taip	Taip
Nr. 35	Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų)	115 vnt.	2025 m. II ketv.	2025 m. III ketv.	SM	Taip	Taip	Taip
Nr. 36	Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų)	260 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	SM	Taip*	Ne	Ne
Nr. 38	Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo priegios ir labai didelės galios įkrovimo priegios kroviniui transportui ir autobusams	2 770 vnt.	2025 m. II ketv.	2025 m. III ketv.	SM	Taip	Taip	Taip
Nr. 39	Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo priegios ir labai didelės galios įkrovimo priegios kroviniui transportui ir (arba) autobusams	5 540 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	SM	Taip	Taip	Taip
Nr. 40	Pradėjusios veikti privačios įkrovimo priegios	26 600 vnt.	2025 m. I ketv.	2025 m. II ketv.	EM	Taip	Taip	Taip
Nr. 41	Pradėjusios veikti privačios įkrovimo priegios	53 200 vnt.	2026 m. I ketv.	2026 m. III ketv.	EM	Taip	Taip	Taip
Nr. 45	Instaliuotas suminis naujų biometano dujų gamybos įrenginių pajėgumas, MW	27,1 MW	2025 m. IV ketv.	2026 m. I ketv.	EM	Taip	Ne	Taip
Nr. 74	Pateikti lietuvių kalbos išteklių, skirti DI ir inovatyvioms technologijoms plėtoti	Viešai prieinami lietuvių kalbos išteklių, skirti DI sprendimams plėtoti	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	EIM	Taip	Ne	Taip
Nr. 75	Įgyvendinti lietuvių kalbos išteklių, reikalingų DI sprendimams plėtoti, kūrimo projektai	5 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	EIM	Taip	Ne	Taip
Nr. 82	Pradėjęs veikti IRT kompetencijų centras	1 vnt.	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	EIM	Taip	Ne	Taip
Nr. 113	Užregistruotos naujos / atnaujintos profesinio mokymo programos, kurios yra prieinamos mokymo paslaugų teikėjams	95 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	ŠMSM	Ne	Ne	Ne
Nr. 114	Profesijos mokytojai ir (arba) meistrai, dalyvaujantys pameistrių ir praktikas atliekančių mokinių mokymo procese	1 000 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	ŠMSM	Taip	Ne	Ne

Vertinto rodiklio Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio siektina reikšmė	Orientacinis rodiklio pasiekimo terminas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą	Orientacinis mokėjimo prašymo pateikimo terminas, su kuriuo deklaruojamas rodiklio pasiekimas	Už rodiklio pasiekimą atsakinga ministerija	Ar rodiklis didelės rizikos pagal		Ar, auditorių vertinimu, rodiklis rizikingas?
						CPVA	FM	
Nr. 123	Jgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai	5 vnt.	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	ŠMSM	Taip	Taip	Taip
Nr. 130	Jgyvendintų inovatyvių projektų skaičius	155 vnt.	2026 m. I ketv.	2026 m. III ketv.	EIM	Ne	Ne	Ne
Nr. 131	Investicijas gavusių startuolių skaičius	172 vnt.	2026 m. I ketv.	2026 m. III ketv.	EIM	Taip	Taip	Taip
Nr. 133	Veikiančių kompetencijos centrų skaičius	2 vnt.	2025 m. IV ketv.	2026 m. I ketv.	EIM ir ŠMSM	Taip	Taip	Taip
Nr. 134	Trijose misijomis grįstose mokslo ir inovacijų programose jgyvendinti MTEP projektai	21 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	EIM ir ŠMSM	Taip*	Ne	Ne
Nr. 135	Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažųjų ir vidutinių įmonių potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams	200 vnt.	2025 m. I ketv.	2025 m. II ketv.	ŠMSM	Taip	Ne	Taip
Nr. 136	Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų (MSI) ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MV) potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams	477 vnt.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	ŠMSM	Taip	Ne	Taip
Nr. 137c	INVEGOS** paskelbtas kvietimas teikti paraiškas	Paskelbtas kvietimas	2025 m. I ketv.	2025 m. IV ketv.	EIM	Ne	Ne	Ne
Nr. 137d	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai	20 %	2025 m. III ketv.	2025 m. IV ketv.	EIM	Ne	Ne	Ne
Nr. 137e	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai	100 %	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	EIM	Ne	Ne	Ne
Nr. 137f	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės investicijos užbaigimas	Sertifikatas arba kitas lygiavertis pervedimo įrodymas	2026 m. II ketv.	2026 III m. ketv.	EIM	Ne	Ne	Ne
Nr. 180b	Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) katalogo išplėtimas	105 vnt.	2025 m. IV ketv.	2026 m. III ketv.	EIM	Ne	Ne	Taip
Nr. 189	Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas	1 325 paramą gavusių dalyvių	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	SADM	Taip*	Ne	Ne
Nr. 190	Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas	14 985 paramą gavusių dalyvių	2025 m. II ketv.	2025 m. III ketv.	SADM	Ne	Ne	Taip
Nr. 191	Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas	19 350 paramą gavusių dalyvių	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	SADM	Ne	Ne	Taip

Vertinto rodiklio Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio siektina reikšmė	Orientacinis rodiklio pasiekimo terminas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą	Orientacinis mokėjimo prašymo pateikimo terminas, su kuriuo deklaruojamas rodiklio pasiekimas	Už rodiklio pasiekimą atsakinga ministerija	Ar rodiklis didelės rizikos pagal		Ar, auditorių vertinimu, rodiklis rizikingas?
						CPVA	FM	
Nr. 193	Savivaldybių patvirtintos užimtumo rėmimo programos	80 %	2025 m. IV ketv.	2026 m. III ketv.	SADM	Ne	Ne	Ne
Nr. 202	Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW)	120 MW	2025 m. I ketv.	2025 m. II ketv.	EM	Taip	Taip	Taip
Nr. 203	Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW)	225 MW	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	EM	Ne	Ne	Taip
Nr. 206	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai	25 %	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	EM	Ne	Ne	Taip
Nr. 207	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai	100 %	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	EM	Ne	Ne	Taip
Nr. 208	Priemonei skirtų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės investicijų pervedimų užbaigimas	Sertifikatas arba kitas lygiavertis pervedimo įrodymas	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	EM	Ne	Ne	Taip

* Centrinės projektų valdymo agentūros vertinimu, rodiklis yra didelės rizikos dėl rodiklio veiksmų plane nustatyto griežto algoritmo skaičiuojant rodiklio vėlavimą. Jei rodiklio veiksmų plano etapo įgyvendinimas vėluoja 15 proc., rodiklis tampa didelės rizikos, tačiau šis vėlavimas nėra reikšmingas rodiklio pasiekimui.

** Nuo 2024-08-30 – UAB ILTE.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK duomenis, Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos pateiktus duomenis

Vertinimo ataskaitos
 „Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
 didinimo plano rodiklių pasiekimo rizikų valdymas“
 5 priedas

Nustatyti rizikingi rodikliai, jų pasiekimo būklė iki 2024-09-30, numatoma jų pasiekimo reikšmė ir terminas

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
Ataskaitos poskyris 3.1.1 Taikytos rizikos valdymo priemonės nepadėjo pasiekti reformos „Judame neteršdami aplinkos“ tikslų (6 rodikliai)									
31	Investicinis	Negražintina parama	Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netauršų transporto priemonių skaičius	6 625: - 6 125 lengvųjų transporto priemonių - 500 sunkiasvorių transporto priemonių	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	Patvirtinta paraiškų 18 (0,29 proc.) lengvųjų ir sudaryta projektų sutarčių 21 sunkiasvorei transporto priemonei.	Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 535 (8,7 proc.) lengvųjų Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: papildomai įsigytų ir registruotų netauršų transporto priemonių skaičius nepadidės, todėl siūloma panaikinti rodiklį.	2025 m. II ketv.
32	Investicinis	Negražintina parama	Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netauršų transporto priemonių skaičius	13 250: - 12 250 lengvųjų transporto priemonių - 1 000 sunkiasvorių transporto priemonių	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	Patvirtinta paraiškų 18 (0,29 proc.) lengvųjų ir sudaryta projektų sutarčių 21 sunkiasvorei transporto priemonei.	Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 6 767 (55,2 proc.) lengvųjų Pagal APVA prognozę: 154 (1,3 proc.) lengvųjų Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 2 600 (21,2 proc.) lengvųjų ir 1 000 (100 proc.) sunkiasvorių.	2026 m. II ketv.
38	Investicinis	Negražintina parama	Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo priemonės ir labai didelės galios įkrovimo priemonės	2 770: - 2 620 lengviesiems elektromobiliams - 150 didelės galios kroviniams elektromobiliams	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	Patvirtinta paraiškų 432 (16,5 proc.) lengviesiems 0 kroviniams	Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 16 (0,6 proc.) lengviesiems Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą:	2025 m. II ketv.

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
			krovininiam transportui ir autobusams					pasirašytos finansavimo sutartys dėl 4 650 viešai prieinamų įkrovimo prieigų iki 2025 m. IV ketv.	
39	Investicinis	Negražintina parama	Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams	5 540: - 5 240 lengviesiems elektromobiliams - 300 didelės galios krovininiams elektromobiliams	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	Patvirtinta paraiškų 432 (8,2 proc.) lengviesiems 0 krovininiams	Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 1 856 (35,4 proc.) lengviesiems Pagal APVA prognozę: 757 (14,4 proc.) lengviesiems Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 4 350 (83 proc.) lengviesiems ir 300 (100 proc.) krovininiams.	2026 m. II ketv.
40	Investicinis	Negražintina parama	Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos	26 600	2025 m. I ketv.	2025 m. II ketv.	Patvirtinta apmokėti 2 238 (8,4 proc.)	Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 6 767 (25,4 proc.) Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: patvirtintas finansavimas 18 910 įkrovimo prieigų sukūrimui iki 2025 m. IV ketv.	2025 m. I ketv.
41	Investicinis	Negražintina parama	Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos	53 200	2026 m. I ketv.	2026 m. II ketv.	Patvirtinta apmokėti 2 238 (4,2 proc.)	Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 19 978 (37,6 proc.) Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 18 910 (35,5 proc.) iki 2026 m. II ketv.	2026 m. I ketv.

Ataskaitos poskyris 3.1.2. Nepavykus rodiklių pasiekti visa apimtimi, deramasi su Europos Komisija dėl rodiklių tikslinimo (6 rodikliai)

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
131	Investicinis	Negražintina parama	Investicijas gavusių startuolių skaičius	172: - 32 startuoliai, remiami Inovacijų skatinimo fondo; - 60 startuolių, remiamų pagal specializuotą programą „Accelerator“; - 60 startuolių, remiamų paslaugomis arba investicijomis pagal tarptautinę programą „Accelerator“; - 20 startuolių, gavusių investicijas iš Europos kosmoso agentūros inkubatoriaus.	2026 m. I ketv.	2026 m. II ketv.	39: 22 (69 proc.) startuoliai, paremti Inovacijų skatinimo fondo 0 startuolių, paremtų pagal specializuotą programą 10 (17 proc.) startuolių, paremtų pagal tarptautinę programą Sudarytos 7 sutartys (35 proc.) su startuoliais dėl jų inkubavimo	Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 15 (75 proc.) startuolių, gavusių investicijas iš Europos kosmoso agentūros inkubatoriaus.	2026 m. I ketv.
135	Investicinis	Negražintina parama	Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažųjų ir vidutinių įmonių potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams	≥ 200: a) ≥ 40 – galimybių studijų, skirtų potencialiems paramos gavėjams, siekiantiems dalyvauti programos „Europos horizontas“ veiklose, rengimui remti; b) ≥ 160 konsultavimo / ekspertų paslaugų siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose.	2025 m. I ketv.	2025 m. II ketv.	54: a) 120 (300 proc.) galimybių studijų b) 14 (8,8 proc.) individualių konsultacijų	Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 200: a) 150 (375 proc.) galimybių studijų b) 10 (6,25 proc.) individualių konsultacijų c) papildyti nauja reikšme - ≥ 40 narysčių tarptautiniuose tinkluose	2025 m. I ketv.

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
136	Investicinis	Negražintina parama	Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų (MSI) ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams	<p>≥ 477:</p> <p>a) ≥ 90 – galimybių studijų, skirtų potencialiems paramos gavėjams, siekiantiems dalyvauti programos „Europos horizontas“ veiklose, rengimui remti;</p> <p>b) ≥ 32 – Europos mokslinių tyrimų erdvės ir programos „Europos horizontas“ projektų įgyvendinimo pajėgumams remti;</p> <p>c) ≥ 24 tarpvalstybinių ES koordinavimo iniciatyvų projektai;</p> <p>d) ≥ 24 projektai – mokslo ir studijų institucijų ir MVĮ projektai, teigiamai įvertinti pagal programą „Europos horizontas“, bet dėl biudžeto trūkumo negavę finansavimo (įskaitant projektus, kuriems suteiktas pažangumo ženklas);</p> <p>e) ≥ 27 grupinės konsultacijos, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose;</p> <p>f) ≥ 240 konsultavimo / ekspertų paslaugų, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose;</p> <p>g) ≥ 40 narysčių tarptautiniuose tinkluose.</p>	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	<p>189:</p> <p>a) 120 (133 proc.) galimybių studijų</p> <p>b) 26 (81 proc.) projektai</p> <p>c) 0 projektų</p> <p>d) 7 (29 proc.) projektai. Daugiau nebus paremta</p> <p>e) 12 (50 proc.) grupinių konsultacijų</p> <p>f) 14 (5,8 proc.) individualių konsultacijų</p> <p>g) 55 (138 proc.) narysčių tarptautiniuose tinkluose</p>	<p>Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą:</p> <p>475:</p> <p>a) 239 (266 proc.) galimybių studijų</p> <p>b) 32 (100 proc.) projektai</p> <p>c) 4 (17 proc.) projektai (nepatenka į 475 projektų skaičių)</p> <p>d) 7 (29 proc.) projektai. Daugiau nebus paremta</p> <p>e) ir f) 65 (24 proc.) grupinių ir individualių konsultacijų</p> <p>g) 70 (175 proc.) narysčių tarptautiniuose tinkluose</p> <p>h) papildyti nauja veikla – ne mažiau kaip 62 laboratorijų ir MTTP infrastruktūros įrangos atnaujinimo projektų.</p>	2026 m. II ketv.
180b	Reforminis	Paskola	Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) katalogo išplėtimas	Nuo 83 iki 105 modulių, t. y. CPO elektroninis katalogas turi būti išplėstas, įtraukiant bent 22 naujus modulius, palyginti su 2022 m. pabaiga.	2025 m. IV ketv.	2026 m. III ketv.	16	CPO suplanuota sukurti 20	2025 m. IV ketv.

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
190	Investicinis	Negražintina parama	Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas	14 985 paramą gavusių dalyvių skaičius: - 7 643 skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviai; - 7 342 mokymo programų, suteikiančių kitų didelės pridėtinės vertės kvalifikacijų ir (arba) kompetencijų, dalyviai	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	7 837 (52 proc.): 6 722 (86 proc.) skaitmeninių 1 115 (14 proc.) kitų kompetencijų	Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 9 597 (64 proc.) dalyvių. Iš jų ne mažiau kaip 5 643 arba 59 proc. skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviai	2025 m. II ketv.
191	Investicinis	Negražintina parama	Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas	19 350 paramą gavusių dalyvių skaičius: - 10 000 skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviai; - 9 350 mokymo programų, suteikiančių kitų didelės pridėtinės vertės kvalifikacijų ir (arba) kompetencijų, dalyviai.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	7 837 (41 proc.): 6 722 (86 proc.) skaitmeninių 1 115 (14 proc.) kitų kompetencijų	Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 15 078 (78 proc.) dalyvių. Iš jų ne mažiau kaip 10 000 arba 66 proc. skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviai	2026 m. II ketv.
Ataskaitos skyrius 3.2. 2 iš 45 vertintų rodiklių nebus pasiekti laiku, tačiau tikėtina, kad galutiniai priemonių tikslai bus įgyvendinti (2 rodikliai)									
25	Investicinis	Negražintina parama	Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh)	7,6 MWh	2025 m. I ketv.	2025 m. II ketv.	Patvirtinta paraiškų 7,94 MWh (104 proc.) Sukurtų pajėgumų 0 MWh	Pagal EK pateiktą siūlymą neformaliam derinimui: 3,8 (50 proc.) MWh Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: agentūros patvirtinti sprendimai įrengti 134 MWh individualius energijos kaupiklius iki 2025 m. III ketv.	2025 m. I ketv.
26	Investicinis	Negražintina parama	Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh)	15,2 MWh	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	Patvirtinta paraiškų 7,94 MWh (52 proc.) Sukurtų pajėgumų 0 MWh	Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą : 134 (882 proc.) MWh	2026 m. II ketv.
35	Investicinis	Negražintina parama	Pristatyta elektra varomų viešojo transporto priemonių (autobusų)	115	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	0	Pagal pateiktą siūlymą EK neformaliam derinimui: 5 (4 proc.)	2025 m. II ketv.

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
								Pagal pateiktą oficialių siūlymą EK: pasirašytos finansavimo sutartys dėl 260 autobusų.	
36	Investicinis	Negražintina parama	Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų)	260	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	0	Sudaryta projektų sutarčių 275 (106 proc.) autobusams	2026 m. II ketv.
Ataskaitos poskyris 3.3.1. Rizikingi sveikatos priežiūros sistemos investiciniai rodikliai (3 rodikliai)									
7	Investicinis	Negražintina parama	Sukurtas pažangios terapijos centras	1	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	0	1	2026 m. II ketv.
19	Investicinis	Negražintina parama	Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius	5	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	0	2 5	2025 m. IV ketv. 2026 m. I ketv.
20	Investicinis	Negražintina parama	Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius	7	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	0	4 5 6 7	2025 m. IV ketv. 2026 m. I ketv. Ne anksčiau nei 2026 m. I ketv. Ne anksčiau nei 2026 m. II ketv.
Ataskaitos poskyris 3.3.2. Rizikingi rodikliai, susiję su misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimo skatinimu (2 rodikliai)									
82	Investicinis	Negražintina parama	Pradėjęs veikti IRT kompetencijų centras	1	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	0	1	Ne anksčiau nei 2026 m. I ketv.
133	Investicinis	Negražintina parama	Veikiančių kompetencijų centrų skaičius	2	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	0	2	Ne anksčiau nei 2026 m. II ketv.

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
Ataskaitos poskyris 3.3.3. Rizikingi rodikliai, susiję su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų didinimu (5 rodikliai)									
202	Investicinis	Negražintina parama	Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW)	120 MW	2025 m. I ketv.	2025 m. II ketv.	Patvirtinta paraiškų 17,98 (15 proc.) MW Sukurti 0,96 (0,8 proc.) MW pajėgumai	Pagal pateiktą siūlymą EK neformaliai derinimui: 90 MW patvirtintas finansavimas Pagal pateiktą oficialų siūlymą EK: 225,38 MW patvirtintos paraiškos iki 2025 m. III ketv.	2025 m. I ketv.
203	Investicinis	Negražintina parama	Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW)	225 MW	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	Patvirtinta paraiškų 17,98 (8 proc.) MW Sukurti 0,96 (0,4 proc.) MW pajėgumai	-	-
206	Investicinis	Paskola	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai	20 proc.	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	Patvirtinta paraiškų 3,9 mln. Eur (3,6 proc.) Pasirašyta paskolų sutarčių 0.	-	-
207	Investicinis	Paskola	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai	100 proc.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	Patvirtinta paraiškų 3,9 mln. Eur (0,7 proc.) Pasirašyta paskolų sutarčių 0.	-	-
208	Investicinis	Paskola	Priemonei skirtų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės investicijų pervedimų užbaigimas	UAB ILTE pervesta 549,1 mln. Eur.	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	58,2 mln. Eur (10,6 proc.)	-	-
Ataskaitos poskyris 3.3.4. Kiti rizikingi rodikliai (7 rodikliai)									
22	Investicinis	Negražintina parama	Atlikti ir užbaigti parengiamieji jūrinių vėjo elektrinių plėtos ir infrastruktūros įrengimo darbai	Turi būti atliktos šios studijos ir įsigytos konsultacijos: 1) atlikta infrastruktūros įgyvendinimo studija; 2) nustatyta jūrinio vėjo elektrinių parkų jungiamosios trasos su sausumos tinklais bei pastotės vieta; 3) atlikti vėjo greičių ir kitų parametrų matavimai;	2025 m. II ketv.	2025 m. IV ketv.	6 (67 proc.) darbų Reikia pabaigti 5), 7) ir 8) darbus.	9 (100 proc.) darbų	2026 m. I ketv.

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
				4) atliktas teritorijos jūros dugno tyrimas; 5) atlikti jūrinio vėjo elektrinių parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimai; 6) įsigytos jūrinio vėjo elektrinių parkų ir jų jungčių su sausumos tinklu konsultacinės paslaugos; 7) parengti jūrinio vėjo elektrinių parkų jungties su sausumos tinklu teritorijų planavimo dokumentai; 8) įgyvendinti jūrinio vėjo elektrinių parkų jungties su sausumos tinklu teritorijų planavimo dokumentai; 9) parengtos jūrinio vėjo elektrinių parko jungties su sausumos tinklu techninės specifikacijos.					
30	Reforminis	Negražintina parama	Įsigaliojęs teisės aktas, kuriuo įdiegiama elektroninė kelių rinkliavos sistema, pagrįsta principais „naudotojas moka“ ir „teršejas moka“	Įsigalioję teisės aktai	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	Įstatymas patikslintas, tačiau jis negali būti įgyvendintas, kol neįdiegta elektroninė kelių rinkliavos sistema	-	-
33	Investicinis	Negražintina parama	Lietuvoje pagamintų (surinktų) elektrinių autobusų skaičius	35	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	0 Nėra pareiškėjų nei autobusų modifikavimui, nei jų surinkimui	-	-
45	Investicinis	Negražintina parama	Instaliuotas suminis naujų biometano dujų gamybos įrenginių pajėgumas, MW	27,1 MW	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	0 MW	11,56 MW(43 proc.) 25,1 MW (93 proc.)	2025 m. IV ketv. Ne anksčiau nei 2026 m. II ketv.
74	Investicinis	Negražintina parama	Pateikti lietuvių kalbos išteklių, skirti DI ir inovatyvioms technologijoms plėtoti	Viešai prieinami lietuvių kalbos išteklių, skirti DI sprendimams plėtoti	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	0	10 (63 proc.) projektų 16 (100 proc.) projektai	2026 m. II ketv. 2026-08-31

Rodiklio nr.	Reforminis / Investicinis rodiklis	Negražintina parama / Paskola	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė	Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas	Mokėjimo prašymo orientacinis terminas	Pasiekta reikšmė 2024-09-30	Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę	Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
75	Investicinis	Negražintina parama	Įgyvendinti lietuvių kalbos išteklių, reikalingų kuriant DI sprendimus, kūrimo projektai	5 grupės projektų (16 projektų)	2026 m. II ketv.	2026 m. III ketv.			
123	Investicinis	Negražintina parama	Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai	5	2025 m. IV ketv.	2026 m. II ketv.	0	5 projektai iš jų: 3 (60 proc.) gali būti netinkami EK	Ne anksčiau nei 2026 m. I ketv.

- Nėra duomenų.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su Europos Komisija duomenis, ministerijų, projektų vykdytojų, Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktus duomenis

Vertinimo ataskaitos
 „Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
 atsparumo didinimo plano rodiklių
 pasiekimo rizikų valdymas“
 6 priedas

Su transporto elektrifikavimu susijusių rodiklių, kurie nebus pasiekti planuota apimtimi, reikšmių siūlomi pakeitimai

Rodiklis	Siekimos rodiklio reikšmės	Susisiekimo ir Energetikos ministerijų siūlymai Finansų ministerijai	Finansų ministerijos užsakymu atliktas vertinimas		Europos Komisijai pateikti siūlymai
			Alternatyva be pakeitimų	Siūloma rinktis alternatyva	
Nr. 31 „Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius“, iš jų:	6 625	80	-	-	Siūloma atsisakyti
<i>netaršių (varomų elektra ir vandeniliu) lengvųjų transporto priemonių (M1 ir N1 klasės)</i>	6 125	50	38	535	
<i>sunkiasvorių transporto priemonių, mikroautobusų ir autobusų (N2, N3, M2 ir M3 klasės)</i>	500	30*	-	-	
Nr. 32 „Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius“, iš jų:	13 250	1 240	-	-	3 600
<i>netaršių (varomų elektra ir vandeniliu) lengvųjų transporto priemonių (M1 ir N1 klasės)</i>	12 250	240	80	6 767	2 600
<i>sunkiasvorių transporto priemonių, mikroautobusų ir autobusų (N2, N3, M2 ir M3 klasės)</i>	1 000	1 000*	-	-	1 000
Nr. 38 „Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos kroviniams transportui ir autobusams“, iš jų:	2 770	50	-	-	4 650 Pasirašytos finansavimo sutartys
<i>elektromobilių įkrovimo prieigos lengviesiems automobiliams</i>	2 620	50	16**	16**	
<i>labai didelės galios įkrovimo prieigos kroviniams transportui ir (arba) autobusams.</i>	150	Siūloma atsisakyti	-	-	
Nr. 39 „Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos kroviniams transportui ir autobusams“, iš jų:	5 540	4 580	-	-	4 650
<i>elektromobilių įkrovimo prieigos lengviesiems automobiliams</i>	5 240	4 280	1 856**	1 856**	4 350
<i>labai didelės galios įkrovimo prieigos kroviniams</i>	300	300	-	-	300

Rodiklis	Siekimos rodiklio reikšmės	Susisiekimo ir Energetikos ministerijų siūlymai Finansų ministerijai	Finansų ministerijos užsakymu atliktas vertinimas		Europos Komisijai pateikti siūlymai
			Alternatyva be pakeitimų	Siūloma rinktis alternatyva	
<i>transportui ir (arba) autobusams.</i>					
Nr. 40 „Pradėjusios veikti privačios įkrovimo priegios“	26 600	Siūloma atsisakyti	2 190	6 767	18 910 Patvirtintas finansavimas galutiniams naudos gavėjams už privačių įkrovimo priegių įrengimą.
Nr. 41 „Pradėjusios veikti privačios įkrovimo priegios“	53 200	18 910	18 756	19 978	18 910
* Siūloma nenurodyti, kiek ir kokios klasės transporto priemonių turi būti įsigyta.					
** Vertinta tik pagal susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 5.3 veiklą „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo priegių planuose)“, pagal kurią planuojama 3 840 elektromobilių įkrovimo priegių. - Nevertinta					
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Susisiekimo ir Energetikos ministerijų pateiktus duomenis ir Finansų ministerijos užsakymu atliktą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ keitimo siūlymų įvertinimą					

Vertinimo ataskaitos
„Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo plano rodiklių
pasiekimo rizikų valdymas“
7 priedas

Rodiklių Nr. 135 ir Nr. 136 pasiekimo būklė 2024-09-30 ir Europos Komisijai pateikti siūlymai tikslinti

Rodiklio Nr. 136 aprašymas	Rodiklio pasiekimo būklė	EK siūlomi pakeitimai
Bus remiama ne mažiau kaip 477 projektų ir konsultavimo paslaugų mokslo ir studijų institucijoms ir MVJ:		Bus remiama ne mažiau kaip 475 projektų ir konsultavimo paslaugų mokslo ir studijų institucijoms ir MVJ.
a) Ne mažiau kaip 90 – galimybių studijų, skirtų potencialiems paramos gavėjams, siekiantiems dalyvauti programos „Europos horizontas“ veiklose, rengimui remti. <i>Iki 2025 m. I ketv. – 40 galimybių studijų (rodiklis Nr. 135).</i>	Priemonė populiari. Iki 2024-09-30 sudaryta 120 projektų sutarčių.	Rodiklio Nr. 136 reikšmę padidinti nuo 90 iki 239, o rodiklio Nr. 135 – nuo 40 iki 150.
b) Ne mažiau kaip 32 – Europos mokslinių tyrimų erdvės ir programos „Europos horizontas“ projektų įgyvendinimo pajėgumams remti.	Priemonė populiari. Iki 2024-09-30 praėjus 53 proc. projekto įgyvendinimo laiko, sudarytos 26 projektų sutartys. Tai sudaro 81 proc. rodiklio reikšmės.	Siūlymai neteikti.
c) Ne mažiau kaip 24 tarpvalstybinių ES koordinavimo iniciatyvų projektai.	Kvietimas Nr. 10-035-T „Parama Lietuvos dalyvavimui tarptautiniuose ES koordinavimo iniciatyvų projektuose kofinansuoti“ paskelbtas 2023-03-06, tačiau iki 2024-09-30 negautas nė vienas PJP. PJP teikimas nuo 2024 m. pradžios iki rugsėjo mėn. sustabdytas, laukiant EK išaiškinimo dėl <i>pro rata</i> principo taikymo RRF sinergijai su kitomis ES priemonėmis.	Planuojama išmokėti 600 000 Eur 4 tarpvalstybinių ES koordinavimo iniciatyvų projektų išlaidoms iš dalies padengti. Šios veiklos projektai finansuojami su kita „Europos horizontas“ programa ir nepatenka į 475 projektų skaičių.
d) Ne mažiau kaip 24 projektai – mokslo ir studijų institucijų ir MVJ projektai, teigiamai įvertinti pagal programą „Europos horizontas“, bet dėl biudžeto trūkumo negavę finansavimo (įskaitant projektus, kuriems suteiktas pažangumo ženklas).	Iki 2024-09-30 teigiamai įvertinti 7 projektai, negavę finansavimo dėl biudžeto trūkumo. Jiems skirtas finansavimas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės. Daugiau projektų nebus remiama, nes nėra galimybės įgyvendinti projektų per trumpesnę nei 2 m. laikotarpį, likusį iki rodiklio pasiekimo.	Sumažinti rodiklio reikšmę iki 7 projektų.
e) Ne mažiau kaip 27 grupinės konsultacijos, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose.	Iki 2024-09-30 įvykdyta 12 grupinių konsultacijų.	Rodiklio Nr. 136 reikšmę sumažinti, sujungiant grupines ir individualias konsultacijas: „Bent 65 konsultacinės / ekspertinės paslaugos ir grupinės konsultacijos, skirtos kompetencijoms dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose palaikyti“. Rodiklio Nr. 135 reikšmę sumažinti nuo 160 iki 10.
f) Ne mažiau kaip 240 konsultavimo / ekspertų paslaugų, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose. <i>Iki 2025 m. I ketv. – 160 konsultavimo / ekspertų paslaugų (rodiklis Nr. 135).</i>	Iki 2024-09-30 praėjus 41 proc. projekto įgyvendinimo laiko, parama skirta tik 14 individualių konsultacijų atlyginimui. Tai sudaro tik 8,8 proc. 135 rodiklio arba 5,8 proc. 136 rodiklio reikšmės.	Rodiklio Nr. 135 reikšmę sumažinti nuo 160 iki 10.
g) Ne mažiau kaip 40 narysčių tarptautiniuose tinkluose.	Priemonė populiari. Sudarytos 55 sutartys.	Padidinti nuo 40 iki 70. Papildyti šia veikla rodiklį Nr. 135, nustatant jo reikšmę 40. Papildyti nauja veikla – ne mažiau kaip 62 laboratorijų ir MTTP infrastruktūros įrangos atnaujinimo projektų.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktus duomenis

Vertinimo ataskaitos
„Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo plano rodiklių
pasiekimo rizikų valdymas“
8 priedas

Su sveikatos priežiūros investiciniais rodikliais susijusių projektų įgyvendinimo būklė 2024-09-30

Nuo 2024-09-30 iki rodiklių Nr. 7, Nr. 19 ir Nr. 20 pasiekimo terminų, nustatytų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane, lieka 15 mėn., o iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, nustatyto veiklos susitarime, – 21 mėn.

Projektas	Darbų objektas	Darbų sutarties			Darbų trukmė pagal investicijų projektą
		Sudarymo data	Terminas	Trukmė	
Rodiklis Nr. 7 „Sukurtas pažangios terapijos centras“					
Nr. 09-006-P-0001 Pažangios terapijos centro („Biomedicum Santara“) įkūrimas	Pažangios terapijos centro statyba (Projekto I etapas)	2024-09-30	2025-12-31 (be pratęsimo) 2026-04-30 (su pratęsimu)	15 mėn. (be pratęsimo) 19 mėn. (su pratęsimu)	18 mėn. rangos darbams pirkti ir vykdyti
	„Švarių“ ir laboratorijos patalpų įrengimas (Projekto II etapas)	Nesudaryta. Viešieji pirkimai nepradėti. Sutartį planuojama sudaryti 2024 m. lapkričio-gruodžio mėn.			Pagal ligoninės darbų grafiką – 15 mėn. I etapui ir 9 mėn. – II etapui.
Rodiklis Nr. 19 „Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius“					
Nr. 09-002-P-0001 VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės skubios pagalbos užtikrinimui ir pavojingų infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtimas	Infekcinių ligų klinikos naujo pastato statyba	2024-07-23	2026-03-25	20 mėn.	19 mėn.
	Skubiosios pagalbos skyriaus priestato rekonstrukcija	Sutartis nesudaryta. Viešieji pirkimai nepradėti. <i>Norint darbus baigti iki mokėjimo prašymo pateikimo, sutartis turėjo būti sudaryta iki 2024-11-30.</i> <i>CPVA 2024-11-18 pritarė projekto vykdytojo inicijuotam sutarties keitimui, kuriuo atsisakoma priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus rekonstrukcijos.</i>			19 mėn.
Nr. 09-002-P-0002 Infekcinių ligų klasterio įkūrimas Santaros klinikose	Infekcinių ligų klasterio pastato statyba	2024-09-10	2025-12-30	16 mėn.	15 mėn.
Nr. 09-002-P-0003 Aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugų plėtra LSMUL Kauno klinikose, siekiant pagerinti infektologinės pagalbos kokybę ir infekcijų kontrolę	Infekcinių ligų centro pastato statyba	2024-05-24	2026-01-31 (be pratęsimo) 2026-05-31 (su pratęsimu)	20 mėn. (be pratęsimo) 24 mėn. (su pratęsimu)	24 mėn.
Nr. 09-002-P-0004 Klaipėdos universitetinės ligoninės infekcinių ligų korpuso modernizavimas ir paslaugų gerinimas	Infekcinių ligų klinikos pastato rekonstrukcija	2024-11-29	2026-01-31 (be pratęsimo) 2026-04-30 (su pratęsimu)	14 mėn. (be pratęsimo) 17 mėn. (su pratęsimu)	19 mėn.
Nr. 09-002-P-0005 Šiaulių regiono Infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo centro modernizavimo (sukūrimo) projektas	Infekcinių ligų centro pastato statyba	2024-05-23	2025-11-30	18 mėn.	17 mėn.
Rodiklis Nr. 20 „Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius“					

Projektas	Darbų objektas	Darbų sutarties			Darbų trukmė pagal investicijų projektą
		Sudarymo data	Terminas	Trukmė	
Nr. 09-008-P-0001 LSMU Kauno ligoninės skubios medicinos pagalbos infrastruktūros modernizavimas	Patalpų rekonstrukcija ir priestato statyba	2024-06-26	2026-01-31 (be pratęsimo) 2026-03-31 (su pratęsimu)	19 mėn. (be pratęsimo) 21 mėn. (su pratęsimu)	14 mėn.
Nr. 09-008-P-0002 VŠĮ Tauragės ligoninės Reanimacijos bei intensyviosios terapijos ir Skubiosios medicinos pagalbos teikimo infrastruktūros modernizavimas	Pastato statyba	2024-03-21	2025-06-30	15 mėn.	13 mėn.
	Pastato rekonstrukcija (antstato statyba)	2024-03-21	2025-06-30	15 mėn.	13 mėn.
Nr. 09-008-P-0003 VŠĮ Marijampolės ligoninės infrastruktūros modernizavimas	Intensyviosios terapijos skyriaus paprastas remontas	2024-04-10	2024 m. rugsėjis	6 mėn.	Nėra informacijos
	Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų rekonstrukcija	2024-10-14 Darbų pradžia 2024-10-31	2025-11-30 (be pratęsimo) 2025-12-31 (su pratęsimu)	13 mėn. (be pratęsimo) 14 mėn. (su pratęsimu)	18 mėn.
Nr. 09-008-P-0004 Priėmimo-skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos paslaugų modernizavimas bei krizinių pajėgumų didinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje	Skubiosios pagalbos pastato Rekonstrukcija (priestato statyba)	Sutartis nesudaryta. Vyksta viešieji pirkimai. <i>Norint darbus baigti iki mokėjimo prašymo pateikimo, sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-02-28.</i>			16 mėn.
	Intensyviosios terapijos skyriaus kapitalinis remontas	2024-04-23	2024-10-31	6 mėn.	
Nr. 09-008-P-0005 Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos paslaugų kokybės gerinimas	Ligoninės pastato rekonstrukcija (priestato statyba) ir patalpų remontas	Sutartis nesudaryta. Vyksta viešieji pirkimai. Du kartus nesėkmingi dėl per didelės kainos. <i>Norint darbus baigti iki mokėjimo prašymo pateikimo, sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-04-30.</i>			14 mėn.
Nr. 09-008-P-0006 Regioninės Telšių ligoninės skubiosios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos paslaugų kokybės gerinimas	Dviejų pastatų rekonstrukcija (priestatų statyba)	Sutartis nesudaryta. Vyksta viešieji pirkimai. <i>Sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-02-28, norint darbus baigti iki rodiklio termino, arba iki 2025-08-31, norint baigti iki mokėjimo prašymo pateikimo.</i>			10 mėn.
Nr. 09-008-P-0007 Skubios pagalbos skyriaus ir reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus infrastruktūros modernizavimas VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė	Skubiosios pagalbos skyriaus patalpų remontas	2024-01-18	2024-09-30 Darbai dar vykdomi.	8,5 mėn.	Nėra informacijos.
	Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus patalpų remontas, I etapas	2024-07-10	2025-02-28	7,5 mėn.	17 mėn. (7 mėn. I etapui, 3 mėn. statybvietės perdavimas, 7 mėn. II etapui)
	Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus patalpų remontas, II etapas	Sutartis nesudaryta. Viešieji pirkimai nepradėti. <i>Norint darbus baigti iki rodiklio termino, sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-05-31.</i>			

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal projektų vykdytojų pateiktus duomenis

Vertinimo ataskaitos
„Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo plano rodiklių
pasiekimo rizikų valdymas“
9 priedas

Projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ būklė 2024-09-30

Nuo 2024-09-30 iki rodiklių Nr. 82 ir Nr. 133 pasiekimo terminų, nustatytų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane, lieka 15 mėn., o iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, nustatyto veiklos susitarime su EK, – 21 mėn.

Misijų tema pagal sumanios specializacijos prioritetus ir projekto partneris	Kuriamas kompetencijų centras*	Pagal projekto įgyvendinimo grafiką			Veiklų įgyvendinimo būklė 2024-09-30
		Veikla	Terminas	Trukmė	
82 rodiklis „Pradėjęs veikti IRT kompetencijų centras“, 2025 m. IV ketv.					
Misijų tema – „Saugi ir įtrauki e. visuomenė“.	IRT kompetencijų centro patalpų, esančių adresu Saulėtekio al. 11, Vilnius, remonto darbai jo pritaikymui kompetencijų centro veiklai.	Viešieji pirkimai	2024 m. balandžio–birželio mėn.	3 mėn.	Viešieji pirkimai paskelbti 2024 m. lapkričio mėn.
Projekto partneris – Kauno technologijos universiteto sutelktas konsorciumas.		Remonto darbai	2024 m. liepos mėn.–2025 m. rugsėjo mėn.	14 mėn.	Remonto darbai ne pradėti.
	IRT kompetencijų centro patalpų, esančių adresu Studentų g. 48A, Kaunas, remonto darbai jo pritaikymui kompetencijų centro veiklai.	Viešieji pirkimai	2024 m. balandžio–birželio mėn.	3 mėn.	Viešieji pirkimai ne pradėti. Pagal sutartį, iki 2024 m. gruodžio mėn. turėjo būti parengtas techninis projektas ir atlikta ekspertizė. 2024-12-10 duomenimis, techninis projektas rengiamas.
		Remonto darbai	2024 m. liepos mėn.–2025 m. rugsėjo mėn.	14 mėn.	Remonto darbai ne pradėti.
133 rodiklis „Veikiančių kompetencijos centrų skaičius“, iki 2025 m. IV ketv. – 2 kompetencijų centrai.					
Misijų tema – „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“.	Patalpų, esančių adresu Tunelio g. 60, Kaunas, kapitalinis remontas (rekonstrukcija) jo pritaikymui kompetencijų centro veiklai.	Viešieji pirkimai	2024 m. gegužės mėn.–rugsėjo mėn.	4 mėn.	Viešieji pirkimai ne pradėti. Pagal sutartį techninis projektas turėjo būti parengtas iki 2024-10-22. 2024-12-10 duomenimis, vyksta techninio projekto ekspertizė.
Projekto partneris – Vilniaus Gedimino technikos universiteto sutelktas konsorciumas.		Rekonstrukcijos darbai	2024 m. rugsėjo mėn.–2025 m. spalio mėn.	14 mėn.	Rekonstrukcijos darbai ne pradėti.
Misijų tema – „Inovacijos sveikatai“.	Patalpų, esančių adresu Saulėtekio g. 9, Vilnius, kuriose bus laboratorinės patalpos (7 bendro naudojimo laboratorijos), kabinetai, inkubavimo erdvė, statybos.	Viešieji pirkimai	2024 m. kovo mėn.–birželio mėn.	4 mėn.	Rangos darbų pirkimas paskelbtas 2024-08-14. Rangos sutartis sudaryta 2024-10-30, darbų užbaigimo terminas 2026-07-22.
Projekto partneris – Vilniaus universiteto sutelktas konsorciumas.		Statybos darbai	2024 m. liepos mėn.–2025 m. gruodžio mėn.	18 mėn.	Statybos darbai pradėti 2024-11-26.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktus duomenis					

Vertinimo ataskaitos

„Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimo rizikų valdymas“

10 priedas

Rodikliai, skirti elektros energijos gamybos pajėgumams iš atsinaujinančių energijos išteklių didinti, ir jų pasiekimo būklė 2024-09-30

Rodiklis pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą					Mokėjimo prašymo pateikimo terminas	Įgyvendinami projektai	Projekto / finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpis	Gauta paraiškų	Patvirtinta paraiškų	Atmesta / atsiimta paraiškų	Pasiektas rodiklio reikšmės lygis
Nr.	Pavadinimas	Siektina reikšmė	Terminas	Paramos rūšis							
202	Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš	120 MW	2025 m. I ketv.	Negražintina parama	2025 m. II ketv.	Jungtinis projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ Nr. 03-005-J-0001	2023-03-09–2026-03-31 Pirmasis kvietimas 2023-06-22.	1234 vnt., 106,1 MW	242 vnt., 17,98 MW	283 vnt., 23,1 MW	Sukurti 0,96 MW pajėgumai.
203	AEI pajėgumai (MW)	225 MW	2026 m. II ketv.		2026 m. III ketv.	Jungtinis projektas „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“ nutrauktas negavus nė vienos paraiškos. Nr. 03-007-J-0001	Praėjo 50 proc. projekto įgyvendinimo laiko arba 45 proc. pirmojo kvietimo laiko nuo paskelbimo.	88,4 proc. 202 rodiklio arba 47,2 proc. 203 rodiklio reikšmės.	15 proc. 202 rodiklio arba 8 proc. 203 rodiklio reikšmės.	19,3 proc. 202 rodiklio arba 10,3 proc. 203 rodiklio reikšmės.	0,8 proc. 202 rodiklio arba 0,4 proc. 203 rodiklio reikšmės.
206	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai*	20 proc.*	2025 m. II ketv.	Paskola	2025 m. IV ketv.	Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Regioninės plėtros fondo, steigimo ir finansavimo sutartis Nr. 30-002-F-0001	2023-12-22–2026-06-30 Kvietimas teikti paraiškas 2024-03-28.	12 vnt. už 52,8 mln. Eur	1 vnt., 3,9 mln. Eur	8 vnt., 42,4 mln. Eur	Pasirašytų paskolų sutarčių nebuvo. 2024-10-22 pasirašyta 3,9 mln. Eur sutartis.
207		100 proc.*	2026 m. II ketv.		2026 m. III ketv.		Praėjo 30 proc. finansinės priemonės įgyvendinimo laiko arba 22 proc. nuo kvietimo paskelbimo.	48,1 proc. 206 rodiklio arba 9,6 proc. 207 rodiklio reikšmės.	3,6 proc. 206 rodiklio arba 0,7 proc. 207 rodiklio reikšmės.	38,6 proc. 206 rodiklio arba 7,7 proc. 207 rodiklio reikšmės.	

* Finansavimo susitarimai turi būti pasirašyti 571,7 mln. Eur, iš jų 549,1 mln. Eur – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir 22,6 mln. Eur – valstybės biudžeto lėšos. Rodiklis Nr. 206 bus pasiektas sudarius finansavimo susitarimus 109,8 mln. Eur, o rodiklis Nr. 207 – 549,1 mln. Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšų.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK duomenis, Energetikos ministerijos, VŠĮ Lietuvos energetikos agentūros ir UAB ILTE pateiktus duomenis

Vertinimo ataskaitos
 „Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
 atsparumo didinimo plano rodiklių
 pasiekimo rizikų valdymas“
 11 priedas

Projektų, susijusių su biometano dujų gamybos pajėgumų sukūrimu, įgyvendinimas iki 2024-09-30 (Rodiklis Nr. 45)

Nuo 2024-09-30 iki rodiklio pasiekimo termino, nustatyto Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane, lieka 15 mėn., o iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, nustatyto veiklos susitarime, – 21 mėn.

Projekto Nr.	MW	Projekto sutarties laikotarpis	Biometano gamybos įrenginių statybos sutarties laikotarpis
I KVIETIMAS			
Nr. 03-003-K-0001	4,835	2023-06-22–2025-12-31	2023-12-07–2025-03-07 su galimu pratęsimu iki 2025-06-07 Trukmė – 15 mėn. be pratęsimo ir 18 mėn. su pratęsimu.
Nr. 03-003-K-0002	4,01305	2023-04-03–2025-12-31	2023-12-22–2025-10-31 Trukmė – 22 mėn.
Nr. 03-003-K-0003	3,868	Sutartis nutraukta	-
Nr. 03-003-K-0007	6,2855	2024-05-07–2025-12-31	Sutartis nesudaryta. Rengiami pirkimo dokumentai.
Nr. 03-003-K-0008	2,7076	2023-03-31–2025-03-31	2023-03-02–2024-07-14 Trukmė – 15 mėn. nuo avansinio mokėjimo gavimo dienos, t. y. 2023-04-14.
II KVIETIMAS			
Nr. 03-016-K-0001	2,9	Finansavimas skirtas energetikos ministro 2024-08-21 įsakymu Nr. 1-153, tačiau CPVA 2024-12-05 informavo EM, kad sutartis nebus sudaroma.	Sutartis nesudaryta.
Nr. 03-016-K-0002	7,25	2024-09-23–2026-03-31	Sutartis nesudaryta. Rengiami pirkimo dokumentai.
Iš viso (be projektų Nr. 03-003-K-0003 ir Nr. 03-016-K-0001):	25,091	-	-

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Centrinės projektų valdymo agentūros projektų registro duomenis ir agentūros bei Energetikos ministerijos pateiktus duomenis



2024

