LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO NR. 2005/LT/16/C/PE/003 „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“

2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. FA-P-70-5-60
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant
Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento
direktorės Vilijos Stirbienės
2010-08-04 pavedimą Nr. P-70-5

Auditą atliko valstybiniai auditoriai:
Žaneta Rozenbergaitė (grupės vadovė)
Vytenis Laukys
Aistė Rumbutytė (nuo 2011-04-08)

Auditas pradėtas 2010-08-04
Auditas baigtas 2011-08-10

Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti
Valstybės kontrolės interneto puslapyje
adresu www.vkontrole.lt

TURINYS

Santrauka 3

Įžanga 5

Audito apimtis ir metodai 7

1. Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančios institucijos 7
2. Bendroji informacija apie projektą 7
3. Reikšmingumas ir patikimumas 11
4. Audito metodai 12

Pastebėjimai, išvados, rekomendacijos 22

5. Pažeidimai 22
6. Patikrinimai 24
7. Viešieji pirkimai 25
8. Išlaidų tinkamumas 29
9. Audito seka ir apskaitos sistemos 32
10. Viešinimo priemonės 32
11. Projekto galutinė ataskaita 32
12. Projekto galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška 35
13. Klaidų vertinimas 36

PRIEDAI 37

SANTRAUKA

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti baigiamąją audito deklaraciją dėl Sanglaudos fondo projektų rengiančios institucijos funkcijas pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1386/2002.

Audito subjektas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (vadovaujančioji institucija), audito procedūros atliktos – Finansų ministerijoje (mokėjimo institucijoje), Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriuje (tarpinėje ir atrankinius patikrinimus atliekančioje institucijose), Aplinkos projektų vykdymo agentūroje (įgyvendinančiojoje institucijoje), UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centre.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, Finansinio audito vadovu, Tarptautiniais audito standartais ir 2005 m. balandžio 15 d. EK rekomendacijomis „Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą“, 2008 m. balandžio 23 d. Sanglaudos fondo ir ex-ISPA priemonės projektų 2000–2006 m. uždarymo gairėmis. Audito ataskaita parengta remiantis mūsų atliktu darbu, kuris pradėtas 2010 m. rugpjūčio 4 d., gavus pavedimą atlikti projekto baigiamąjį auditą.

Auditas suplanuotas ir atliktas siekiant pakankamai įsitikinti, kad galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje Bendrijos pagalbos likučiui gauti nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal sprendimo sąlygas ir nustatytus tikslus. Audito metu surinkti visi reikalingi paklausimai siekiant užtikrinti, kad išlaidų ataskaitos yra teisingos, pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingai atliktos, o projektas įgyvendintas laikantis sprendimo skirti paramą sąlygų ir projekto tikslų.

Audito metu atlikta valdymo ir kontrolės sistemos apžiūra, įvertinta projekto galutinio mokėjimo paraiška ir galutinė ataskaita. Nustatyta 41 952,16 EUR netinkamų finansuoti išlaidų, tai sudaro 0,2 proc. deklaruotų Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų. Pateikti didelės svarbos pastebėjimai:

- EK deklaruotos **28 316,00 EUR** įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantiniu laikotarpiu, išlaidos, mūsų nuomone, yra netinkamos finansuoti, nes eksploatuojant įrangą tai yra susidėvėjusių įrangos dalių pakeitimo (veiklos) sąnaudos, kurios pagal tipines apskaitos nuostatas nėra kapitalizuojamos, o traukiamos į atsargas arba veiklos sąnaudas ir nelaikomos įrangos bandymų išlaidomis;
- EK deklaruotos **13 636,16 EUR** veiklos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto tikslais, mūsų nuomone, yra netinkamos finansuoti;

- nepasiekti Europos Komisijos sprendime Nr. K(2009) 8360 patvirtinti projekto tikslai pagerinti vidutinį atliekų surinkimo procentą regione iki 98 proc. miesto vietovėse ir iki 85 proc. kaimo vietovėse bei padidinti bendrą perdirbamų atliekų surinkimo procentą iki 23,6 proc.;
- valdymo ir kontrolės sistemos institucijos neužtikrino, kad kokybiškai parengtos Projekto galutinė ataskaita, galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška Valstybės kontrolei būtų pateiktos laiku.

Audito ataskaitoje pateikti vidutinės ir nedidelės svarbos pastebėjimai, susiję su neatitikimais įforminant projekto pažeidimus; su viešųjų pirkimų ir viešinimo priemonių vykdymu; patikromis, kurias vykdė Aplinkos projektų vykdymo agentūra.

Iš esmės šio projekto valdymo ir kontrolės sistema tenkina minėto Europos Komisijos reglamento ir Komisijos sprendimo skirti paramą reikalavimus, išskyrus nurodytus pastebėjimus. Projekto galutinė ataskaita parengta pagal Europos Tarybos reglamento reikalavimus, joje atskleisti projektui nustatyti tikslai, išskyrus minėtus pastebėjimus, o galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais, atrodo, teisingai nurodo padarytas išlaidas.

Prie audito ataskaitos pridedama deklaracija baigus teikti paramą (valstybinio audito išvada) yra parengta pagal Europos Komisijos sprendime skirti paramą ir Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos III priede pateiktą formą.

Audito ataskaita ir deklaracija baigus teikti paramą (valstybinio audito išvada) pagrįsta iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. surinktais audito įrodymais.

ĮŽANGA

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti baigiamąją audito deklaraciją dėl Sanglaudos fondo projektų rengiančios institucijos funkcijas pagal 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1386/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 1995 m. gegužės 30 d. įstatymą[1] Nr. I-907 [2], Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija, nepriklausoma nuo mokėjimo, vadovaujančiosios, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijų.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, Finansinio audito vadovu, Tarptautiniais audito standartais (toliau – TAS) ir 2005 m. balandžio 15 d. EK rekomendacijomis „Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą“ [3] (toliau – EK rekomendacijos), 2008 m. balandžio 23 d. Sanglaudos fondo ir ex-ISPA priemonės projektų 2000–2006 m. uždarymo gairėmis [4]. Kaip numatyta Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] 14 straipsnio 1 dalyje, Deklaracija parengta atsižvelgiant į valdymo ir kontrolės sistemų apžiūrą, jau atliktų patikrinimų išvadas ir į papildomą atrankinį operacijų patikrinimą, galutinę ataskaitą, parengtą pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 [6] II priedo F straipsnio 4 dalį.

Auditas suplanuotas ir atliktas siekiant pakankamai įsitikinti, kad galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje Bendrijos pagalbos likučiui gauti nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal sprendimo sąlygas ir nustatytus tikslus. Audito metu surinkome visus reikalingus paklausimus siekdami užtikrinti, kad išlaidų ataskaitos yra teisingos, pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingai atliktos, o projektas įgyvendintas laikantis sprendimo skirti paramą sąlygų ir projekto tikslų.

Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 4 d. pavedimu Nr. P-70-5 atlikome Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Audituojamas projektas) baigiamąjį auditą, privalomą pagal Komisijos sprendimo [7] III. 1 priedo III skyriuje ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [5] nustatytus reikalavimus dėl Bendrijos pagalbos likučio mokėjimo. Pagal teisės aktų reikalavimus prie Audituojamo projekto galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos turi būti

[1] Su vėlesniais pakeitimais.

pridėta deklaracija baigus teikti paramą (toliau – Deklaracija), parengta pagal Komisijos sprendimo [7] III. 4. C priede ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] III priede pateiktą formą.

Teikti pastebėjimai suskirstyti į kategorijas pagal svarbą, kuri, mūsų įsitikinimu, turi būti jiems priskirta:

- *Didelės svarbos pastebėjimai* – dalykai, susiję su Audituojamo projekto įgyvendinimu ir turį įtakos galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos tikslumui ir teisingumui, į kuriuos aukščiausiojo lygio VI, MI, TI, ir ĮI vadovai turi nedelsdami atkreipti dėmesį ir imtis atitinkamų priemonių.
- *Vidutinės svarbos pastebėjimai* – dalykai, susiję su Sanglaudos fondo aplinkos sektoriaus projektus administruojančių institucijų vidaus kontrolės sistema, į kuriuos nedelsiant turėtų būti atkreiptas šių institucijų atitinkamo lygio vadovų dėmesys.
- *Nedidelės svarbos pastebėjimai* – dalykai, kurie neprieštarauja Komisijos reglamentams ir Komisijos sprendimams [7, 8] ir yra susiję su vidaus kontrolės nedideliais trūkumais, kuriuos reikia spręsti, siekiant užtikrinti visapusę atitiktį nacionaliniams teisės aktams.

Mes turime pareikšti nuomonę, ar galutinėje išlaidų ataskaitoje pateikta informacija visais svarbiais aspektais yra teisinga, išlaidos padarytos pagal reglamentus, sprendimo dėl projekto reikalavimus ir jo tikslus, o paraiška Komisijai gauti Bendrijos pagalbos likutį yra pagrįsta. Ši nuomonė reiškiama atskirai pateikiamoje Deklaracijoje.

Audito ataskaita parengta remiantis mūsų atliktu darbu, kurį pradėjome 2010 m. rugpjūčio 4 d., gavę pavedimą atlikti Audituojamo projekto baigiamąjį auditą. Audito ataskaita ir Deklaracija pagrįsta iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. surinktais audito įrodymais.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

1. Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančios institucijos

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Sanglaudos fondo administravimui taikomi Europos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentai. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [5] valstybei, gaunančiai Sanglaudos fondo lėšas, nustatyti reikalavimai dėl valdymo ir kontrolės sistemos.

Vykdydama minėtą reglamentą Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 [9] patvirtino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisykles, kuriose nustatė institucijų funkcijas ir teises. Šiuo metu visus Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus aplinkos apsaugos projektus administruojančios institucijos yra šios:

LR finansų ministerija	– vadovaujančioji;
	– auditą koordinuojanti;
	– mokėjimo;
LR aplinkos ministerija	– tarpinė;
	– atrankinius patikrinimus atliekanti;
Aplinkos projektų valdymo agentūra	– įgyvendinančioji;
Europos Komisijos, vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovai	– SF priežiūros komitetas;
UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“	– galutinis paramos gavėjas.

2. Bendroji informacija apie projektą

Sanglaudos fondo projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ buvo patvirtintas 2005 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2005) 5289 [7]. Jis pakeistas[2] 2009 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2007) 8360 [8].

Pagrindiniai Audituojamo projekto tikslai:

- Panevėžio apskrityje sukurti aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu darnią buitinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus. Ypač padėti įgyvendinti šių teisės aktų laikymąsi:
  - Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų, su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 91/156/EEB;

[2] Pakeitimas nekeičia Sanglaudos fondo paramos dydžio, bet yra susijęs su Projekto apimčių sumažinimu.

- Direktyvos 99/31/EEB dėl atliekų sąvartynų;
- Direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų, su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EB;
- Reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės;
- Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/12/EB;
- Direktyvos 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;
- Direktyvos 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų;
- Direktyvos 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą;
- Direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.

Fiziniai tikslai:

- įrengti pilnai reikalavimus atitinkantį sąvartyną Dvarininkų kaime (1 sekciją) su filtrato surinkimo bei nukreipimo sistema ir atliekų rūšiavimo linija;
- viešąsias atliekų surinkimo paslaugas papildomai teikti 60 000 žmonių ir taip iki 2010 m. pagerinti vidutinį atliekų surinkimo procentą regione nuo vidutiniškai 72 proc. iki 98 proc. miesto vietovėse ir iki 85 proc. kaimo vietovėse;
- nustatyti tarifus, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir regione įtvirtina principą „teršėjas moka“;
- sukūrus naująją atliekų tvarkymo sistemą ir įrengus atliekų rūšiavimo liniją, padidinti bendrą perdirbamų atliekų surinkimo procentą (nuo 0 proc. 2005 m.) iki 23,6 proc. 2010 m.;
- įrengus 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, sumažinti į sąvartyną patenkančių biologiškai skaidžių atliekų kiekį;
- įrengus 5 APA, užtikrinti, kad į sąvartyną nepatektų biologiškai skaidžios, statybos bei griovimo atliekos ir pavojingos atliekos;
- uždarius ir sutvarkius reikalavimus neatitinkančio pagrindinio sąvartyno teritoriją, sumažinti požeminio ir paviršinio vandens taršą;
- užtikrinti, kad Regioninio atliekų tvarkymo centro pajamų pakaktų eksploatavimo, techninės priežiūros ir nusidėvėjimo išlaidoms padengti.

1 lentelėje pateikiama informacija apie Komisijos sprendimais Audituojamam projektui patvirtintas išlaidas ir jų tinkamumo laikotarpį.

1 lentelė. Audituojamam projektui patvirtintos išlaidos

Komisijos sprendimu projektui patvirtintos išlaidos	**EUR**	**%**
Bendrosios išlaidos	22 994 660	
Bendrosios tinkamos finansuoti išlaidos	19 487 000	
Sanglaudos fondo paramos dydis nuo tinkamų finansuoti Projekto išlaidų	16 563 950	85
Tinkamų finansuoti Projekto išlaidų laikotarpiai		
Darbams, patvirtintiems Komisijos sprendimu	2005-09-02 – 2010-12-31	

Šaltiniai: Komisijos sprendimai [7, 8]

Komisijos sprendime [7] ir jį pakeitusiame / papildžiusiame Komisijos sprendime [8] patvirtinti Projekto pagrindiniai priežiūros rodikliai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė. 2009-10-22 Komisijos sprendimu Nr. K (2009) 8360 sprendimu patvirtinti priežiūros rodikliai

Priežiūros rodiklis	**Mato vnt.**	**Rodiklis**
1. Panevėžio miesto sąvartyno uždarymas (atliekų kaupo uždengimas: nelaidus, drenažinis ir žemės sluoksniai; filtrato ir dujų surinkimo sistemų įrengimas, teritorijos apželdinimas ir kt.)	**vnt.**	**1**
2. Atliekų priėmimo aikštelių (APA) įrengimas (asfalto dangos, reikiamos infrastruktūros sukūrimas, privažiavimo kelių tiesimas, nuotekų valymo sistema, pavojingų atliekų saugykla, administracinės-buitinės patalpos, konteinerių pirkimas ir kt.)	**vnt.**	**5**
3. Kompostavimo aikštelės (asfalto dangos, infrastruktūros sukūrimas, filtrato surinkimo ir nukreipimo sistema, filtrato sukauptuvai ir kt.)	**vnt.**	**5**
4. Perkrovimo stotys (asfalto dangos, infrastruktūros sukūrimas, konvejerio įrengimas, presas, supresuotoms atliekoms skirtų konteinerių pirkimas ir kt.)	**vnt.**	**2**
5. Rūšiavimo linija (konvejerių įrengimas, rūšiavimo kabina, presavimo sistemos, PET perforatorius ir kt.)	**vnt.**	**1**
6. Naujas regioninis sąvartynas	**vnt.**	**1**
6.1 I sekcijos įrengimas (žemės darbai; geosintetinio molio sluoksnis, nelaidi HDPE plėvelė, apsauginė geotekstilė, drenažinis sluoksnis; filtrato surinkimo sistemos įrengimas, paviršinio vandens nukreipimo sistemos įrengimas, privažiavimo bei vidinių kelių tiesimas ir kt.)	ha	5,7-6,3
6.2 Tarnybinė zona (ratų plovimo duobė, priešgaisriniai rezervuarai, garažas, rūšiavimo pastatas ir kt.)	vnt.	1
6.3 Administracinis pastatas	vnt.	1
6.4 Filtrato surinkimo sistema	vnt.	1
6.5 Paviršinio vandens ir nuotekų surinkimo sistema (dvi lietaus nuotekų siurblinės, naftos gaudyklė, gruntinio vandens drenažo siurblinė)	vnt.	1
7. Kompensacinės priemonės gyventojams (langų ir durų pakeitimas, apželdinimas siekiant sumažinti triukšmą)	**vnt.**	**1**
8. Rūšiavimo linijos krautuvas	**vnt.**	**1**
9. Ratinis krautuvas	**vnt.**	**1**
10. Žaliųjų atliekų smulkintuvas	**vnt.**	**1**
11. Kompaktorius	**vnt.**	**1**
12. Buldozeris	**vnt.**	**1**
13. Sijotuvas-būgninis rėtis	**vnt.**	**1**
14. Automobilis su priekaba (perkrovimo stotims aptarnauti)	**vnt.**	**1**

Šaltinis – Komisijos sprendimas [8]

Įgyvendinant Audituojamą projektą pasirašytos dvi rangos darbų, trys paslaugų teikimo ir septynios įrangos tiekimo sutartys. Informacija apie Audituojamo projekto sutartis ir atliktus mokėjimus pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Audituojamo projekto įgyvendinimo statybos darbų rangos, paslaugų teikimo ir įrangos tiekimo sutartys

Sutarties pasirašymo data	Sutarties Nr.	Rangovas / paslaugų teikėjas / prekių tiekėjas	Sutarties objektas	Sutarties suma be PVM, EUR	EK deklaruotų išlaidų suma, EUR	Skirtumas, EUR
Statybos darbų rangos sutartys						
2007-11-19	A/2007/P/34[3]	AB „Panevėžio statybos trestas“	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba	4 341 794,58	4 338 231,54	3 563,04
2007-12-07	A/2007/P/35	AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio keliai“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu	Projekto komponentų Panevėžyje statyba	13 630 357,48	13 400 071,76	230 285,72
Paslaugų sutartys						
2005-12-29	2005/28/A/P/LT[4]	UAB „SWECO BKG“	Techninės pagalbos teikimas UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“	245 160,45	215 215,56	29 944,89
2006-10-17	A/2006/P/17	UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“	Visuomenės informavimas ir švietimas	66 033,36	65 946,64	86,72
2007-08-24	2007/120//A/P/LT	M & S Umweltprojekt GmbH	Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra	289 073,51	224 482,59	64 590,92
Įrangos įsigijimo sutartys						
2009-11-24	2009/26/A/PT/LT	Jungtinės veiklos pagrindu UAB „Koger Eco“ ir „AS KOGER & PARTNERID” filialas	Atliekų tankintuvas (kompaktorius)	263 505,80	263 505,80	-
2009-11-24	2009/27/A/PT/LT	UAB „Elklita“	Krautuvas	21 718,61	21 718,60	0,01
2009-11-24	2009/28/A/PT/LT	UAB „Keluva“	Ratinis frontalinis krautuvas	112 502,90	112 502,89	0,01
2009-11-24	2009/29/A/PT/LT	UAB „Oksata“	Kompostuojamų atliekų smulkintuvas	112 343,61	112 343,60	0,01
2009-11-24	2009/30/A/PT/LT	UAB „Atomeksim“	Sijotuvas-būgninis rėtis	66 930,00	66 930,00	-
2009-11-24	2009/31/A/PT/LT	UAB „Intrac Lietuva“	Buldozeris	170 470,34	170 470,34	-
2009-11-24	2009/32/A/PT/LT	UAB „KMT“	Automobilis su priekaba 30 m^3 konteinerių pervežimui	149 430,32	149 430,32	-
			Iš viso	**19 469 320,96**	**19 140 849,64**	**328 471,32**

Šaltinis – APVA, MI

[3] 2008-11-07 sutarties Nr. A/2007/P/34 pakeitimu Nr. 1 pakeistas darbų baigimo laikas (darbų atlikimo terminas – 2008-12-30).
[4] 2006-09-01sutarties Nr. 2005/28/A/P/LT pakeitimu Nr. 1 pakeistos UAB „SWECO BKG“ numatytų ekspertų darbų užduotys bei joms atlikti planuojamos laiko sąnaudos (pagrindinių ir nepagrindinių ekspertų darbo laiko dienomis išlieka nepakitęs).

3. Reikšmingumas ir patikimumas

Auditas buvo suplanuotas taip, kad atitiktų Komisijos reglamento [5] reikalavimus ir būtų atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Finansinio audito vadovą ir Tarptautinius audito standartus, patvirtintus Tarptautinės buhalterių asociacijos.

Audituojamo projekto baigiamojo audito reikšmingumą nustatėme remdamiesi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. birželio 30 d. raštu Nr. (18.52.8-01)-6K-1106792 mums pakartotiniam vertinimui pateikta galutine išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška. Projekto baigiamajam auditui taikytas reikšmingumo lygis – 2 proc. visų EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų, t. y. 19 140 849,64 EUR. Atliekamo audito reikšmingumo suma – 382 816,99 EUR – didžiausia priimtina klaidų suma.

Pagal reikšmingumo lygį nustatoma, ar pastebėtos pavienės klaidos, praleisti ar netinkamai pateikti duomenys arba jų visuma rodo, kad EK pateikiama galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška Bendrijos pagalbos likučiui gauti visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo padarytas išlaidas.

Auditą suplanavome ir atlikome taip, kad būtume 95 proc. tikri pareikšdami nuomonę dėl galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Bendrijos pagalbos likučiui gauti teisingumo ir pagrįstumo. Šį patikimumo lygį pasiekėme:

- vertindami Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistemą ir vykdomų kontrolės priemonių veikimą;
- atlikę detaliuosius testus.

Audito metu pasiekėme 95 proc. patikimumo lygį, atsižvelgę į šiuos dalykus:

- išsamią rizikos analizę, atliktą audito planavimo stadijoje, kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;
- rašytinių procedūrų laikymosi patikrinimą (kontrolės testai), įskaitant patikras vietoje;
- savarankiškas audito procedūras (detaliuosius testus);
- Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų patikrų vietoje / patikrinimų rezultatų peržiūrą;
- išorės auditorių ataskaitų peržiūrą;
- auditų Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančiose institucijose patirtį;
- teigiamą Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų požiūrį į auditą.

4. Audito metodai

Atsižvelgdami į audito tikslus ir siekdami gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų audito įrodymų, atlikome Valstybinio audito reikalavimuose ir 500 TAS numatytas audito procedūras:

- įrašų ir dokumentų tikrinimą;
- ilgalaikio materialiojo turto tikrinimą (valstybinių auditorių patikros vietoje metu);
- paklausimus (valstybinio auditoriaus paklausimu nusimanančių asmenų pateikta finansinio ir nefinansinio pobūdžio informacija);
- perskaičiavimą (dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio tikslumo tikrinimas);
- patvirtinimą (valstybinių auditorių gaunamus tiesioginius rašytinius trečiosios (patvirtinančios) šalies atsakymus);
- analitines procedūras.

Audito tikslams atskleisti buvo parengtos trys audito programos:

- valdymo ir kontrolės sistemos veikimui įvertinti;
- Audituojamo projekto tikslų atskleidimui galutinėje ataskaitoje įvertinti;
- galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje nurodytoms išlaidoms, pagrindinių operacijų atlikimui įvertinti.

Vienas audito tikslų – atlikti valdymo ir kontrolės sistemos vertinimą Audituojamo projekto atžvilgiu, todėl audito metu Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų vidaus kontrolės veikimui įvertinti skirtas atitinkamas dėmesys. Siekdami įsitikinti vidaus kontrolės procedūrų teoriniu buvimu ir pakankamu praktiniu veikimu, atlikdami audito procedūras vertinome tam tikrų kontrolės grupių – veiklos kontrolės, patikrų vietoje / patikrinimų, apskaitos ir mokėjimų kontrolės – buvimą, veikimą praktikoje, atlikimą laiku, taikymą visiems atvejams ir gebėjimą nustatyti ir taisyti klaidas. Šiems tikslams pasiekti parengta audito programa.

Audito metu vertinome šias Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų taikomas kontrolės priemones:

- APVA kontrolės priemones, taikomas apmokėjimo sąskaitai (mokėjimo prašymui) vertinti;
- APVA, MI, VI kontrolės priemones, susijusias su patikromis vietoje / patikrinimais, viešaisiais pirkimais, mokėjimo procedūromis, apskaita ir kt.

Vidaus kontrolę testavome šiais audito metodais:

- kontrolės testais;
- patikromis vietoje / patikrinimais, ataskaitų peržiūra (kur tinkama);
- išorės audito ataskaitų peržiūra (kur tinkama).

Norėdami įsitikinti, ar Sanglaudos fondo aplinkos sektoriaus projektus administruojančiose institucijose sukurta valdymo ir kontrolės sistema atitinka Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [5] ir Komisijos sprendime [7] nustatytus reikalavimus, vertinome:

- likutinę riziką, susijusią su valdymo ir kontrolės sistema;
- viešuosius pirkimus;
- techninį valdymą ir įgyvendinimą, kiek tai susiję su išlaidų tinkamumu;
- lėšų apskaitą, mokėjimo procedūras ir audito seką;
- Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimus;
- informavimą ir viešinimą;
- VI, MI, APVA atliktas Audituojamo projekto patikras vietose, AM VAS atrankinius patikrinimus.

Vertindami viešųjų pirkimų sistemą, peržiūrėjome:

- pirkimo dokumentus;
- visas sudarytas sutartis ir jų pakeitimus.

Siekiant įvertinti viešųjų pirkimų sistemą, išsamiai patikrintos 2 rangos darbų sutartys (Nr. A/2007/P/34 ir A/2007/P/35) ir 2 įrangos įsigijimo sutartys (Nr. 2009/26/A/PT/LT ir 2009/31/A/PT/LT).

Audito metu vertindami, ar viešieji pirkimai vykdyti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, atlikome kontrolės (atitikimo) testus, kuriuose išskyrėme klausimų grupes pagal šias viešųjų pirkimų sritis:

- konfidencialumo reikalavimas;
- pirkimo būdas;
- pirkimo vertės skaičiavimas;
- viešojo pirkimo komisija, pirkimų ataskaitos;
- viešųjų pirkimų skelbimai;
- pirkimo dokumentai, pirkimo dokumentų teikimas tiekėjams;
- paraiškų ir pasiūlymų pateikimas, vokų su pasiūlymais atplėšimas;
- tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas;
- pasiūlymų vertinimas ir palyginimas;
- pirkimo sutarties sudarymas ir informacijos apie sudarytą sutartį paskelbimas.

Bendra patikrintų sutarčių suma 18 406 128,20 Lt, arba 94,5 proc. visų pasirašytų sutarčių verčių sumos.

Audito metu, atsižvelgdami į nustatytą riziką, papildomai įvertinome, ar perkančioji organizacija – APVA, vykdydama sutarties Nr. 2007/120/A/P/LT viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo procedūrą, vienodai vertino 2007-09-28 Viešųjų pirkimų tarnybos ataskaitoje Nr. 2S-12

minimų dalyvių klaidas, padarytas skaičiuojant pasiūlymo kainą, t. y. ar UAB Tiltų ekspertų centro pasiūlymas iš tikrųjų buvo atmestas dėl analogiškos priežasties.

Siekdami įsitikinti APVA priimtų sprendimų teisingumu, papildomai peržiūrėjome tris įrangos įsigijimo viešojo pirkimo metu (po vokų atplėšimo) gautas pretenzijas (sutartys Nr. 2009/29/A/PT/LT (2 pretenzijos) ir 2009/30/A/PT/LT (1 pretenzija)).

Atlikę viešųjų pirkimų sistemos patikrinimus, pagal Finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo rekomendacijas [10] įvertinome finansinių pataisų taikymo tikslingumą.

Vertindami Projekto administracinį techninį valdymą ir įgyvendinimą:

- peržiūrėjome SFMIS duomenų bazės Sanglaudos fondo modulyje esančią informaciją, susijusią su Audituojamu projektu;
- peržiūrėjome rangos darbų ir paslaugų sutartis, jų pakeitimus / papildymus, pagal FIDIC Raudonąją knygą pasirašytų sutarčių kiekio žiniaraščius;
- peržiūrėjome Audituojamo projekto techninio prižiūrėtojo parengtą galutinę techninės priežiūros ataskaitą;
- teikėme paklausimus galutiniam paramos gavėjui, APVA atsakingiems darbuotojams;
- testais patikrinome, ar:
  - visiems darbams, nurodytiems rangos darbų sutartyse, buvo išduoti statybos leidimai;
  - visi darbai (statiniai), nurodyti rangos darbų sutartyse, buvo pripažinti tinkami naudoti;
  - faktiškai atlikti darbai atitinka Komisijos sprendimuose [7, 8] patvirtintus Audituojamo projekto pagrindinius priežiūros rodiklius;
  - išlaidos visiems darbams, kurie numatyti Komisijos sprendimuose [7, 8], patirtos išlaidų tinkamumo laikotarpiu;
- siekdami įsitikinti Audituojamo projekto tikslų, susijusių su viešosios atliekų surinkimo paslaugos suteikimu ir vidutinio atliekų surinkimo procento regione pagerinimo bei perdirbamų atliekų surinkimo procento padidinimo faktiniu įgyvendinimu, kreipėmės[5] į Aplinkos ministerijos Atliekų departamentą prašydami pateikti Aplinkos ministerijos turimus 2010 m. Panevėžio apskrities duomenis apie jų faktinį įgyvendinimą;
- audito metu nustatę riziką, kad Audituojamo projekto priežiūros rodiklis – Panevėžio miesto sąvartyno uždarymas - įgyvendintas nevisiškai, t. y. neįrengta dujų surinkimo sistema, atlikome susijusias audito procedūras;

[5] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2011-05-31 raštas Nr. S-(70-1808)-1789 „Dėl informacijos pateikimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos departamentui.

- audito metu nustatę riziką, kad projekto lėšomis įsigyta atliekų rūšiavimo įranga yra neveikianti, siekdami įsitikinti šios įrangos veikimu, atlikome susijusias audito procedūras;
- audito metu nustatę riziką, kad pagal įrangos įsigijimo sutartis galėjo būti finansuotos įrangos garantinio remonto ir techninio aptarnavimo (kai per nustatytą laiką tiekėjas turi teikti visą aptarnavimą, t. y. garantinį remontą ir techninį aptarnavimą, įskaitant susidėvinčias detales, medžiagas) išlaidas, įvertinome šių išlaidų pobūdį ir tinkamumą finansuoti;
- audito metu nustatę riziką, kad pagal statybos darbų rangos sutartis galėjo būti finansuotos išlaidos, susijusios su techninės priežiūros inžinieriaus aptarnavimu, įvertinome šių išlaidų pobūdį ir tinkamumą finansuoti.

Įvertinome Sanglaudos fondo projektus administruojančių institucijų atliktas patikras vietose / patikrinimų rezultatus ir jų įforminimą. Siekdami surinkti informaciją, susijusią su Audituojamo projekto administruojančių institucijų atliktomis patikromis vietose ir patikrinimais, išsiuntėme paklausimus:

- Aplinkos misterijos Vidaus audito skyriui[6], kad ji pateiktų Audituojamo projekto atrankinių patikrinimų (valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo vertinimo ir išlaidų) ataskaitų sąrašą.
- VI, MI, kad pateiktų ataskaitas patikrinimų, atliktų pagal Komisijos reglamento (EB) 1386/2002 [5] 4 straipsnį;
- APVA, kad pateiktų ataskaitas patikrų vietoje, atliktų pagal Komisijos reglamento (EB) 1386/2002 [5] 4 straipsnį.

Peržiūrėjome visas turimas Europos Komisijos ir Europos audito rūmų audito ataskaitas, EK auditorių reikalavimu Aplinkos ministerijos atliktų APVA 2005 m. lapkričio 30 d. – 2006 m. spalio 31 d. vykdytų ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų dokumentų 62 viešųjų pirkimų patikrinimų lapus, siekdami nustatyti, ar šiose ataskaitose nėra pateikta informacijos apie Audituojamą projektą.

Vertindami, ar Audituojamo projekto apskaitos sistema ir audito seka yra tinkama, atlikome galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje nurodytų visų EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos sutikrinimus su visais APVA pateiktais:

- išlaidas pateisinančiais dokumentais[7];
- išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais[8];

[6] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2010-08-05 raštas Nr. S-(70-1808)-1785 „Dėl informacijos pateikimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnybai.
[7] Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-08-16 įsakymo Nr. 1K-288 2 p. – išlaidas pateisinantys dokumentai: rangovų (paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų) pateiktos sąskaitos, perdavimo-priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai ir kt. dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas.
[8] Ten pat, išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai – banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš banko sąskaitos ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

- apmokėjimo sąskaitų duomenimis.

Audito metu atlikome Europos Komisijai pateiktų mokėjimo paraiškų ir jų apmokėjimų sutikrinimus, taip pat pagal visas sutartis atliktų mokėjimų rangovams / paslaugų teikėjams / įrangos tiekėjams bendros sumos sutikrinimus su NFD ir APVA apskaitos duomenimis.

Vertinome, ar visas už paramos lėšas įsigytas turtas tinkamai nurodytas Galutinio paramos gavėjo apskaitoje.

Audito metu nustatę riziką, kad pagal statybos rangos darbų sutartį Nr. A/2007/P/35 Panevėžio miesto senojo sąvartyno uždarymo nebaigtos statybos 12 915 001,58 Lt išlaidos GPG apskaitoje nepagrįstai nurašytos į sąnaudas, o ne padidintas ilgalaikis turtas, atlikdami susijusias audito procedūras, vertinome išlaidų nurašymo į sąnaudas pagrįstumą.

Siekdami įsitikinti, kad Audituojamo projekto galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi padarytas išlaidas, parengėme Audituojamo projekto galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos audito programą.

Didžioji dalis įrodymų dėl audito patikimumo turi būti gauta atlikus detaliuosius testus, taigi, atlikome pakankamos apimties išlaidų testavimo savarankiškas procedūras.

Atsižvelgdami į tai, kad tarpinėse ir galutinėje išlaidų ataskaitose ir mokėjimo paraiškose EK tinkamos finansuoti išlaidos deklaruotos remiantis apmokėtomis sąskaitomis, siekdami tam tikrų Audituojamo projekto deklaraciją baigus teikti paramą rengiančiai institucijai iškeltų tikslų ir spręsdami atitinkamus uždavinius, audito metu atlikome šiuos pagrindinius darbus:

- kontrolės (atitikimo) testavimą ir apmokėjimo sąskaitų administravimo kontrolės testus;
- apmokėtų apmokėjimo sąskaitų detalųjį testavimą.

Siekdami padidinti audito poveikį, išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detaliojo patikrinimo testus sujungėme. Taigi, atlikome tiek pat išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detaliųjų testų. Atlikdami kontrolės (atitikimo) ir detalųjį testavimą išskyrėme šias su pagrindinėmis kontrolės priemonėmis susijusias klausimų grupes:

- apmokėjimo sąskaitos pagrįstumas / išlaidų tinkamumo vertinimas;
- mokėjimo atlikimas;
- mokėjimų apskaita.

Pavyzdžius kontrolės (atitikimo) ir detaliajam testavimui atrinkome remdamiesi Finansų ministerijos 2011 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (18.52.3-01)-6K-1103520 mums vertinti pateiktos projekto galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos duomenimis, kurioje EK tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19 144 512,02 EUR. Tinkamų projekto išlaidų laikotarpiu išrašytos ir apmokėtos 58 apmokėjimo sąskaitos (mokėjimo prašymai) – 19 144 512,02 EUR.

Projekto baigiamojo audito metu pateikus pastabas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2011-06-30 raštu Nr. (18.52.8-01)-6K-1106792 mums pakartotiniam vertinimui pateikė

patikslintą galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką, kurioje EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma buvo mažesnė 3 662,38 EUR, t. y. nurodyta EK deklaruota tinkamų išlaidų suma – 19 140 849,64 EUR.

Siekdami padidinti audito efektyvumą, gauti pakankamų, tinkamų ir patikimų audito įrodymų, reikalingų nuomonei Deklaracijoje pareikšti, ir vadovaudamiesi išankstinio planavimo metu surinkta informacija, tiriamąją duomenų visumą (generalinę aibę) suskirstėme pagal sutarčių rūšis (statybos rangos darbų, paslaugų teikimo, įrangos tiekimo). 4 lentelėje pateikiama Audituojamo projekto išlaidų duomenų visuma – projekto tinkamų finansuoti išlaidų laikotarpiu apmokėtos sąskaitos (mokėjimo prašymai) – detalizuota pagal sutartis ir atliktų darbų aktų išlaidų pozicijas (statybos rangos darbų sutarčių atveju).

Pavyzdžius išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detaliajam testavimui atrinkome šiais būdais:

- *Statybos rangos darbų sutarčių* atveju atliktų darbų aktų individualių išlaidų pozicijų pavyzdžių atrinkimui taikėme stratifikuotą atranką. Taikydami skirtingus TAS numatytus atrankos ir parinkimo būdus patikrinome atliktų darbų pozicijas, kurių suma – 9 765 820,87 EUR (51,0 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų):
  - *Teigiamos pozicijos*. Atliktų darbų aktų teigiamų pozicijų pavyzdžių atrinkimui naudodami programinę įrangą IDEA taikėme piniginio vieneto atranką (angl. *MUS*). Faktinę pavyzdžių imtį kontrolės (atitikimo) ir detaliajam testavimui sudarė 181 pavyzdys. Kadangi dalies atliktų aktų pozicijų vertė buvo didesnė negu pavyzdžių atrankos intervalo vertė, testuojamų atliktų darbų aktų pozicijų skaičius buvo 148, kurių suma – 9 765 820,87 EUR, sudarė pirmos subvisumos imtį.
  - *Nulinės pozicijos*. Atsižvelgdami į didelį atliktų darbų aktų pozicijų su nulinėmis reikšmėmis skaičių, nusprendėme surinkti papildomus įrodymus iš šios – antrosios subvisumos. IDEA programine įranga atsitiktinės atrankos būdu atsirinkome ir patikrinome 10 atliktų darbų aktų pozicijų, kurių suma yra lygi 0.
- *Paslaugų teikimo sutarčių* atveju taikėme visų objektų parinkimo būdą – patikrinome visas pagal šias sutartis išrašytas apmokėjimo sąskaitas, kurių suma – 505 644,79 EUR (2,6 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų).
- *Įrangos tiekimo sutarčių* atveju taikytas visų objektų parinkimo būdas – patikrinome visas pagal šias sutartis išrašytas apmokėjimo sąskaitas, kurių suma – 896 901,55 EUR (4,7 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų).

4 lentelė. Audituojamo projekto išlaidų duomenų visuma (detalizuota pagal sutartis ir atliktų darbų aktų pozicijas)

Sutarties Nr.	EK deklaruotų Projekto tinkamų išlaidų visuma[9]							
	apmokėjimo sąskaitos (mokėjimo prašymai)		atliktų darbų aktų pozicijos, iš jų:		teigiamos pozicijos		nulinės pozicijos	
	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR
Statybos darbų rangos sutartys								
A/2007/P/34	10	4 340 484,42	2 226	4 340 484,42	1 994	4 340 484,42	232	-
A/2007/P/35	19	13 401 481,26	2 752	13 401 481,26	2 314	13 401 481,26	438	-
Iš viso darbų sutartys:	**29**	**17 741 965,68**	**4 978**	**17 741 965,68**	**4 308**	**17 741 965,68**	**670**	**-**
Paslaugų teikimo sutartys								
2005/28/A/P/LT	5	215 215,56	-	-	-	-	-	-
A/2006/P/17	7	65 946,64	-	-	-	-	-	-
2007/120//A/P/LT	5	224 482,59	-	-	-	-	-	-
Iš viso paslaugų teikimo sutartys:	**17**	**505 644,79**	-	-	-	-	-	-
Įrangos tiekimo sutartys								
2009/26/A/PT/LT	1	263 505,80	-	-	-	-	-	-
2009/27/A/PT/LT	2	21 718,60	-	-	-	-	-	-
2009/28/A/PT/LT	2	112 502,89	-	-	-	-	-	-
2009/29/A/PT/LT	2	112 343,60	-	-	-	-	-	-
2009/30/A/PT/LT	2	66 930,00	-	-	-	-	-	-
2009/31/A/PT/LT	1	170 470,34	-	-	-	-	-	-
2009/32/A/PT/LT	2	149 430,32	-	-	-	-	-	-
Iš viso įrangos tiekimo sutartys:	**12**	**896 901,55**	-	-	-	-	-	-
Iš viso	**58**	**19 144 512,02**	x	x	x	x	**x**	**x**

Šaltinis – Valstybės kontrolė

[9] Remiantis 2011-04-01 raštu Nr. (18.52.3-01)-6K-1103520 mums vertinti pateiktos projekto galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos duomenimis. Projekto baigiamojo audito metu pateikus pastabas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2011-06-30 raštu Nr. (18.52.8-01)-6K-1106792 mums pakartotiniam vertinimui pateikė patikslintą galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką, kurioje EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma buvo mažesnė 3 662,38 EUR, t. y. nurodyta EK deklaruota tinkamų išlaidų suma – 19 140 849,64 EUR.

5 lentelėje pateikiami kontrolės (atitikimo) ir detaliajam išlaidų testavimui Audituojamo projekto baigiamojo audito metu atrinkti pavyzdžiai (pagal sutartis).

5 lentelė. Audituojamo projekto EK deklaruotų tinkamų išlaidų duomenų visuma ir atrinkti pavyzdžiai išlaidų testavimui (pagal sutartis)

Sutarties Nr.	EK deklaruotų Projekto tinkamų išlaidų visuma[10]		Detaliajam išlaidų testavimui atrinkta	
	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR
		Atliktų darbų aktų pozicijos		
Statybos darbų rangos sutartys				
A/2007/P/34	2 226	4 340 484,42	47	1 079 858,19
A/2007/P/35	2 752	13 401 481,26	101	8 685 962,68
Iš viso darbų sutartys:	**4 978**	**17 741 965,68**	**148**	**9 765 820,87**
		Apmokėjimo sąskaitos		
Paslaugų teikimo sutartys				
2005/28/A/P/LT	5	215 215,56	5	215 215,56
A/2006/P/17	7	65 946,64	7	65 946,64
2007/120//A/P/LT	5	224 482,59	5	224 482,59
Iš viso paslaugų teikimo sutartys:	**17**	**505 644,79**	**17**	**505 644,79**
Įrangos tiekimo sutartys				
2009/26/A/PT/LT	1	263 505,80	1	263 505,80
2009/27/A/PT/LT	2	21 718,60	2	21 718,60
2009/28/A/PT/LT	2	112 502,89	2	112 502,89
2009/29/A/PT/LT	2	112 343,60	2	112 343,60
2009/30/A/PT/LT	2	66 930,00	2	66 930,00
2009/31/A/PT/LT	1	170 470,34	1	170 470,34
2009/32/A/PT/LT	2	149 430,32	2	149 430,32
Iš viso įrangos tiekimo sutartys:	**12**	**896 901,55**	**12**	**896 901,55**
Iš viso	**x**	**19 144 512,02**	**x**	**11 168 367,21**

Šaltinis – Valstybės kontrolė

Taigi, atlikome kontrolės (atitikimo) ir detalųjį EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų (apmokėjimo sąskaitų) testavimą ir patikrinome 58,3 proc. (11 168 367,21 EUR) visų 2011 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštu Nr. (18.52.8-01)-6K-1106792 vertinti pateiktoje patikslintoje galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Siekdami gauti papildomą užtikrinimą, kad rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose nurodyti darbai atlikti, įranga įsigyta vadovaujantis Komisijos reglamente [5] ir sprendimuose [7, 8]

[10] Remiantis 2011-04-01 raštu Nr. (18.52.3-01)-6K-1103520 mums vertinti pateiktos projekto galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos duomenimis. Projekto baigiamojo audito metu pateikus pastabas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2011-06-30 raštu Nr. (18.52.8-01)-6K-1106792 mums pakartotiniam vertinimui pateikė patikslintą galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką, kurioje EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma buvo mažesnė 3 662,38 EUR, t.y. nurodyta EK deklaruota tinkamų išlaidų suma – 19 140 849,64 EUR.

nustatytais reikalavimais ir tikslais, 2011 m. gegužės 25 d. atlikome patikrą pas galutinį paramos gavėją – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centre ir projekto įgyvendinimo vietoje.

Atlikdami patikrą Audituojamo projekto įgyvendinimo vietoje, aplankėme Dvarininkų km., Miežiškių sen., Panevėžio r. pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/35 uždarytą Panevėžio miesto sąvartyną su priklausiniais, Panevėžio kompostavimo aikštelę, Panevėžio regioninį sąvartyną, įsitikinome jų ir kompensacinių priemonių gyventojams buvimu, susipažinome su atliekų šalinimo procesu naujame regioniniame sąvartyne. Per patikrą vietoje įsitikinome Komisijos sprendime (su pakeitimu) [7, 8] įvardytos Audituojamo projekto lėšomis įsigytos įrangos buvimu:

- rūšiavimo linijos krautuvo (sutartis Nr. 2009/27/A/PT/LT);
- ratinio krautuvo (sutartis Nr. 2009/28/A/PT/LT);
- žaliųjų atliekų smulkintuvo (sutartis Nr. 2009/29/A/PT/LT);
- kompaktoriaus (sutartis Nr. 2009/26/A/PT/LT);
- buldozerio (sutartis Nr. 2009/31/A/PT/LT);
- sijotuvo-būgninio rėčio (sutartis Nr. 2009/30/A/PT/LT);
- automobilio su priekaba (perkrovimo stotims aptarnauti) (sutartis Nr. 2009/32/A/PT/LT).

Siekdami įsitikinti didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių buvimu, patikrinome nestatistinės atsitiktinės atrankos būdu pasirinktą pagal sutartį Nr. A/2007/P/34 Biržų km, Biržų r. pastatytą didžiųjų atliekų priėmimo aikštelę, taip pat įsitikinome Biržų km, Biržų r. įrengtos perkrovimo stoties ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės buvimu.

Atlikdami patikrą vietoje patikrinome atliktus darbus, atrinktus remiantis audito išankstinio planavimo metu nustatyta rizika. Darbai atrinkti išnagrinėjus Komisijos sprendimą ir jo pakeitimą [7, 8], patikrinus UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro ilgalaikio turto ir kitus apskaitos dokumentus, įvertinus pasirašytas sutartis, peržiūrėjus Audituojamo projekto galutinę ataskaitą.

Pagal tai patikrai vietoje buvo atrinkta: dujų surinkimo sistema uždarytame Panevėžio miesto sąvartyne, pagal sutartį Nr. A/2007/P/35 įrengta tarnybinė zona ir administracinis pastatas naujajame regioniniame sąvartyne, atliekų rūšiavimo linija su įranga, paviršinio vandens ir nuotekų surinkimo sistema naujajame regioniniame sąvartyne (dvi lietaus nuotekų siurblinės, naftos gaudyklė, gruntinio vandens drenažo siurblinė).

Šios patikros metu taip pat patikrinome, ar Audituojamo projekto viešinimo priemonės (atminimo lentos) atitinka joms keliamus reikalavimus.

Pagal Audituojamo projekto galutinei ataskaitai patikrinti parengtą audito programą vertinta galutinė ataskaita:

- ar ji parengta pagal Tarybos reglamento [6] II priedo F straipsnio 4 dalyje galutinei ataskaitai nurodytus reikalavimus;

- gal joje yra reikšmingų netikslumų, ypač dėl Audituojamo projekto įvykdymo, laikantis jame nustatytų tikslų;
- ar ji tinkamai pateikia Audituojamo projekto įgyvendinimą – Komisijos sprendime [8] I priedo 8 dalyje numatytus tikslus.

Siekdami surinkti su Audituojamo projekto pažeidimais susijusią informaciją, išsiuntėme paklausimus:

- Finansų ministerijai[11], kuri turėjo pateikti informaciją apie visus jai žinomus su minėtu projektu susijusius pažeidimų atvejus;
- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai[12] (FNTT), kuri turėjo informuoti, ar buvo atliekami tyrimai, susiję su audituojamo Projekto vykdymu.

Atlikome Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų vertinimą, ar teisingai ir tvarkingai atlikti pažeidimų tyrimai.

Taip pat vertinome, ar informavimo ir viešinimo priemonės įgyvendintos pagal Komisijos reglamentuose [5, 11], nacionalinių teisės aktų ir Komisijos sprendimo [7] III.6 priede pateiktus reikalavimus.

Dalyvavome Sanglaudos fondo priežiūros komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo pristatomas Audituojamas projektas, peržiūrėjome Sanglaudos fondo priežiūros komiteto posėdžių protokolus.

Šio audito rezultatai, gauti įvertinus vidaus kontrolę ir atlikus detaliuosius testus, pateikiami ataskaitos 5–13 skyriuose.

[11] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės raštai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai: 2010-08-05 Nr. S-(70-1808)-1788 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ ir 2011-05-25 Nr. S-(70-1.8)-1144 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“.
[12] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2010-08-05 raštas Nr. S-(70-1808)-1789 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos.

5. Pažeidimai

Finansų ministerija 2010 m. rugpjūčio 23 d. raštu[13] informavo, kad vadovaujančioji institucija, gavusi informaciją apie įtariamą pažeidimą, susijusį su rangovu AB Panevėžio statybos trestu (sutartis Nr. A/2007/P/34, atliktų darbų aktas Nr. 8), 2010-02-25 raštu kreipėsi į APVA, prašydama atlikti pažeidimo tyrimą. APVA, atlikusi pažeidimo tyrimą, 2010-06-23 raštu informavo Finansų ministeriją, kad įtrauktos įrangos (konteinerių, bakelių, talpų, biotualetų) išlaidos negali būti pripažintos netinkamomis. VI, išnagrinėjusi APVA informaciją, nustatė, kad šiame akte papildomai įtrauktos išlaidos (priešgaisriniai skydai, ir kt., kurių tinkamumas finansuoti nėra pagrįstas) ir 2010-08-17 paprašė atnaujinti pažeidimo tyrimą. Apie įtariamo pažeidimo eigą ir rezultatus mus informuos iš karto, kai tik bus gautas atsakymas.

Finansų ministerija 2011 m. liepos 8 d. raštu[14], patikslindama informaciją apie visus Finansų ministerijai žinomus su Audituojamu projektu susijusius pažeidimų atvejus, t. y. visus pripažintus pažeidimus (priimtus sprendimus) ir vykstančius tyrimus dėl pažeidimų nustatymo, informavo, kad ministerijos turimais duomenimis, iki 2011 m. liepos 7 d. Europos Sąjungos struktūrinių fondų kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS) buvo užregistruoti 4 su projektu susiję pažeidimai, ir pateikė detalesnę informaciją. Šiuo raštu taip pat buvome informuoti, kad Finansų ministerija 2011 m. birželio 23 d. ir 2011 m. birželio 29 d. raštais yra pavedusi APVA atlikti pakartotinius įtariamų pažeidimų tyrimus dėl APVA nenustatytų pažeidimų (dėl projekto viešinimo priemonių, skelbtų nacionaliniuose arba regioniniuose visuomenės informavimo kanaluose; dėl informacinių stendų, pastatų pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/34; išlaidų, numatytų įrangos techniniam aptarnavimui ir priežiūrai; išlaidų, patirtų pagal techninės pagalbos sutartį Nr. 2005/28/A/P/LT, skirtų darbuotojų mokymams).

Finansų ministerija 2011 m. rugpjūčio 5 d. raštu[15] informavo, kad APVA naujų ar pasikeitusių aplinkybių dėl įtariamų pažeidimo tyrimų nėra gavusi, todėl palaiko savo išvadas, kad užfiksuoti projekto neatitikimai negali būti traktuojami kaip pažeidimai ir šiose išvadose priimtų sprendimų nekeis. Šiuo raštu taip pat buvome informuoti, kad Finansų ministerija raštu pakartotinai kreipsis į APVA dėl minėtų pažeidimų tyrimų atlikimo.

FNTT 2010 m. rugpjūčio 11 d. raštu[16] patvirtino, kad ikiteisminiai tyrimai, susiję su audituojamu Projektu, nebuvo atliekami.

Informacija apie su Audituojamu projektu susijusius pažeidimus pateikta 3 priede.

[13] Nr. ((4.79-08)-5K-1018223)-6K-1007742 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“.
[14] Nr. ((4.79-08)-5K-1115290)-6K-1107122 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“.
[15] Nr. ((4.75.25-08)-5K-1119765; 1120462; 1119892; 1120377)-6K-1108284 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“.
[16] Nr. 25/11-13-4562 „Dėl informacijos pateikimo“.

(1) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] 3 straipsnio b dalyje nurodyta, kad įgyvendinančiųjų įstaigų valdymo ir kontrolės sistemose, atsižvelgiant į administruojamos paramos apimtį, turi būti numatytos veiksmingos sistemos, užtikrinančios pakankamą funkcijų vykdymą.

Pagal Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (su pakeitimais) [9] 11.1 punktą, įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami, Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir laikomasi Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatų.

Audito metu nustatėme, kad APVA, taikydama finansines korekcijas už viešinimo taisyklių pažeidimus, vadovavosi jokiu vidiniu teisės aktu nepatvirtinta finansinių pataisų skaičiavimo metodika.

Audito metu taip pat nustatėme, kad APVA taiko skirtingas finansines pataisas už analogiškus viešinimo taisyklių pažeidimus. APVA, vykdydama pažeidimo tyrimus dėl sutarties Nr. A/2007/P/34 informacinių stendų atitikties Viešinimo taisyklėms [11], nustatė pažeidimus (paskelbti objekto statybos darbų įgyvendinimo terminai, o ne viso projekto įgyvendinimo terminai; nurodyta ne projekto, o rangos sutarties vertė nacionaline valiuta) ir pritaikė 5 proc. finansinę pataisą dėl keturių informacinių stendų (prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės, Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės, Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės ir Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės). Tuo tarpu informaciniame stende prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, agentūrai nustačius analogiškus pažeidimus, finansinės pataisos pritaikytos nebuvo.

Pagal sutartį Nr. A/2007/P/34 buvo įsigyti aštuoni informaciniai stendai. Vertindami Audituojamo projekto viešinimo priemones nustatėme, kad analogiški pažeidimai buvo padaryti septyniuose pagal šią sutartį įsigytuose stenduose. Dėl vieno informacinio stendo APVA nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima įsitikinti atitiktimi viešinimo taisyklėms.

Kadangi audito metu APVA parengė ir direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. T1-196 patvirtino Rekomendacijas dėl finansinių korekcijų, taikytinų iš SF finansuojamų projektų informavimo ir viešumo priemonėms, todėl rekomendacijos neteikiame.

Išvada

APVA neturėjo teisės aktais patvirtintos viešinimo taisyklių pažeidimų nustatymo ir vertinimo metodikos, todėl nustatyti atvejai, kai net to paties projekto analogiški pažeidimai įvertinami skirtingai arba visiškai nevertinami kaip pažeidimai. APVA nustatė pažeidimus ne visuose informaciniuose stenduose.

6. Patikrinimai

Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius 2010 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. (4-1)-D8-7622 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad Audituojamo projekto atrankinių patikrinimų neatliko.

Informacija apie Europos Audito Rūmų, Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų atliktus Audituojamo projekto patikrinimus / patikras pateikta ataskaitos 4 priede.

(2) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] 4 straipsnį, jeigu fiziniai arba administraciniai patikrinimai yra neišsamūs, tačiau atlikti atrinkus darbus arba sandorius, dokumentuose nurodomi atrinkti darbai arba sandoriai ir apibūdinamas atrankos metodas.

APVA, vykdydama sutarties Nr. A/2007/P/34 patikrą vietoje, tikrino, ar įranga ir darbuotojai aikštelėje atitinka konkurso pasiūlyme (sutarties dalyje) nurodytus duomenis. Audito metu nustatėme, kad į šį klausimą patikros vietoje ataskaitose pateikti teigiami atsakymai, tačiau ne visais atvejais ataskaitose nurodytas atrankos metodas, taikytas tikrinant atsirinktą įrangą ar medžiagas.

Rekomendacija dėl pastebėjime minimų trūkumų teikta Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/013 baigiamojo audito metu, todėl šio audito metu rekomendacija neteikiama (rekomendacija laikoma įgyvendinta).

Išvada

APVA patikrų vietoje ataskaitose nėra nurodytas atrankos metodas.

(3) Nedidelės svarbos pastebėjimas

APVA direktoriaus įsakymu patvirtintame procedūrų vadove [12] nustatytas patikros vietoje ataskaitos parengimo penkių darbo dienų terminas. Audito metu nustatėme, kad:

- patikra vietoje atlikta 2007 m. sausio 31 d., o patikros vietoje ataskaita Nr. SA-07 parengta 2007 m. kovo 19 d., vėluojant daugiau nei du su puse mėnesio;
- patikra vietoje atlikta 2009 m. gruodžio 8 d., o patikros vietoje ataskaita Nr. SA-60 parengta 2009 m. gruodžio 23 d., vėluojant 7 darbo dienas.

Išvada

Patikros vietoje ataskaitos parengtos nesilaikant APVA procedūrų vadove nurodyto termino.

7. Viešieji pirkimai

(4) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [13] 24 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

Šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 12 punkte nurodyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti tiekėjų informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina.

Vadovaujantis šio įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, nesibaigus pirkimo pasiūlymo pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus.

Vykdydama sutarties Nr. A/2007/P35 viešąjį pirkimą, APVA ne kartą tikslino / aiškino pirkimų dokumentus. Audito metu nustatėme, kad dalyvis, atsižvelgdamas į 2007-11-07 APVA raštą, paprašė paaiškinti APVA pateiktus atsakymus, susijusius su pirkimo dokumentų kokybe (kokiais dokumentais vadovautis įkainojant numatomus atlikti darbus)[17]. Į šį paklausimą nebuvo atsakyta, nes buvo pasibaigęs prašymų teikti paaiškinimus teikimo terminas. Pažymėtina, kad sutarties vykdymo metu dalyvio paklausime minimų darbų (vertė 935 000 Lt) buvo atsisakyta (priežastis – nenumatyta būtinybė visą reikalingą priemolinio grunto kiekį transportuoti ilgesniais atstumais).

APVA, vykdydama sutarties Nr. A/2007/P34 viešąjį pirkimą, dalyviams, įsigijusiems pirkimo dokumentus, 2007-10-05 nurodė, kad statinio projektuotojai pateiks pirkimo dokumentų IV skyrių (sutarties kiekių žiniaraščius), ir nukėlė pasiūlymo pateikimo terminą. UAB „Statva“ 2007-10-16 paklausė agentūros klausimų, susijusių ir su naujai pateiktų sutarties kiekių žiniaraščių kokybe. APVA, remdamasi pirkimo dokumentų I skyriaus 10.1 dalimi, kad konkurso dalyviai gali raštu prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti pirkimo dokumentus su sąlyga, kad tokie prašymai bus gauti ne vėliau kaip prieš 12 kalendorinių dienų iki pirkimo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, neatsakė į šį dalyvio klausimą. Audito metu nustatėme, kad vykdant sutartį kai kurie klausime nurodyti darbai (perkrovimo stočių vidaus elektros tinklų darbai įforminti pakeitimu Nr.27 (darbų vertė 42 261,06 Lt) buvo įforminti kaip papildomi.

Mūsų nuomone, šis pažeidimas neturi finansinio poveikio.

Išvada

APVA turėjo informacijos apie nekokybiškus pirkimo dokumentus, tačiau nesiėmė jokių priemonių šiai situacijai išsiaiškinti ir pakeisti.

[17] APVA 2007-11-07 rašto Nr. APVA-4775 „Atsakymai į konkurso dalyvių pateiktus klausimus“ 7-ajame atsakyme nurodyta, kad apvadinių pylimų formavimui ir dugno įrengimui turės būti atvežta 85 000 m^3 priemolinio grunto. Konkurso darbų kiekių žiniaraščio 3.2.1.1.8 pozicijoje nurodyta „Šlaitų supylimas, priemolinio grunto (50 proc. atvežtinio) paskleidimas, perstumiant gruntą – 85 000 m^3“. Dalyvis teiravosi, kuo vadovautis įkainuojant šią poziciją.

(5) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [13] (aktualios redakcijos nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08 ir nuo 2009-01-01 iki 2009-09-01) atitinkamai 6 ir 7 straipsnių dalis pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą. Pagal 16 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija pirkimui organizuoti ir atlikti privalo sudaryti viešojo pirkimo komisiją. Atsižvelgiant į šias nuostatas, viešojo pirkimo komisija privalo būti sudaryta viešojo pirkimo pradžioje.

Audito metu nustatyta, kad viešųjų pirkimų komisija buvo sudaryta ne iš karto prasidėjus viešajam pirkimui, o tik po tam tikro laiko:

- dėl sutarties Nr. A/2007/P/34 viešojo pirkimo procedūros pradėtos 2007 m. rugpjūčio 28 d., viešojo pirkimo komisija APVA direktoriaus įsakymu sudaryta 2007 m. spalio 12 d., t. y. praėjus daugiau negu 1,5 mėnesio.
- dėl sutarties Nr. A/2007/P35 viešojo pirkimo procedūros pradėtos 2007 m. rugsėjo 25 d., viešojo pirkimo komisija APVA direktoriaus įsakymu sudaryta 2007 m. spalio 31 d., t. y. praėjus daugiau negu vienam mėnesiui.
- dėl sutarčių Nr. 2009/26/A/PT/LT ir 2009/31/A/PT/LT viešojo pirkimo procedūros pradėtos 2009 m. gegužės 4 d., viešojo pirkimo komisija APVA direktoriaus įsakymu sudaryta 2009 m. liepos 30 d., t. y. praėjus beveik 3 mėnesiams.

Išvada

APVA nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų laiku sudaryti viešojo pirkimo komisiją.

(6) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [13] (aktualios redakcijos nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08 ir nuo 2009-01-01 iki 2009-09-01) 16 straipsnio 2 dalį, komisijos pirmininku ir nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad nepriekaištingos reputacijos asmenimis nelaikomi asmenys, teisti už sunkų ir labai sunkų nusikaltimą ar nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai arba valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas; asmenys, teisti už tyčinį nusikaltimą, – jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas; asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus; asmenys, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ir pan.

APVA prieš sudarydama viešųjų pirkimų komisiją sutartims (Nr. A/2007/P/34, A/2007/P35, 2009/26/A/PT/LT ir 2009/31/A/PT/LT) sudaryti, nepateikė įrodymų, kaip įsitikino, kad viešųjų

pirkimų komisijų nariai turi nepriekaištingą reputaciją (ypač tais atvejais, kai viešojo pirkimo komisijos nariais buvo skiriami ne perkančiosios organizacijos darbuotojai).

Išvada

APVA neįsitikino, kad viešųjų pirkimų komisijų nariai yra nepriekaištingos reputacijos asmenys.

(7) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [13] 24 straipsnio 2 dalies 19 punktą pirkimo dokumentuose turi būti pateikta informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. Jeigu kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Audito metu nustatėme, kad APVA parengtų Viešojo pirkimo sąlygų 4.5 punkte nurodyta, kad prekių kainos pateikiamos litais, t. y. įpareigojama pirkimo pasiūlymus pateikti litais. Dėl šios priežasties pirkimo dokumentuose nėra informacijos, kad, jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, tai jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Mūsų nuomone, šis pažeidimas yra formalus ir neturi finansinio poveikio.

Išvada

APVA pirkimo dokumentuose nenurodė Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 19 punkte reikalaujamos informacijos, jei pasiūlymuose kainos bus nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

(8) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo [13] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 27 straipsnio 2 dalimi, perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentus pateikti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 6 dienas nuo tiekėjų prašymo pateikti pirkimo dokumentus gavimo dienos, jei prašymas yra pateiktas likus pakankamai laiko (ne mažiau kaip 6 dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Audito metu APVA nepateikė įrodymų, kad dokumentai laiku buvo pateikti visiems dalyviams (nepateikti įrodymai dėl sutarties Nr. A/2007/P/34 viešojo pirkimo dalyvio UAB „Statva“ ir sutarties Nr. A/2007/P35 dalyvių UAB Panevėžio statybos tresto ir UAB „Panevėžio keliai“).

Išvada

Audito metu APVA nepateikė įrodymų, kad pirkimo dokumentai pateikti laiku.

(9) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo [13] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 24 straipsnio 7 dalimi, pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

Sutarties Nr. A/2007/P/35 pirkimo dokumentų I skyriaus 10.1 punkte nurodyta, kad konkurso dalyviai gali raštu prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti pirkimo dokumentus su sąlyga, kad tokie prašymai gauti ne vėliau kaip prieš 12 kalendorinių dienų iki pirkimo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Audito metu nustatėme, kad nebuvo atsakyta į 2007-10-29 UAB „Merko statyba“ rašto Nr. 5020/CU001SBU 10 klausimą: "Kiek procentų statybos metu gali sumažėti rangos darbų apimtys?“, nors terminas teikti paaiškinimus nebuvo pasibaigęs.

Išvada

Perkančioji organizacija, APVA, atsakė ne į visus dalyvių paklausimus.

(10) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [13] 94 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

Audito metu nustatėme, kad APVA:

- į 2009-05-28 UAB „Intrac“ pretenziją atsakė 2009-06-09, t. y. vėluojant 6 dienas;
- į 2009-06-11 „Avelin AP“ pretenziją atsakyta 2009-06-19, t. y. vėluojant 2 dienas;
- į 2009-06-10 UAB „Koger ECO“ pretenziją atsakyta 2009-06-19, t. y. vėluojant 3 dienas.

Išvada

APVA nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 5 dalyje nurodytų pretenzijų nagrinėjimo terminų.

(11) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006-11-29 įsakymu [14] patvirtintų rekomendacijų Nr. 1S-73 10 punkte siūloma, kad perkančioji organizacija savo kompetencijai pasiliktų tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą. Pretenzijoms nagrinėti būtų įgaliojamas asmuo, ne šios komisijos narys, arba sudaroma kita komisija. Atliekant pirkimą pagal sutartis Nr. 2009/26/A/PT/LT ir 2009/31/A/PT/LT, UAB „Witractor“ ir UAB „Intrac Lietuva“ pretenzijas nagrinėjo APVA viešojo pirkimo komisijos pirmininkė.

Išvada

Tiekėjų pateiktų pretenzijų nagrinėjimas neatitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-73 patvirtintų rekomendacijų APVA gautas pretenzijas nagrinėti pavesti su viešųjų pirkimų komisija nesusijusiems asmenims ar sudarytai kitai komisijai.

8. Išlaidų tinkamumas

(12) Didelės svarbos pastebėjimas

Kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 [15] 23 straipsnyje, išlaidos, skirtos pirkti ar statyti įrenginius ir įrangą, kurie turi būti įrengti ir sumontuoti projekte nuolatiniam naudojimui, yra tinkamos, jeigu jos įtrauktos į už įgyvendinimą atsakingos įstaigos ilgalaikio naudojimo įrangos aprašą ir pagal tipines apskaitos nuostatas yra laikomos kapitalo sąnaudomis. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 35 straipsnyje numatyta, kad projekto arba projektų grupės veiklos sąnaudos nėra tinkamos. Vykdančio personalo mokymo ir projekto bei jo įrangos bandymų išlaidos yra tinkamos bet kuriuo būtinu laikotarpiu, nurodytu Komisijos sprendime.

Audito metu nustatėme, kad perkančioji organizacija (APVA), atlikdama įrangos pirkimus, pirkimo dokumentų techninės specifikacijos dalyje tiekėjams nurodė pateikti atsargines dalis, kurios bus reikalingos pirmuosius dvejus eksploatacijos metus (3 000 darbo valandų), taip pat teikti visą aptarnavimą: garantinį remontą ir techninį aptarnavimą, įskaitant susidėvinčias detales, medžiagas ir darbą. Audito metu įsitikinome, kad tiekėjai įvykdė visus sutartyse numatytus įsipareigojimus.

Galutinis paramos gavėjas, apskaitoje registruodamas projekto įgyvendinimo metu įsigytą įrangą, į šio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą nepagrįstai įtraukė įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantiniu laikotarpiu, išlaidas.

Pagal 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 1999/44/EB „Dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų“ 6 straipsnio 1 dalį, garantijos teikėjas yra teisiškai įsipareigojęs pirkėjui garantijos dokumente nustatytomis sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, garantijos dokumente pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl sąlygų, kurias pardavėjas įsipareigoja įvykdyti. Direktyvoje minimus garantinius įsipareigojimus, susijusius su prekių įsigijimu, apskaitos požiūriu galima suskirstyti į:

- defektinius įsipareigojimus, susijusius su prekių trūkumais, atsiradusiais dėl gamintojo kaltės;
- su eksploatacija (veikla) susijusius įsipareigojimus, tai atsarginės dalys, natūraliai susidėvėjusių dalių keitimas, remontas ir pan.

Mūsų nuomone, garantiniai įsipareigojimai, susiję su defektų šalinimu, yra tinkamos finansuoti išlaidos, nes remiantis 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 [15] 23 straipsniu pagal tipines apskaitos nuostatas yra laikomos kapitalo sąnaudomis.

Garantiniai įsipareigojimai, susiję su įrenginio eksploatacijos metu per nustatytą tarnavimo laiką natūraliai susidėvinčiomis dalimis ir medžiagomis (įvairiais skysčiais) bei remontu nėra tinkamos finansuoti išlaidos, nes eksploatuojant įrenginį, tai yra susidėvėjusių įrenginio dalių pakeitimo (veiklos) sąnaudos, kurios pagal tipines apskaitos nuostatas nėra kapitalizuojamos, o yra traukiamos į atsargas arba veiklos sąnaudas ir nelaikomos įrangos bandymų išlaidomis. 28 316,00 EUR (97 769,49 Lt) išlaidos, susijusios su įrangos techniniu aptarnavimu ir priežiūra, įskaitant susidėvinčias atsargines garantiniu laikotarpiu, mūsų nuomone, yra netinkamos finansuoti (žr. 6 lentelę).

Išvada

EK deklaruotos **28 316,00 EUR** įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantiniu laikotarpiu, išlaidos, mūsų nuomone, yra netinkamos finansuoti.

(13) Didelės svarbos pastebėjimas

Pagal Komisijos reglamento Nr. 16/2003 [15] 5 straipsnio 1 dalį, išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime [7, 8], atsižvelgiant į Komisijos reglamento Nr. 1386/2002 [5] 8 straipsnio 2 dalies b punktu, ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu.

Komisijos sprendimo [8] I priedo 13.2 dalyje numatyta techninė pagalba GPG ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui.

Paraiškos paramai gauti 13.2 dalyje nurodyta, kad techninė pagalba yra suteikiama galutiniam paramos gavėjui deleguotų funkcijų vykdymui.

Audito metu nustatėme, kad pagal techninės pagalbos sutartį Nr. 2005/28/A/P/LT buvo kompensuotos galutinio paramos gavėjo ir 7-nių jo valdybos narių mokomosios kelionės į Švediją išlaidos. Projekto lėšomis finansuotos ir EK deklaruotos 13 636,16 EUR (47 082,93 Lt) veiklos išlaidos, skirtos minėtų 7-nių GPG valdybos narių (savivaldybių ir AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ darbuotojų) mokymui, tiesiogiai nesusijusios su projekto tikslais, mūsų nuomone, yra netinkamos finansuoti.

Išvada

EK deklaruotos **13 636,16 EUR** veiklos išlaidos, patirtos dėl 7-nių galutinio paramos gavėjo valdybos narių mokomosios kelionės į Švediją, kurios tiesiogiai nesusijusios su projekto tikslais, mūsų nuomone, yra netinkamos finansuoti.

6 lentelė. Į ilgalaikį turtą įtraukta įrenginių vertė ir išlaidos techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu

Nr.	Sutarties Nr.	Įrenginys	Į ilgalaikį turtą įtraukto turto vertė, Lt	PVM sąskaita faktūra (be PVM), Lt			Sutarties priedas, 2 forma, Lt		
				Įrenginio vertė	Techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu	Mokymai, instrukcijos	Įrenginio vertė	Mokymai, instrukcijos	Techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu
1	2009/27/A/PT/LT	Rūšiavimo linijos krautuvas	74 990,00			74 990,00	72 550,00	200,00	2 240,00
2	2009/28/A/PT/LT	Ratinis krautuvas	388 450,00			388 450,00	365 450,00	3 000,00	20 000,00
3	2009/29/A/PT/LT	Žaliųjų atliekų smulkintuvas	387 900,00			387 900,00	345 921,49	3 000,00	38 978,51
4	2009/26/A/PT/LT	Kompaktorius	909 832,83			909 832,83	890 946,01	1 035,84	17 850,98
5	2009/31/A/PT/LT	Buldozeris	588 600,00			588 600,00	573 400,00	300,00	14 900,00
6	2009/32/A/PT/LT	Automobilis su priekaba (perkrovimo stotims aptarnauti)	515 953,00			515 953,00	511 853,00	300,00	3 800,00
Iš viso, Lt			**2 865 725,83**			**2 865 725,83**	**2 760 120,50**	**7 835,84**	**97 769,49**
Iš viso, EUR			**829 971,57**			**829 971,57**	**799 386,15**	**2 269,42**	**28 316,00**

Šaltinis – Valstybės kontrolė

9. Audito seka ir apskaitos sistemos

Išvada

Audito seka ir apskaitos sistemos atitiko joms keliamus reikalavimus.

10. Viešinimo priemonės

(14) Vidutinės svarbos pastebėjimas

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004 [11] 4 straipsnį, be projekto aprašymo, priemonės ir informavimo bei viešumo instrumentai apima ir elementą – Europos vėliavą, laikantis priede nustatytų grafinių taisyklių.

Vertindami Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje pateiktas viešinimo priemones nustatėme atvejus, kai nebuvo nurodyta privaloma informacija, t. y. Europos Sąjungos vėliava:

- 2007-03-31 ir 2007-04-03 siužetuose per Kupiškio rajono televiziją „Kupiškio TV“;
- 2007-06-14 ir 2007-06-28 reportažuose per Panevėžio miesto ir rajono televiziją „KTV plius“.

Išvada

Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje nurodytos kai kurios viešinimo priemonės, demonstruotos televizijoje neturėjo privalomojo elemento, nurodyto Komisijos reglamente (EB) Nr. 621/2004.

11. Projekto galutinė ataskaita

Finansų ministerija 2011 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (18.52.3-01)-6K-1103520 (žr. 5 priedą) Valstybės kontrolei vertinti pateikė Audituojamo projekto galutinę ataskaitą. Atlikusi pažeidimų tyrimus, Finansų ministerija 2011 m. birželio 30 d. raštu Nr. (18.52.8-01)-6K-1106792 (žr. 6 priedą) pateikė patikslintą Audituojamo projekto galutinę ataskaitą (žr. 8 priedą).

(15) Didelės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatėme, kad pasiekti ne visi Komisijos sprendime [7, 8] nurodyti tikslai:

- vienas iš fizinių tikslų – viešąsias atliekų surinkimo paslaugas papildomai teikti 60 000-čių žmonių ir taip iki 2010 m. pagerinti vidutinį atliekų surinkimo procentą regione nuo vidutiniškai 72 proc. iki 98 proc. miesto vietovėse ir iki 85 proc. kaimo vietovėse.

Remdamiesi Aplinkos ministerijos 2011-06-16 raštu Nr. (15-1)-D8-5679 pateiktais 2010 metų duomenimis, gautais iš Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento, apie šio tikslo faktinį įgyvendinimą Panevėžio apskrityje, nustatėme, kad 2005–2010 m. laikotarpiu viešąja atliekų tvarkymo

paslauga papildomai pradėjo naudotis 89 311 gyventojų, dėl to, 2010 m. sukūrus komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, paslauga miesto vietovėse, kuriose gyvena daugiau kaip 1 000 gyventojų, naudojosi 96 proc., o miesto vietovėse, kuriose gyvena mažiau nei 1 000 gyventojų – 69 proc.

Taigi, įgyvendinus projektą vidutinis atliekų surinkimo procentas Panevėžio regiono miesto vietovėse pagerintas iki 96 proc., o turėjo būti iki 98 proc., ir iki 69 proc. kaimo vietovėse, o turėjo būti iki 85 proc.

- Komisijos sprendimuose [7, 8] nurodytas kitas fizinis tikslas – sukūrus naująją atliekų tvarkymo sistemą ir įrengus atliekų rūšiavimo liniją, padidinti bendrą perdirbamų atliekų surinkimo procentą nuo 0 proc. 2005 m. iki 23,6 proc. 2010 metais.

Remdamiesi Aplinkos ministerijos 2011-06-16 raštu Nr. (15-1)-D8-5679 pateiktais 2010 metų duomenimis, gautais iš Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento, apie šio tikslo faktinį įgyvendinimą Panevėžio apskrityje, nustatėme, kad Panevėžio regione 2010 m. buvo perdirbta 14 proc. komunalinių atliekų.

Taigi, sukūrus naująją atliekų tvarkymo sistemą ir įrengus atliekų rūšiavimo liniją bendras perdirbamų atliekų surinkimo procentas padidintas iki 14 proc., o turėjo būti iki 23,6 proc.

Išvada

Pasiekti ne visi Komisijos sprendime nurodyti tikslai.

(16) Didelės svarbos pastebėjimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [6] II priedo F straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Komisijai galutinė ataskaita turi būti pateikta per šešis mėnesius po to, kai baigiamas vykdyti projektas arba projekto etapas. Šio reglamento II priedo D straipsnio 2.d dalyje nustatyta, kad per šešis mėnesius nuo nustatyto darbų pabaigos termino Komisijai pateikiama mokėjimo paraiška ir paraiška dėl išlaidų, nustatytų sprendime suteikti paramą projektui, projekto etapui ar projekto grupei.

Pagal Sanglaudos fondo ir Ex-ISPA 2000–2006 metų projektų uždarymo gairių (angl. *Guidelines on the Closure of Cohesion Fund and Ex-ISPA projects 2000-2006)* [4] 2.2 p. rekomenduojama deklaraciją baigus teikti paramą pateikti per 6 mėn. nuo paskutinės išlaidų tinkamumo datos kartu su prašymu galutiniam mokėjimui ir galutine išlaidų deklaracija bei projekto galutine ataskaita.

Remiantis EK gairėmis dėl baigiamosios deklaracijos parengimo (angl. *Guidance note on declaration at winding-up of projects under article 12 1. f of Regulation 1164/94, article 13 and annex III of regulation 1386/2002*) [3], rekomenduojama, kad Deklaracija turi būti pateikta baigus kiekvieną projektą, projekto etapą (techniškai ir finansiškai nepriklausomą) arba projektų grupę ir ne vėliau kaip pateikus prašymą galutiniam mokėjimui ir galutinę išlaidų deklaraciją.

Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (su pakeitimais) [9] reglamentuoti projekto galutinės ataskaitos ir galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos pateikimo susijusioms institucijoms terminai.

Remiantis taisyklių 6.10 punktu, Mokėjimo institucija baigiamajam valstybiniam auditui atlikti pateikia įgyvendinančiosios institucijos patvirtintą galutinę projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitą ir mokėjimo paraišką Europos Komisijai gauti galutinę išmoką, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki nustatyto šių dokumentų pateikimo Europos Komisijai termino.

Mokėjimo institucija Audituojamo projekto galutinę ataskaitą ir galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką deklaraciją baigus teikti paramą rengiančiai institucijai – Valstybė kontrolei pateikė nesilaikydama Vyriausybės nutarimu Nr. 1026 patvirtintose taisyklėse [9] nustatyto šių dokumentų pateikimo Valstybės kontrolei termino:

- Audituojamo projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita bei projekto galutinė ataskaita pateiktos laiku, t. y. 2011 m. balandžio 1 d., tačiau šiuo raštu paaiškinta, kad, atsižvelgiant į atliekamo pažeidimo tyrimo rezultatus, Audituojamo projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita gali būti tikslinamos (žr. 5 priedą).
- Audituojamo projekto patikslinta galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita bei projekto galutinė ataskaita pateikta 2011 m. birželio 30 d., t. y. Tarybos reglamentu nustatyto šių dokumentų pateikimo Europos Komisijai termino paskutinę dieną. Šiuo raštu paaiškinta, kad inicijuoti įtariamų pažeidimų tyrimai, susiję su išlaidų tinkamumu finansuoti, todėl, atsižvelgiant į įtariamų pažeidimų tyrimo rezultatus, Audituojamo projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita ir projekto galutinė ataskaita gali būti tikslinamos (žr. 6 priedą).

Išvada

Valdymo ir kontrolės sistemos institucijos neužtikrino, kad kokybiškai parengtos Projekto galutinė ataskaita, galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška Valstybės kontrolei būtų pateiktos laiku.

(17) Nedidelės svarbos pastebėjimas

Vadovaujantis Komisijos reglamento Nr. 1164/94 [6] II priedo F straipsnio 4 dalies b punktu, galutinėje ataskaitoje turi būti informacija apie visas projekto viešinimo priemones.

Audito metu nustatėme, kad Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje ir išlaidų ataskaitoje yra nurodytos tik tos viešinimo priemonės, kurios finansuotos iš Audituojamo projekto lėšų, o savarankiškai galutinio paramos gavėjo vykdytos viešinimo priemonės nėra nurodytos.

Išvada

Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje ir išlaidų ataskaitoje nėra nurodytos visos viešinimo priemonės, kaip tai numatyta Komisijos reglamento Nr. 1164/94 II priedo F straipsnio 4 dalies b punkte.

12. Projekto galutinė išlaidų ataskaita ir mokėjimo paraiška

Finansų ministerija 2011 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (18.52.3-01)-6K-1103520 (žr. 5 priedą) Valstybės kontrolei vertinti pateikė Audituojamo projekto galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką, 2011 m. birželio 30 d. raštu Nr. (18.52.8-01)-6K-1106792 (žr. 6 priedą) – patikslintą Audituojamo projekto galutinę išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką, kurioje EK tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19 140 849,64 EUR. Europos Komisijai deklaruota prašoma Bendrijos pagalbos likučio suma – 3 018 562,20 EUR (žr. 7 priedą).

Informacija apie Europos Komisijai teiktas mokėjimo paraiškas ir Europos Komisijos pervestas Sanglaudos fondo lėšas pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė. Europos Komisijai teiktos mokėjimo paraiškos ir Europos Komisijos pervestos SF lėšos

Mokėjimo paraiška	Paraiškos pateikimo EK data	Mokėjimo paraiškoje prašoma SF dalis, EUR	EK pervesta SF dalis, EUR	Skirtumas
Avansinio	2007-12-13	3 312 790,00	3 312 790,00	-
I tarpinio	2008-04-28	4 734 692,61	4 734 692,61	-
II tarpinio	2008-11-21	1 101 998,91	1 101 998,90	0,01
III tarpinio	2009-04-14	2 417 194,33	2 417 194,33	-
IV tarpinio	2010-02-24	1 684 484,15	1 684 484,15	-
Galutinio[18]	2011-06-30	3 018 562, 20	-	3 018 562,21
	Iš viso	**16 269 722,20**	**13 251 159,99**	**3 018 562,21**

Šaltinis – mokėjimo institucija

8 lentelėje pateikiamas Sanglaudos fondo paramos likučio apskaičiavimas.

8 lentelė. SF paramos likučio apskaičiavimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Suma, EUR
1.	Komisijos sprendimu patvirtinta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma	19 487 000,00
2.	EK deklaruotos tinkamos finansuoti projekto išlaidos	19 140 849,64
3.	Audito metu nustatytos netinkamos finansuoti projekto išlaidos (žr. (12), (13) pastebėjimus)	41 952,16
4.	Perskaičiuotos projekto tinkamos finansuoti išlaidos (2 eil. – 3 eil.)	19 098 897,48
5.	Perskaičiuotų projekto tinkamų finansuoti išlaidų SF dalis (4 eil. x 85 proc.)	16 234 062,86
6.	Pagal avansinio ir tarpinio mokėjimo paraiškas Europos Komisijos pervestos sumos	13 251 159,99
7.	Perskaičiuotas SF paramos likutis (5 eil. – 6 eil.)	2 982 902,87

Šaltinis – Valstybės kontrolė

[18] VK vertinti pateikta Galutinio mokėjimo paraišką ir išlaidų ataskaita.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad audito metu nustatėme netinkamų finansuoti išlaidų, Projekto galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje perskaičiuotas Sanglaudos fondo paramos likutis turi būti **2 982 902,87 EUR**.

13. Klaidų vertinimas

Atlikę detalųjį testavimą nustatėme žinomą klaidą – **41 952,16 EUR** (SF dalis – 35 659,34 EUR), kurią sudaro:

- **28 316,00 EUR** dėl išlaidų, kurios susijusios su įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias dalis garantinio laikotarpio metu, išlaidomis (žr. (12) pastebėjimą);
- **13 636,16 EUR** dėl patirtų veiklos išlaidų, kurios tiesiogiai nesusijusios su projekto tikslais (žr. (13) pastebėjimą).

Projekto baigiamajam auditui taikytas reikšmingumo lygis yra 2 proc. (382 816,99 EUR) visų EK deklaruotų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Išvada

Audito metu nustatyta žinoma klaida (**41 952,16 EUR**) neviršija nustatyto reikšmingumo lygio (**382 816,99 EUR**).

7-ojo audito departamento direktorė Vilija Stirbienė

7-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė Žaneta Rozenbergaitė

Valstybinio audito ataskaita (3 egz.) pateikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
Valstybinio audito ataskaitos kopija pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.

PRIEDAI

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
1 priedas

Valstybinio audito ataskaitoje vartojamos santrumpos

Santrumpa	Pavadinimas
AM VAS	Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius
APA	Atliekų priėmimo aikštelės
APVA	Aplinkos projektų valdymo agentūra
Deklaracija	Deklaracija baigus teikti paramą
EK	Europos Komisija
EK rekomendacijos	EK rekomendacijos dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr.1164/94 12 straipsnio 1 dalies punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą
ES	Europos Sąjunga
FIDIC	Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
FNTT	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
GPG	Galutinis paramos gavėjas
IĮ	Įgyvendinančioji institucija
ISPA	Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas
LR	Lietuvos Respublika
MI	Mokėjimo institucija
SF	Sanglaudos fondas
SFMIS	Europos Sąjungos struktūrinių fondų kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema
TI	Tarpinė institucija
TID	Transporto investicijų direkcija
UAB	Uždaroji akcinė bendrovė
VI	Vadovaujančioji institucija
VK	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
VPT	Viešųjų pirkimų tarnyba

Šaltinis – Valstybės kontrolė

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
2 priedas

Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, kuriais remtasi valstybinio audito ataskaitoje

1. Lietuvos Respublikos Seimo 2007-10-11 nutarimas Nr. X-1295 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Europos Sąjungos finansinės paramos auditus“ pakeitimo“.
2. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas, 1995-05-30 Nr. I-907 (su pakeitimais).
3. 2005 m. balandžio 15 d. EK rekomendacijos dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą.
4. Sanglaudos fondo ir ex-ISPA priemonės projektų 2000–2006 uždarymo gairės, 2008-04-23 Nr. COCOF 08/0022/02-EN.
5. 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1386/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų tvarkos atlikimo.
6. 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą.
7. 2005 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas Nr. K(2005) 5289 dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
8. 2009 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimas Nr. K(2009) 8360, iš dalies keičiantis 2005 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimą Nr. K(2005) 5289.
9. Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (su pakeitimais).
10. Rekomendacijos dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo COCOF 07/0037/03-LT.
11. 2004 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 621/2004, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su Sanglaudos fondo veikla.

12. Aplinkos projektų valdymo agentūros procedūrų vadovas, patvirtintas APVA direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. T1-92 „Dėl Aplinkos projektų valdymo agentūros procedūrų vadovo patvirtinimo“ (su pakeitimais).
13. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su pakeitimais).
14. Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijos, patvirtintos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006-11-29 įsakymu Nr. 1S-73 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“.
15. 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2003, nustatantis specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo.

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
3 priedas

Informacija apie Audituojamo projekto pažeidimus

Eil. Nr.	Pranešimo apie pažeidimą		Pažeidimo			Priimti sprendimai	Pažeidimo dydis (EUR)				Komentaras
	Nr.	data	registracijos numeris	nustatymo data	tipas		iš viso (9+10+11)	SF lėšos	BF lėšos		
									Valstybės biudžeto dalis	Nuosavų lėšų dalis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	2011-06-17	LT/11/078/SF/0	2011-06-16	Vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 dalis lėšų buvo panaudota netinkamai (informaciniai stendai neatitinka reikalavimų)	Tyrimas užbaigtas. 2011-06-16 APVA direktoriaus įsakymu nurodyta GPG grąžinti lėšas į biudžetą	405,47	344,65	60,82	-	
2	1	2011-06-16	LT/11/079/SF/0	2011-06-16	Vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 dalis lėšų buvo panaudota netinkamai (informaciniai stendai neatitinka reikalavimų)	Tyrimas užbaigtas. 2011-06-16 APVA direktoriaus įsakymu nurodyta GPG grąžinti lėšas į biudžetą	173,78	147,71	26,07	-	
3	1	2011-06-21	LT/11/080/SF/0	2011-06-21	Vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 dalis lėšų buvo panaudota netinkamai (pagal sutartį Nr. A/2007/P/34 patirtos išlaidos techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimui)	Tyrimas užbaigtas. 2011-06-21 APVA direktoriaus įsakymu nurodyta GPG grąžinti lėšas į biudžetą	1 847,41	1 570,30	277,11	-	

4	1	2011-06-21	LT/11/081/SF/0	2011-06-21	Vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 dalis lėšų buvo panaudota netinkamai (pagal sutartį Nr. A/2007/P/35 patirtos išlaidos techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimui)	Tyrimas užbaigtas. 2011-06-21 APVA direktoriaus įsakymu nurodyta GPG grąžinti lėšas į biudžetą	1 235,72	1 050,36	185,36	-

Šaltinis – VI

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
4 priedas

Informacija apie Audituojamo projekto patikrinimus

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos numeris	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Europos Audito Rūmai	Misijos 2008-11-17..21, 2008-12-01..12, 2009-01-05..15	DAS 2008	Sanglaudos fondo išmokų teisėtumo ir tvarkingumo auditas ir Sanglaudos fondo išmokų finansinių klaidų taisymo valdymo vertinimas	DAS 2008 misijos metu EAR vertino 10 Sanglaudos fondo Lietuvoje finansuojamų projektų, tame tarpe ir audituojamą projektą. Pirmasis audito tikslas – užtikrinti, kad 10 atsitiktine tvarka atrinktų projektų deklaruojamos ir Sanglaudos fondo kompensuojamos išlaidos būtų teisėtos ir tvarkingos. Antrasis audito tikslas buvo įvertinti nustatytų projekto išlaidų finansinių klaidų, dėl kurių iš Europos Komisijos išmokėtos neteisingos sumos, taisymo valdymą. Klaidos gali būti nustatytos atliekant įvairių rūšių kontrolę, t. y. atliekant kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 1382/2002 4, 8 ar 9 straipsnius, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ar nacionalinių ir regioninių kontrolės institucijų auditą.	Su audituojamu projektu susiję pastebėjimai: EAR nurodė, kad APVA įgyvendindama projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 perkančiosioms organizacijoms mokėdavo 30–40 % sutarties vertės dydžio avansus. Atsižvelgdamos į tokias neįprastai didelės vertės išankstines išmokas, Audito Rūmų tarnybos pateikė užklausas kitoms perkančiosioms organizacijoms, kuriose atliktas auditas, kad įsitikintų, ar tokia praktika atitinka rinkos sąlygas. Kitos perkančiosios organizacijos manė, kad 30–40 % sutarties vertės suma yra per didelė. Audito rūmų tarnybos mano, kad projekte 2005/LT/16/C/PE/003 4 sutarčių rinkos išankstinės išmokos neatitiko praktikos.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos numeris	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimai (15 proc.)					
LR Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius	-	-	-	-	-
Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikros					
Tarpinė institucija (LR aplinkos ministerija)	2007-06-28	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikros lapas Nr. 6	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikrinimas	Sutartis Nr. A/2006/P/17 „Visuomenės informavimas ir švietimas“	AM, patikrinusi pirkimą konstatavo, kad viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikrinimo metu Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatyta.
Tarpinė institucija (LR aplinkos ministerija)	2007-09-07	Patikros lapas Nr. 7	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikrinimas	Sutartis Nr. 2005/28/A/P/LT „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninės pagalbos teikimas UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“	Patikrinus pirkimą, esminių procedūrų pažeidimų nenustatyta, išskyrus smulkius pastebėjimus, kurie neturėjo įtakos sutarties sudarymui.
Patikrinimai / patikros, susiję su Audituojamu projektu					
Mokėjimo institucija	2008-03-07	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančioje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto I tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1) Sutarties Nr. 2005/28/A/P/LT sąskaita Nr. 4 – 44 238,01 EUR; 2) Sutarties Nr. A/2007/P/35 sąskaita Nr. 1 – 4 089 107,24 EUR.	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 5 570 226,60 EUR sumos.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos numeris	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Mokėjimo institucija	2008-11-11	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančioje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto II tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1) Sutarties Nr. 2005/28/A/P/LT sąskaita Nr. 5 – 72 435,41 EUR; 2) Sutarties Nr. A/2007/P/35 sąskaita Nr. 4 – 349 181,22 EUR.	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 1 296 469,30 EUR sumos.
Mokėjimo institucija	2009-03-20	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančioje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto III tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1) Sutarties Nr. A/2007/P/34 sąskaita Nr. 7 – 435 581,19 EUR; 2) Sutarties Nr. A/2007/P/35 sąskaita Nr. 5 – 538 108,17 EUR.	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 2 843 758,03 EUR sumos.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos numeris	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Mokėjimo institucija	2009-12-30	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančioje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto IV tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1) Sutarties Nr. 2007/120/A/P/LT sąskaita Nr. 2 – 72 463,23 EUR; 2) Sutarties Nr. A/2006/P/17 sąskaita Nr. 6 – 11 618,51 EUR.; 3) Sutarties Nr. A/2007/P/34 sąskaita Nr. 9 – 751 624,08 EUR; 4) Sutarties Nr. A/2007/P/35 sąskaita Nr. 13 – 811 674,14 EUR.	Patikros rezultatai nesudaro prielaidų patvirtinti mokėjimo paraišką EK dėl visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 3 853 866,10 EUR sumos. Kadangi pažeidimo tyrimas užtrunka kelias savaites, o NFD privalo pateikti kuo daugiau mokėjimo paraiškų EK, nutarta teikti mokėjimo paraišką EK, minusuojant per ataskaitinį laikotarpį pagal minėto rangovo sąskaitoje deklaruojamas 25 787,94 EUR išlaidas už įsigytą trumpalaikį turtą, deklaruojant EK 3 828 078,16 EUR sumą.
Patikros Audituojamo projekto vykdymo vietoje					
Įgyvendinančioji institucija	2007-01 -31	SA-07	Patikra projekto vykdymo vietoje (apima administracinį, finansinį, techninį aspektus)	Planinė patikra. Patikrinimas vietoje buvo atliktas sutarčiai dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tarp Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“.	Esminių trūkumų nebuvo nustatyta. Pateiktos rekomendacijos paramos gavėjui: 1) Nuolat koreguoti procedūrų vadovą, atsižvelgiant į pastebėtus trūkumus ar klaidas, bei reaguoti į besikeičiančią padėtį ir vadovautis juo; 2) Nevėluojant teikti visas ataskaitas bei kitus Procedūrų vadove numatytus dokumentus Aplinkos projektų įgyvendinimo agentūrai; 3) Įsitikinti, kad prasidėjus rangos sutartimis nekiltų problemų dėl žemės nuosavybės (ar nėra privačių valdų gretimybės, privažiavimo).

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos numeris	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Įgyvendinančioji institucija	2008-09-18	SA-48	Patikra projekto vykdymo vietoje (apima administracinį, finansinį, techninį aspektus)	Patikra projekto vykdymo vietoje. Patikrinimas buvo atliktas sutarčiai Nr. A/2007/P/34 „Atliekų priėmimo punktų statyba, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“.	Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, VAS bei kitais norminiais aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą verslo įmonėse. Darbai įgyvendinami, laikantis specifikacijų. Susidaręs vėlavimas įtakotas projekto neatitikimų ir praleidimų, gamtinių sąlygų, išorinių veiksnių, susijusių su paskirtais sklypais, inžinerinėm komunikacijomis. Atkreiptinas dėmesys į techninio projekto rengėjo UAB „SPB“ (Statinių projektavimo biuras) nekokybiškai atliktą techninį projektą, bei dalies darbų atsisakymą, kuris įtakojo projekto koregavimą. Dėl to iš naujo teko derinti projektus ir koreguoti kai kuriuos statybos leidimus. Patikros metu pateiktos rekomendacijos: pašalinti netikslumus statybos žurnaluose.
Įgyvendinančioji institucija	2009-12-08	SA-60	Patikra projekto vykdymo vietoje (apima administracinį, finansinį, techninį aspektus)	Patikra projekto vykdymo vietoje. Patikrinimas buvo atliktas sutarčiai Nr. A/2007/P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“.	Patikros metu nebuvo nustatyta trūkumų, kurie neigiamai paveiktų tolesnį projekto įgyvendinimą.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos numeris	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Valstybės kontrolė	2010-05-25	-	Patikra projekto vykdymo vietoje	Žr. šios ataskaitos 4 skyriuje.	Atlikus patikrą vietoje nustatyti šie neatitikimai: ▪ pagal statybos rangos darbų sutartį Nr. A/2007/P/35 Panevėžio miesto senojo sąvartyno uždarymo 12 915 001,58 Lt nebaigtos statybos išlaidos GPG apskaitoje nepagrįstai nurašytos į sąnaudas, o ne padidintas ilgalaikis turtas; ▪ Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje neatskleista informacija dėl dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos panaudojimo (įranga įsigyta ne iš projekto lėšų) ir iš dujų surinkimo gautų ir numatomų gauti pajamų. Atsižvelgiant į tai, kad audito metu pateikus pastabas, trūkumai ištaisyti, pastebėjimai Audito ataskaitoje neteikiami.

Šaltinis – AM, MI, APVA, Valstybės kontrolė

Valstybinio audito ataskaitos
Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
5 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ
Gauta
2011-04-01 Nr. 6-1046

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
Finansinio audito 7-ajam departamentui

2011-04-01 Nr. (18.52.3-01)-6K-110 15220

DĖL SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO NR. 2005/LT/16/C/PE/003 GALUTINĖS ATASKAITOS IR GALUTINIO MOKĖJIMO PARAIŠKOS PATEIKIMO

LAISVĖS LIEPSNA

Siunčiame Jums Finansų ministerijos (Sanglaudos fondo mokėjimo institucijos) patvirtintos galutinio mokėjimo paraiškos Europos Komisijai gauti iš Sanglaudos fondo galutinę išmoką projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ išlaidoms kompensuoti kopiją kartu su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (Sanglaudos fondo įgyvendinančiosios institucijos) patvirtinta projekto galutinės ataskaitos kopija.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Sanglaudos fondo vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 (Žin., 2005, Nr. 127-4588; 2010, Nr. 81-4257), 6.3 punktu, pagal kurį pažeidimas gali būti nustatomas tada, kai projekto vykdytojas vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu, šiuo metu inicijuoja įtariamo pažeidimo tyrimą dėl projekto viešinimo (straipsnių, informacinių stendų, radijo ir televizijos laidų) atitikties Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams. Atsižvelgiant į įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatus, projekto galutinio mokėjimo paraiška ir galutinė ataskaita gali būti tikslinamos.

PRIDEDAMA:
1. Galutinio mokėjimo paraiškos Europos Komisijai kopija, 42 lapai.
2. Projekto galutinės ataskaitos kopija, 1 egzempliorius ir jos priedai elektroninėse laikmenose, 17 vnt.

Finansų viceministras Edmundas Žilevičius

Aurelija Stražinskaitė, tel. 2390 289

Rastas

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481
El. paštas finmin@finmin.lt
http://www.finmin.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288601650

Valstybinio audito ataskaitos
Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
6 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ
Gauta
2011-07-04 Nr. G-2094

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
Finansinio audito 7-ajam departamentui

2011-06-30 Nr. (18.52.8-01)-6K-1106792

DĖL SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO NR. 2005/LT/16/C/PE/003 GALUTINIO MOKĖJIMO PARAIŠKOS IR GALUTINĖS ATASKAITOS PATIKSLINIMO

LAISVĖS LIEPSNA

Primename, kad Finansų ministerija 2011 m. balandžio 1 d. kartu su raštu Nr. (18.52.3-01)-6K-1103520 Jūsų institucijai pateikė Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – projektas) mokėjimo paraiškos Europos Komisijai gauti iš Sanglaudos fondo galutinę išmoką (toliau – galutinio mokėjimo paraiška) kopiją ir projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitos (toliau – galutinė ataskaita) kopiją.

Šiame rašte taip pat buvome informavę Jūsų instituciją, kad teisės aktų nustatyta tvarka yra vykdomi įtariamų pažeidimų tyrimai, susiję su išlaidų tinkamumu finansuoti, dėl kurių rezultatų gali būti tikslinamos projekto galutinio mokėjimo paraiška ir galutinė ataskaita. Atsižvelgdami į tai, kad Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atliko pažeidimo tyrimus ir priėmė sprendimus susigrąžinti netinkamai panaudotas Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšas, siunčiame Jums patikslintų projekto galutinio mokėjimo paraiškos ir galutinės ataskaitos kopijas.

Taip pat informuojame, kad šiuo metu yra inicijuoti įtariamų pažeidimų tyrimai, susiję su išlaidų tinkamumu finansuoti, todėl, atsižvelgiant į įtariamų pažeidimų tyrimo rezultatus, projekto galutinio mokėjimo paraiška ir galutinė ataskaita gali būti tikslinamos.

PRIDEDAMA:
1. Galutinio mokėjimo paraiškos kopija, 39 lapai.
2. Patikslintos projekto galutinės ataskaitos kopija, 1 egzempliorius.
3. Patikslintos projekto galutinės ataskaitos priedų elektroninės laikmenos, 2 vienetai.
4. 2011 m. birželio 29 d. Finansų ministerijos rašto Nr. ((4.79-08)-5K-1113592;1112993)-6K-1106734 kopija, 5 lapai.

Finansų viceministras Edmundas Žilevičius

Aurelija Stražinskaitė, tel. 2390 289

AS_VK Del patikslintos GA ir GMP_2005CPE003_110629

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481
El. paštas finmin@finmin.lt
http://www.finmin.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288601650

Valstybinio audito ataskaitos
Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
7 priedas

Projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita

CERTIFICATE AND STATEMENT OF EXPENDITURE AND APPLICATION FOR PAYMENT

EUROPEAN COMMISSION

Cohesion Fund

(Final certificate and statement of expenditure and application for payment)

Name of project: ***Panevėžys Regional Waste Management System Development***

Commission Decision No ***K(2005)5289*** of ***08/12/2005***

Commission Reference (CCI No) ***2005/LT/16/C/PE/003***

National reference _____ (if any)

CERTIFICATE

I, the undersigned Mr. Edmundas Žilevičius, Vice-Minister of the Ministry of Finance, representing the paying authority designated by[1] the Government of the Republic of Lithuania Resolution No. 1026 on the Administration of Assistance from the European Union's Cohesion Fund in Lithuania of 24 August 2001 (Official Gazette No. 74-2596, No. 87-3483, 2008), hereby certify that all eligible expenditure included in the attached statement, representing the contributions of the Cohesion Fund and national funding, was paid in line with the progress of the project

after[2]: 0 2 (d d) 0 9 (m m) 2 0 0 5 (y y y y) and amounts to: **19,140,849.64** EUR (exact amount to two decimal places)

The attached statement of expenditure broken down by category of expenditure, and by project in the case of a group of projects, covers expenditure up to

3 1 1 2 2 0 1 0 (dd/mm/yyyy)

and is an integral part of this certificate, as is the accompanying report on progress of the project compared with plans.

I also certify that the project is making satisfactory progress towards completion in accordance with the objectives and that the information given in the progress report is correct.

---

1 Indicate the administrative instrument of designation in accordance with Article D(1) and (4) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, with appropriate references and the date.

2 Starting date for eligibility of expenditure under the decision.

I T K R A

2011 -06- 30

Aldona Čapliejienė

I further certify that the project is being implemented in accordance with the terms of the decision and in compliance with the provisions of Regulation (EC) No 1164/94, in particular as regards:

1. compliance with the provisions of the Treaty and instruments adopted under it and with Community policies, in particular the rules on protection of the environment, transport (including trans-European networks), competition, and the award of public contracts (Article 8 of Regulation (EC) No 1164/94);

2. application of management and control procedures to the project, in particular to verify the reality of expenditure claimed and the proper execution of the project in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1386/2002 and to prevent, detect and correct irregularities, pursue fraud, and recover unduly paid amounts (Article 12 of Regulation (EC) No 1164/94 and Articles G and H of Annex II thereto).

In accordance with Article G(3) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, the supporting documents are and will continue to be available for a minimum period of three years following payment of the balance by the Commission.

I certify that:

1. the statement of expenditure is accurate and results from accounting systems based on verifiable supporting documents;

2. the statement of expenditure and the application for payment take account of any recoveries made and interest received thereon;

3. details of the underlying transactions are recorded, where possible, on computer files and are available on request to the Commission departments responsible.

Date 30 06 2011 (dd/mm/yyyy)

EDMUNDAS ŽILEVIČIUS
Vice-Minister of the Ministry of Finance

Name in capitals, stamp, position and signature of competent authority

TIKRA
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 30

2

Statement of expenditure incurred in the project[3]
Reference No (CCI code – Code commun d'identification): ***2005/LT/16/C/PE/003***
Name of project: ***Panevėžys Regional Waste Management System Development***
Date: ***31/12/2010***

Category of expenditure	Total expenditure incurred to date (between 02/09/2005[4] and 31/12/2010) [6]	Expenditure certified in present declaration	Total expenditure planned (initial budget) [6]	Expenditure incurred to date, as proportion of initial budget (%)	Unused expenditure
1. Planning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Land acquisition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Site preparation	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4. Building and construction [7]	17.738.303,30	4.651.848,98	17.972.151,00	98,70	0,00
5. Equipment	896.901,55	896.901,55	914.583,00	98,07	0,00
6. Technical assistance	439.698,15	42.219,64	534.233,00	82,30	0,00
7. Publicity[5]	65.946,64	11.347,38	66.033,00	99,87	0,00
8. VAT or equivalent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Other (contingencies, reserves)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.140.849,64**	**5.602.317,55**	**19.487.000,00**	**98,22**	**0,00**

[3]For decisions on groups of projects, expenditure must be broken down by projects, except where the expenditure is common to the group, as it in the case of technical assistance or publicity.
[4]Starting date for eligibility of expenditure.
[5]Under Decision 96/445/EC (OJ L 188, 27.7.1996, p. 47).
[6] The initial budget and the total expenditure are presented according 22/10/2009 Commission Decision No K(2009)8360 specified categories.
[7] EUR 2.252,88 under agreement No. A/2007/P/34 and EUR 1.409,50 under agreement No. A/2007/P/35 is not declared in this payment application (see Annex D).

TIKRA
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 30

Annex to statement of expenditure: recoveries effected since the last certified statement of expenditure and included in the present statement of expenditure

Amount ordered to be recovered	N.A.
Debtor	N.A.
Date of issue of recovery order	N.A.
Authority which issued recovery order	N.A.
Date of recovery	N.A.
Amount recovered	N.A.

TIKRA
Aldona Čepiėjienė
2011-06-30

4

APPLICATION FOR FINAL PAYMENT

Name of project: ***Panevėžys Regional Waste Management System Development***

Commission reference (CCI No) ***2005/LT/16/C/PE/003***

Pursuant to Article D(2)(d) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, I, the undersigned Mr. Edmundas Žilevičius, Vice-Minister of the Ministry of Finance, request payment of the amount of **EUR 3,018,562.20** as a final payment. This application meets the admissibility requirements because:

Delete as appropriate

(a)	the report on the progress of the project in relation to physical and financial indicators and demonstrating its conformity with the decision granting the assistance, including the specific conditions laid down	*- is enclosed as Annex A*
(b)	the final report on implementation required under the Annex to Annex II to the Regulation, including in the latter case details of compliance with the public procurement rules	*- is enclosed*
(c)	observations and recommendations made by national and/or Community audit authorities, in particular the correction of suspected or proven irregularities	*- are enclosed as Annex C*
(d)	the main technical, financial and legal problems that have arisen and the measures taken to correct them	*- are indicated in Annex D*
(e)	the analysis of any departures from the original financial plan	*- is enclosed as Annex E*
(f)	the publicity measures taken with regard to the project	*- are indicated in Annex F*
(g)	none of the certified expenditure has been suspended pursuant to Article G(2) or H(2) of Annex II to the Regulation	

Payment should be made to:

Beneficiary:	**Name:** Ministry of Finance of the Republic of Lithuania **Address:** Lukiškių 2, LT 01512, Vilnius, Lithuania **Contact:** Ms. Aurelija Stražinskaitė **Telephone:** +370 5 239 02 89 **E-mail:** A.Strazinskaite@finmin.lt **Fax:** +370 5 239 00 39
Bank:	**Bank name:** Bank of Lithuania **Bank address:** Gedimino av. 6, Vilnius, Lithuania **Post Code:** LT 01103 **Town:** Vilnius **Sort code:** 10100 **BIC code:** LIABLT2X
Account No	632425 IBAN LT62 1010 0000 0063 2425
Account holder (if different from beneficiary)	

Date 30 06 2011 (dd/mm/yyyy)

EDMUNDAS ŽILEVIČIUS

Vice-minister of the Ministry of Finance

Name in capitals, stamp, position and signature of competent authority

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Aldona Čeniėjienė

2011-06-30

5

A PRIEDAS

Projekto pavadinimas: **Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas**

Komisijos sprendimas **Nr. K(2005)5289, patvirtintas 08/12/2005**

Projekto fizinio ir finansinio įgyvendinimo ataskaita

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (*)	Fizinis įgyvendinimas					Finansinis įgyvendinimas				Finansinio įgyvendinimo lygis (%)	Fizinio įgyvendinimo lygis (%)
	Fizinai rodikliai (*)					Finansiniai rodikliai					
	vienetas	kiekis	fizinis įgyvendinimas po paskutinės mokėjimo paraiškos (nuo 2009-11-01)	fizinis įgyvendinimas įskaitant šią mokėjimo paraišką (iki 2010-12-31)	fizinio įgyvendinimo eiga (%)	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (suma)*	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (%)	išlaidos po paskutinės mokėjimo paraiškos (nuo 2009-11-01) (**)	išlaidos įskaitant šią mokėjimo paraišką (iki 2010-12-31) (**)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(5)/(3)*100	(7)	(8)=(7)/(7 iš viso)*100	(9)	(10)	11=(10)/(7)*100	12=(6)*(8)/100
Atliekų priėmimo punktų statyba, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba	**%**	**100**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**4.338.231,54**	**22,26**	**23.535,06**	**4.338.231,54**	**100,00**	**22,26**
Atliekų priėmimo aikštelių (APA) įrengimas (asfalto dangos, reikiamos infrastruktūros sukūrimas, privažiavimo kelių tiesimas, nuotekų valymo sistema, pavojingų atliekų saugykla, administracinės-buitinės patalpos, konteinerių pirkimas ir kt.)	vnt.	5	0,0	5,0	100,0						
Kompostavimo aikštelės (asfalto dangos, infrastruktūros sukūrimas, filtrato surinkimo ir nukreipimo sistema, filtrato sukauptuvai ir kt.)	vnt.	4	0,0	4,0	100,0						
Perkrovimo stotys (asfalto dangos, infrastruktūros sukūrimas, konvejerio įrengimas, presas, supresuotoms atliekoms skirtų konteinerių pirkimas ir kt.)	vnt	2	0,0	2,0	100,0						
Projekto komponentų Panevėžyje statyba	**%**	**100**	**5,0**	**100,0**	**100,0**	**13.400.071,76**	**68,76**	**4.628.313,92**	**13.400.071,76**	**100,00**	**68,76**
Naujas regioninis sąvartynas	vnt.	1	0,0	1,0	100,0						
I sekcijos įrengimas (žemės darbai, geosintetinio molio stuokstis, neteisė HDPE plevelė, apsauginė geotekstilė, drenažinis stuokstis; filtrato surinkimo sistemos įrengimas, paviršinio vandens nukreipimo sistemos įrengimas, privažiavimo bei vidinių kelių tiesimas ir kt.)***	ha	5,7-6,3	0,0	6,12	100,0						
Tarnybinė zona (ratų plovimo duobė, priešgaisrinės rezervuarai, garažas, rūšiavimo paštatas ir kt.)	vnt.	1	0,0	1,0	100,0						
Administracinis pastatas	vnt.	1	0,0	1,0	100,0						
Filtrato surinkimo sistema	vnt.	1	0,0	1,0	100,0						
Paviršinio vandens ir nuotekų surinkimo sistema (dvi lietaus nuotekų siurblinės, naftos gaudyklė, gruntinio vandens drenažo siurblinė)	vnt.	1	0,0	1,0	100,0						
Kompensacinės priemonės gyventojams (langų ir durų pakeitimas, apželdinimas siekiant sumažinti triukšmą)	vnt.	1	0,0	1,0	100,0						
Panevėžio miesto sąvartyno uždarymas (atliekų kaupo uždengimas: neteisė, drenažinis ir žemės stuokseniai, filtrato ir dujų surinkimo sistemų įrengimas, teritorijos apželdinimas ir kt.)	vnt.	1	0,1	1,0	100,0						
Kompostavimo aikštelės (asfalto dangos, infrastruktūros sukūrimas, filtrato surinkimo ir nukreipimo sistema, filtrato sukauptuvai ir kt.)	vnt	1	0,0	1,0	100,0						
Rūšiavimo linija (konvejerių įrengimas, rūšiavimo kabina, presavimo sistemos, PET perforatorius ir kt.)	vnt	1	0,0	1,0	100,0						
Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas	**%**	**100**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**896.901,55**	**4,60**	**896.901,55**	**896.901,55**	**100,00**	**4,60**
Rūšiavimo linijos krautuvas	vnt	1	1,0	1,0	100,0						
Rutinis krautuvas	vnt	1	1,0	1,0	100,0						

6

A PRIEDAS

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (*)	Fizinis įgyvendinimas					Finansinis įgyvendinimas				Finansinio įgyvendinimo lygis (%)	Fizinio įgyvendinimo lygis (%)
	Fizinai rodikliai (*)					Finansiniai rodikliai					
	vienetas	kiekis	fizinis įgyvendinimas po paskutinės mokėjimo paraiškos (nuo 2009-11-01)	fizinis įgyvendinimas įskaitant šią mokėjimo paraišką (iki 2010-12-31)	fizinio įgyvendinimo eiga (%)	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (suma)*	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (%)	išlaidos po paskutinės mokėjimo paraiškos (nuo 2009-11-01) (**)	išlaidos įskaitant šią mokėjimo paraišką (iki 2010-12-31) (**)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(5)/(3)*100	(7)	(8)=(7)/(7 iš viso)*100	(9)	(10)	11=(10)/(7)*100	12=(6)*(8)/100
Žaliųjų atliekų smulkintuvas	vnt.	1	1,0	1,0	100,0						
Kompaktorius	vnt.	1	1,0	1,0	100,0						
Buldozeris	vnt.	1	1,0	1,0	100,0						
Sijotuvas-būgninis rietis	vnt.	1	1,0	1,0	100,0						
Automobilis su priekaba (perkrovimo stotims aptarnauti)	vnt	1	1,0	1,0	100,0						
Techninės pagalbos teikimas UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"	**%**	**100**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**215.215,56**	**1,10**	**0,00**	**215.215,56**	**100,00**	**1,10**
Visuomenės informavimas ir švietimas	**%**	**100**	**17,0**	**100,0**	**100,0**	**65.946,64**	**0,34**	**11.347,38**	**65.946,64**	**100,00**	**0,34**
Techninė priežiūra	**%**	**100**	**47,0**	**100,0**	**100,0**	**224.482,59**	**1,15**	**42.219,64**	**224.482,59**	**100,00**	**1,15**
Nepanaudotos lėšos						**346.150,36**	**1,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IŠ VISO						**19.487.000,00**	**100,00**	**5.602.317,55**	**19.140.849,64**	**98,22**	**98,22**
										Bendras finansinio įgyvendinimo lygis	**Bendras fizinio įgyvendinimo lygis**

(*) Apima 100% visų tinkamų finansuoti išlaidų

(**) Finansinis įgyvendinimas pagal kiekvieną sutartį komponentą nenurodytas, kadangi toks sumokėtų lėšų išskirstymas yra labai sudėtingas arba neįmanomas. Pagal darbų sutartį sąlygas, iš kiekvieno tarpinio mokėjimo pažymės sumos yra grąžinamas samokėtas avansas ir sulaikomi pinigai. Grąžinimo ir sulaikymo dydis yra nustatomas kiekvienoje eilėje rangos sutartyje. Nor ei išskirti samokėtą sumą pagal kiekvieną vienetas komponentą, sugrąžinę avansą ir sulaikyę, pritęsę sumos taip pat turėtų būti išskaičytos kiekvienam komponentui. Dėl šios priežasties rangovų teikiamos ataskaitos ir tarpinio mokėjimo pažymos paskirstyti labai sudėtingos. Be to, sutartyje numatyti bendrojo pobūdžio darbai apima visus komponentus, todėl jų paskirstymas atskiroms komponentams yra neįmanomas.

(***) Naujojo regioninio sąvartyno I sekcijos įrengtas plotas buvo patikslintas pagal VĮ „Registrų centro" išmatavimus (6,12 ha)

TIKRA

Aldona Čepėlienė

2011 -06- 30

7

A1 PRIEDAS

GAUTŲ SĄSKAITŲ IR MOKĖJIMŲ PAGAL RANGOVUS SUVESTINĖ

Projekto pavadinimas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Komisijos sprendimas Nr. K(2005)5289, patvirtintas 08/12/2005

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
UAB "Baltijos viešųjų ryšių grupė" Nr. A/2006/P/17	7	2009.12.11	2009.12.24	9.645,27	Už 2009 m. balandžio mėn. 17 d. - spalio mėn. 17 d. suteiktas paslaugas Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.24	1.702,11	Valstybės biudžeto dalis
"M&S Umweltprojekt" GmbH Nr. 2007/120/A/P/LT (paslaugos)	4	2010.05.17	2010.06.11	22.130,67	Už 2009 m. birželio mėn. 19 d. - 2010 m. sausio mėn. 19 d. suteiktas paslaugas Sanglaudos fondo dalis
			2010.06.11	3.905,41	Valstybes biudžeto dalis
	5	2010.12.15	2010.12.28	13.756,03	Už 2010 m. sausio mėn. 19 d. - lapkričio mėn. 19 d. suteiktas paslaugas Sanglaudos fondo dalis
			2010.12.28	2.427,53	Valstybes biudžeto dalis
UAB "Koger Eco" Nr. 2009/26/A/PT/LT (įranga)	1	2009.12.23	2009.12.31	223.979,93	Už atliekų tankintuvą (kompaktorių) Tana Gx320 Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.31	39.525,87	Valstybes biudžeto dalis
UAB "Ellidita" Nr. 2009/27/A/PT/LT (įranga)	1	2009.11.30	2009.12.21	3.692,16	Avansinis mokėjimas - 20 % sutarties vertės Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.21	651,56	Valstybes biudžeto dalis
	2	2010.03.24	2010.04.28	14.768,65	Už krautuvą Sanglaudos fondo dalis
			2010.04.28	2.606,23	Valstybės biudžeto dalis
UAB "Keluva" Nr. 2009/28/A/PT/LT (įranga)	1	2009.12.02	2009.12.21	19.125,49	Avansinis mokėjimas - 20 % sutarties vertės Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.21	3.375,09	Valstybes biudžeto dalis
	2	2010.03.25	2010.04.28	76.501,97	Už ratinį frontalinį krautuvą ZL50G(XCMG) Sanglaudos fondo dalis
			2010.04.28	13.500,34	Valstybes biudžeto dalis
UAB "Oksata" Nr. 2009/29/A/PT/LT (įranga)	1	2009.11.24	2009.12.21	19.098,41	Avansinis mokėjimas - 20 % sutarties vertės Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.21	3.370,31	Valstybes biudžeto dalis
	2	2010.05.20	2010.06.10	76.393,65	Už kompostuojamų atliekų smulkintuvą Caravaggi BIO 900 Sanglaudos fondo dalis
			2010.06.10	13.481,23	Valstybes biudžeto dalis
UAB "Atomeksim" Nr. 2009/30/A/PT/LT (įranga)	1	2009.11.25	2009.12.21	11.378,10	Avansinis mokėjimas - 20 % sutarties vertės Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.21	2.007,90	Valstybes biudžeto dalis
	2	2010.03.23	2010.04.28	45.512,40	Už šijotuvą - būgninį rėtį Pezzolato S.p.A, modelis L3000M Sanglaudos fondo dalis
			2010.04.28	8.031,60	Valstybes biudžeto dalis
UAB "Intrac Lietuva" Nr. 2009/31/A/PT/LT (įranga)	1	2010.02.19	2010.03.19	144.899,79	Už buldozerį CASE 1850K LGP Sanglaudos fondo dalis
			2010.03.19	25.570,55	Valstybes biudžeto dalis
UAB "KMT" Nr. 2009/32/A/PT/LT (įranga)	1	2009.12.24	2010.02.01	25.403,15	Avansinis mokėjimas - 20 % sutarties vertės Sanglaudos fondo dalis
			2010.02.01	4.482,91	Valstybes biudžeto dalis
	2	2010.03.24	2010.04.28	101.612,62	Už automobilį su priekaba 30 m3 konteinerių pervežimui Sanglaudos fondo dalis
			2010.04.28	17.931,64	Valstybes biudžeto dalis
AB "Panevėžio statybos trestas" Nr. A/2007/P/34 (darbai)	9*	2008.12.31	2009.04.07	21.919,75	Už 2008 m. gruodžio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.04.03	3.868,19	Valstybes biudžeto dalis
				-344,65	Netinkamos finansuoti išlaidos Sanglaudos fondo dalis
				-60,82	Valstybes biudžeto dalis
				-1.570,30	Netinkamos finansuoti išlaidos Sanglaudos fondo dalis
				-277,11	Valstybes biudžeto dalis
AB "Panevėžio statybos trestas" Nr. A/2007/P/35 (darbai)	14	2009.06.30	2009.11.02	347.403,88	Už 2009 m. birželio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.11.02	61.306,58	Valstybes biudžeto dalis
	15	2009.08.31	2009.11.18	880.185,93	Už 2009 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.11.18	155.326,94	Valstybes biudžeto dalis
	16	2009.10.30	2010.02.26	1.199.082,82	Už 2009 m. spalio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2010.02.23	211.602,85	Valstybes biudžeto dalis
	17	2009.11.30	2010.02.26	233.373,11	Už 2009 m. lapkričio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2010.02.23	41.183,50	Valstybes biudžeto dalis
	18	2009.12.04	2010.02.26	136.093,23	Už 2009 m. gruodžio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2010.02.23	24.016,45	Valstybes biudžeto dalis
	19	2010.02.12	2010.03.31	1.139.125,92	Sulaikomi pinigai Sanglaudos fondo dalis
			2010.03.31	201.022,21	Valstybes biudžeto dalis
				-147,71	Netinkamos finansuoti išlaidos Sanglaudos fondo dalis
				-26,07	Valstybes biudžeto dalis
				-1.050,36	Netinkamos finansuoti išlaidos Sanglaudos fondo dalis
				-185,36	Valstybes biudžeto dalis
Iš viso A1 priede				5.602.317,55	

* IV tarpinio mokėjimo paraiškoje dėl įtariamo pažeidimo pagal sąskaitą Nr. 9 nebuvo deklaruotos 25.787,94 EUR išlaidos. 2010-11-08 lėšos pripažintos tinkamomis finansuoti iš Sanglaudos fondo lėšų.

TIKRA
Ingrida Čarlejienė
2011 -06- 30

C PRIEDAS

Projekto pavadinimas: ***Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas***

Komisijos sprendimas ***Nr. K(2005)5289, patvirtintas 08/12/2005***

NACIONALINIŲ IR/ARBA EUROPOS BENDRIJŲ INSTITUCIJŲ ATLIKTŲ PATIKRINIMŲ IR ATRANKINIŲ PATIKRINIMŲ IŠVADOS BEI REKOMENDACIJOS

2007 m. rugsėjo 28 d. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - VPT) atliko viešojo pirkimo Nr. 51632 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" patikrinimą.

Pastabos:

- Konkurso sąlygų 11.1 punkto nuostata, kad „perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą gautas ne vėliau kaip prieš 12 darbo dienų iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos" neatitinka Įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų terminų.
- Konkurso sąlygų 3 dalies lentelėje nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 1, 2, 3. Punktuose reikalavimas kartu su kvalifikaciją įrodančiais dokumentais pateikti ir priesaikos pažymą neatitinka Įstatymo 33 straipsnio 5 dalies, kurioje nustatyta, kad priesaikos pažymą tiekėjas pateikia tik tada, kai jis negali pateikti kvalifikaciją įrodančių dokumentų.
- Konkurso sąlygų 4.2 punkte įtvirtintas reikalavimas tiekėjams kartu su pasiūlymo originalu pateikti dar 3 pasiūlymo kopijas, esant didelei dokumentų apimčiai, nepagrįstai didina konkurso dalyvių išlaidas ir gali įtakoti pasiūlymo kainą.
- Konkurso sąlygų 13.8 punkto nuostata nurodo, kad „perkančioji organizacija neprivalo atlyginti galimų nuostolių tiekėjams, netgi jei ji buvo informuota, kad tokie nuostoliai galimi" neatitinka Įstatymo 123 straipsnio, kuris numato perkančiosios organizacijos atsakomybę, jei ji nevykdo Įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia Įstatymas.
- Konkurso sąlygų priedo Nr. 3 (viešojo pirkimo sutarties projektas) 6.1 punkto nuostata, kad „sutarties vykdymo laikotarpio esminės sutarties sąlygos negali būti keičiamos" neužtikrina Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto reikalavimo, kad viešojo pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
- M&S Umweltprojekt GmbH pasiūlyme klaidingai apskaičiuota bendra jo kaina su PVM – 1.177.733,30 Lt vietoje 1.177.773,34 Lt (kaina be PVM 998.113,00 Lt ir PVM 179.660,34 Lt). Į Įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas šiuo atveju atsižvelgta nebuvo, nors dėl klaidingai apskaičiuotos bendros kainos pasiūlymas atmestinas. Tuo perkančioji organizacija neužtikrino įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų pagrindinių viešųjų pirkimų principų, nes UAB „Tiltų ekspertų centras" pasiūlymas, kuro kaina mažesnė, dėl analogiškos priežasties buvo atmestas.
- Sudarytos pirkimo sutarties bendra kaina 1.177.773,34 Lt. su PVM neatitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros kainos – 1.177.773,30 Lt su PVM. Tai neatitinka Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatų.
- Pirkimo procedūrų ataskaitoje ir skelbime apie pirkimo sutarties sudarymą neteisingai surodyta bendra galutinė sutarties vertė – 1.177.773,30 Lt su PVM.

VPT pateikė „Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitą" (Nr. 2S-12), kurioje nurodė išvadas jau įvykusiam pirkimui „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" (pirkimo Nr. 51632), tačiau neįpareigojo nutraukti sutarties. Aplinkos projektų valdymo agentūra atsižvelgė į VPT pastabas, vykdydama tolimesnius pirkimus.

2008 m. gruodžio 8 d. Europos Audito Rūmų auditas atliko projekto patikrą. Šiam projektui buvo pateikta pastaba, kad išankstinės išmokos rangovams, paslaugų tiekėjams buvo nuo 30 iki 40 % visos sutarties vertės ir tokie dydžiai neatitinka įprastų rinkos sąlygų. Europos Komisija 2010 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. REGIO J3 MB/ba D(2010) 990431 pateikė LR finansų ministerijai parengtą Europos Audito Rūmų atstovų pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų apžvalgą, kurioje nurodė, kad šią pastabą valstybės narė pagrindė ir šis pastebėjimas yra baigtas nagrinėti.

TIKRA
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 30

D PRIEDAS

Projekto pavadinimas: ***Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas***

Komisijos sprendimas ***Nr. K(2005)5289, patvirtintas 08/12/2005***

TECHNINĖS, FINANSINĖS AR TEISINĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS

Darbų atlikimo ir įrangos tiekimo konkursai skelbiami parengus techninius projektus ir pirkimo dokumentus. Tačiau projektavimo ir pirkimo dokumentų rengimo paslaugų pirkimas, kuris finansuojamas Finansinio memorandumo Nr. 2001/LT/16/P/PA/002, atviro konkurso būdu buvo vykdomas keturis kartus. Pirmą kartą iki paskutinės pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2005 m. rugsėjo 26 d. nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas. Antrą kartą atviro konkurso laimėtojas 2005 m. lapkričio 24 d. atsisakė pasirašyti paslaugos pirkimo sutartį. Trečią kartą gavus VPT 2006 m. vasario 7 d. sutikimą vienintelis konkurso dalyvis buvo atmestas. Ketvirtą kartą paslaugos pirkimą vykdant neskelbiamų derybų būdu, pirkimo sutartis pasirašyta 2006 m. kovo 3 d. Vykdant projektavimo sutartį darbai užsitęsė dėl to, kad:

1.Panevėžio miesto savivaldybė pakeitė stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įrengimui skirtą vietą;

2. Biržų rajono savivaldybė pakeitė stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės, kompostavimo aikštelės, perkrovimo stoties įrengimui skirtas vietas;

3. Visos savivaldybės vėlavo išduoti projektavimo sąlygas. UAB „Statinių projektavimo biuras" parengta preliminari projektavimo ataskaita buvo Priežiūros komiteto posėdžiuose svarstoma ir patvirtinta tik 2007 m. kovo 27 d. posėdyje.

Visuomenės informavimo ir švietimo konkurso paskelbimas vėlavo dėl techninės pagalbos konsultantų UAB „SWECO BKG LSPI" vėlavimo parengti visuomenės informavimo ir švietimo programą ir pirkimo dokumentus.

Techninės pagalbos sutarties Nr. 2005/28/A/P/LT paslaugos tiekėjas UAB "SWECO BKG LSPI" iki sutarties pabaigos termino neatliko visų sutartyje numatytų užduočių dėl užsitęsusios Regioninio atliekų tvarkymo plano tvirtinimo procedūros Panevėžio regiono plėtros taryboje bei nepanaudotų kasdieninės pagalbos dienų numatytų sutartyje.

Pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/34 „Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" rangovas, AB „Panevėžio statybos trestas", 2008 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. 08/09-25-001 pareiškė pretenziją į darbų baigimo laiko pratęsimą, remdamasis tuo, kad negauna laiku pakoreguotų Techninių projektų, todėl negali laiku atlikti darbų.

Vadovaujantis 2009 m. spalio 22 d. patvirtintu Europos Komisijos sprendimu atsisakyta pirkimų „94 sąvartynų uždarymas" ir „Bioatliekų konteinerių pirkimas" fizinių rodiklių, kadangi labai išaugo projekto kaštai ir galutinis paramos gavėjas neturėjo galimybių finansuoti projekto pabrangimo. Taip pat šiuo sprendimu patvirtintas įrangos įsigijimas regioniniam sąvartynui: kompaktorius, ratinis frontalinis krautuvas, kompostuojamų atliekų smulkintuvas, buldozeris, sijotuvas-būgninis rėtis, krautuvas rūšiavimo linijos pastate, automobilis su priekaba perkrovimo stočių aptarnavimui.

Įgyvendinant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"(toliau – Projektas), Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) atliko 15 pažeidimo tyrimų, o juos pabaigusi, nustatė 4 pažeidimus, kuriuos užregistravo Struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - SFMIS). 11 įtarimų dėl pažeidimų nepasitvirtino, todėl SFMIS jie nebuvo užregistruoti.

- 2010-11-08 atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Projekto sutartyje Nr. A/2007/P/34 „Atliekų priėmimo punktų, aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" numatytų lėšų, skirtų trumpalaikio turto įsigijimui, tinkamumo. Atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą nustatyta, jog trumpalaikis turtas (metalinės spintos ir priešgaisrinių apsaugos priemonių komplektas) įsigijimo išlaidos yra įtrauktos į projekto vykdytojo ilgalaikio turto aprašą ir jų įsigijimo (įsirengimo) vertė į sąnaudas nurašoma per įrangos naudojimo laikotarpį. Agentūroje nuspręsta, kad įtarimas dėl pažeidimo nepasitvirtino, netinkamų finansuoti lėšų nenustatyta.
- 2011-04-26 Agentūra pabaigė pažeidimo tyrimą dėl įtariamo pažeidimo vykdant Projekto

TIKRA
2011 -06- 30
Aldona Čepėnienė

2006-10-17 sutartį Nr. A/2006/P/17 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: visuomenės informavimas ir švietimas" (toliau – Viešinimo sutartis). Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad pagal Viešinimo sutartį nacionalinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse publikuoti informaciniai straipsniai atitinka ne visus Informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklėse, patvirtintose 2006 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1043 (Žin., 2006, Nr. 114-4351, toliau – Viešinimo taisyklės), privalomoms viešinimo priemonėms (visuomenės informavimo priemonėse skelbiamai informacijai) keliamus reikalavimus. Nustatyti trūkumai įvertinti kaip neesminiai, nepadarę įtakos 2004 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su Sanglaudos fondo veikla, 1 str. nurodyto tikslo pasiekimui, nes Viešinimo taisyklių 35 punkte nustatytas reikalavimas skelbti ne mažiau kaip kartą per metus trumpą įgyvendinamo Projekto ar techninės paramos priemonės pavadinimą ir Viešinimo taisyklių 34.3, 34.5 ir 34.6 punktuose nurodytą informaciją buvo įvykdytas (pagal Viešinimo sutartį viešinimo priemonių visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta net daugiau nei reikalaujama Viešinimo taisyklių 35 punkte), todėl finansinės korekcijos Projekto galutiniam paramos gavėjui nebuvo pritaikytos, įtariamo pažeidimo tyrimas užbaigtas nenustačius netinkamų finansuoti lėšų.

- SFMIS užregistruotas pažeidimas Nr. LT/11/078/SF/0 dėl pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/34 „Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" įrengtų informacinių stendų (prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės; prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės; prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės; prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės; prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės), nes jie neatitiko Viešinimo taisyklių 17 punkto reikalavimų. Grąžintinomis pripažintos lėšos **405,47 euro**, todėl Agentūra pradėjo šių lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūrą.
- SFMIS užregistruotas pažeidimas Nr. LT/11/079/SF/0 dėl pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/35 „Projekto komponentų Panevėžyje statyba" pastatytuose informaciniuose stenduose užfiksuotų neatitikimų Viešinimo taisyklių 17 p. reikalavimams. Grąžintinomis pripažintos lėšos **173,78 euro**, todėl Agentūra pradėjo šių lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūrą.
- SFMIS užregistruotas pažeidimas Nr. LT/11/080/SF/0 dėl rangos sutartyje Nr. A/2007/P/34 „Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" numatytų ir vėliau patirtų išlaidų techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimui. Dalis jų, t. y. elektros energijos, remonto - 3 600 Lt, bei valymo - 6 000 Lt (pagal projekto vykdytojo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" rašte Nr. S-455 pateiktą informaciją) buvo numatytos ir techninės priežiūros sutartyje. Kadangi rangovo patirtos inžinieriaus aprūpinimo išlaidos (30 100 Lt) viršijo pagal šią rangos sutartį skirtą išlaidų sumą šiai darbų pozicijai (20 000 Lt), netinkamų finansuoti išlaidų suma yra **6 378,74 Lt** ((3 600 Lt + 6 000 Lt)/30 100 Lt*20 000 Lt) arba **1 847,41 euro**, Agentūra pradėjo šių lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūrą.
- SFMIS užregistruotas pažeidimas Nr. LT/11/081/SF/0 dėl pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/35 „Projekto komponentų Panevėžyje statyba", darbų kiekių žiniaraščiuose numatytos ir vėliau patirtos išlaidos techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimui, tačiau rangos sutartyje nebuvo numatyta atlikti darbų /suteikti paslaugų, susijusių su inžinieriaus aprūpinimu. Grąžintinomis pripažintos lėšos 4 800 Lt (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai Lt 0 ct) suma, kadangi rangovo patirtos inžinieriaus aprūpinimo išlaidos (22 500 Lt) viršijo pagal šią rangos sutartį skirtą išlaidų sumą šiai darbų pozicijai (20 000 Lt), netinkamų finansuoti išlaidų suma yra **4 266,67 Lt** (4 800/22 500 Lt*20 000 Lt) arba **1 235,72 euro**, todėl Agentūra pradėjo šių lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūrą.
- 2011-06-17 atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Europos Komisijai deklaruotų 28 316,00 eurų įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu sutartyse „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: atliekų tankintuvas (kompaktorius)" (Nr. 2009/26/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: krautuvas" (Nr. 2009/27/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: ratinis frontalinis krautuvas" (Nr. 2009/28/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas" (Nr. 2009/29/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: Sijotuvas-būgninis rėtis" (Nr. 2009/30/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: buldozeris" (Nr. 2009/31/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: Automobilis su priekaba 30 m³

2011 -06- 30
Aldona Čupėjienė

11

konteinerių pervežimui" (Nr. 2009/32/A/PT/LT). Agentūra nustatė, kad įrangos garantinio aptarnavimo ir techninio aptarnavimo užtikrinimas ir su tuo susijusios išlaidos yra būtinos, kad įrenginys funkcionuotų tinkamai ir be defektų (analogija – rangos sutartyse numatytas defektinis laikotarpis). Dėl šios priežasties minėtos išlaidos buvo įtrauktos į įrangos įsigijimo sutartis. Nutarta, jog įtarimas dėl pažeidimo nepasitvirtino, netinkamų finansuoti lėšų nenustatyta.

- 2011-06-21 atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Europos Komisijai deklaruotų 32 626,37 euro projekto veiklos išlaidų, padarytų pagal techninės pagalbos sutartį Nr. 2005/28/A//P/LT, tikėtinai tiesiogiai nesusijusių su projekto tikslais. Agentūra nustatė, kad deleguotos funkcijos turi būti suprantamos ne tik Agentūros deleguotos funkcijos projekto įgyvendinimui, bet ir Panevėžio apskrities savivaldybių deleguotas funkcijas, susijusias su atliekų tvarkymo sistemos organizavimu. Nutarta, jog įtarimas dėl pažeidimo nepasitvirtino, netinkamų finansuoti lėšų nenustatyta.
- 2011-06-21 Agentūra pabaigė įtariamo pažeidimo tyrimą dėl Projekto viešinimo pagal Viešinimo sutartį. Šį pažeidimo tyrimą Agentūra inicijavo remdamasi 2011-06-13 Agentūroje gauta Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento audito pastebėjimų suvestine Nr. 3, kurioje buvo pateiktos pastabos ir dėl Projekto viešinimo priemonių: 2007-03-31, 2007-04-03 per Kupiškio rajono televiziją „Kupiškio TV", 2007-06-14 Panevėžio miesto ir rajono televiziją „KTV plius", 2007-06-28 Panevėžio miesto ir rajono televiziją „KTV plius" parodytų laidų, 2008-02-19 „Kupiškio žinios" laikraštyje išspausdinto straipsnio „Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse" ir 2008-04-17 Kupiškio rajono laikraštyje „Kupiškio žinios" išspausdintos publikacijos „Dar šiemet Kupiškyje – didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė". Atlikusi tyrimą, Agentūra nusprendė nekeisti 2011-04-26 Agentūros išvadoje dėl pagal viešinimo sutartį įgyvendintų viešinimo priemonių nurodyto sprendimo, kuria buvo nuspręsta, kad Viešinimo taisyklių 35 punkte nustatytas reikalavimas skelbti ne mažiau kaip kartą per metus trumpą įgyvendinamo Projekto ar techninės paramos priemonės pavadinimą ir Viešinimo taisyklių 34.3, 34.5 ir 34.6 punktuose nurodytą informaciją viešinant Projektą buvo įgyvendintas. 2011-06-21 Agentūros parengtoje išvadoje nurodyta, kad dėl Valstybės kontrolės pateiktose pastabose nurodytų viešinimo trūkumų finansinių korekcijų Projekto vykdytojui nuspręsta netaikyti, nes pastebėti trūkumai įvertinti kaip netrukdantys Reglamento 621 tikslą pasiekti.

Projekto Galutinėje ataskaitoje nurodyti finansinės analizės duomenys pateikti jau įvertinus šiuose 4 įgyvendinant Projektą nustatytuose pažeidimuose grąžintinomis pripažintas lėšų sumas, dėl kurių buvo pradėta lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūra.

TIKRA
Aldona Čaplėjienė
2011-06-30

E PRIEDAS

Projekto pavadinimas: ***Panevėžio regiono atlieku tvarkymo sistemos sukūrimas***

Komisijos sprendimas ***Nr. K(2005)5289, patvirtintas 08/12/2005***

PRIEŽASTYS, LĖMUSIOS SKIRTUMĄ TARP FIZINIO IR FINANSINIO ĮGYVENDINIMO, NUKRYPIMUS NUO NUMATYTO GRAFIKO

-

TIKRA
Aldona Čepėjienė
2011-06-30

F PRIEDAS

Projekto pavadinimas: ***Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas***

Komisijos sprendimas ***Nr. K(2005)5289, patvirtintas 08/12/2005***

PROJEKTO VIEŠINIMAS

1. Stendai darbų vykdymo vietose: Taip ☒ Ne ☐ Netaikoma ☐

2. Informacijos priemonės, kuriose visuomenė buvo informuojama apie projektą:

2.1. Spauda ☒

2.2. Televizija ☒

2.3. Radijas ☒

2.4. Internetas ☒

3. Kitos vaizdo ir garso informacijos priemonės ☒

4. Kita: ☒

Eil. Nr.	*Priemonės pavadinimas*	*Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslai ir siekiami rezultatai*	*Priemonės platinimo kanalas, data*	*Nuorodos ir (arba) informacijos šaltiniai*
1	***Visuomenės informavimo kompanijų analizė***	*Išanalizuoti vykdytas visuomenės informavimo kampanijas šalyje, įvertinti jų trūkumus ir privalumus, suformuoti išvadas ir siūlymus visuomenės informavimo kampanijai Panevėžio apskrityje. Kiekis – 1 ataskaita*	*Neplatinamas. UAB PRATC naudojimui.*	Ataskaita
2	***Panevėžio regiono gyventojų sociologinė apklausa***	*Tikslas – palyginti visuomenės informuotumą ir požiūrio į projektą kitimą. Kiekis – 4 apklausos*	*Panevėžio regiono gyventojai*	2006 m. atliktos apklausos ataskaita; 2007 m. atliktos apklausos ataskaita; 2008 m. atliktos apklausos ataskaita; 2009 m. atliktos apklausos ataskaita.
3	***Susitikimai su bendruomenėmis***	*Projekto pristatymas vietos bendruomenei, susipažinimas su gyventojų lūkesčiais,*	*Susitikimas su Panevėžio miesto bendrijų pirmininkais (2006 12 06)*	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas

TIKRA
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 30

		esamomis problemomis, požiūriu atliekų tvarkymo klausimais. Kiekis – 42 susitikimai.		
			Susitikimas su Biržų raj. Nemunėlio Radviliškio bendruomene (2006 12 13)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Kupiškio raj. Alizavos bendruomene (2006 12 19)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio raj. Raguvos bendruomene (2007 01 16)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Kupiškio raj. Skapiškio bendruomene (2007 02 14)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Rokiškio raj. Pandėlio bendruomene (2007 03 14)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Rokiškio raj. Kazliškio bendruomene (2007 03 14)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio raj. Vadoklių bendruomene (2007 03 16)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio kolegijos bendruomenės nariais (2007 03 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Pasvalio raj. Daujėnų bendruomene (2007 03 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Pasvalio raj. Girsudų bendruomene	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Biržų raj. Vabalninko bendruomene (2007 03 27)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio rajono bendruomenių pirmininkais (2008 03 06)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Biržų rajono Kirdonių bendruomene (2008 04 09)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Pasvalio rajono Deglėnų bendruomene	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas

15

TIKRA
2011 -06- 30
Aldona Čeplėjienė

			(2008 04 09)	
			Susitikimas su Rokiškio rajono Kamajų bendruomene (2008 04 11)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Kupiškio rajono Juodpėnų bendruomenė (2008 04 11)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Pasvalio rajono Pušaloto bendruomene (2008 09 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Pasvalio rajono Joniškėlio bendruomene (2008 09 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Rokiškio rajono Juodupės bendruomene (2008 10 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties bendruomene (2008 10 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Kupiškio rajono Šepetos bendruomene (2008 10 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Kupiškio rajono Subačiaus bendruomene (2008 10 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Biržų rajono Medeikių bendruomene (2008 11 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Biržų rajono Gulbinų bendruomene (2008 11 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio miesto Suaugusių mokymo centras bendruomene (2008 11 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio rajono Naujarodžių miestelio bendruomene „Žėlupė" (2008 11 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio rajono Krekenavos miestelio bendruomene „Tiltas" (2008 11 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio rajono Smilgių kaimo bendruomene „Bitė" (2008 11 26)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas

TIKRA
2011 -06- 30
Aldona Čepišjienė

			Susitikimas su Panevėžio miesto sodininkų bendrija (2008 11 26)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Pasvalio rajono Saločių bendruomene (2009 02 18)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Biržų rajono Rinkuškių bendruomene (2009 02 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Rokiškio raj. Kavoliškio bendruomene (2009 03 17)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio raj. Perekšlių bendruomene (2009 03 19)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Kupiškio raj. Noriūnų bendruomene (2009 03 24)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio kolegijos aplinkos apsaugos ir statybos katedros bendruomene (2009 09 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio gausių šeimų bendrija „Šeimyna" (2009 09 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Panevėžio miesto politikių klubu „Veiklios moterys" (2009 09 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos nariais (2009 09 25)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Biržų rajono Papilio bendruomene (2009 10 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Kupiškio rajono Palevenėlės bendruomene (2009 10 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Susitikimas su Rokiškio rajono bibliotekininkų bendruomene (2009 10 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
4	***Susitikimai su interesų grupėmis***	*Tikslas – kokybiškai atnaujinti esamą pratc.lt tinklapį ir teikti aktualią informaciją tiek bendrovės, tiek įgyvendinamo projekto*	*Panevėžio apskrities savivaldybių atstovai (2006 11 30)*	Susitikimo dalyvių sąrašas

TIKRA
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 30

		eigos klausimais. Kiekis – 25 susitikimai		
			Pasvalio raj. Vaškų vidurinė mokykla (2006 12 15)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Rokiškio raj. ekologų klubas „Medeina" (2007 01 30)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Panevėžio miesto A. Lipniūno vid mokykla (2007 03 01)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Pasvalio raj. Saločių vid. mokykla (2007 03 01)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Rokiškio raj. Pandėlio gimnazija (2007 03 14)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Panevėžio raj. Vadoklių vid. mokykla (2007 03 16)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Panevėžio m. Vilties vid. mokykla (2007 03 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Panevėžio r. Upytės pagr. Mokykla (2007 03 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Vabalninko (Biržų raj.) B. Sruogos vid. Mokykla (2007 03 27)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Biržų Aušros vid. Mokykla (2007 03 27)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Kupiškio raj. Skapiškio vid. mokykla (2007 03 29)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Kupiškio raj. Subačiaus vid. mokykla (2007 03 29)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Pasvalio rajono seniūnijų seniūnai (2007 10 18)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Biržų rajono seniūnijų seniūnai (2007 10 18)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Panevėžio rajono seniūnijų seniūnai (2007 10 26)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Rokiškio rajono seniūnijų seniūnai (2007 10 26)	Susitikimo dalyvių sąrašas
			Kupiškio rajono seniūnijų seniūnai (2007 11 28)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Panevėžio Gamtos mokykla (2007 11 28)	Susitikimo nuotraukos ir

2011 -06- 30
Aldona Čeplėjienė

				dalyvių sąrašas
			Panevėžio m. Senvagės m-kla (2008 09 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Pasvalio raj. Joniškio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinės m-kla (2009 02 18)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Biržų raj. Pabiržės pagrindinės m-kla (2009 02 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Rokiškio raj. Panemunėlio pagrindinė mokykla (2009 03 17)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Panevėžio raj. Naujamiesčio vid. mokykla (2009 03 19)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
			Kupiškio raj. Noriūnų J.Černiaus pagrindinė mokykla (2009 03 24)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas
5	***Publikacijos nacionaliniuose dienraščiuose***	*Informuoti Lietuvos ir Panevėžio apskrities visuomenę apie projekto svarbą ir jo rezultatus.*	*Dienraštis „L.T" (2006 12 27)*	„Panevėžio regione kuriama nauja atliekų tvarkymo sistema"
			Dienraštis „L.T" (2006 12 29)	„Panevėžiečiai šviesti visuomenę apie atliekų tvarkymo svarbą pradeda nuo bendruomenių ir mokinių"
			Dienraštis „Lietuvos žinios" (2009 07 24)	„Atidarytas naujasis Panevėžio regiono sąvartynas"
			Dienraštis „Lietuvos žinios" (2009 10 15)	„Baigiama įgyvendinti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema"
6	***Publikacijos apskrities, regioninėje, vietos spaudoje***	*Pateikti regiono gyventojams informaciją apie svarbius projekto vykdymo etapus bei projekto naudą.*	*Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai" (2006 12 07)*	„Panevėžio regiono gyventojai supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema"
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis" (2006 12 07)	„Panevėžio regiono gyventojai supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema"
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios" (2006 12 09)	„Panevėžio regiono gyventojai supažindinami su nauja atliekų

TIKRA
Aldona Čapiėjienė
2011 -06- 30

				tvarkymo sistema“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“ (2006 12 28)	„UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras pristato ateities planus Alizavos bendruomenei“
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2006 12 30)	„Vaškų vidurinės mokyklos vaikai mokosi rūšiuoti atliekas“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 02 14)	„Jaunieji Rokiškio ekologai domisi atliekų tvarkymu“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 02 24)	„UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras pristato ateities planus Skapiškio bendruomenei“
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 02 24)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 02 26)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2007 02 28)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 02 28)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2007 02 28)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis“ (2007 03 01)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“ (2007 03 01)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis“ (2007 03 08)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2007 03 08)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link“
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 03 08)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link“

TIKRA
Aldona Čepėjienė

2011-06-30

			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 03 08)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link“
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2007 03 10)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link“
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 03 10)	„Su atliekų rūšiavimu susipažino dar viena mokykla“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 03 10)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 03 16)	„Jaunieji Panevėžio ekologai domisi atliekų tvarkymu“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2007 03 20)	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas pristatomas Rokiškio rajono bendruomenėms“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2007 03 21)	„Atliekų tvarkymo patarimai Pandėlio gimnazijos moksleiviams“
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2007 03 21)	„Aktyviausiems Vadoklių mokiniams – PRATC suvenyrai“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 03 27)	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas pristatomas ir atokesniuose kampeliuose įsikūrusioms bendruomenėms“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 03 28)	„Busimieji Panevėžio kolegijos aplinkos inžinieriai susipažino su rengiama Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema“
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“(2007 03 28)	„Upytėje A. Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai mokėsi rūšiuoti atliekas“
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2007 03 31)	„Iš moksleivių lūpų girdėjome tik klausimai, bet ir patarimai Panevėžio regiono atliekų

KOPIJA
2011-06-30

				tvarkymo centrui“
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis“(2007 04 03)	„Vabalninko B. Sruogos mokyklos mokiniai mokėsi teisingai rūšiuoti atliekas“
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 04 03)	„Atliekų tvarkymo tema svarbi ir Biržų moksleiviams“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 04 04)	„UAB PRATC susitikimas su mokiniais – Subačiaus gimnazijoje“
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 04 05)	„Dvi Pasvalio rajono bendruomenės susipažino su atliekų tvarkymo sistema“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 04 07)	„Skapiškio mokyklos mokiniai mokėsi rūšiuoti atliekas“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 04 18)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link“
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“(2007 04 21)	„Paskutinis šį pusmetį UAB PRATC susitikimas su bendruomenėmis – Vabalninko miestelyje“
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 04 21)	„Piešinių konkurse Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ auklėtinis pelnė antrą vietą“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 04 22)	„Gražiausi atliekų konteineriai – Panevėžio lopšelio – darželio auklėtinių piešiniuose“
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis“ (2007 04 24)	„Biržų lopšelio – darželio auklėtinei – trečioji vieta gražiausio konteinerio piešinių konkurse“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 05 19)	„Didžiosios atliekos – į specialias aikšteles“
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2007 05 19)	„Didžiosios atliekos – į specialias aikšteles“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2007 05 22)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“

T I K R A
Aldona Čupiėjienė
2011 -06- 30

			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 05 22)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2007 05 23)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2007 05 23)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 05 23)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 05 24)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2007 06 06)	„Apskrities viršininko administracijoje atidaryta piešinių paroda“
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 10 25)	„Prasidėjo rudenį planuotas PRATC susitikimų ciklas“
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 10 25)	„Susitikimų ciklas – jau prasidėjo“
			Panevėžio miesto laikraštis "Sekundė"(2007 11 13)	„Įsibėgėjo PRATC susitikimų ciklas su seniūnais“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2007 11 13)	„Atliekų tvarkymo sistema domėjosi ir Rokiškio seniūnai“
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2007 12 07)	„Panevėžio moksleiviai mokėsi rūšiuoti atliekas“
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2008 01 17)	„Moksleiviai mokosi rūšiuoti atliekas ir piešdami“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 01 17)	„Salamiesčio pagrindinės mokyklos penktokai – komiksų konkurso prizininkai“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2008 01 17)	„Rūpinimąsi aplinka vaikai išreiškė kurdami komiksus apie atliekų tvarkymą
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 01 17)	„Komiksų konkurse atliekų tvarkymo tema pirmąją vietą laimėjo Biržų moksleiviai
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2008 01 19)	„Komiksų konkurse pasvalietė ketvirtoje užėmė antrąją

2011 -06- 30

				vietą“
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 01 26)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse“
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2008 01 29)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2008 01 29)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 01 31)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2008 01 31)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse“
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 02 19)	„Komiksų konkurse apie atliekų tvarkymą aktyviausi buvo panevėžiečiai
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 02 19)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 02 28)	"Nauji rūšiuotinų atliekų konteineriai - jau ir Kupiškio rajone"
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“ (2008 03 06)	„Nauji rūšiuotinų atliekų konteineriai – jau ir Kupiškio rajone“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2008 04 16)	„Nauja atliekų tvarkymo sistema domina Kamajų miestelio gyventojus“
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2008 04 17)	„Dar šiemet Rokiškyje – didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė“
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 04 17)	„Pradėtas trečiasis susitikimų ciklas“
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 04 17)	"Dar šiemet Biržuose - didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė"

T I K R A
Aldana Čeplėjienė
2011 -06- 30

			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 04 17)	Jau trečia Kupiškio rajono bendruomenė susitinka su PRATC atstovais"
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 04 17)	"Dar šiemet Kupiškyje - didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė"
			Pasvalio rajono laikraštis „Pasvalio balsas“ (2008 04 17)	"Švaros mėnuo kartu su apskrities bendruomenėmis“
			Pasvalio rajono laikraštis „Pasvalio balsas“ (2008 04 17)	"Dar šiemet Pasvalyje - didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė"
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 04 18)	„Didžiųjų atliekų šalinimo vieta – surinkimo aikštelėse")
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2008 04 19)	"Švaros mėnuo kartu su apskrities bendruomenėmis“
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2008 04 26)	„Didžiųjų atliekų šalinimo vieta – surinkimo aikštelėse"
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 05 24)	„Naujajame sąvartyne netrukus suūš statybininkų technika“"
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 05 31)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“ (2008 06 03)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“
			Pasvalio rajono laikraštis „Pasvalio balsas“ (2008 06 05)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 06 05)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 06 09)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2008 06 17)	„Pradėtas statyti Panevėžio regiono sąvartynas“

Aldona Čepėjienė

2011 -06- 30

			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas" (2008 09 27)	„Pušaloto bendruomenės nariai domėjosi naująja atliekų tvarkymo sistema
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas" (2008 09 29)	„Panevėžio Senvagės pagrindinės mokyklos pradinukai – geriausi gamtos draugai"
			Pasvalio rajono laikraštis „Pasvalio balsas "(2008 09 30)	„Nauja atliekų tvarkymo sistema aktuali ir Joniškėlio gyventojams"
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis" (2008 10 25)	„Panemunėlio geležinkelio stoties bendruomenė susitiko su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras atstovais"
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios" (2008 10 28)	„Subačiaus bendruomenė – viena aktyviausių Kupiškio rajone"
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis" (2008 10 28)	„Naujai kuriamai atliekų tvarkymo sistemai – juodupiečių dėmesys
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys" (2008 10 28)	„Šepetos miestelio gyventojai domėjosi nauja atlieka tvarkymo sistema
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai" (2008 11 20)	„Medikių miestelio bendruomenės nariai susitikimo su PRATC atstovu"
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis"(2008 11 20)	„Susitikime Gulbinų kaime virė karštos diskusijos su PRATC atstovu"
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas" (2008 11 24)	„Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė susitiko su PRATC atstovu"
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas" (2008 12 10)	„Naujarodžių bendruomenės „Žėlupė" nariai išgirdo apie kuriamą atliekų tvarkymo sistemą"
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė"(2008 12 10)	„Krekenavos bendruomenė „Pilta" susitikimo su PRATC atstovu"

TIKRA

2011 -06- 30

			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2008 12 11)	„Panevėžio sodų bendrijų pirmininkai aktyviausiai domėjosi kuriama regiono atliekų tvarkymo sistema
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 12 11)	„Smilgių miestelio bendruomenė „Bitė“ – viena aktyviausių Panevėžio rajono bendruomenių
			Pasvalio raj. laikraštis „Darbas“ (2009 03 03)	„Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės mokykloje – PRATC viktorina“
			Biržų raj. laikraštis „Šiaurės rytai“ (2009 03 03)	„PRATC atstovai lankė Biržų rajono bendruomenes“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“(2009 04 01)	„Panevėžio rajono bendruomenės susitiko su PRATC atstovais“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2009 04 02)	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema – įgyvendinimas vyksta sklandžiai“
			Rokiškio miesto ir rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2009 04 07)	„Rokiškio rajono bendruomenėms – paskaitos apie naują atliekų tvarkymo sistemą“
			Biržų raj. laikraštis „Šiaurės rytai“ (2009 07 28)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę
			Pasvalio raj. laikraštis „Darbas“ (2009 08 06)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2009 08 11)	„Liepą atidarytas naujasis Panevėžio regiono sąvartynas“
			Rokiškio miesto ir rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2009 08 06)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę
			Kupiškio miesto ir rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“ (2009 08 11)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2009 08 11)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę

2011 -06- 30

27

			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2009 09 16)	„Asbesto turinčios atliekos priimamos Panevėžio regioniniame sąvartyne
			Rokiškio miesto ir rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2009 10 13)	„Kur priimamos didžiosios, žaliosios ir pavojingos atliekos?“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Sekundė“ (2009 10 16)	„Panevėžio apskrityje daugėja rūšiuojančių atliekas“
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2010 10 07)	„Regioninis sąvartynas veikia visu pajėgumu“
7	***Pranešimai spaudai***	*Platinti informaciją visais svarbiais projekto vykdymo etapais visą projekto vykdymo laikotarpį. Kiekis – 29 pranešimai*	*BNS, Elta, Aina, Biznews (2006 11 27)*	„Atliekų tvarkymosi mokėsi Švedijoje“
			2006 12 01	Panevėžio regiono gyventojai bus supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema“
			2006 12 22	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras pristato atliekų tvarkymo sistemą apskrities bendruomenėms)
			2007 01 05	„Panevėžiečiams rūpi aplinkosauga, bet atliekas rūšiuoti dar reikia išmokti“
			2007 01 30	„Raguvos gyventojai domisi kuriama atliekų tvarkymo sistema“
			2007 03 05	„2006 metais atlikti darbai postūmis tolimesnei UAB PRATC veiklai“
			2007 03 05	„Paskutinių grupių darželinukai pieš atliekų konteinerį“
			2007 03 21	„Piešinių konkursas ikimokyklinukams „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano

2011 -06- 30

				kieme“ pratęsiamas“
			2007 04 12	„Paskelbtas konkursas praėjo sėkmingai“
			2007 06 28	„Tarptautiniame galiūnų turnyre – diskusijos aplinkosauginėmis temomis“
			2007 08 27	"Galutinis Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo plano variantas - jau rugsėjį"
			2007 08 27	"Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo technine priežiūra rūpinsis vokiečiai"
			2007 11 20	„Atliekų priėmimo, perkrovimo ir kompostavimo aikšteles statys AB „Panevėžio statybos trestas“
			2007 12 17	„Regioninį sąvartyną statys AB "Panevėžio statybos trestas" ir AB "Panevėžio keliai"
			2007 12 17	„ Panevėžio apskrities gyventojai pradėjo aktyviau rūšiuoti atliekas"
			2008 01 08	„Komiksų konkurse dalyvavusiems moksleiviams idėjų nepristigo“
			2008 06 11	„Panevėžio regiono sąvartyno statybos jau pradėtos“
			2008 10 02	„Vaikai į atliekų rūšiavimą žiūri kitaip nei suaugusieji“
			2008 10 06	„PRATC paskelbė jau ketvirtą konkursą mokiniams“
			2008 12 18	„Konkurso „Mes norime gyventi švariau“ laimėtoja – Karolina Andriulytė iš Kupiškio“
			2009 01 19	“Atliekas rūšiuojančių Panevėžio apskrities gyventojų

Aldona Čepulienė
2011 -06- 3 0

				dalis auga"
			2009 07 21	"Panevėžio regione atidarytas naujasis sąvartynas "
			2009 08 14	„Panevėžio apskrityje jau atidarytos didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės"
			2009 09 16	„PRATC atstovų susitikimai su Panevėžio regiono bendruomenėmis"
			2009 10 05	„Kviečiame į susitikimus su PRATC atstovais"
			2009 10 08	„Kur priimamos didžiosios, žaliosios ir pavojingos atliekos Panevėžio apskrityje?"
			2009 10 09	„Kviečiame žiniaskłaidos atstovus į spaudos konferenciją"
			2009 10 13	„Baigiama kurti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema"
			2009 10 15	„Kasmet vis daugiau pritariančiųjų naujajai atliekų tvarkymo sistemai Panevėžyje"
8	Spaudos konferencija	*Pristatyti žiniasklaidai PRATC įgyvendintus darbus kiekvienais metais, vykdomų projektų aktualijų pristatymas. Kiekis – 5 konferencijos*	*2006 11 30*	Pristatytas projektas, numatomi įvykdyti darbai. Dalyvių sąrašas
			2007 03 01	Dalyvių sąrašas, Pristatymas nuotraukos
			2007 12 11	Dalyvių sąrašas, Pristatymas
			2008 06 10	Spaudos konferencija, pažymint regtoninio sąvartyno statybos pradžią (kapsulės su laišku ateities kartoms įbetonavimas) regtoninio sąvartyno statybvietėje.

KOPIJA
2011 -06- 30

				Dalyvių sąrašas, Nuotraukos
			2009 10 13	Dalyvių sąrašas, nuotraukos
9	PRATC internetinio tinklapio sukūrimas/palaikymas/atnaujinimas	*Tikslas – kokybiškai atnaujinti esamą pratc.lt tinklapį ir teikti aktualią informaciją tiek bendrovės, tiek įgyvendinamo projekto eigos klausimais*	*www.pratc.lt* *2006 - 2007 m. I pusmetis;* *2007 m. II pusmetis;* *2008 m. I pusmetis;* *2008 m. II pusmetis;* *2009 m. I pusmetis;* *2009 m. I pusmetis;* *2009 m. II pusmetis;* *2010 m. II pusmetis.*	
10	Savivaldybių internetinių puslapių atnaujinimas	Tikslas - *informacijos tiekimas regiono savivaldybių tinklalapiams*	*www.panevezys.lt* *2007 – 2009 m.*	
			www.rokiskis.lt *2007-2009 m.*	
			www.kupiskis.lt *2007 – 2009 m.*	
			www.kupiskis.lt *2010 m.*	
			www.pasvalys.lt *2007 – 2009 m.*	
			www.panrs.lr *2007 – 2009 m.*	
			www.birzai.lt *2007 – 2009 m.*	
			www.pava.lt *2007 – 2009 m.*	
11	Žiniasklaidos monitoringas ir analize	*Tikslas – stebėti PRATC vykdomų darbų/projektų nušvietimą pagrindiniuose nacionalinės, regioninės ir vietinės žiniasklaidos priemonėse.*	*Neplatinamas*	Monitoringo ataskaitos TIKRA Aldona Černiejienė
12	Neperiodinis leidinys „Atliekų	Tikslas - *Tekstine ir vaizdine išraiška*	*2008 m. kovas - balandis*	Leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos Nr. 1";

2011 -06- 30

	tvarkymo aktualijos“	*pateikti informaciją, žinotiną Panevėžio regiono juridiniams asmenims.*		Patvirtinimas apie leidinio išplatinimą, nuotraukos.
			2009 m. gegužė - birželis	Leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos Nr.2“; Patvirtinimas apie leidinio išplatinimą.
			2009 m. rugsėjis - spalis	Leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos Nr.3“; Patvirtinimai apie leidinio išplatinimą.
13	Konkursai ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams	*Tikslas – suaktyvinti jaunosios kartos domėjimąsi atliekų tvarkymo klausimais ir panaudoti juos kaip idėjų propaguotojus už mokyklos ribų.*	*2007 m. kovas - balandis*	Piešinių konkursas „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme“.
			2007 m lapkritis - gruodis	Komiksų konkursas „Kaip Tvarkiukas atliekas rūšiavo“. Kvietimas, diplomo kopija dalyvių sąrašas; Piešinių nuotraukos.
			2008 m. vasaris - gegužė	Kūrybinis sentencijų konkursas apie atliekų rūšiavimą. Kvietimas, diplomo kopija, dalyvių sąrašas. Piešinių nuotraukos. Apdovanojimų nuotraukos.
			2008 m. spalis - gruodis	Kūrybinis konkursas. Kvietimas, dalyvių sąrašas nugalėtojos darbelis. Apdovanojimų nuotraukos.
14	TV laida	*Tikslas – suaktyvinti bendruomenės pozityvų interesą ir domėjimąsi kuriama atliekų tvarkymo sistema.* ***Kiekis – 18 laidų.***	*Kupiškio rajono televizija „Kupiškio TV“* *2007 03 31* *2007 04 03*	12 min. trukmės siužetas-laidelė skirta supažindinti su PRATC veikla bei informuoti gyventojus apie besikeičiančią atliekų tvarkymo sistemą. Interviu su UAB PRATC valdybos nariu Kupiškio raj. savivaldybės administracijos direktoriumi [illegible], Žilvinu Aukštikalniu.
			Kupiškio rajono televizija „Kupiškio TV“ *2007 04 14*	15 min. trukmės reportažas apie UAB PRATC

Aldona Čepėjienė

2011 -06- 30

			2007 04 17	šviečiamąją veiklą. Interviu su UAB PRATC projekto administratoriumi Vaidu Pelecku, atsitiktiniais praeiviais.
			Panevėžio miesto ir rajono televizija „KTV plius“ 2007 06 14	9 min trukmės reportažo metu pristatomas UAB PRATC įgyvendinamas investicinis projektas. Interviu su UAB PRATC direktoriumi Arturu Gruce.
			Panevėžio miesto ir rajono televizija „KTV plius“ 2007 06 28	7 min. trukmės reportažo metu pristatoma UAB PRATC visuomenės informavimo ir švietimo programa, rūšiavimo nauda. Interviu su UAB PRATC projekto administratoriumi Vaidu Pelecku.
			Panevėžio miesto ir rajono televizija „KTV plius“ 2007 10 18	Tiesioginė 30 min.. diskusijų laida „Ar viskas gerai?“ Direktorius Arturas Gruce tiesioginiame eteryje pateikė informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, atsakė į žiūrovų klausimus. Laidos scenarijus.
			Panevėžio miesto ir rajono televizija „KTV plius“ 2007 12 11 2007 12 12	Informacinis reportažas apie pasirašytas statybos darbų sutartis.
			Panevėžio miesto ir rajono TV „ATV“ 2008 02 13	Laidoje „Sveikatos sodas“ 10 min. reportažas apie UAB „PRATC“ veiklą, įgyvendinamą projektą, sociologinio tyrimo rezultatus.
			Panevėžio miesto ir rajono TV „KTV plius“ 2008 06 10	Laida „Panevėžio žinios“ informacinis reportažas apie pradėtas Panevėžio regioninio sąvartyno darbų pradžią.
			Panevėžio miesto ir rajono TV „KTV plius“ 2008 10 02	11 min. trukmės informacinė laida apie investicinį projektą, rengiamus susitikimus su moksleiviais ir bendruomenėmis.

2011 -06- 30

			Biržų rajono TV „Rygveda“ 2008 11 14	10 min. trukmės informacinė laida apie įgyvendinamą investicinį projektą, rengiamus susitikimus su bendruomenėmis, kūrybinius konkursus mokiniams.
			Panevėžio regiono televizija „ATV“ 2009 04 08	20 min. trukmės informacinė laida apie investicinį projektą, atliekų tvarkymą.
			Panevėžio regiono televizija „ATV“ 2009 07 17	10 min. trukmės informacinė laida apie liepos 16 d. atidarytą naują Panevėžio regioninį sąvartyną.
			Panevėžio regiono televizija „ATV“ 2009 09 24	10 min. trukmės reportažas apie Panevėžio mieste esančią didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.
			Kupiškio miesto ir rajono televizija „Kupiškio TV“ 2009 09 26	14 min. trukmės reportažas apie Kupiškio mieste atidarytą didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelę.
			Biržų miesto ir rajono televizija „Rygveda“ 2009 09 27	14 min. 33 sek. trukmės reportažas apie susitikimus su bendruomenėmis, atidarytas atliekų priėmimo aikšteles.
			Kupiškio miesto ir rajono televizija „Kupiškio TV“ 2009 10 03	13 min. trukmės reportažas apie atidarytą naująjį Panevėžio regiono sąvartyną.
			Panevėžio regiono televizija „PAN TV“ 2009 10 15	6 min. 24 sek. trukmės reportažas apie įgyvendintą Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektą.
			Panevėžio regiono televizija „ATV“ 2009 10 16	10 min. trukmės reportažas apie įgyvendintą Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektą.
15	Radijo laida	*Tikslas – suaktyvinti bendruomenės pozityvų interesą ir domėjimąsi kuriama atliekų tvarkymo sistema.*	*Panevėžio miesto ir rajono radijas „Aukštaitijos radijas“ laida „Su mumis lengviau“ 2007 02 12*	20 min. reportažas apie UAB PRATC vykdomą projektą. Dalyviai: UAB PRATC direktorius Arturas Grucė ir valdybos narys Viktoras

Aldona Čepėlienė
2011-06-30

34

		Kiekis – 12 laidų		Trofimovas.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Aukštaitijos radijas" laida „Grojame ir kalbame Jums" *2007 03 30*	15 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie PRATC įgyvendinamą visuomenės informavimo ir švietimo programą.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas" *2007 08 09*	13 min. trukmės tiesioginio eterio laidos metu UAB PRATC direktorius informavo apie investicinio projekto naudą, ruošiamus atlikti darbus, jau pasirašytas darbų sutartis.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas" laida „Su Ingrida" *2008 02 06*	10 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie atliktą sociologinę regiono gyventojų apklausą, apie pradėtus infrastruktūros objektų statybos darbus.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas" laida „Su Ingrida" *2008 04 09*	15 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie investicinį projektą, apie atliekų rūšiavimą, statomas aikšteles.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Aukštaitijos radijas" laida *2008 04 14*	15 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie investicinį projektą, apie atliekų rūšiavimą, statomas aikšteles.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas" laida „Su Ingrida" *2008 06 11*	10 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie pradėtus regioninio sąvartyno statybos darbus.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Aukštaitijos radijas" laida *2009 01 23*	11 min. trukmės informacinė laidelė apie vykdomus statybos darbus, atlikto sociologinio tyrimo rezultatus
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas" laida *2009 01 28*	15 min. trukmės informacinė laidelė apie vykdomus statybos darbus, atlikto sociologinio tyrimo rezultatus.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas" laida rytinė	11 min. trukmės informacinė laidelė apie investicinio

2011 -06- 30

			laida 2009 07 23	projekto rezultatus, vykdomus darbus, atidarytą naująjį regioninį sąvartyną.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas" laida 2009 08 25	10 min. trukmės reportaže pateikiama informacija apie atidarytą regioninį sąvartyną, didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės, juose priimamas atliekas, darbo laiką.
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas" laida 2009 10 12	16 min. 17 sek. diskusinė laida apie įrengtus ir pradėjusius veikti atliekų tvarkymo įrenginius. Diskusijoje apie Panevėžio regione esančias atliekų tvarkymo problemas dalyvavo PRATC direktorius ir Panevėžio raj. savivaldybės ekologė.
16	TV klipas	*Tikslas – patrauklia vizualine išraiškos forma sužadinti visuomenės dėmesį į atliekų rūšiavimą. Kiekis – 1 TV klipas rodomas 30 kartų. Demonstravimas 3 regioninėse televizijose.*	*2008 – 2009 m.*	TV klipas ir jo transliacijų patvirtinimas.
17	Spalvotos atmintinė fiziniams asmenims	*Tikslas – supažindinti visuomenę su atliekų rūšiavimo reikalingumu bei informuoti kokios bus ar gali būti rinkliavos už atliekų tvarkymą. Kiekis – 10 000 vnt*	*2008 m. lapkritis*	Atmintinė ir atmintinės platinimo patvirtinimas. TIKRA
18	Spalvotos atmintinės juridiniams asmenims	*Tikslas – supažindinti visuomenę su atliekų rūšiavimo reikalingumu bei informuoti kokios bus ar gali būti rinkliavos už atliekų tvarkymą. Kiekis – 1 000 vnt*	*2008 m. lapkritis*	Aldona Čejnėjienė Atmintinės maketas ir atmintinės platinimo patvirtinimas. 2011 -06- 30

19	Informaciniai plakatai	*Tikslas – patrauklia forma teikti informaciją kaimo žmonėms apie reikalingumą tvarkyti susidarančias atliekas. Kiekis – 4000 vnt.*	*2008 m. spalis*	Plakato maketas, plakato platinimo patvirtinimas, nuotraukos.
20	Reklaminė atributika	*Tikslas – suaktyvinti bendruomenės pozityvų interesą ir domėjimąsi kuriama atliekų tvarkymo sistema.*	*2007 – 2009 m.*	Atributikos nuotraukos ir platinimas.
21	Viešinimas internete		*Nuo 2004 m. apie projektą nuolat informuojama Finansų ministerijos tinklalapyje http://www.finmin.lt/sanglaudos_fondas, o nuo 2006 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt) http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas.*	

TIKRA
Aldona Čepulienė
2011 -06- 30

Informaciniai stendai ir atminimo lentos

Priemonė	Įrengimo data	Vieta	Rangos sutarties pavadinimas
Informacinis stendas	2008 m. sausis iki 2010 m. sausio	Prie Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Dvarininkų k. Panevėžio r.	Projekto komponentų Panevėžyje statyba Sutarties Nr. A/2007/P/35
Atminimo lenta	Nuo 2010 m. sausio iki 2015 m.	Prie Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Dvarininkų k. Panevėžio r.	Projekto komponentų Panevėžyje statyba Sutarties Nr. A/2007/P/35
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Savitiškio g. 12, Panevėžys.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Savitiškio g. 12, Panevėžys.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Pasvalio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Mūšos g. 12B, Pasvalys.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Pasvalio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Mūšos g. 12B, Pasvalys.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Technikos g. 61, Kupiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Technikos g. 61, Kupiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Rokiškio perkrovimo stoties ir stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Rokiškio perkrovimo stoties ir stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34.

T I K R A

38

2011 -06- 30 Aldona Čuplėjienė

Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Didžiagrašių k., Kupiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Didžiagrašių k., Kupiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Ruzgų k., Rokiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Ruzgų k., Rokiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Levaniškio k., Rokiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Levaniškio k., Rokiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34

TIKRA
Aldona Čepėjienė
2011-06-30

39

Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
8 priedas

Projekto galutinė ataskaita

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

sanglaudos fondas

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

Nr. 2005/LT/16/C/PE/003

GALUTINĖ ATASKAITA

Parengė:	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	Vardas ir pavardė, parašas
Patvirtino:	LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra	*Direktoriaus pavaduotojas* *Vidmantas Vansavičius* Vardas ir pavardė, parašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čopėjienė
2011 -06- 29

2011, Panevėžys

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

1

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL ARTURO GRUCĖS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

2011 m. birželio 7 d. Nr.
Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 172 straipsniu ir remdamasis Arturo Grucės 2011 m. birželio 6 d. prašymu bei valdybos pirmininko pritarimu:

1. S u t e i k i u direktoriui Arturui Grucei 11 kalendorinių dienų kasmetines mokamas atostogas nuo š.m. birželio 13 d. iki birželio 23 d.
2. S k i r i u eksploatavimo inžinierių Gintautą Ulį pavaduoti direktorių Arturą Grucę jo atostogų metu š.m. birželio 13 – 23 d.

Direktorius Arturas Grucė

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Kopija tikra
Biuro administratorė Daiva Bručienė
2011-06-22

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-29

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 5758,
faks. (8 5) 272 2563, el. p. apva@apva.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288779560

PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Aš, Vidmantas Vansavičius, Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas, tvirtinu, kad darbai, aprašyti Galutinėje ataskaitoje yra įvykdyti remiantis sprendimu suteikti paramą projektui Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas".

Vidmantas Vansavičius

Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas

Data: 2011-06-23

Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

2011-06-22

Aš, Gintautas Ulys, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC) eksploatavimo inžinierius, atliekantis direktoriaus funkcijas, tvirtinu, kad informacija, pateikta Galutinėje ataskaitoje yra teisinga, o atlikti darbai įvykdyti, remiantis sprendimu suteikti paramą Sanglaudos fondo aplinkos investicijų projektui „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", projekto registracijos numeris **2005/ LT/16/C/PE/003**.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Eksploatavimo inžinierius, atliekantis direktoriaus pareigas — Gintautas Ulys

LIETUVOS UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras RESPUBLIKA

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VESTINIŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

2

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

TURINYS

TRUMPINIAI **9**
BENDROJI INFORMACIJA **10**
1. ĮVADAS **11**
1.1. Esama padėtis atliekų tvarkymo srityje 11
1.2. Sanglaudos fondo parama 11
1.3. Sanglaudos fondo valdymas 12
2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS **18**
2.1. Projekto aprašymas 18
2.2. Projekto valdymo ypatumai 18
2.3. Viešieji pirkimai 19
2.3.1.Techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 19
2.3.2. Techninė priežiūra 20
2.3.3. Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba 22
2.3.4. Projekto komponentų Panevėžyje statyba 23
2.3.5. Visuomenės informavimas ir švietimas 24
2.3.6. Regioninio sąvartyno įrengimai ir mobili įranga 25
2.4. Situacija iki projekto įgyvendinimą 27
2.5. Panevėžio apskrities sąvartynų būklė iki projekto įgyvendinimo 28
2.6. Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įvykdyti darbai 29
2.7. Projekto atitikimas Europos Komisijos sprendimui 90
2.7.1. Europos Komisijos sprendimo specialiosios sąlygos 90
2.7.2. Projekto tikslai ir pagrindiniai priežiūros rodikliai 96
2.8. Projekto patikros 103
2.9. Projekto pažeidimai 106
3. FINANSINĖS NAUDOS ANALIZĖ **110**
3.1. Įvadas 110
3.2. Finansinė analizė 111
3.2.1. Projekto investicijų dydis 122
3.2.2. Projekto veiklos sąnaudos 122
3.2.3. Projekto pajamos 123
3.2.4. ES paramos lėšos 124
3.2.5. Projekto finansiniai rodikliai 124
3.2.6. Projekto finansinio gyvybingumo vertinimas 125
3.2.7. Projekto jautrumo analizė 126
3.2.8. finansinės analizės išvados 127
3.3. Ekonominė analizė 127
3.3.1. Nauda aplinkai 128
3.3.2. Veiklos efektyvumas 128
3.3.3. Ekonominio vertinimo aspektai 129
3.3.4. Ekonominė diskonto norma 129
3.3.5. Kainodara 129
3.3.6. Projekto ekonominiai kaštai 130
3.3.7. Ekonominės naudos vertinimas 131
3.3.8. Nauda aplinkai, sveikatai ir ekonominiam vystimuisi bei socialinė nauda 131
3.3.9. Sveikata ir aplinka 132
3.3.10. Efektyvumas ir išteklių kaštų taupymas 136

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
T I K R A
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Capličienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

3.3.11. Jautrumas ir rizikos analizė 138
3.3.12. Ekonominės analizės išvados 138
4. PROJEKTO VIEŠINIMAS 140
4.1. Europos sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamo projekto viešinimas 140
4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos 175
IŠVADOS 187
PRIEDAI 188

PAVEIKSLĖLIAI

1 pav. Sanglaudos fondo valdymas Lietuvoje 13
2 pav. Užpilama tranšėja su įrengtais inžineriniais tinklais Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelėje 30
3 pav. Inžinerinių tinklų užpylimas Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelėje 31
4 pav. Nuimtas augalinis sluoksnis ir vykdomi sankasos formavimo darbai Rokiškio kompostavimo aikštelėje 31
5 pav. Nuimto augalinio sluoksnio storis Rokiškio kompostavimo aikštelėje 32
6 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė. Klojami lietaus, buitinių nuotėkų tinklai 32
7 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė. Žemės darbai, teritorijos paruošimas 33
8 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė. Žemės darbai, pagrindo iš smėlio įrengimas. 33
9 pav. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Pagrindo iš smėlio įrengimas 34
10 pav. Rokiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė. Žemės darbai, teritorijos paruošimas 34
11 pav. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Pagrindo įrengimas, bortų ir latakų montavimas 35
12 pav. Rokiškio perkrovimo stotis. Perkrovimo pastato pamatai. 35
13 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė. Įrengiami pagrindai po asfaltbetonio danga 36
14 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Žemės darbai, teritorijos paruošimas. 36
15 pav. Montuojami lietaus vandens valymo įrenginiai. Panevėžio m. stambiagabaričių atliekų aikštelėje. 37
16 pav. Lietaus nuotėkų tinklai Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje. 37
17 pav. Panevėžio stambiagabaričių atliekų aikštelė. Pamatų po tarnybiniais pastatais armavimas 38
18 pav. Rokiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė. Lietaus nuotėkų tinklų montavimas. 38
19 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė. Asfaltavimo darbai. 39
20 pav. Rokiškio perkrovimo stoties pastato karkaso montavimas. 39
21 pav. Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Rezervuaro žemės darbai. 40
22 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, pagrindų įrengimas. 40
23 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Vandens rezervuaras. 41
24 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Latakų ,kelio bortų įrengimas. 41
25 pav. Rokiškio perkrovimo stotis. 42
26 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Atliekami gerbūvio darbai. 42
27 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Atliekami gerbūvio darbai. 43
28 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Atliekami gerbūvio darbai. 43
29 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė. Baigiamieji darbai prieš aikštelės pridavimą. 44
30 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė. Baigiamieji darbai prieš aikštelės pridavimą. 44
31 pav. Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė. Baigiamieji darbai prieš aikštelės pridavimą. 45

T I K R A
Skyriaus vedėja

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

32 pav. Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė. Baigiamieji darbai prieš aikštelės pridavimą....45
33 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės filtrato surinkimo rezervuaras. 46
34 pav. Technologinė įranga Biržų atliekų perkrovimo stotyje. 46
35 pav. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės filtrato surinkimo rezervuaras....47
36 pav. Kertami medžiai ir krūmai naujojo sąvartyno teritorijoje....49
37 pav. Sandėliuojami iškirsti medžiai. 49
38 pav. „Filtrato" ežeras....50
39 pav. Užpilinėjamas „filtrato" ežeras. 50
40 pav. Pastatytas informacinis stendas. 51
41 pav. Nuimamas augalinis sluoksnis naujojo sąvartyno teritorijoje....51
42 pav. Klojama kaupo 1-os sekcijos filtrato drenažo linija d-315. 52
43 pav. Kasamas ir išvežamas augalinis gruntas kaupo 1-oje sekcijoje. 52
44 pav. Kasamas ir išvežamas augalinis gruntas iš Atliekų rūšiavimo, garažo su dirbtuvėmis, tarnybinio pastato teritorijos....53
45 pav. Kasamas iškeliamo kelio aplink sąvartyno teritoriją drenažinis griovys....53
46 pav. Nuimamas augalinis gruntas nuo iškeliamo kelio, aplink sąvartyno teritoriją, zonos. 54
47 pav. Pietinio aptarnavimo kelio perkėlimas (kelio griovio formavimas, viršutinio dangos sluoksnio iš skaldos įrengimas)....54
48 pav. Filtrato „ežero" užpylimas. 55
49 pav. Mėsos pramonės atliekų duobių tvarkymo I-as etapas....55
50 pav. Mėsos pramonės atliekų duobių tvarkymo II-as etapas. Supilto karjerinio žvyro planiravimas. 56
51 pav. Asbesto atliekų sekcijos dugno valymas (esamo dumblo pašalinimas), užpylimas karjeriniu žvyru....56
52 pav. Atliekų kaupo I-os sekcijos pylimų supylimas ir tankinimas. 57
53 pav. Gruntinio vandens drenažo įrengimas (sausintuvų PVC vamzdynų 67/75 klojimas)....57
54 pav. Filtrato „ežero" naujos darbo zonos įrengimas. 58
55 pav. Filtrato „ežero" naujos darbo zonos filtrato drenažo įrengimas. 58
56 pav. Filtrato „ežero" naujos darbo zonos filtrato drenažo įrengimas. 59
57 pav. Pietinio aptarnavimo kelias. 59
58 pav. Asbesto atliekų sekcija....60
59 pav. Atliekų kaupo I-a sekcija. 60
60 pav. Sąvartyno filtrato rezervuarai....61
61 pav. Atliekų rūšiavimo pastatas....61
62 pav. Kūdros užkasimas....62
63 pav. Atliekų kaupo I-a sekcija. 62
64 pav. Sąvartyno filtrato drenažas....63
65 pav. Aikštelių gerbūvio darbai....63
66 pav. Atliekų rūšiavimo pastatas....64
67 pav. Naftos gaudyklės įrengimas. 64
68 pav. Atliekų rūšiavimo patalpos įrengimas. 65
69 pav. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas. 65
70 pav. Kelias aplink I-ąją sekciją ir žvyro kelias. 66
71 pav. Sąvartyno filtrato drenažo įrengimas. 66
72 pav. Garažas su remonto dirbtuvėmis 67
73 pav. Plovyklos įrengimas....67
74 pav. Lauko elektros tinklai 68
75 pav. Kaupo šlaitų tvarkymas....68

KOPIJA TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėlienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

76 pav. Sąvartyno filtrato drenažo įrengimas....69
77 pav. Dezinfekcijos duobės autotransporto ratams plauti įrengimas....69
78 pav. Ventiliacijos montavimas tarnybiniame pastate....70
79 pav. Sieninių panelių montavimas garažo pastate....70
80 pav. Kaupo šlaitų tvarkymas....71
81 pav. Armatūros rišimas priešgaisriniame rezervuare....71
82 pav. Vartų montavimas garažo su remonto dirbtuvėmis pastate....72
83 pav. Langų ir durų montavimas tarnybiniame pastate....72
84 pav. Drenažinio žvyro sluoksnis ant senojo sąvartyno kaupo viršaus....73
85 pav. Montuojama tvora....73
86 pav. Artezinio gręžinio montavimo baigiamieji darbai....74
87 pav. Geosintetinio molio pakloto klojimas....74
88 pav. Asfalto dangos klojimas kompostavimo aikštelėje....75
89 pav. Tarnybinis pastatas....75
90 pav. Tarnybinio pastato katilinė....76
91 pav. Tarnybinis pastatas....76
92 pav. I – oji kaupo sekcija....77
93 pav. Rūšiavimo pastatas....77
94 pav. Rūšiavimo įranga....78
95 pav. Garažas su remonto dirbtuvėmis ir atliekų rūšiavimo pastatas....78
96 pav. Priešgaisrinis rezervuaras....79
97 pav. Gerbūvis....79
98 pav. Pietinio šlaito apželdinimo darbai....80
99 pav. Kaupo viršutinės dalies geosintetiniu moliu užklojimo darbai....80
100 pav. Sąvartyno šiaurės – rytų pusės kaupo profiliavimas....81
101 pav. Klojamas geosintetinio molio izoliacinis kilimas....81
102 pav. Paviršinio vandens surinkimo griovių sutvirtinimas akmens skalda....82
103 pav. Sąvartyno kaupo apželdinimo darbai....82
104 pav. Krautuvas „Mitsubishi FD20CN“ su griebtuvu....83
105 pav. Ratinis frontalinis krautuvas ZL50G (XCMG)....84
106 pav. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas CARAVAGGI Bio 900....85
107 pav. Atliekų tankintuvas (kompaktorius) TANA Gx320....86
108 pav. Buldozeris CASE 1850 K LGP....87
109 pav. Sijotuvas- būgninis rėtis Pezzolato L 3000M....88
110 pav. Automobilis Volvo FM 6*2 D13C460 Euro V su priekaba HUEFFERMANN HKA 1870 30 m^3 konteinerių pervežimui....89
111 pav. Susitikimų Informacinis stendas....174
112 pav. Informacinis stendas prie Panevėžio regioninio sąvartyno (projekto komponentų Panevėžyje statyba)....178
113 pav. Atminimo lenta prie Panevėžio regioninio sąvartyno (projekto komponentų Panevėžyje statyba)....178
114 pav. Informacinis stendas prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės....179
115 pav. Atminimo lenta prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės....179
116 pav. Informacinis stendas prie Pasvalio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės....180
117 pav. Atminimo lenta prie Pasvalio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės....180
118 pav. Informacinis stendas prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės....181
119 pav. Atminimo lenta prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės....181
120 pav. Informacinis stendas prie Rokiškio perkrovimo stoties ir stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės....182

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

121 pav. Atminimo lenta prie Rokiškio perkrovimo stoties ir stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės 182
122 pav. Informacinis stendas prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 183
123 pav. Atminimo lenta prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 183
124 pav. Informacinis stendas prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 184
125 pav. Atminimo lenta stendas prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 184
126 pav. Informacinis stendas prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 185
127 pav. Atminimo lenta stendas prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 185
128 pav. Informacinis stendas prie Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 186
129 pav. Atminimo lenta stendas prie Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 186

LENTELĖS

Lentelė Nr. 1. Techninės pagalbos UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras viešasis pirkimas 19
Lentelė Nr. 2. Techninės priežiūros viešasis pirkimas 20
Lentelė Nr. 3. Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos viešasis pirkimas 22
Lentelė Nr. 4. Projekto komponentų Panevėžyje statybos viešasis pirkimas 23
Lentelė Nr. 5. Visuomenės informavimo ir švietimo viešasis pirkimas 24
Lentelė Nr. 6. Regioninio sąvartyno įrengimų ir mobilios įrangos viešasis pirkimas 25
Lentelė Nr. 7. Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba 29
Lentelė Nr. 8. Projekto komponentų Panevėžyje statyba 47
Lentelė Nr. 9. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Krautuvas 83
Lentelė Nr.10. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Ratinis frontalinis krautuvas 84
Lentelė Nr.11. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas 85
Lentelė Nr.12. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Atliekų tankintuvas (kompaktorius) 86
Lentelė Nr. 13. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Buldozeris 87
Lentelė Nr.14. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Sijotuvas- būgninis rėtis 88
Lentelė Nr. 15. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Automobilis su priekaba 30 m^3 konteinerių pervežimui. 89
Lentelė Nr. 16. Atliekų priimamų į sąvartyną rūšys bei mokesčio dydis 91
Lentelė Nr. 17. Pagal Europos Komisijos sprendimą pasiekti fiziniai rodikliai 100
Lentelė Nr. 18. Projekto patikros 103
Lentelė Nr. 19. Projekto vertė ir finansavimo šaltiniai 111
Lentelė Nr. 20. Projekto komponentų vertės 111
Lentelė Nr. 21. Bendra vykdytų darbų / suteiktų paslaugų pagal sutartis mokėjimų suvestinė.. 113

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEKSTO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 22. Projekto vykdytojų (rangovų, paslaugų teikėjų) mokėjimų suvestinė 115
Lentelė Nr. 23. Projekto išlaidų suskirstymas pagal išlaidų kategorijas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 121
Lentelė Nr. 24. Projekto viešinimo priemonės 140
Lentelė Nr. 25. Įrengti informaciniai stendai ir atminimo lentos 175

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

TRUMPINIAI

PRATC – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
AM – Aplinkos ministerija
APVA – Aplinkos projektų valdymo agentūra
EK – Europos komisija
ES – Europos Sąjunga
EB – Europos Bendrija
EEB Europos Ekonominė Bendrija
EUR – euras
FIDIC – Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
ISPA – Pasirengimo Narystei Struktūrinės Politikos Instrumentas
LR – Lietuvos Respublika
LT – Lietuva
Nr. – numeris
SF – Sanglaudos fondas
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
vnt. – vienetas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TERTINIŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Bendroji informacija

[redacted]	**Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas**	
	2005/LT/16/C/PE/003	
	LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01013, Vilnius, Lietuva	
	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Beržų g. 44, LT- 36144 Panevėžys, Lietuva	
	19.487.000,00 EUR	
	85 proc. (16.563.950,00 EUR)	
	2005-12-08	Europos Komisijos sprendime nurodyta projekto išlaidų tinkamumo paramai gauti pabaigos data **2010-12-31**
	2009-10-22	Europos Komisijos sprendimo Nr. K(2009)8360 pakeitime nurodyta projekto išlaidų tinkamumo paramai gauti pabaigos data **2010-12-31**
		Projekto pabaiga **2010-12-31**
	Pradžia: **2007-03-01**	Pabaiga: **2010-12-31**
	2005-09-02	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

1. ĮVADAS

1.1. Esama padėtis atliekų tvarkymo srityje

1996 m. paskelbtame Pranešime apie Bendrijos strategiją atliekų tvarkymo srityje pateikiama Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Dokumentas patvirtina 1989 m. Bendrijos atliekų tvarkymo strategijoje nustatytą „principų hierarchiją", t.y. pirmiausiai atliekų susidarymo prevencija ir toliau lieka pirmuoju prioritetu, o po jo seka pakartotinis naudojimas, atliekų perdirbimas, kitoks atliekų naudojimas (energijai gauti) ir galiausiai saugus atliekų šalinimas.

Atliekų tvarkymas Lietuvoje yra prioritetinė aplinkos apsaugos sritis, kurios svarba nurodyta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu „Dėl valstybės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo" Nr. I-1550 (Žin., 1996, Nr. 103-2347) patvirtintoje Valstybinėje aplinkos apsaugos strategijoje.

Siekiant įvykdyti atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES direktyvų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nustatyti atliekų tvarkymo prioritetai ir principai, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, kuriais vadovaujantis pradėtos diegti regioninės atliekų tvarkymo sistemos, apimančios kelių savivaldybių teritorijas ir padedančios apsaugoti aplinką nuo užteršimo atliekomis. Regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimas – naujas ir perspektyvus reiškinys, sąlygotas Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai.

Atliekų tvarkymo sistemos tikslas – iki 2010 metų sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, organizuoti jos funkcionavimą ir įgyvendinti šios sistemos plėtrą.

1.2. Sanglaudos fondo parama

Vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties nuostatomis, Europos Bendrijos Taryba 1994 m. gegužės 16 d. reglamentu Nr. 1164/94, įsteigiančiu Sanglaudos fondą, kurio pakeitimai buvo atlikti Tarybos 1999 m. birželio 21d. reglamentu Nr. 1264/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą, ir 1999m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1265/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedą, įsteigė Sanglaudos fondą. Reglamentas taip pat nustato Sanglaudos fondo remtinas priemones, galimas paramos formas, dydžius ir sąlygas bei pagrindinius projektų tvirtinimo, įgyvendinimo, priežiūros ir vertinimo principus.

Sanglaudos fondas – tai struktūrinė priemonė, sukurta 1993 m. ir nuo 1994 m. padedanti valstybėms narėms sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei stabilizuoti savo ekonomiką, mažinant skirtumus tarp regionų. Sanglaudos fondas finansuoja iki 85 proc. tinkamų išlaidų, susijusių su svarbiausiais aplinkosaugos ir transporto infrastruktūros projektais. Tokiu būdu stiprinama ES sanglauda ir solidarumas. Parama skiriama atskiriems projektams juos individualiai suderinus su Europos Komisija. Visi projektai finansuojami pagal šiuos kriterijus:

- Projektas atitinka ES direktyvų reikalavimus ir skirtas svarbiausių direktyvų įgyvendinimui;
- finansuojami ne mažesni kaip 10 mln. EUR vertės projektai;
- finansuojama iki 80 – 85 proc. projekto vertės;
- turi būti išlaikytas balansas tarp transporto ir aplinkos apsaugos projektų;
- Projektas turi atitikti "teršėjas moka" bei "darnaus vystymosi" principus, atliktas poveikio aplinkai vertinimas bei nepatekti į Natura 2000 saugomas teritorijas;
- Projektai gali būti grupuojami ir skirstomi į stadijas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS IR VERTIMŲ SKYRIUS
T I K R A
Skyriaus vedėja
2011 -06- 2 9
Aldona Čepiėjienė

- Suteikiama techninė pagalba projektų rengimui, monitoringui, projektų vertinimui, visuomenės informavimui.

Sanglaudos fondo parama Lietuvoje buvo teikiama vadovaujantis bendru Lietuvos Respublikos finansų, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtinta ir su Europos Komisija suderinta Sanglaudos fondo strategija 2004-2006 metams. Strategijoje apibrėžiamos pagrindinės šio fondo paramos panaudojimo kryptys. Jos atitinka ilgalaikius Lietuvos tikslus bei ES politikos gaires transporto plėtros ir aplinkos apsaugos srityse.

Atliekų tvarkymo regioninės sistemos (naujų sąvartynų įrengimas ir senų uždarymas, atliekų priėmimo aikštelių, kompostavimo aikštelių įrengimas) – viena iš pagrindinių aplinkosaugos investicijų krypčių 2004-2006 m.

Atliekų tvarkymo sistemos kūrimo teisinė ir administracinė bazė:

- Atliekų direktyva (2006/12/EB);
- Sąvartynų direktyva (1999/31/EB);
- Pavojingų atliekų direktyva Nr. 94/31/EB, iš dalies keičianti direktyvą Nr. 91/689/EEB;
- Atliekų deginimo direktyva (2000/76/EB, 94/67/EB, 89/369/EEB, ir 89/429/EEB);
- Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva Nr. 2004/12/EB, iš dalies keičianti direktyvą Nr. 94/62/EB;
- LR atliekų tvarkymo įstatymas;
- Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas;
- Atliekų tvarkymo taisyklės.

1.3. Sanglaudos fondo valdymas

ISPA yra pasirengimo narystei ES struktūrinės politikos priemonė, kuri kaip ir PHARE, SAPARD, yra skirta kitų finansinių išteklių panaudojimui ypač svarbių projektų įgyvendinimui skatinti Vidurio ir Rytų Europos šalyse kandidatėse. Konkrečiai ISPA finansinės paramos programa yra skirta padėti minėtoms šalims priartinti aplinkosaugos ir transporto būklę prie ES šalių būklės.

ISPA finansinės paramos programos tikslas buvo prisidėti prie stojimo partnerystės tikslų įgyvendinimo kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje ir prisidėti siekiant atitikti nacionalinius aplinkosaugos ir transporto sektorių plėtros ir kokybės gerinimo tikslus.

ISPA yra Sanglaudos fondo prototipas, įsteigtas 2000–2006 metų laikotarpiui **Europos Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1267/1999**, parengiančiu struktūrinės pasirengimo narystei politikos instrumentą.

Kadangi Sanglaudos fondas yra ES finansinė priemonė, jį valdant dalyvauja šios ES institucijos:

- **Europos Parlamentas**, kuris tvirtina ES biudžetą, kartu ir Sanglaudos fondo lėšas kiekvienam finansiniam laikotarpiui;
- **Europos Taryba**, kurios sprendimu priimtas reglamentas, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir nustatantis jo išteklių paskirstymą šalims narėms bei įtvirtinantis pagrindines valdymo taisykles;
- **Europos Komisija**, kuriai tenka pagrindinis Sanglaudos fondo valdymo ES lygiu vaidmuo, yra atsakinga už projektų patvirtinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą, potencialaus ir realaus kiekvieno projekto poveikio įvertinimą. Įgyvendinus projektą, Europos Komisija patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Atsižvelgiant į ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2004, Nr. 103-3777; 2008, Nr. 87-3483) Sanglaudos fondo lėšas administruojanti institucija-vadovaujančioji, mokėjimo, tarpinė ir įgyvendinančioji, taip pat galutinis paramos gavėjas. Tiesioginė atsakomybė už projektų valdymą ir finansinę kontrolę tenka šalims narėms. Sanglaudos fondo valdymą reglamentuojantys teisės aktai nurodo keletą institucijų, kurios dalyvauja valdant šį fondą šalyje narėje.

Sanglaudos fondo administravimo sistema yra paremta ISPA paramos programos valdymo sistema, panaudojant patirtį, įgytą valdant ISPA lėšas.

Sanglaudos fondo valdymo struktūra nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į ES dienos yra tokia:

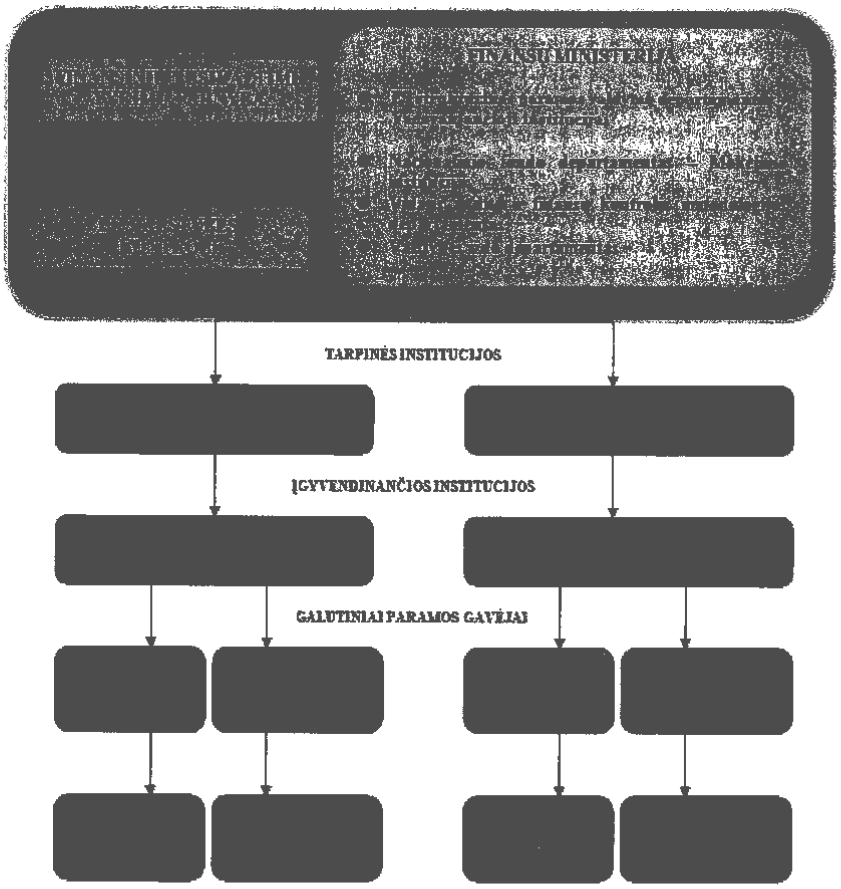

1 pav. Sanglaudos fondo valdymas Lietuvoje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėšienė

Europos Komisija (EK) – Europos Sąjungos institucija.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@prate.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Valstybės kontrolė - Lietuvos Respublikos aukščiausioji valstybinio audito institucija, Jos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, atlieka baigiamąją deklaraciją teikiančios institucijos funkciją.

Finansų ministerija – vadovaujančioji, auditą koordinuojančioji ir mokėjimus atliekanti institucija;

Aplinkos ministerija – tarpinė institucija aplinkos apsaugos srityje;

Aplinkos projektų valdymo agentūra – įgyvendinančioji institucija aplinkos apsaugos srityje.

Įgyvendinant ISPA/ Sanglaudos fondo finansuojamą projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", galutinis paramos gavėjas – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, todėl žemiau aprašomos tik susijusios institucijos.

Finansų ministerija – Vadovaujančioji ir Mokėjimo institucija.

- *Vadovaujančioji institucija* įgyvendina ES Sanglaudos fondo strategiją, koordinuoja ES Sanglaudos fondo lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūrą, atlieka kitas SF vadovaujančiosios institucijos funkcijas.
- *Mokėjimo institucija* administruoja iš Europos Komisijos gautas Sanglaudos fondo lėšas, tikrina ir teikia Europos Komisijai mokėjimo paraiškas išmokoms gauti, užtikrina tinkamą projektų įgyvendinimo finansinę priežiūrą bei atlieka kitas Sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijas.
- *Aplinkos ministerija (AM)* – tarpinė institucija. Pagal kompetenciją rengia Sanglaudos fondo strategijos aplinkosauginę dalį, siūlo projektų, tinkamų finansuoti iš Sanglaudos fondo, sąrašą; užtikrina Sanglaudos fondo paraiškų parengimą, prireikus teikia siūlymus dėl Europos Komisijos sprendimo pakeitimų bei atlieka kitas Sanglaudos fondo tarpinės institucijos funkcijas.
- *Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)* – Įgyvendinančioji institucija, kuri organizuoja viešuosius pirkimus, pasirašo sutartis, užtikrina, kad įgyvendinant Sanglaudos fondo projektus, būtų laikomasi Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų teisės aktų bei užtikrina informavimo ir viešumo veiksmų įgyvendinimą bei atlieka kitas Sanglaudos fondo įgyvendinančios institucijos funkcijas.

Galutiniai naudos (paramos) gavėjai – institucijos, gaunančios paramą ir tiesioginę naudą iš įgyvendinamų projektų.

Įgyvendinančios institucijos ir galutinio paramos gavėjo atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymas:

Aplinkos projektų valdymo agentūra

- **Viešųjų pirkimo konkursų organizavimas ir sutarčių sudarymas:**

  vykdo viešuosius pirkimus pagal LR viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimus;

  tikrina UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras pateiktų pirkimo dokumentų atitikimą LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

  atsako į konkurso dalyvių paklausimus dėl konkurso sąlygų paaiškinimo. Klausimus dėl techninės specifikacijos persiunčia atsakyti galutiniam paramos gavėjui;

  kviečia APVA, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras bei, pagal poreikį, kitus atstovus į viešojo pirkimo komisiją ir ją tvirtina;

  skiria savo atstovus į viešojo pirkimo komisiją;

  tvirtina viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą;

  atsako į konkurso dalyvių skundus;

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

pasirašo su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį, perkančiosios organizacijos vardu.

– **Projekto komponentų įgyvendinimo sutarčių vykdymas:**

prasidėjus sutarties įgyvendinimui, per savaitę paskiria projekto komponento įgyvendinimo vadovą iš APVA pusės ir raštu informuoja apie tai partnerius;

gavus galutinio paramos gavėjo komentarus, per savaitę, raštiškai pakomentuoja ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimo sutarčių vykdymu;

per savaitę gavus dokumentus raštiškai patvirtina ar pakomentuoja Projekto įgyvendinimo sutarčių pakeitimus, kuriems pritarė galutinis paramos gavėjas;

gavus techninį projektą iš konsultantų ir turint galutinio paramos gavėjo pritarimą, per savaitę pateikia jį techninei ekspertizei įvertinti;

nuolat prižiūri, kad kitos Projekto įgyvendinimo sutarčių šalys nurodytas funkcijas atliktų pagal sutarčių sąlygas.

– **Finansinė kontrolė, priežiūra, ataskaitos ir sąskaitų apmokėjimas**:

peržiūri gautus mokėjimo prašymus, sąskaitas ir kitus dėl apmokėjimo pateiktus dokumentus pagal ES Komisijos sprendimo dėl paramos skyrimo šiems Projektams nuostatas, LR teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų reikalavimus ir, jei gauti dokumentai yra priimti, juos patvirtina bei perduoda vieną sąskaitą galutiniam paramos gavėjui;

apmoka Tiekėjo, Rangovo pateiktą sąskaitą ES Sanglaudos fondo bei specialiųjų valstybės biudžeto ES Sanglaudos fondo programų projektui skiriamomis bendrojo finansavimo lėšomis, kaip nustatyta LR teisės aktuose ir šio projekto komponentų sutartyje;

atlikus mokėjimą, per 5 darbo dienas išsiunčia pranešimą (kartu su patvirtinta sąskaita ir kitais dokumentais) Galutiniam paramos gavėjui apie atliktus mokėjimus iš ES Sanglaudos fondo bei specialiųjų valstybės biudžeto ES Sanglaudos fondo programų projektui skiriamų bendrojo finansavimo lėšų;

jei mokėjimo prašymas ir mokėjimo prašymą pateisinantys dokumentai nepriimami, per 5 darbo dienas gražina juos Galutiniam paramos gavėjui pataisyti, nurodant neatitikimo priežastis.

– **Vadovavimas, priežiūra, apskaita ir ataskaitos:**

vykdo projekto komponentų patikrinimą jų įgyvendinimo vietose, šių patikrinimų registraciją bei galutiniam paramos gavėjui ar kitoms (paslaugų, darbų, tiekimo) sutarčių šalims nurodo imtis būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti;

kaupia gautą bei pačių pateiktą raštišką informaciją apie Projekto įgyvendinimo sutarčių eigą ir saugo ją 5 metus po paskutinio mokėjimo;

rengia ataskaitas Finansų ministerijai ir Aplinkos ministerijai apie visą bendrą šio Projekto komponentų įgyvendinimo eigą;

teikia informaciją Europos Komisijai apie UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įsipareigojimo 5 metus neperleisti viešosios nuosavybės turto privatiems asmenims vykdymą.

– **Visuomenės informavimas ir švietimas:**

vykdo bendrosios viešos informacijos paskelbimą;

vykdo Europos Komisijos informavimą apie šio projekto visuomenės informavimo priemones;

vykdo Galutinio paramos gavėjo parengto visuomenės informavimo veiksmų plano vykdymo kontrolę.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@praic.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

– **Auditas:**
bendradarbiauja su vidaus ir kviestiniais auditoriais;
teikia auditoriams visą su projektais susijusią dokumentaciją ir informaciją;
įgyvendina audito išvadas ir rekomendacijas susijusias su APVA veikla.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Galutinis paramos gavėjas, projektų vykdytojas – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras atsakingas už:

– **Viešųjų pirkimo konkursų organizavimas ir sutarčių sudarymas:**
vykdo visas užsakovo pareigas, numatytas LR Statybos įstatyme ir Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos statybos sutarties sąlygose (FIDIC), 1999 m. leidimas;
vykdo techninių specifikacijų bei brėžinių kokybės rengimo koordinavimą ir derinimą tarp savivaldybės ir kitų institucijų, bei patvirtina pagal STR reikalavimus;
pateikia pastabas Tiekėjų parengtoms pirkimo dokumentų techninėms specifikacijoms bei brėžiniams (per 1 savaitę nuo jų gavimo dienos);
parengia atsakymus į konkurso dalyvių paklausimus dėl techninės specifikacijos ir išsiunčia į APVA (per 3 kalendorines dienas nuo jų gavimo dienos);
skiria savo atstovus į viešojo pirkimo komisiją, kuri dirba pagal APVA patvirtintą reglamentą bei dalyvauja visuose viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose;
APVA pakvietus, pasirašo su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį Užsakovo vardu.

– **Projekto komponentų įgyvendinimo sutarčių vykdymas:**
pateikia savalaikį kreipimąsi į savivaldybes dėl detaliojo plano rengimo sąlygų sąvado bei sąlygų sąvado projektavimui išdavimo ten, kur Galutinis paramos gavėjas yra planavimo organizatorius;
ten, kur Galutinis paramos gavėjas nėra planavimo organizatorius užtikrina, kad detaliojo plano rengimo sąlygų sąvado projektavimui išdavimas būtų savalaikis ir dėk šios priežasties nebūtų projektavimo sutarties užduočių įvykdymo vėlavimo;
prasidėjus Projekto komponento sutarties įgyvendinimui, pateikia Tiekėjui, Rangovui visus su šiuo projekto komponentu susijusius dokumentus, kaip nustatyta sutarties sąlygose;
per savaitę raštiškai pateikia pastabas gautoms ataskaitoms ir kitiems dokumentams, susijusiems su Projekto įgyvendinimo sutarčių vykdymu;
per savaitę patvirtina ar pakomentuoja Tiekėjui, Rangovui jo prašomą sutarties pakeitimą;
patvirtintą sutarties pakeitimą pateikia į APVA derinti;
nuolat tikrina savalaikį Projekto komponentų įgyvendinimo sutartyse aprašytų užduočių atlikimą, užduočių kokybę ir jų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, o taip pat savalaikį susijusių ataskaitų pateikimą;
konsultantams pateikus techninį projektą, pateikia galutinio paramos gavėjo pritarimą APVA, kad ji per savaitę pateiktų jį techninei ekspertizei įvertinti;
ekspertizei patvirtinus projektinę dokumentaciją, pateikia visus reikalingus dokumentus į atitinkamą savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo;
pateikia statybos leidimą rangovui (per savaitę pateikia kopiją APVA);
kreipiasi dėl išankstinio APVA ir Aplinkos ministerijos pritarimo, bet kokių nukrypimų nuo EK sprendime ar darbų sutartyse numatytų apimčių, atveju;
turi teisę inicijuoti EK sprendimo pakeitimą ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki projekto pabaigos ir tik vieną kartą. Tokiu atveju, parengia visą EK sprendimo

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

pakeitimui reikalingą dokumentaciją ir suderina su Aplinkos ministerija, finansų ministerija ir APVA;

inicijuoja projekto komponentų žemės sklypų nuosavybės ir kitų žemės valdymo teisių patvirtinančių dokumentų sutvarkymą;

atsako už projekto techninių sprendinių ir rezultatų, nustatytų sutarčių sąlygose įgyvendinimo kontrolę bei projekto įgyvendinimą pagal EK sprendime numatytas sąlygas;

atsako už pagrindinių priežiūros ir kitų projekto EK sprendime rodiklių pasiekimą.

– **Finansinė kontrolė, priežiūra, ataskaitos ir sąskaitų apmokėjimas:**

paskiria finansininką projekto apskaitai tvarkyti;

per 3 savaites nuo rangos sutarčių pasirašymo dienos pateikia APVA suderinto su rangovu apmokėjimo grafiką;

kontroliuoja, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (FIDIC inžinierius) patvirtintų Rangovo sąskaitas laiku, kaip nustatyta šio projekto komponento sutartyje;

sąskaitų kontrolė ir mokėjimai Rangovui atliekami šia tvarka:

- nepriklausomas techninės priežiūros inžinierius/FIDIC inžinierius, Galutinio paramos gavėjo vadovas ir Finansininkas per rangos sutartyje nurodytą terminą peržiūri sąskaitos atitikimą faktiškai atliktiems darbams, ir/arba atliktam tiekimui, o taip pat „leistinų išvadų detalizavimą" („eligible expenditures specification") ir ją patvirtina;
- sąskaitą, patvirtinus nepriklausomam FIDIC inžinieriui ir Galutinio paramos gavėjo vadovui ir Finansininkui, užpildo mokėjimo prašymą, prideda pateisinančius dokumentus ir pateikia APVA;

atsako už savalaikį ES bei biudžeto lėšų įsisavinimą (pagal patvirtintą valstybės investicijų programą).

– **Vadovavimas, priežiūra, apskaita ir ataskaitos:**

iki 2006 m. gegužės 29 d. paruošia Procedūrų vadovą (instrukcijas);

teikia APVA šią informaciją:

- ateinančių metų projekto komponentų įgyvendinimo grafiką (pirkimų ir mokėjimų planus) iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. bei, esant reikalui, projekto įgyvendinimo grafiko tikslinimą;
- galutinę Projekto komponentų sutarčių įgyvendinimo ataskaitą (per 1 mėn. visoms sutarties šalims pasirašius darbų priėmimo- perdavimo aktą);
- ataskaitą apie Projekto komponentų sutarčių įgyvendinimo neatitikimus (per savaitę po nustatyto neatitikimo);

kaupia gautą bei pačių pateiktą raštišką informaciją apie Projekto įgyvendinimo sutarčių eigą ir saugo ją 5 metus po paskutinio mokėjimo;

kaupia ir saugo apskaitos dokumentų originalus 10 metų po Projekto komponentų įgyvendinimo sutarčių galiojimo pabaigos.

– **Visuomenės informavimas ir švietimas:**

Galutinis paramos gavėjas atsakingas už 2004 m. balandžio 1 d. Europos komisijos reglamente Nr. 621/2004 nustatytų privalomųjų informavimo ir viešumo veiksmų įgyvendinimą, tame tarpe:

- visuomenės informavimo veiksmų plano parengimą;
- užtikrina, kad projektų vykdytojai įgyvendintų kontraktuose numatytas informavimo bei viešumo priemones.

– **Auditas:**

užtikrina, kad visa projekto dokumentacija būtų prieinama Europos Komisijai ir Audito rūmams;

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VESTINŲJŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

užtikrina, kad visa turima projekto dokumentacija būtų prieinama APVA, Aplinkos ministerijai ir įgaliojimus turintiems pareigūnams patikrinimo vietoje metu;
– įgyvendina audito išvadas ir rekomendacijas, susijusias su Galutinio naudos gavėjo veikla.

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

2.1. Projekto aprašymas

Panevėžio apskritis yra šiaurės Lietuvoje. Centras – Panevėžys.
Apskrityje yra 6 savivaldybės:

* Biržų rajono;
* Kupiškio rajono;
* Panevėžio miesto;
* Panevėžio rajono;
* Pasvalio rajono;
* Rokiškio rajono.

2005 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijai pritarus projektui „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pasirašytas Europos Komisijos sprendimas, kuriame:

– Bendra projekto vertė – 19.487.000,00 EUR, iš jų:
– 85 proc. sudaro Sanglaudos fondo lėšos (16.563.950,00 EUR),
– 15 proc. (2.923.050,00 EUR) – Valstybės biudžeto lėšos,

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" tikslas - sukurti aplinkosaugos požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią nacionalinių ir tarptautinių standartų bei įstatymų nustatytus reikalavimus. Padidinti atliekų tvarkymo efektyvumą ir už prieinamą mokestį teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams.

Projekto "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" **rezultatai**:

– Pastatytas naujas regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Dvarininkų kaime (Panevėžio raj.).
– Panevėžio regione įrengtos 5 didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės.
– Panevėžio regione įrengtos 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.
– Uždarytas Panevėžio miesto senasis sąvartynas Dvarininkų kaime.
– Įsigyta reikalinga įranga.
– Rūšiavimo linijos įrengimas.
– Perkrovimo stočių įrengimas (Rokiškyje ir Biržuose).

2.2. Projekto valdymo ypatumai

2004 m. birželio 28 d. šešios Panevėžio regiono savivaldybės (Panevėžio miesto, Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų) pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, kuria įsipareigojo kurti ir plėtoti bendrą Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemą.

2005 m. kovo 21 d. pasirašyta UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras steigimo sutartis. Bendrovės steigėjos šešios Panevėžio apskrities savivaldybės (Panevėžio miesto, Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų). UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras valdybą sudaro šešių Panevėžio regiono savivaldybių atstovai.

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

2005 m. liepos 1 d. bendrovė įregistruota juridinių asmenų registre, pavirtinti bendrovės įstatai.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras teikia pagalbą regiono savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus, eksploatuoja didžiųjų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles, kompostavimo aikšteles, perkrovimo stotis ir Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.

Projektui pasibaigus, t.y. nuo 2010 m. gruodžio 31 d. gavėjo šalis užtikrina, kad visi viešieji (centrinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, įskaitant audituojančias įmones) ir privatūs subjektai, dalyvaujantys valdant projektą, turėtų priėjimą prie projekto apskaitos ir kitų su projekto išlaidomis susijusių dokumentų, kuriuos atsakingosios institucijos privalo saugoti penkerius metus nuo paskutinio su projektu susijusio mokėjimo.

Projektui pasibaigus, visą sukurtą infrastruktūrą toliau eksploatuos UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, veiklos sąnaudas dengdama iš regioninio sąvartyno vartų mokesčio. Komunalinių atliekų tvarkymą, susidarymo normas toliau reglamentuos savivaldybių tarybų patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės. Savivaldybių tarybos taip pat ir toliau tvirtins tarifus ir komunalinių atliekų susidarymo normas.

2.3. Viešieji pirkimai

Visi projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimo metu vykdyti viešieji pirkimai buvo atliekami laikantis Tarybos direktyvos Nr. 92/50/EEB , Tarybos direktyvos Nr. 93/36/EEB, Tarybos direktyvos Nr. 93/37/EEB dėl direktyvos Nr. 93/38/EEB, direktyvos Nr. 2004/18/EB ir direktyvos Nr. 2004/17/EK reikalavimų bei LR Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais LR teisės aktais bei konkurso sąlygomis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.

Viešųjų pirkimų dokumentuose sutarčių sąlygos darbams buvo parengtos pagal FIDIC tipinių sutarčių sąlygas.. Detalesnė informacija apie viešuosius pirkimus pateikiama žemiau.

2.3.1. Techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Lentelė Nr. 1. Techninės pagalbos UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras viešasis pirkimas

[redacted]

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratelt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS, KORUPCIJOS ... IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

19

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

[redacted]

Pagal 2005 m. gruodžio 29 d. su UAB „Sweco BKG“ pasirašytą Techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras sutartį **Nr. 2005/28/A/P/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 215.215,56 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 182.933,23 EUR,
- LR biudžeto dalis: 32.282,33 EUR.

Likusi **nepanaudota** dalis (EUR be PVM):

- Sanglaudos fondo dalis: 25.453,15 EUR,
- LR biudžeto dalis: 4.491,74 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 87,79 proc. numatytų lėšų.

Nebuvo išmokėta visa numatyta lėšų suma, kadangi iki sutarties vykdymo laikotarpio pabaigos nebuvo išnaudotas visas kasdienės pagalbos teikimas ir pagalba viešiesiems pirkimams, kadangi rangos darbų ir įrangos viešasis pirkimas vyko jau pasibaigus šios sutarties laikotarpiui.

2.3.2. Techninė priežiūra

Lentelė Nr. 2. Techninės priežiūros viešasis pirkimas

[redacted]

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Sutarties sudarymo data:	2007-08-24
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	998.113,00 Lt (be PVM) 289.073,51 EUR
Darbų teikimo terminai: Pradžia:	2007-11-19
Pabaiga:	2010-11-19
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą, vykdant Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto statybos darbus: -Naujojo regioninio sąvartyno įrengimas; -Rūšiavimo linijos įrengimas; -Tarnybinio pastato įrengimas; -Langų ir durų pakeitimas; -Pakelės apželdinimas; -5 kompostavimo aikštelių įrengimas; -5 atliekų priėmimo aikštelių įrengimas; -dviejų perkrovimo stočių įrengimas; -95 sąvartynų uždarymas (po komisijos sprendimo pakeitimo- 1 sąvartyno uždarymas). Vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbus pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybas (1999 m., pirmas leidimas, „Raudonoji Knyga“). Sutarties valdymas, projektų priežiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas; Vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbus pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybas (1999 m., pirmas leidimas, „Geltonoji Knyga“). Sutarties valdymas, projektų priežiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas; Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos Statybos techniniuose reglamentuose: STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“, STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, STR 1.02.06:2005 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos respublikoje, taisyklės“; Teikti finansines ataskaitas Užsakovo bei Perkančiosios organizacijos finansininkams. Teikti technines ataskaitas Užsakovui, Aplinkos ministerijai ir Perkančiajai organizacijai.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 4[illegible]

LIETUVOS RESPUBLIKOS ... MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORUPCIJOS ... IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čepėljienė

21

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Pagal 2007 m. rugpjūčio 24 d. su M&S Umweltprojekt GmbH pasirašytą Techninės priežiūros sutartį **Nr. 2007/120/A/P/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 224.482,59 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 190.810,20 EUR,
- LR biudžeto dalis: 33.672,39 EUR.

Likusi **nepanaudota** dalis: 64.590,92 (EUR be PVM):

- Sanglaudos fondo dalis: 54.902,28 EUR,
- LR biudžeto dalis: 9.688,64 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 77,66 proc. numatytų lėšų.
Pastaba: nebuvo atliekami 94 senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbai. Šių statybos darbų techninės priežiūros vertė pagal techninės priežiūros sutartį Nr. 2007/120/A/P/LT yra 57.628,60 EUR. Taip pat buvo neišmokėta netesybos dėl pavėluotai paruoštos galutinės ataskaitos: 6.962,32 EUR.

2.3.3. Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba

Lentelė Nr. 3. Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos viešasis pirkimas

[redacted]

*Remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 bendrųjų sutarties sąlygų 8.1 punktu, statybos darbų pradžia nustatyta 2007 m. lapkričio 30 d. Darbų baigimo laikas pagal sutarties 10 punktą yra 12 mėn. (iki 2008 m, lapkričio 30 d.),. tačiau darbų terminas pratęstas iki 2009 m. gegužės 29 d.. Paskutinė darbų perėmimo pažyma pasirašyta 2008 m. gruodžio 29 d.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Pagal 2007 m. lapkričio 19 d. su AB „Panevėžio statybos trestas" pasirašytą rangos sutartį **Nr. A/2007/P/34** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 4.340.484,42 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 3.689.411,76 EUR,
- LR biudžeto dalis: 651.072,66 EUR.

Netinkamos finansuoti išlaidos* 2.252,88 EUR:

- Sanglaudos fondo dalis: 1.914,95 EUR,
- LR biudžeto dalis: 337.93 EUR.

* aprašymas dėl atlikto pažeidimo tyrimo, kurio metu buvo nustatyta netinkamų lėšų dalis, pateikta galutinės ataskaitos 2.9 dalyje „Projekto pažeidimai".

Likusi **nepanaudota** dalis (EUR be PVM):

- Sanglaudos fondo dalis: 1.113,63 EUR,
- LR biudžeto dalis: 196,53 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 99,97 proc. numatytų lėšų.

2.3.4. Projekto komponentų Panevėžyje statyba

Lentelė Nr. 4. Projekto komponentų Panevėžyje statybos viešasis pirkimas

[redacted]	2007-08-30
	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2007-10-03. Viešojo pirkimo būdas - atviras konkursas (statybos darbai pagal FIDIC „raudonąją" knygą). 2007-11-19 vyko viešas vokų atplėšimo posėdis. Gauti du pasiūlymai. Skundų negauta. 2007-12-07 pasirašyta rangos sutartis.
	AB „Panevėžio statybos trestas" ir AB „Panevėžio keliai" jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
	2007-12-07
	47.062.898,31 Lt (be PVM) 13.630.357,48 EUR
	2007-12-20
	2009-12-20
	Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie: • Naujo regioninio sąvartyno Panevėžyje su visa infrastruktūra statyba; • Kompostavimo aikštelės statyba; • Senojo Panevėžio sąvartyno uždarymas; • Rūšiavimo linijos statyba; • Administracinio pastato ir pagalbinių pastatų statyba; • Langų ir durų pakeitimas; • Pakelės apželdinimas.

*Remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/35 bendrųjų sutarties sąlygų 8.1. punktu, statybos darbų pradžia nustatyta 2007 m. gruodžio 20 d. I grupės (pilnai pastatyti naują regioninį sąvartyną Panevėžyje su reikalinga infrastruktūra sąvartyno eksploatavimui; pastatyti kompostavimo aikštelę; tarybinį pastatą ir pagalbinius pastatus; rūšiavimo liniją;

KOPIJA TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėlienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

pakeisti langus ir duris; apželdinti pakelę) baigimo laikas yra 18 mėn. (iki 2009 m. birželio 20 d.), tačiau darbų terminas pratęstas iki 2009 m liepos 10 d. II grupės (uždaryti senąjį Panevėžio sąvartyną) baigimo laikas yra 24 mėn. (iki 2009 m. gruodžio 20 d.).). Paskutinė darbų perėmimo pažyma pasirašyta 2009 m. gruodžio 4 d.

Pagal 2007 m. gruodžio 7 d. su AB „Panevėžio statybos trestas" ir AB „Panevėžio keliai" pasirašytą rangos sutartį **Nr. A/2007/P/35** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 13.401.481,26 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 11.391.259,06 EUR,
- LR biudžeto dalis: 2.010.222,20 EUR.

Netinkamos finansuoti išlaidos* 1.409,50 EUR:

- Sanglaudos fondo dalis: 1.198,07 EUR,
- LR biudžeto dalis: 211,43 EUR.

*aprašymas dėl atlikto pažeidimo tyrimo, kurio metu buvo nustatyta netinkamų lėšų dalis, pateikta galutinės ataskaitos 2.9 dalyje „Projekto pažeidimai".

Likusi **nepanaudota** dalis (EUR be PVM):

- Sanglaudos fondo dalis: 194.544,80 EUR,
- LR biudžeto dalis: 34.331,42 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 98,32 proc. numatytų lėšų.

2.3.5. Visuomenės informavimas ir švietimas

Lentelė Nr. 5. Visuomenės informavimo ir švietimo viešasis pirkimas

[redacted]	2006-06-28
	Išankstinis skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2006-02-15. Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2006-07-14. Viešojo Pirkimo būdas – atviras konkursas. 2006-08-18 vyko viešas vokų atplėšimo posėdis. Gauti devyni pasiūlymai. 2006-09-26 [illegible] paskelbta preliminari eilė. Skundų negauta. 2006-10-17 pasirašyta pirkimo sutartis.
	UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė"
	2006-10-17
	228 000 Lt (be PVM) 66 033,36 EUR
	2006-10-17
	[illegible]
	Pagrindiniai šios sutarties pirkimo tikslai yra: Visuomenės švietimo tikslai: Supažindinti gyventojus su kuriama regionine atliekų tvarkymo sistema ir formuoti teigiamą nuomonę; Kodėl kuriama regioninė atliekų tvarkymo sistema; Kaip diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema; Kas finansuoja naujos regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą; [illegible] gyventojai žinotų ir turėtų teigiamą [illegible] rūšiavimo ir perdirbimo svarbą [illegible]

KRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

[illegible]

Pagal 2006 m. spalio 17 d. su UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pasirašytą viešojo pirkimo sutartį **Nr. A/2006/P/17** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 65.946,64 EUR iš kurių:

- Sanglaudos fondo dalis: 56.054,64 EUR,
- LR biudžeto dalis: 9.892,00 EUR.

Likusi **nepanaudota** dalis (EUR be PVM):

- Sanglaudos fondo dalis: 73,72 EUR,
- LR biudžeto dalis: 13,00 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 99,87 proc. numatytų lėšų.

2.3.6. Regioninio sąvartyno įrengimai ir mobili įranga

Lentelė Nr. 6. Regioninio sąvartyno įrengimų ir mobilios įrangos viešasis pirkimas

[illegible]

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

25

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

	pasiūlymai; VI dalis – Buldozeris, gauti keturi pasiūlymai; VII dalis – Automobilis su priekaba 30 m^3 konteinerių pervežimui, gauti keturi pasiūlymai.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	I dalis – pagal jungtinės veiklos Sutartį UAB „Koger Eco" ir „AS KOGER & PARTNERID" filialas II dalis – UAB „Elklita" III dalis – UAB „Keluva" IV dalis – UAB „Oksata" V dalis – UAB „Atomeksim" VI dalis – UAB „Intrac Lietuva" VII dalis – UAB „KMT"
Sutarties sudarymo data:	I dalis – 2009-11-24; II dalis – 2009-11-24; III dalis – 2009-11-24; IV dalis – 2009-11-24; V dalis – 2009-11-24; VI dalis – 2009-11-24; VII dalis – 2009-11-24.
Prekių kaina arba kainodaros taisyklės:	I dalis – 263.505,80 EUR (be PVM); II dalis –21.718,60 EUR (be PVM); III dalis – 112.502,89 EUR (be PVM); IV dalis – 112.343,60 EUR (be PVM); V dalis – 66.930,00 EUR (be PVM); VI dalis – 170.470,34 EUR (be PVM); VII dalis – 149.430,32EUR (be PVM).
Prekių teikimo terminai: Pradžia:	I dalis – 2009-11-24; II dalis – 2009-11-24;; III dalis – 2009-11-24; IV dalis – 2009-11-24; V dalis – 2009-11-24; VI dalis – 2009-11-24; VII dalis – 2009-11-24.
Pabaiga:	I dalis – 2010-03-24; II dalis – 2010-03-24; III dalis – 2010-03-24; IV dalis – 2010-05-24*; V dalis – 2010-03-24; VI dalis – 2010-03-24; VII dalis – 2010-03-24.
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	I dalis – Atliekų tankintuvas (kompaktorius) (1 vienetas); II dalis – Krautuvas su griebtuvu (1 vienetas); III dalis– Ratinis frontalinis krautuvas (1 vienetas); IV dalis – Kompostuojamų atliekų smulkintuvas (1 vienetas); V dalis – Sijotuvas – būgninis rėtis (1 vienetas); VI dalis – Buldozeris (1 vienetas); VII dalis – Automobilis su priekaba 30 m^3 konteinerių pervežimui (1 vienetas).

* Remiantis sutarties Nr. 2009/29/A/P/LT 8.2 punktu, užduočių vykdymo trukmė yra 4 mėnesiai nuo sutarties vykdymo pradžios dienos (iki 2010 m. kovo 24 d.), tačiau sutartis buvo pratęsta iki 2010 m. gegužės 24 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIRTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė
2011 -06- 29

Pagal 2009 m. lapkričio 24 d. su pagal jungtinės veiklos sutartį UAB „Koger Eco" ir „AS KOGER & PARTNERID" filialas pasirašytą prekių tiekimo sutartį **Nr. 2009/26/A/PT/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 263.505,80 EUR iš kurių:
- Sanglaudos fondo dalis: 223.979,93 EUR,
- LR biudžeto dalis: 39.525,87 EUR,

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

Pagal 2009 m. lapkričio 24 d. su UAB „Elklita" pasirašytą prekių tiekimo sutartį **Nr. 2009/27/A/PT/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 21.718,60 EUR iš kurių:
- Sanglaudos fondo dalis: 18.460,81 EUR,
- LR biudžeto dalis: 3.257,79 EUR,

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

Pagal 2009 m. lapkričio 24 d. su UAB „Keluva" pasirašytą prekių tiekimo sutartį **Nr. 2009/28/A/PT/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 112.502,89 EUR iš kurių:
- Sanglaudos fondo dalis: 95.627,46 EUR,
- LR biudžeto dalis: 16.875,43 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

Pagal 2009 m. lapkričio 24 d. su UAB „Oksata" pasirašytą prekių tiekimo sutartį **Nr. 2009/29/A/PT/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 112.343,60 EUR iš kurių:
- Sanglaudos fondo dalis: 95.492,06 EUR,
- LR biudžeto dalis: 16.851,54 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

Pagal 2009 m. lapkričio 24 d. su UAB „Atomeksim" pasirašytą prekių tiekimo sutartį **Nr. 2009/30/A/PT/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 66.930,00 EUR iš kurių:
- Sanglaudos fondo dalis: 56.890,50 EUR,
- LR biudžeto dalis: 10.039,50 EUR,

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

Pagal 2009 m. lapkričio 24 d. su UAB „Intrac Lietuva" pasirašytą prekių tiekimo sutartį **Nr. 2009/31/A/PT/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 170.470,34 EUR iš kurių:
- Sanglaudos fondo dalis: 144.899,79 EUR,
- LR biudžeto dalis: 25.570,55 EUR,

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

Pagal 2009 m. lapkričio 24 d. su UAB „KMT" pasirašytą prekių tiekimo sutartį **Nr. 2009/32/A/PT/LT** pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 149.430,32 EUR iš kurių:
- Sanglaudos fondo dalis: 127.015,77 EUR,
- LR biudžeto dalis: 22.414,55 EUR,

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

2.4. Situacija iki projekto įgyvendinimo

Panevėžio apskrityje per 2004 metus susidarė 92.693 tonų apskaitytų mišrių komunalinių atliekų. Vertinant savivaldybes pagal susidarančių atliekų kiekius aiškiai matosi, kad daugiausiai jų susidarė Panevėžyje (54,8 tūkst. t), mažiausiai – Pasvalio rajone (6,5 tūkst. t).

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Oficialiais statistiniais Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis metinis mišrių atliekų kiekis, tenkantis vienam Panevėžio apskrities gyventojui (priimant, kad apskrityje yra 299,99 tūkst. gyventojų) vidutiniškai tenka apie 309 kg/metus mišrių komunalinių atliekų.

Panevėžio apskrities rajonų savivaldybių atliekų tvarkymo planuose nurodomas atskiras bioskaidžių atliekų surinkimas. Pagal Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros pateiktus oficialius 2004 m. atliekų apskaitos duomenis, bioskaidžios atliekos yra apskaitytos tik Panevėžio miesto savivaldybėje (1562,39 t/m). Svarbiausia šios rūšies atliekų apskaitos problema yra ta, kad dažniausiai bioskaidžios atliekos šalinimui sumaišomos su komunalinėmis atliekomis ir į sąvartynus patenka kaip mišrios komunalinės atliekos.

Panevėžio apskrityje atskirai popieriaus/kartono, stiklo ir plastiko atliekos buvo surenkamos tik Panevėžio mieste ir keliose Panevėžio rajono seniūnijų centrinėse gyvenvietėse.

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis Panevėžio apskrityje pavojingų atliekų per metus susidaro apie 3,97 tūkst. t. arba 0,92 % visų atliekų.

Apskrityje esančių įmonių gamybos procesuose neišvengiamai susidaro gamybinės (pramoninės) atliekos, kurios turi būti tvarkomos įmonių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimuose nustatyta tvarka- paprastai perduodama išoriniam tvarkytojui. Pastarųjų atliekų apskaita, surinkimas, rūšiavimas, laikymas ar naudojimas yra pačių įmonių problema. Visos gamybinės atliekos turi būti apskaitomos Valstybinėje atliekų apskaitos sistemoje, t. y. įmonės duomenimis apie šias atliekas kasmet turi būti pateikti Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui. Panevėžio apskrityje 2004 m. susidarė apie 335 tūkst. t. gamybinių atliekų.

Pagal AM Aplinkos apsaugos agentūros duomenis 2004 m. Panevėžio apskrityje surinkta 20.530,09 t. eksploatuoti netinkamų įvairios paskirties transporto priemonių ir atliekų, išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekų. Svarbią šių atliekų bendrojo srauto dalį sudaro 653,785 tonos naudotų padangų.

2004 m. atliekų apskaitos duomenimis Panevėžio apskrityje susidaręs elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų kiekis yra 7,98 t. Tame skaičiuje 3,245 t atliekų, susidariusių Panevėžio miesto savivaldybėje, buvo pašalintos sąvartyne. Vertinti kitose savivaldybėse susidariusį šių atliekų kiekį neįmanoma, kadangi EEĮ atliekų kiekiai buvo apskaityti tik Panevėžio miesto (7,90 t) ir Pasvalio rajono (0,08 t) savivaldybėse. Didžioji dalis susidariusių EEĮ atliekų yra perdirbamos.

2.5. Panevėžio apskrities sąvartynų būklė iki projekto įgyvendinimo

Panevėžio apskrityje iki projekto įgyvendinimo buvo 95 legalūs įvairaus dydžio sąvartynai ir šiukšlynai. Nei vienas iš apskrityje esančių sąvartynų neatitiko nacionalinių ir tarptautinių reikalavimų, keliamų sąvartynams. Reikia paminėti, kad tarp sąvartyno ir šiukšlyno yra keli skirtumai. Šiukšlynai yra visiškai netvarkomi, dažniausiai atsirandantys spontaniškai. Tuo tarpu, sąvartynuose taikomi tam tikri valdymo būdai, jų kūrimas yra planingas procesas. Kai kuriais atvejais sąvartynai buvo steigiami pagal kokios nors formos projektą. Dažnai šios sąvokos vartojamos netinkamai ir dauguma vadinamųjų sąvartynų nesiskiria nuo vadinamųjų šiukšlynų.

Kiekvienoje Panevėžio apskrities savivaldybės teritorijoje eksploatuojamas pagrindinis rajono sąvartynas. Didžiąją dalį juose šalinamų atliekų sudaro didžiuosiuose apskrities miestuose susidarančios mišrios komunalinės atliekos. Vienas šios rūšies sąvartynas vidutiniškai aptarnauja 2.500 gyventojų. Pagrindiniai rajonų sąvartynai skiriasi dydžiu, sukauptų ir šiuo metu pašalintų bei sutankintų atliekų kiekiu.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@prat.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

2.6. Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įvykdyti darbai

Projektas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ buvo vykdomas pagal dvi atskiras darbų sutartis. Objektų atlikimo pažymos pateiktos 13 priede. Darbų perėmimo pažymos pateiktos 14 priede. Smulkesnė informacija pateikiama žemiau:

Lentelė Nr. 7. Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba

[redacted]	**A/2007/P/34**
	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba
	FIDIC Statybos sutarties sąlygos "Raudonoji knyga"
	Pagal šią sutartį įrengtos penkios stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Panevėžyje, Pasvalyje, Biržuose, Kupiškyje ir Rokiškyje, perkrovimo aikštelės Biržuose ir Rokiškyje, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Biržuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Rokiškyje. Ši Rangos sutartis apima asfaltuotų aikštelių teritorijas, konteineinio tipo pastatų elektros ir elektronikos bei pavojingoms atliekoms saugoti ir buitinių patalpų, vandentiekio ir nuotekų tinklų, paviršinio vandens surinkimo sistemų su naftos purvo – gaudyklėmis, teritorijos apšvietimo bei aplverimo įrengimo darbus ir kt. (Žr. 5 priedą. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Didžiagrasių k., Kupiškio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-53-081230-078, 2008-12-29). Žr. 6 priedą. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Savitiškio g. 12, Panevėžys pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-51081224-073, 2008-12-22). (Žr. 7 priedą. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Technikos g. 6L, Kupiškis pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-53-081230-077, 2008-12-29). (Žr. 8 priedą. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Mūšos g. 12B, Pasvalys pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-55-081223-068, 2008-12-16). (Žr. 9 priedą. Perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės K. Donelaičio g. 16, Rokiškis pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-56-081223-070, 2008-12-17). (Žr. 10 priedą. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Ruzgų k., Rokiškio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-56-081223-071, 2008-12-17). (Žr. 11 priedą. Perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Biržų k., Biržų r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-52-081224-078, 2008-12-22). (Žr. 12 priedą. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Levanisko k., Pasvalio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-55-081223-069, 2008-12-16).
	AB "Panevėžio statybos trestas"
	2007-11-30
	2009-03-29
	✓ Aikštelių teritorijoje nukastas [illegible]

KATRIOLĖ. [illegible] TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

- ✓ Nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai;
- ✓ Paviršinio vandens surinkimo sistemų su naftos – purvo gaudyklėmis bei priešgaisriniais rezervuarais įrengimas;
- ✓ Teritorijos asfaltavimas;
- ✓ Įrengti konteinerinio tipo pastatai elektros ir elektronikos bei pavojingoms atliekoms saugoti ir buitinės patalpos;
- ✓ Pastatyti 62 konteineriai rūšiuotinoms atliekoms (po 13 konteinerių Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio ir Pasvalio aikštelėse ir 10 konteinerių Biržų aikštelėje);
- ✓ Teritorijos apšvietimo ir aptvėrimo darbai;
- ✓ Aplinkos sutvarkymo darbai.

Objektų atlikimo pažymos pateiktos 13 priede. Darbų perėmimo pažymos pateiktos 14 priede.

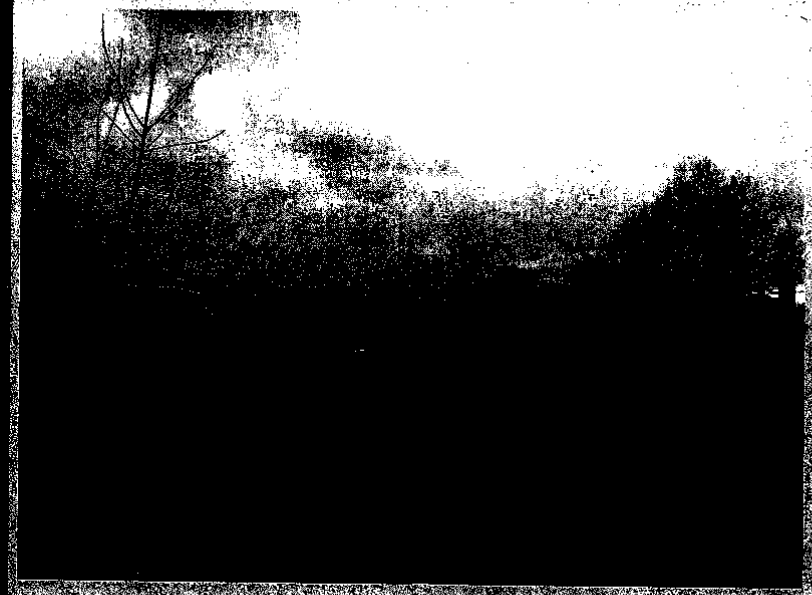

2 pav. Užpilama tranšėja su įrengtais inžineriniais tinklais Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelėje

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

30

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

3 pav. Inžinerinių tinklų užpylimas Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelėje

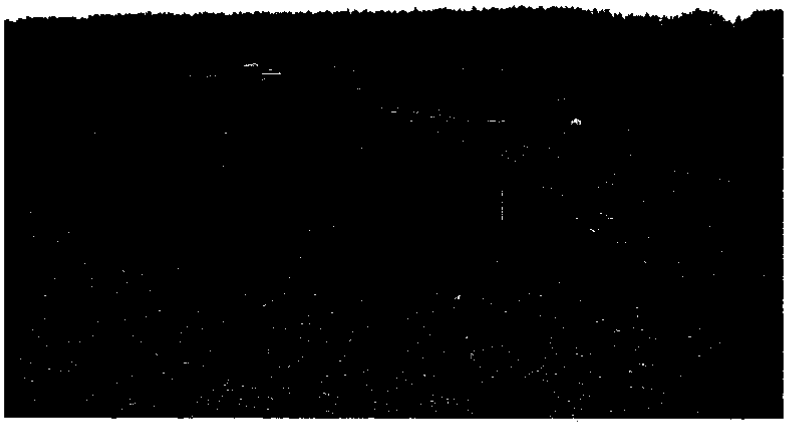

4 pav. Nuimtas augalinis sluoksnis ir vykdomi sankasos formavimo darbai Rokiškio kompostavimo aikštelėje

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR PERTIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. pštas info@prat.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

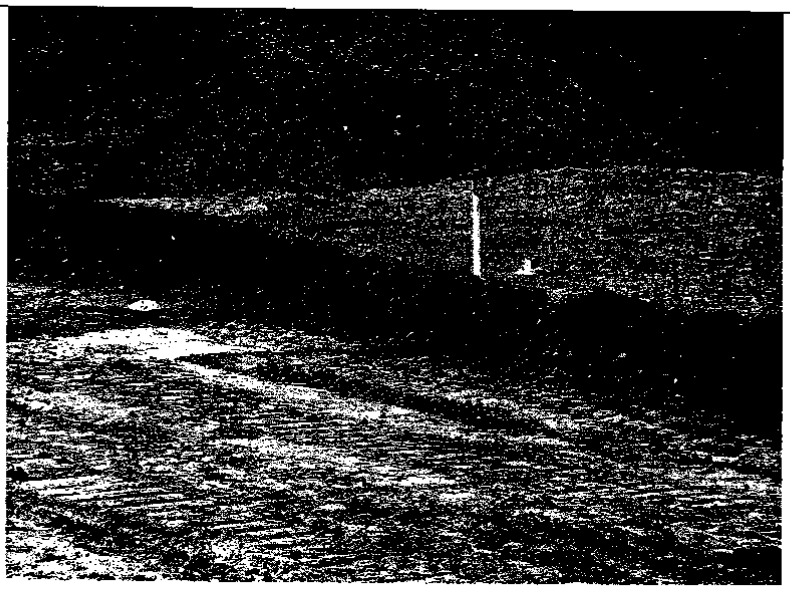

5 pav. Nuimto augalinio sluoksnio storis Rokiškio kompostavimo aikštelėje

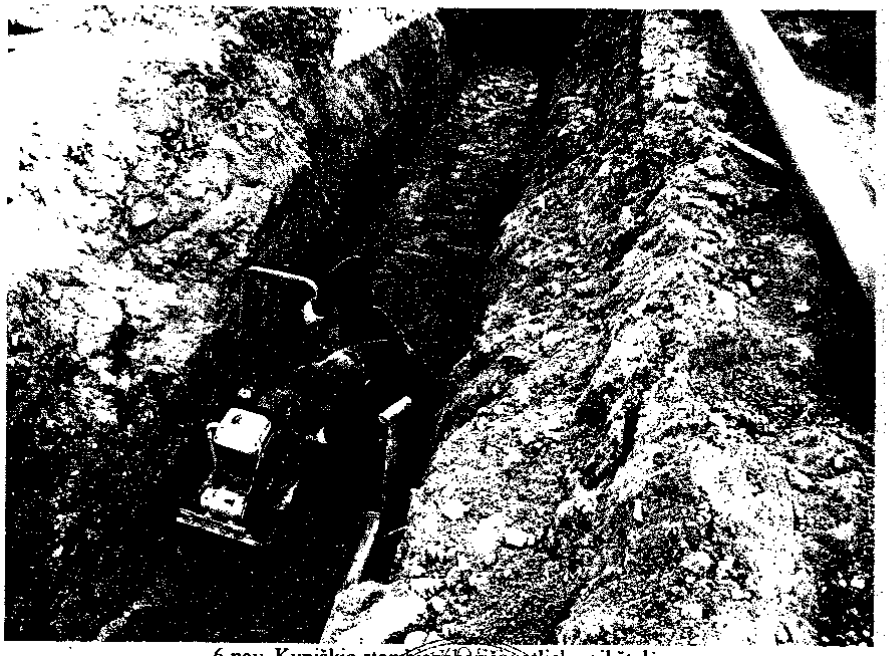

6 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė.
Klojami lietaus, buitinių nuotekų tinklai

K R A
Skyriaus vedėja
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 2 9

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432 [illegible], el. paštas [illegible]

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

7 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė.
Žemės darbai, teritorijos paruošimas.

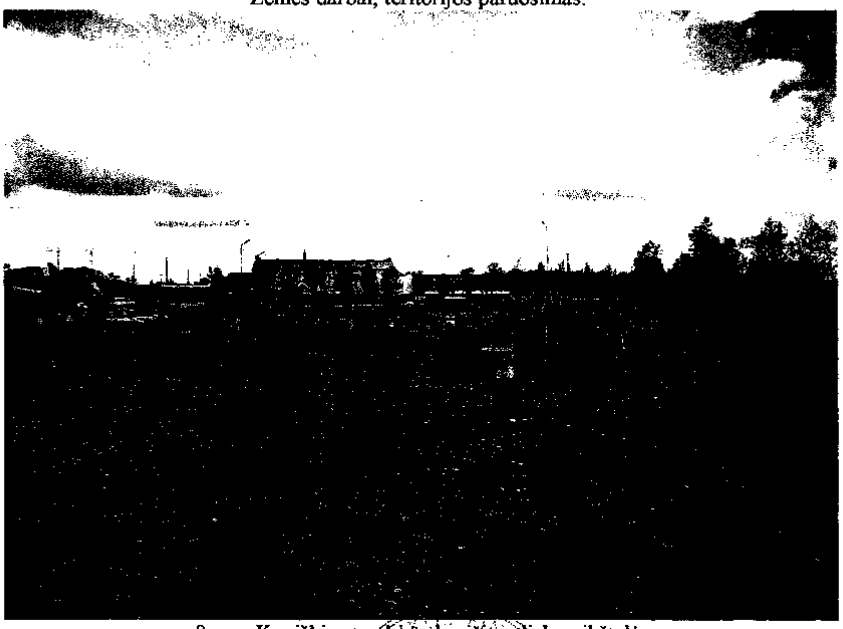

8 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė.
Žemės darbai, pagrindo iš smėlio įrengimas.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, e. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

9 pav. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.
Pagrindo iš smėlio įrengimas.

10 pav. Rokiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė.
Žemės darbai, teritorijos paruošimas.

Kodas 300127004. Beržų g. 44. Panevėžys. tel./faks. (8-45) 432199. el. paštas info@pranc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

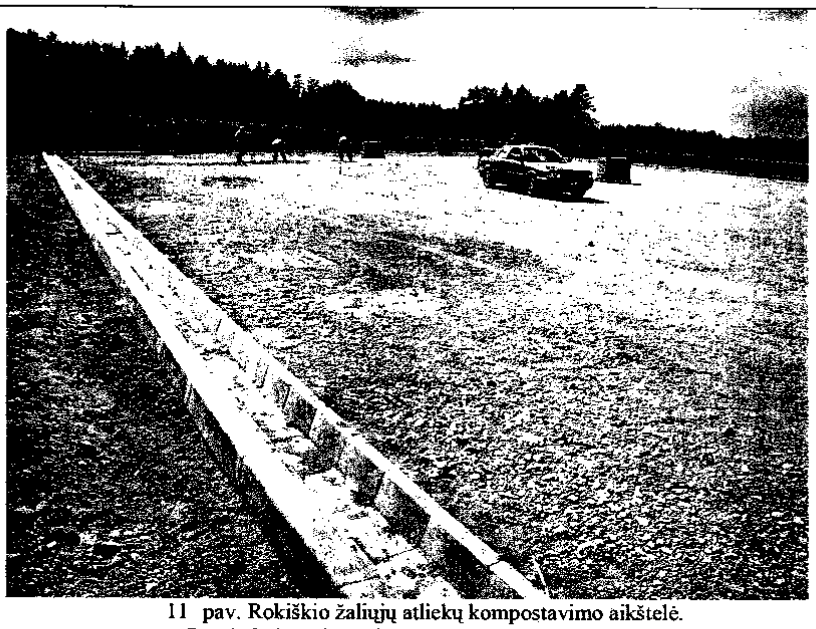

11 pav. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.
Pagrindo įrengimas, bortų ir latakų montavimas.

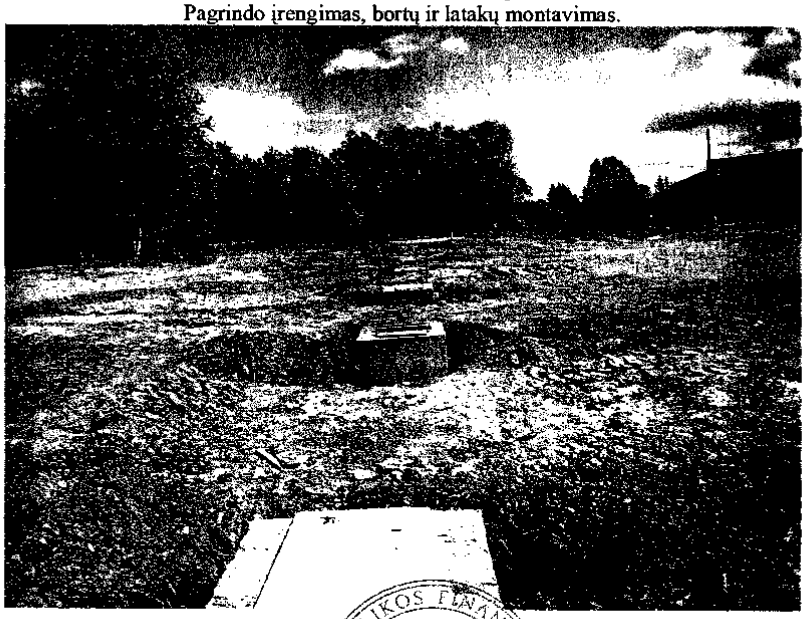

12 pav. Rokiškio perkrovimo stotis. Perkrovimo pastato pamatai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. [illegible]

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

13 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė.
Įrengiami pagrindai po asfaltbetonio danga.

14 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Žemės darbai, teritorijos paruošimas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

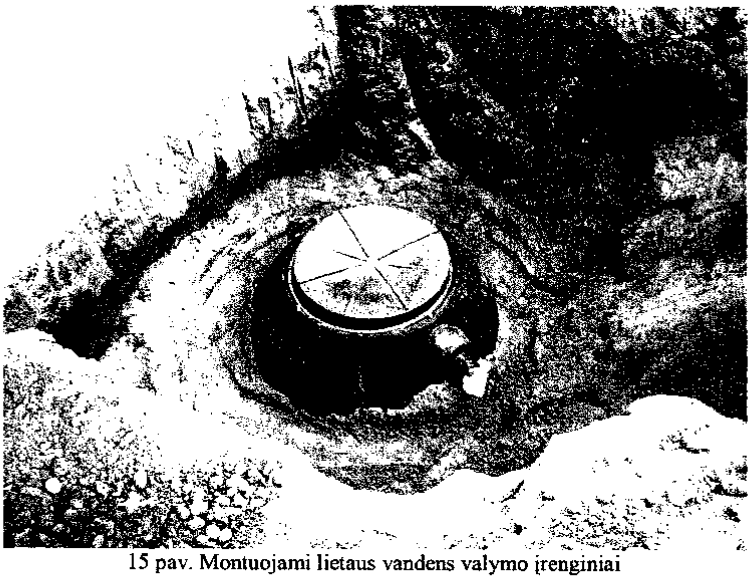

15 pav. Montuojami lietaus vandens valymo įrenginiai Panevėžio m. stambiagabaričių atliekų aikštelėje.

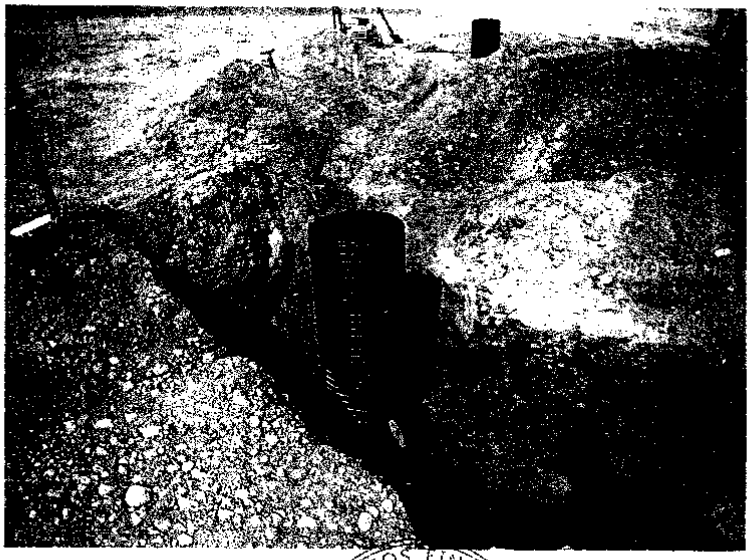

16 pav. Lietaus nuotėkų tinklai Kokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

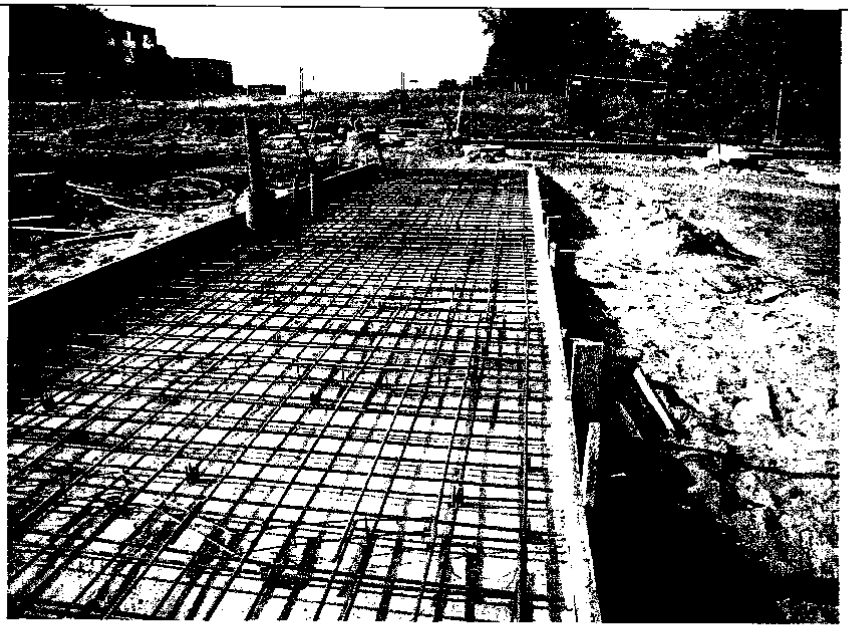

17 pav. Panevėžio stambiagabaričių atliekų aikštelė.
Pamatų po tarnybiniais pastatais armavimas.

18 pav. Rokiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė.
Lietaus nuotėkų tinklų montavimas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, [illegible]@pratelt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

19 pav. Kupiškio stambiagabaričių atliekų aikštelė.
Asfaltavimo darbai.

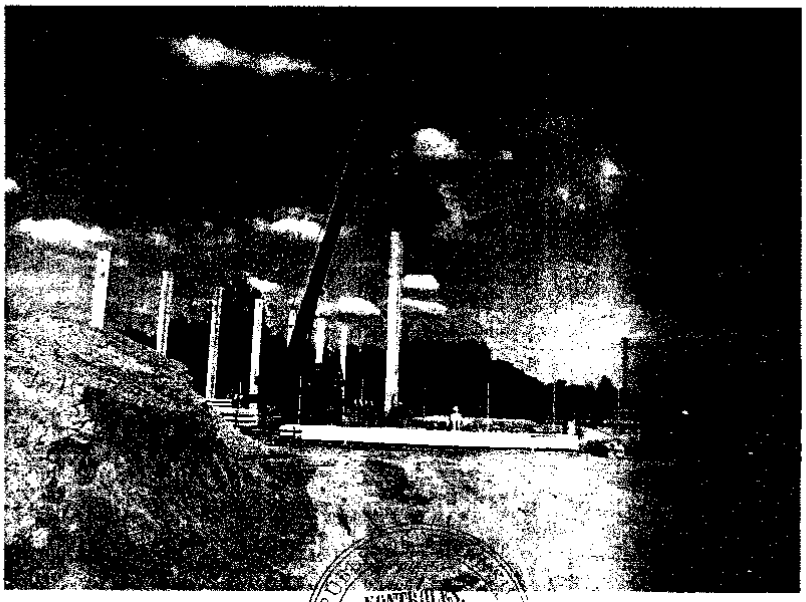

20 pav. Rokiškio perkrovimo stoties pastato karkaso montavimas.

KONTROLĖS, AUDITO IR VERTINIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432192, el. paštas info@prato.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

21 pav. Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Rezervuaro žemės darbai.

22 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, pagrindų įrengimas.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

23 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Vandens rezervuaras.

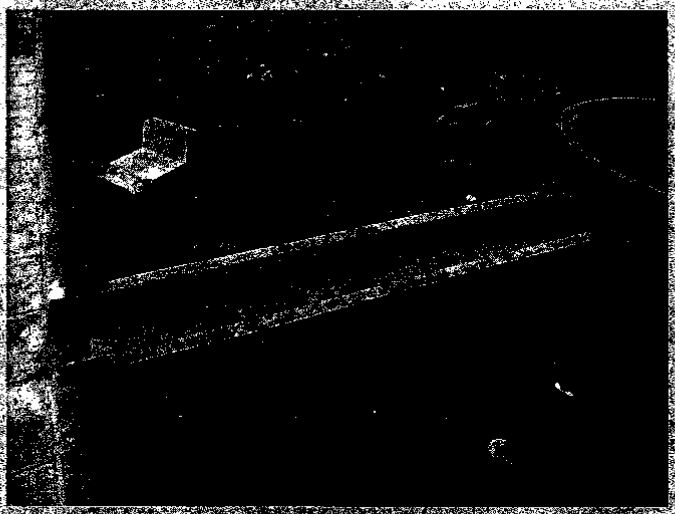

24 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Laiakų, kelio bortų įrengimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RIKANSIS MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

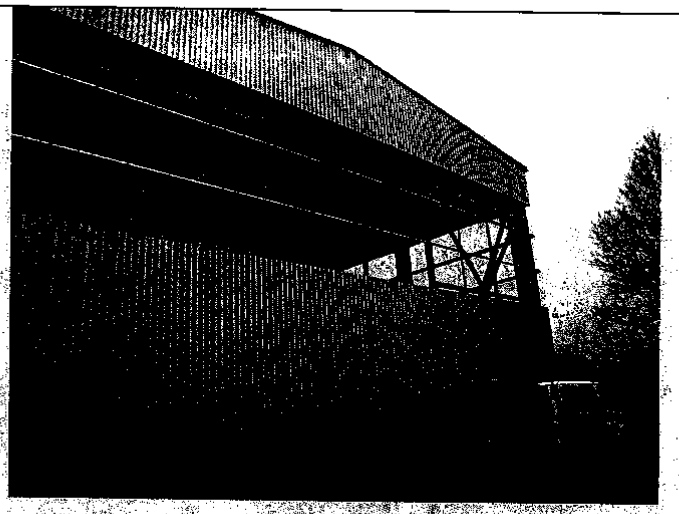

25 pav. Rokiškio perkrovimo stotis.

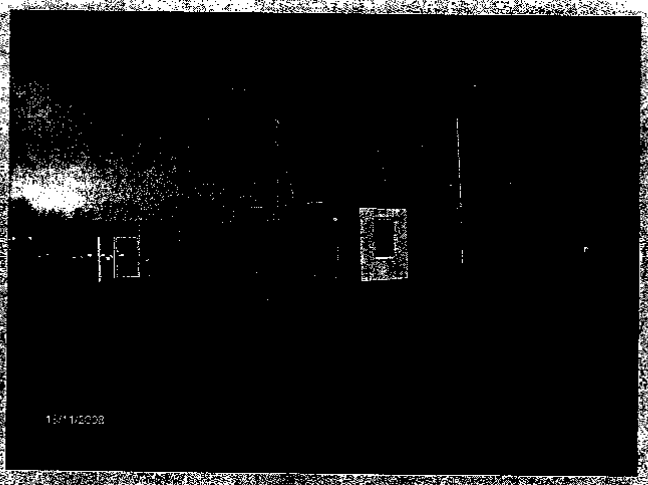

26 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Atliekami gerbūvio darbai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplajienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

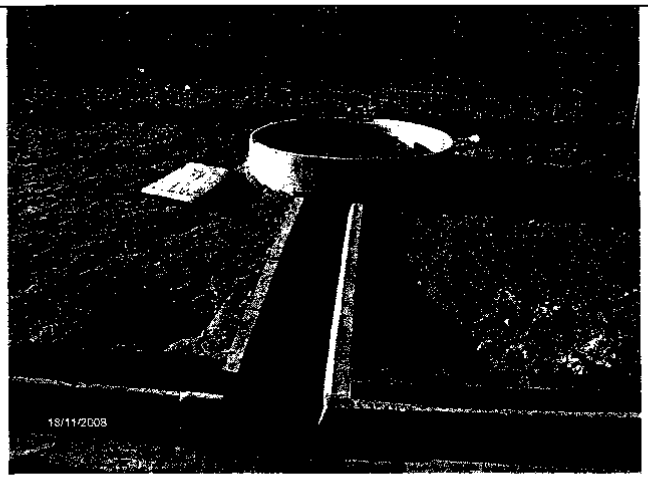

27 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Atliekami gerbūvio darbai.

28 pav. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Atliekami gerbūvio darbai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

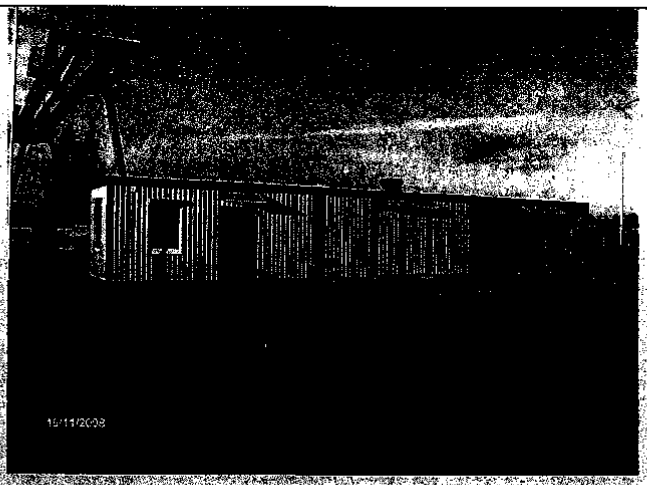

29 pav. Kupiškio šiaimbiagabaritių atliekų priėmimo aikštelė. Baigiamieji darbai prieš aikštelės pridavimą.

30 pav. Kupiškio šiaimbiagabaritių atliekų priėmimo aikštelė. Baigiamieji darbai prieš aikštelės pridavimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

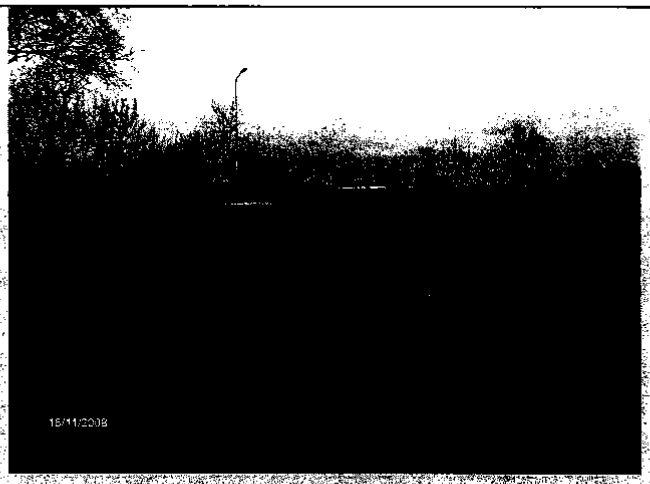

31 pav. Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė. Baigiamieji darbai prieš aikštelės pridavimą.

32 pav. Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė. Baigiamieji darbai prieš aikštelės pridavimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapliejienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

45

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

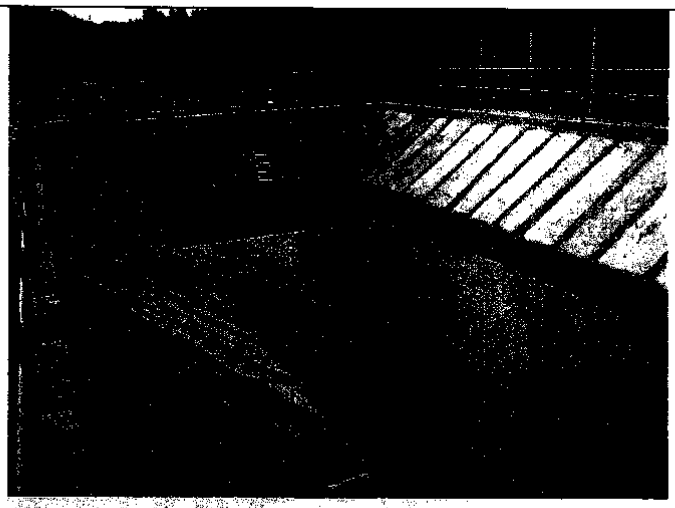

33 pav. Kupiškio žaluju atliekų kompostavimo aikštelės filtrato surinkimo rezervuaras.

34 pav. Technologinė įranga Biržų atliekų perkrovimo stotyje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

35 pav. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės filtrato surinkimo rezervuaras.

Lentelė Nr. 8. Projekto komponentų Panevėžyje statyba

A/2007/P/35

Projekto komponentų Panevėžyje statyba

FIDIC Statybos sutarties sąlygos "Raudonoji knyga"

Pagrindiniai Rangos sutarties darbai yra šie:

- Naujo regioninio savartyno Panevėžyje su visa infrastruktūra statyba;
- Kompostavimo aikštelės statyba;
- Senojo Panevėžio savartyno uždarymas;
- Rūšiavimo linijos statyba;
- Administracinio pastato ir pagalbinių pastatų statyba;
- Langų ir durų pakeitimas 7 namams;
- Pakelės apželdinimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

47

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Darbų rangovas	AB „Panevėžio statybos trestas" ir AB „Panevėžio keliai" jungtinės veiklos sutarties pagrindu
Darbų pradžios data	2007-12-20
Darbų pabaigos data	2009-12-20
Atliktų darbų aprašymas	**Regioninio sąvartyno I-osios sekcijos įrengimas:** ✓ Miško kirtimas; ✓ I-osios sekcijos įrengimo darbai: ✓ Durpingo sluoksnio pašalinimas ir užpylimas smėlingu gruntu; ✓ Priemolinio grunto sluoksnio įrengimas; ✓ Gruntinio vandens horizonto pažeminimo sistemos įrengimas; ✓ Smėlio pasluoksnio įrengimas; ✓ HPDE geomembranos įrengimas; ✓ Apsauginės geotekstilės įrengimas; ✓ Drenažinio sluoksnio (filtratui) įrengimas bei granitinės skaldos mišinio sluoksnio įrengima aplink filtrato surinkimo drenas. **Sąvartyno tarnybinė zona:** ✓ Gręžtinių pamatų tarnybiniam pastatui įrengimas; ✓ Karkaso montavimas; ✓ Sienų konstrukcijos montavimas iš apšiltintų plokščių; ✓ Pagalbinių pastatų įrengimas; ✓ Kiemo inžinieriniai tinklai; ✓ Priešgaisrinių rezervuarų įrengimas; (žr. 1 priedą. Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinim tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00012, 2009-07-01 (statybos II dalies I etapas)); (žr. 2 priedą. Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinim tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00013, 2009-07-01 (statybos I dalis)); **Kompostavimo aikštelės įrengimas:** ✓ Kompostavimo aikštelės vertikalinio planiravimo darbai; ✓ Aikštelės pagrindų paruošimas asfaltbetonio dvisluoksnės dangos įrengimui; ✓ Kompostavimo aikštelės bortų ir latakų įrengimas; ✓ Kompostavimo aikštelės asfaltbetonio dangos įrengimas; (žr. 3 priedą. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinim tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00011, 2009-07-01); ✓ **Seno sąvartyno kaupo formavimas:** ✓ Kaupo formavimo darbai; ✓ Smėlio pasluoksnio uždėjimas; ✓ Atskiriamoji geotekstilė; ✓ Bentonito kilimas; ✓ Smėlio sluoksnis; ✓ Priemolio sluoksnis; ✓ Augalinis sluoksnis, ✓ Apvažiavimo kelias aplink kaupą; ✓ Monitoringo gręžinių įrengimas; (Žr. 4 priedą. Panevėžio miesto sąvartyno Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkam uždarytu aktas Nr. PTN-100-091209-00145, 2009-12-04); Objektų atlikimo pažymos pateiktos 13 priede. Darbų perėmimo pažymos pateiktos 14 pried

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čaplėjienė

UAB „PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

36 pav. Kertami medžiai ir krūmai naujojo sąvartyno teritorijoje.

37 pav. Sandėliuojame iškirsti medžiai.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

38 pav. „Filtrato“ ežeras.

39 pav. Užpilmėjamas „filtrato“ ežeras.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapiėjienė

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR PERTIMŲ SKYRIUS

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@prato.lt

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

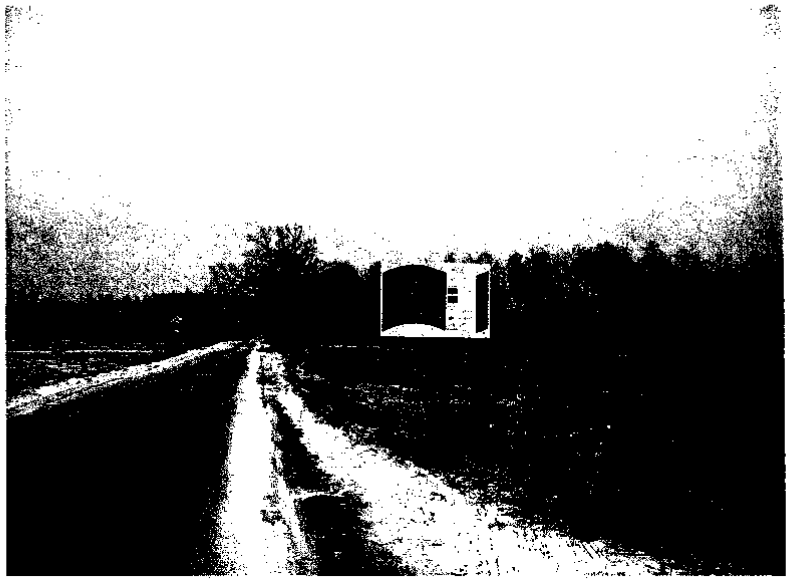

40 pav. Pastatytas informacinis stendas.

41 pav. Nuimamas augalinis sluoksnis naujojo savartyno teritorijoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

51

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

42 pav. Klojama kaupo 1-os sekcijos filtrato drenažo linija d-315.

43 pav. Kasamas ir išvežamas augalinis gruntas kaupo 1-oje sekcijoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VEDTIAU SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. [illegible]

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

44 pav. Kasamas ir išvežamas augalinis gruntas iš Atliekų rūšiavimo, garažo su dirbtuvėmis, tarnybinio pas teritorijos.

45 pav. Kasamas iškeliamo kelio aplink savartyno teritorija drenažinis griovys.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. pastas [illegible]

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

46 pav. Nuimamas augalinis gruntas nuo iškeliamo kelio, aplink sąvartyno teritoriją, zonos.

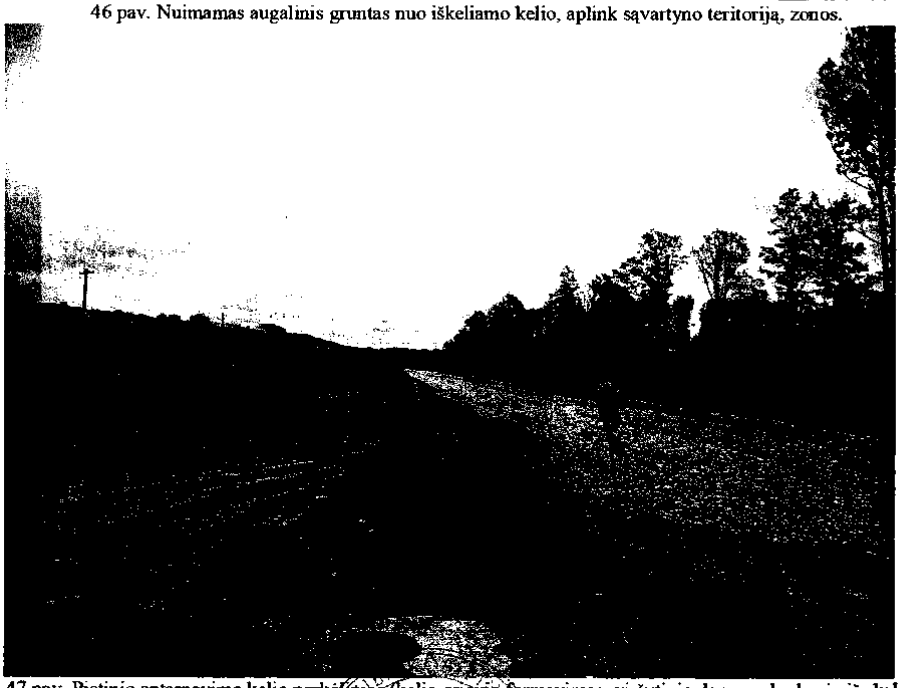

47 pav. Pietinio aptarnavimo kelio perkėlimas (kelio griovio formavimas, viršutinio dangos sluoksnio iš skaldo isengimas).

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

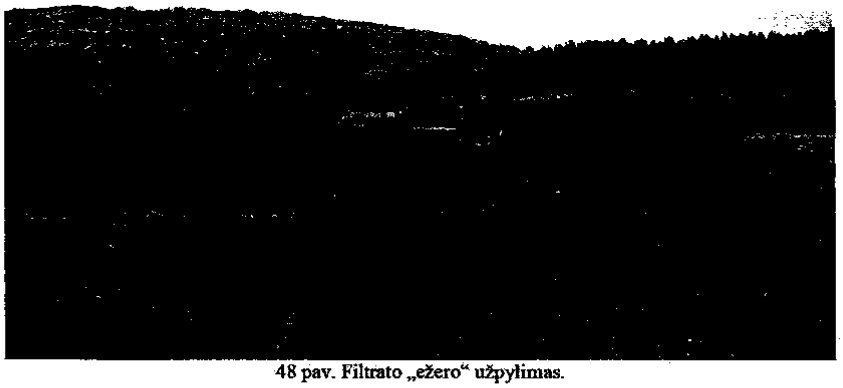

48 pav. Filtrato „ežero“ užpylimas.

49 pav. Mėsos pramonės atliekų duobių tvarkymo I-as etapas.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

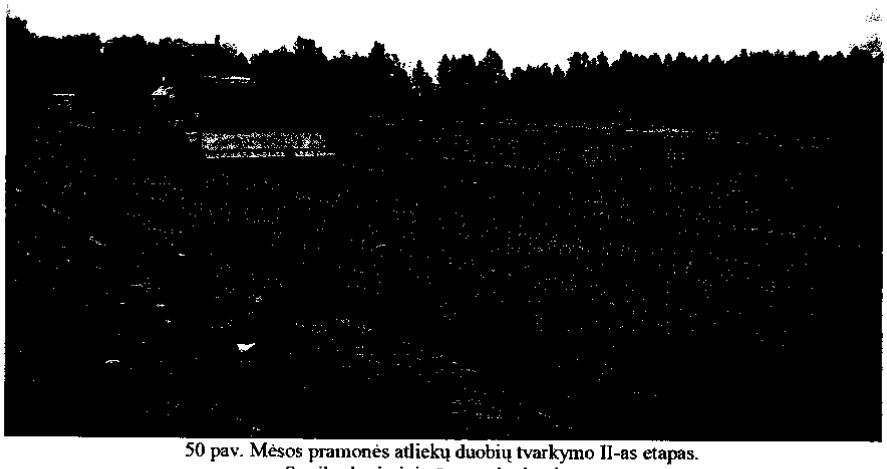

50 pav. Mėsos pramonės atliekų duobių tvarkymo II-as etapas.
Supilto karjerinio žvyro planiravimas.

51 pav. Asbesto atliekų sekcijos dugno valymas (esamo dumblo pašalinimas), užpylimas karjeriniu žvyru.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 482199, el. paštas [illegible]atc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėjas
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

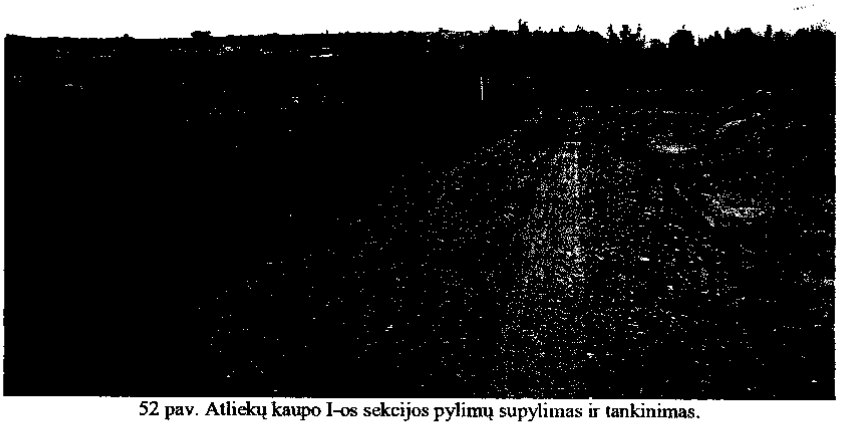

52 pav. Atliekų kaupo I-os sekcijos pylimų supylimas ir tankinimas.

53 pav. Gruntinio vandens drenažo iretkimas (vaustinių PVC vamzdynų 67/75 klojimas).

KOREKTOR KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

57

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

54 pav. Filtrato „ežero" naujos darbo zonos įrengimas.

55 pav. Filtrato „ežero" naujos darbo zonos filtrato drenažo įrengimas.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

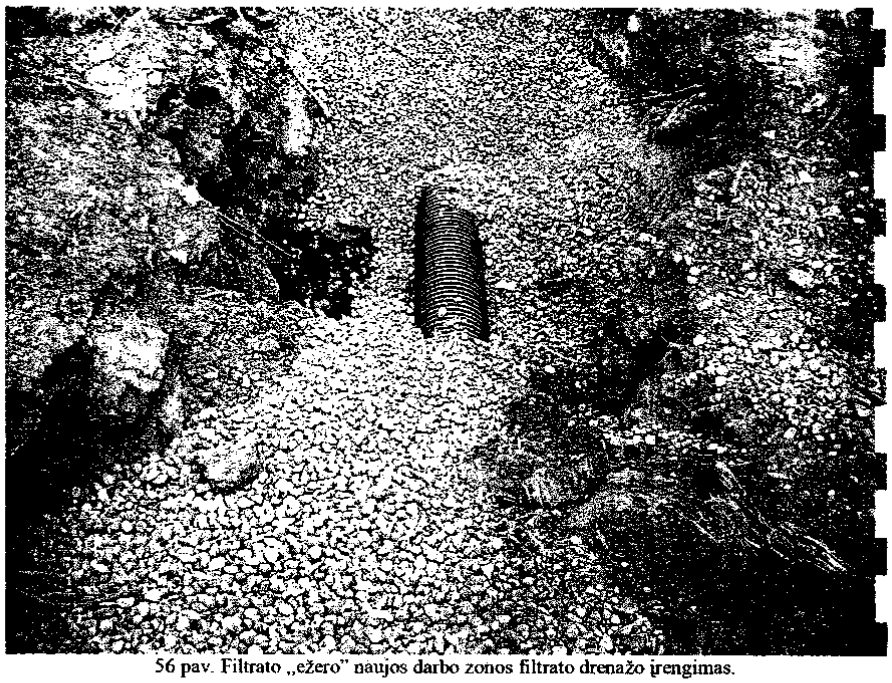

56 pav. Filtrato „ežero" naujos darbo zonos filtrato drenažo įrengimas.

57 pav. Pietinio aptarnavimo kelias.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. paštas info@praic.lt

UAB „PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

58 pav. Asbesto atliekų sekcija.

59 pav. Atliekų kupo I-a sekcija.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEKSTŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čapljienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. paštas info@prac.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

72 pav. Garažas su remonto dirbtuvėmis.

73 pav. Plovyklos įrengimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

67

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

74 pav. Lauko elektros tinklai.



75 pav. Kaupo šlaitų tvarkymas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vėdėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

68

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

76 pav. Sąvartyno filtrato drenažo įrengimas.

77 pav. Dezinfekcijos duobės autotransporto ratams plauti įrengimas.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDINIŲ SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

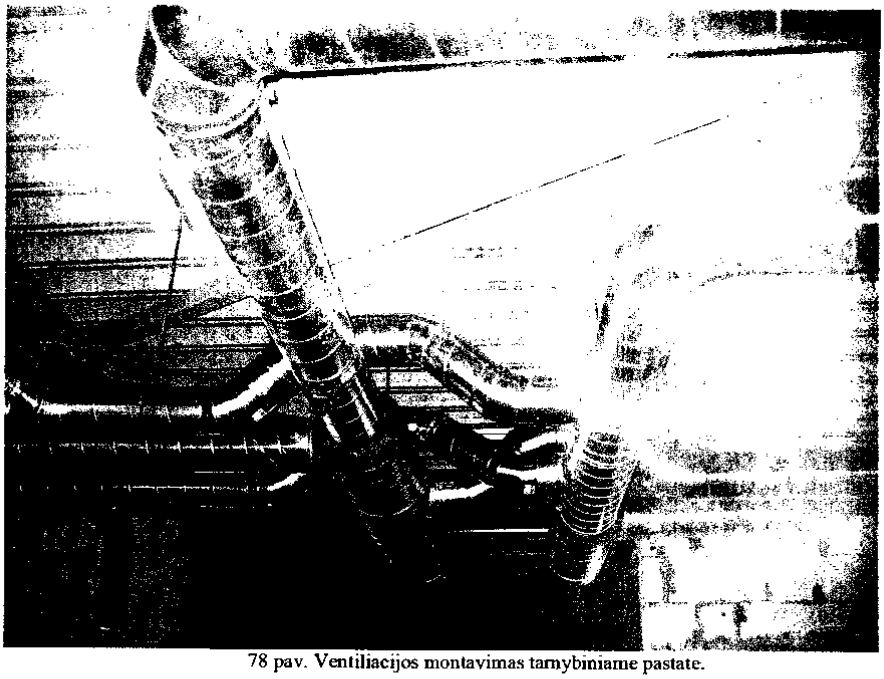

78 pav. Ventiliacijos montavimas tarnybiniame pastate.

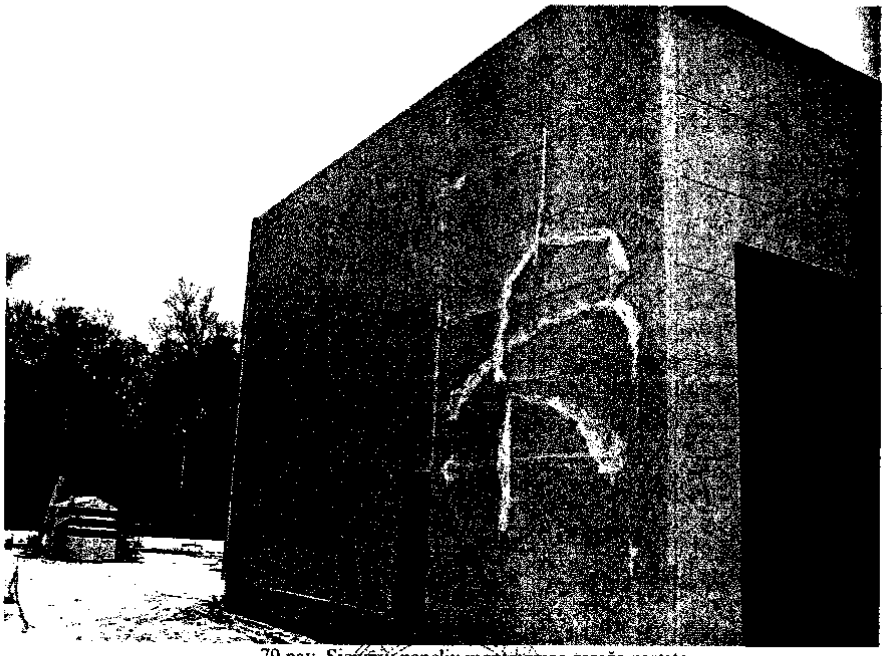

79 pav. Sieninių panelių montavimas garažo pastate.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, [illegible]

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

80 pav. Kaupo šlaitų tvarkymas.

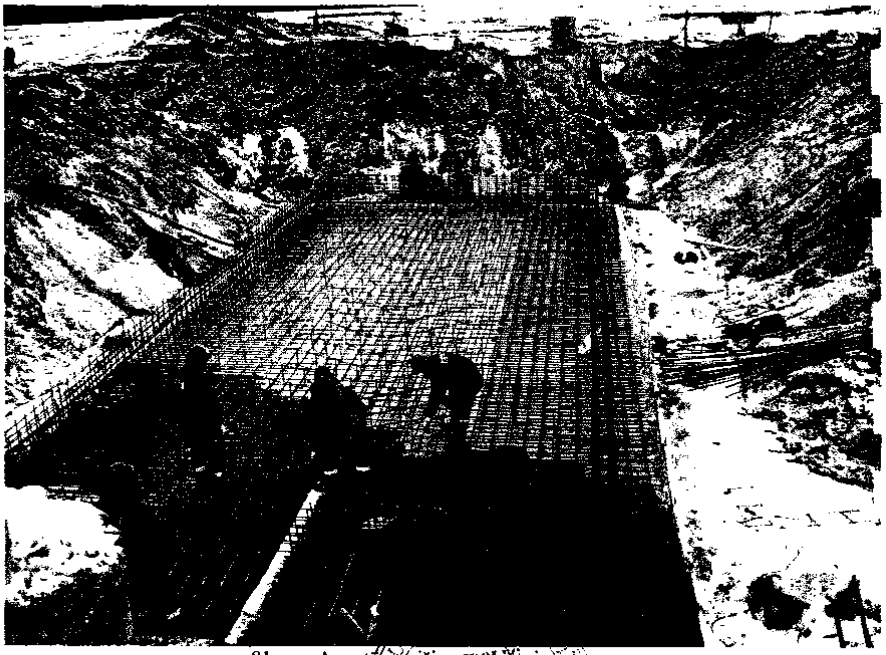

81 pav. Armatūros rišimas telesgaisriniame rezervuare.

KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. paštas info@vrtc.lt

UAB „PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"

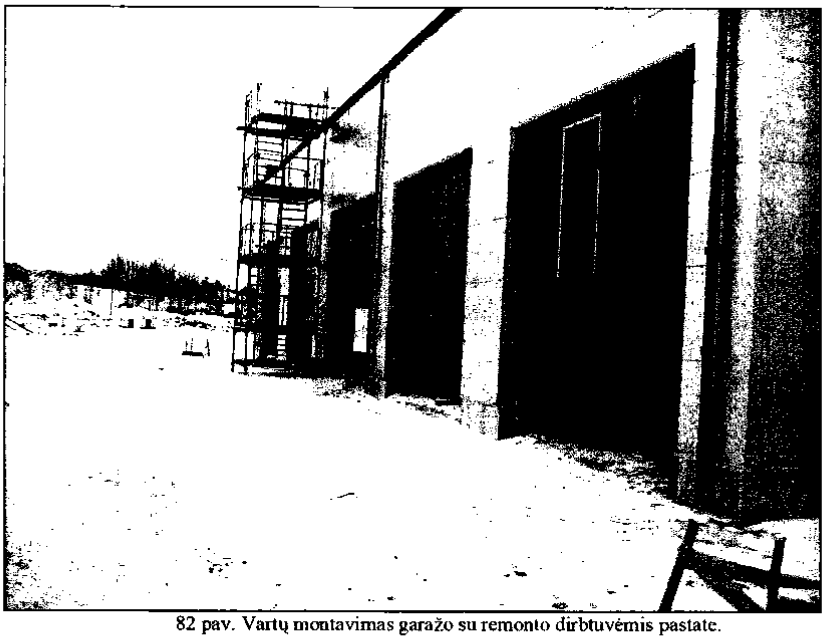

82 pav. Vartų montavimas garažo su remonto dirbtuvėmis pastate.

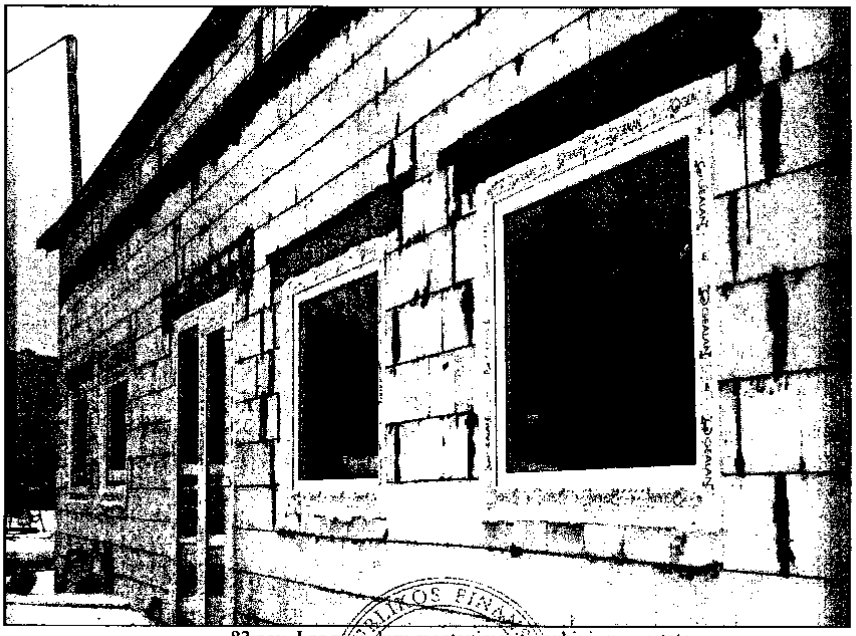

83 pav. Langų ir durų montavimas tarnybiniame pastate.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@prato.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

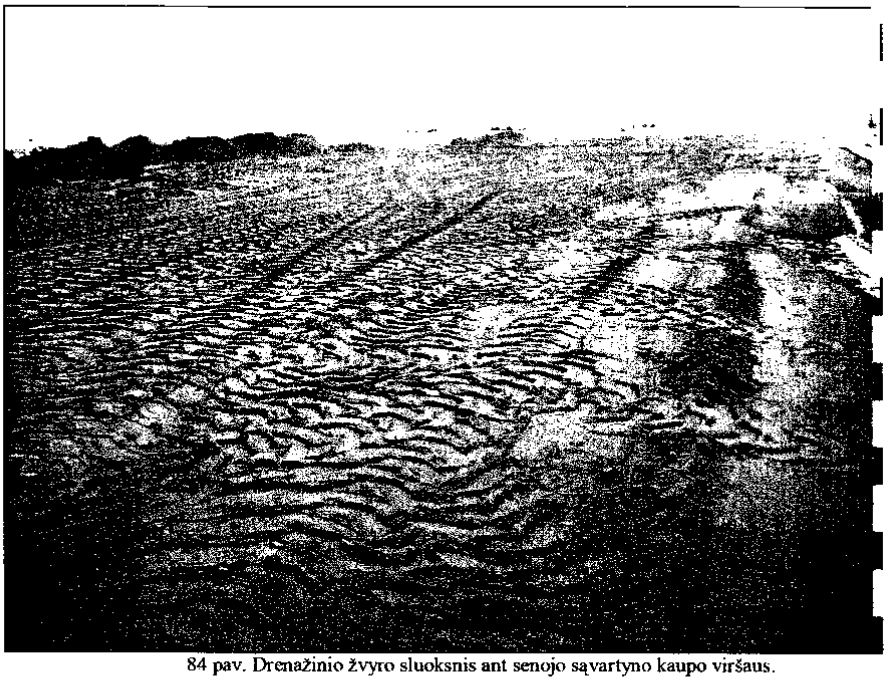

84 pav. Drenažinio žvyro sluoksnis ant senojo sąvartyno kaupo viršaus.

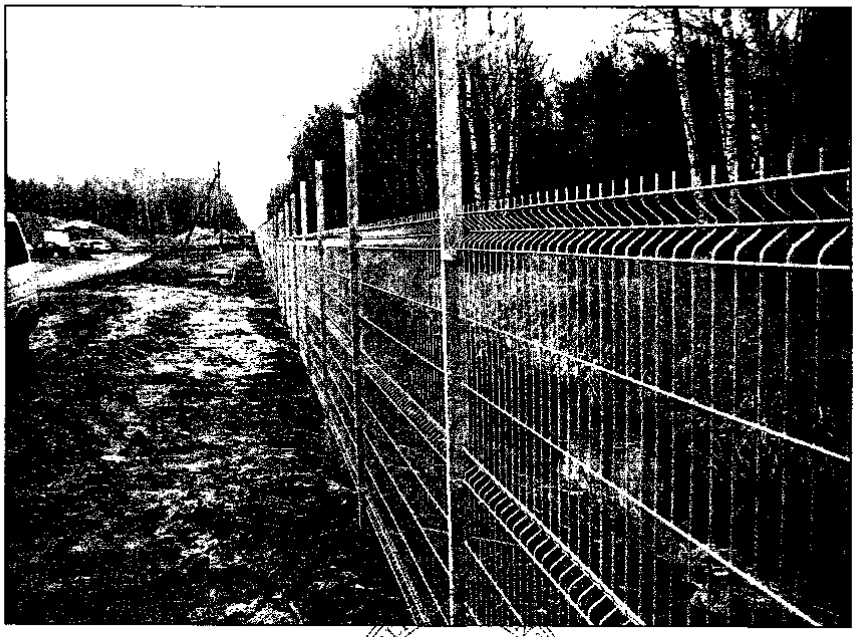

85 pav. Monitoriaus tvora.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. paštas info@[illegible]

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

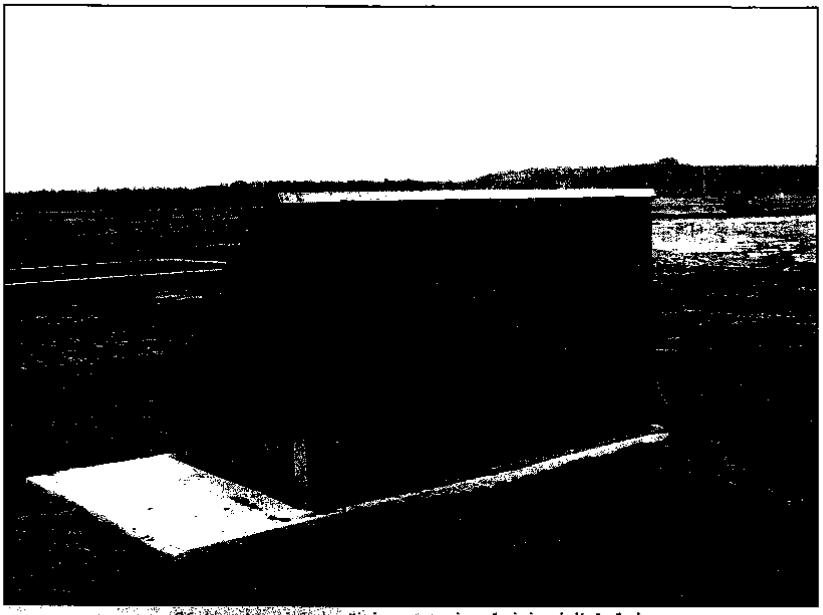

86 pav. Ariečinio gręžinio montavimo baigiamieji darbai.

87 pav. Geosintetinio molio pakloto klojimas.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEISINIO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

74

UAB „PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"

88 pav. Asfalto dangos klojimas kompostavimo aikštelėje.

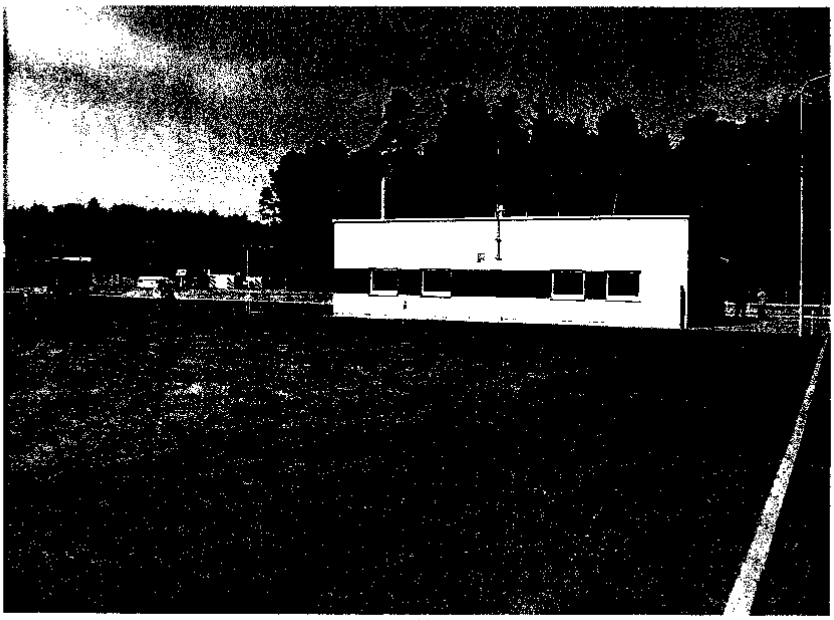

89 pav. Tarnybinis pastatas.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEISINIO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432198, el. paštas info@uatc.lt

75

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

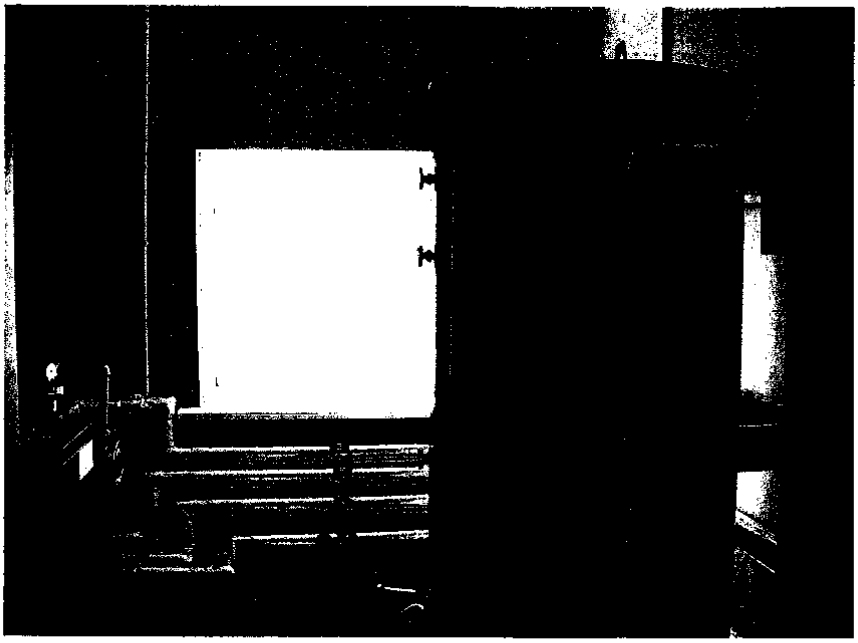

90 pav. Tarnybinio pastato katilinė.

91 pav. Tarnybinis pastatas.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VESTIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė
2011-06-29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 4[illegible]99, el. pastas info@prate.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

92 pav. I – oji kaupo sekcija.

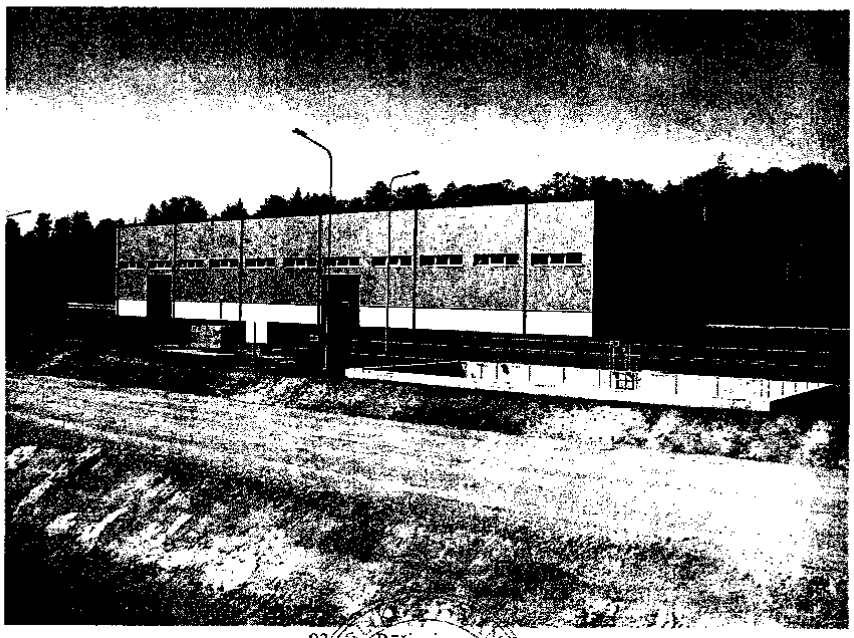

93 pav. Rūšiavimo pastatas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432198, el. paštas info@prato.lt

77

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

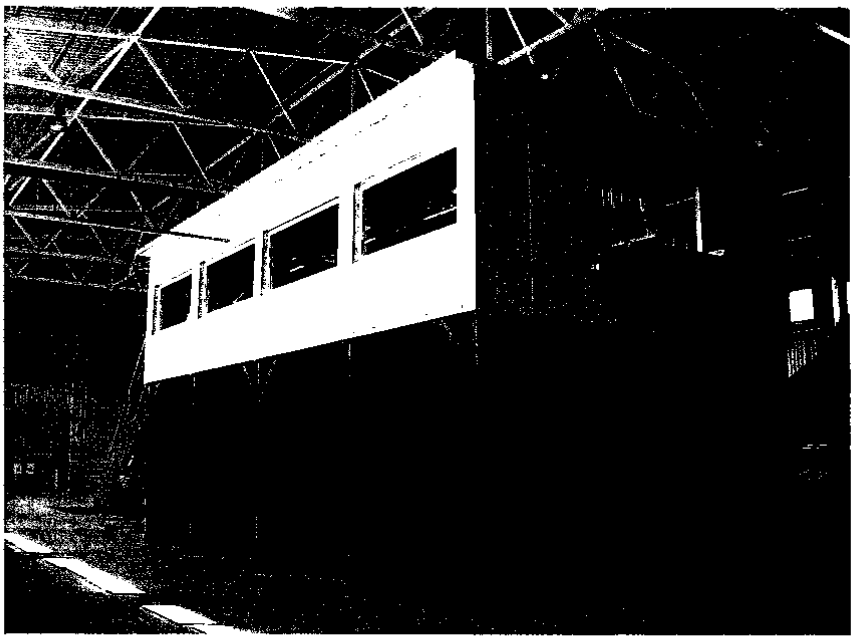

94 pav. Rūšiavimo įranga.

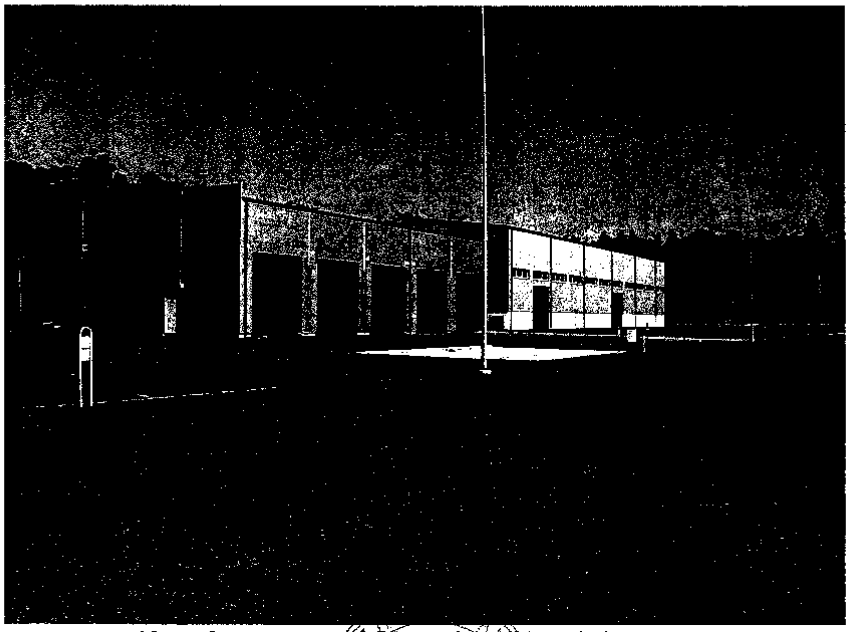

95 pav. Garažas su remonto dirbtuvėmis ir atliekų rūšiavimo pastatas.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

96 pav. Priešgaisrinis rezervuaras.

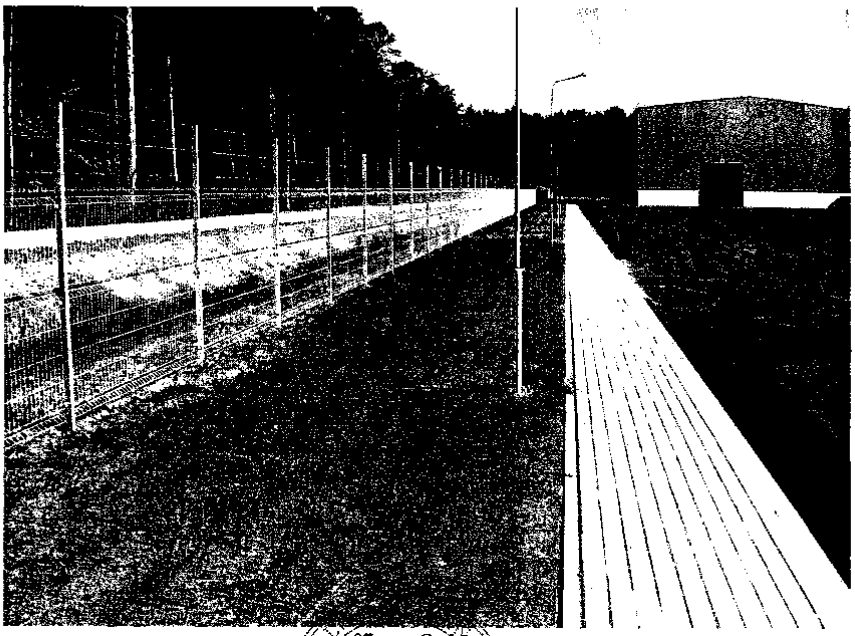

97 pav. Gerbūvis.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 439199, el. paštas info@prate.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

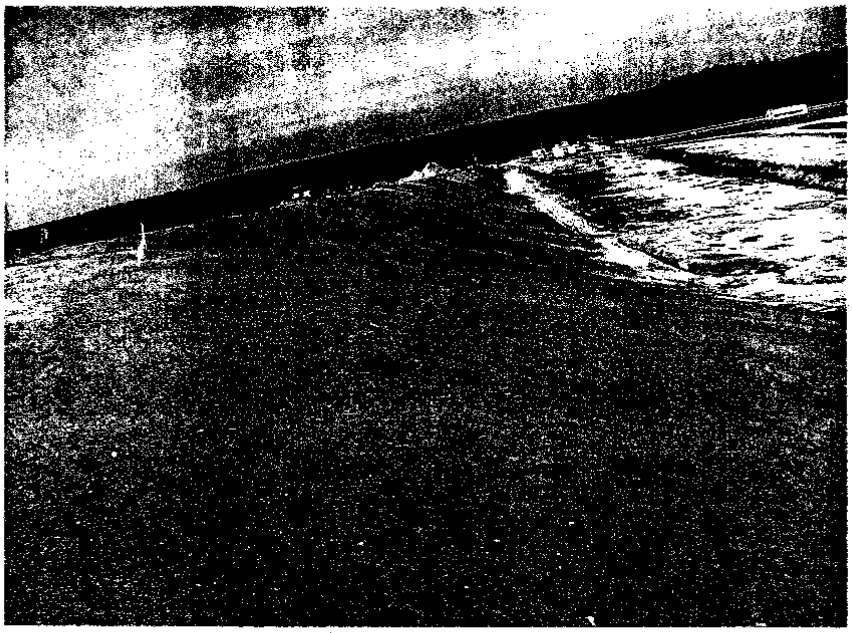

98 pav. Pietinio šlaito apželdinimo darbai.

99 pav. Kaupo viršutinės dalies geosintetiniu moliu užklojimo darbai.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011-06-29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@prate.lt

UAB „PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"



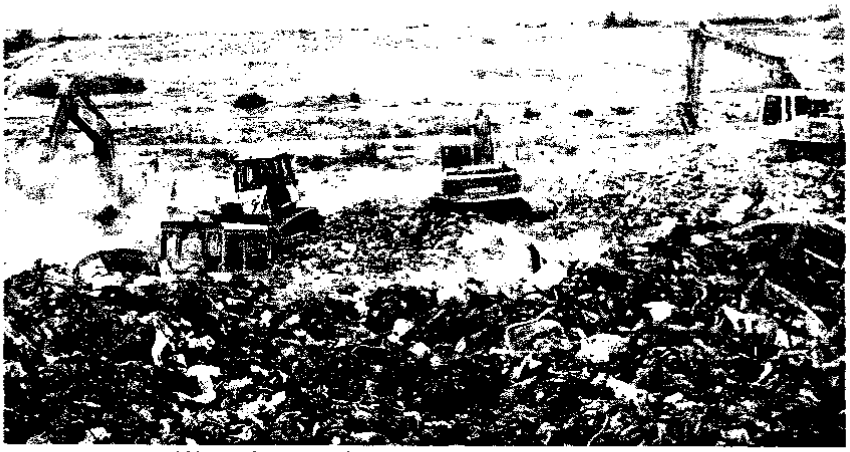

100 pav. Sąvartyno šiaurės – rytų pusės kaupo profiliavimas.

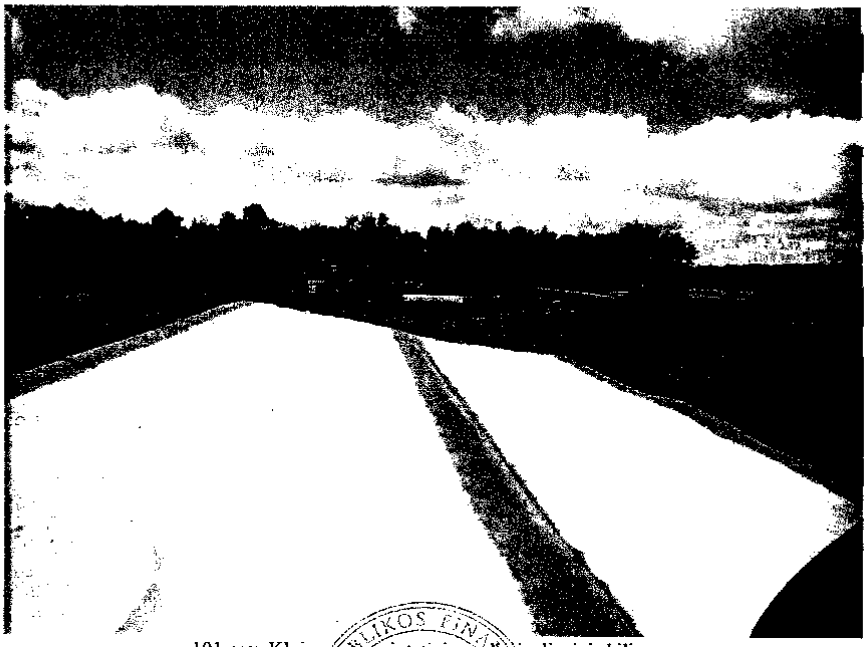

101 pav. Klojamas geosintetinio molio izoliacinis kilimas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 432 [illegible] el. paštas [illegible]

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

102 pav. Paviršinio vandens surinkimo griovių sutvirtinimas akmens skalda.

103 pav. Sąvartyno kaupo apželdinimo darbai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS. KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel. faks. (8 -45) 432199, el. pa[illegible]

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 9. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Krautuvas

Sutarties Nr.	**2009/27/A/PT/LT**
Sutarties pavadinimas	**Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Krautuvas.**
Sutarties pobūdis	**Įrangos tiekimas**
Sutarties aprašymas	Sutarties objektas yra įrangos tiekimas.
Prekių tiekėjas	**UAB „Elklita“**
Prekių tiekimo pradžios data	2009-11-24
Prekių tiekimo pabaigos data	2010-03-24
Prekių aprašymas	Pagal sutartį Nr. 2009/27/A/PT/LT į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną rūšiavimo linijai eksploatuoti pristatytas krautuvas „Mitsubishi FD20CN“ su griebtuvu. (Žr. 15 priedą. Įrangos pirkimo priėmimo- perdavimo aktai).

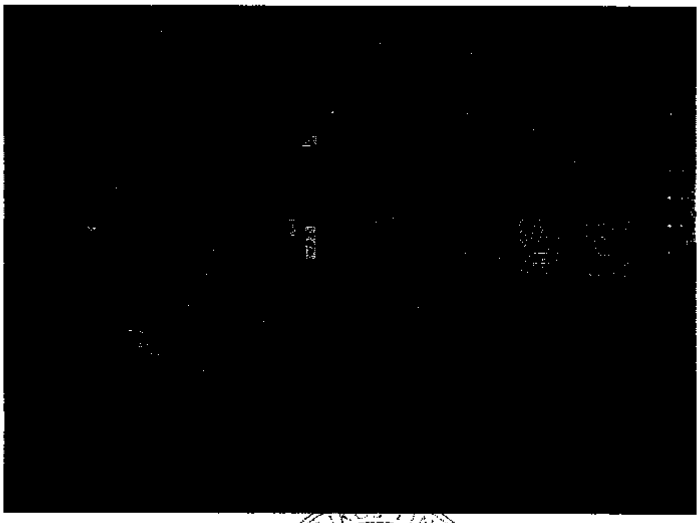

104 pav. Krautuvas „Mitsubishi FD20CN“ su griebtuvu.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004. Beržų g. 44. Panevėžys. tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@prate.lt

83

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 10. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Ratinis frontalinis krautuvas

[redacted]	**2009/28/A/PT/LT**
	Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Ratinis frontalinis krautuvas.
	Įrangos tiekimas
	Sutarties objektas yra įrangos tiekimas.
	UAB „Keluva“
	2009-11-24
	2010-03-24
	Pagal sutartį Nr. 2009/28/A/PT/LT į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną I-ajai sekcijai ir kompostavimo aikštelei eksploatuoti pristatytas ratinis frontalinis krautuvas ZL50G (XCMG). (Žr. 15 priedą. Įrangos pirkimo priėmimo- perdavimo aktai).
	[redacted]
	103 pav. Ratinis frontalinis krautuvas ZL50G (XCMG)

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR PERSIŲSTŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čaplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 11. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas

[redacted]	**2009/29/A/PT/LT**
	Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas.
	Įrangos tiekimas
	Sutarties objektas yra įrangos tiekimas.
	UAB „Oksata"
	2009-11-24
	2010-05-24
	Pagal sutartį Nr. 2009/29/A/PT/LT į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną kompostavimo aikštelei eksploatuoti pristatytas kompostuojamų atliekų smulkintuvas CARAVAGGI Bio 900. (Žr. 15 priedą. Įrangos pirkimo priėmimo- perdavimo aktai).
	[redacted]
	106 pav. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas CARAVAGGI Bio 900.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDINIŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 12. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Atliekų tankintuvas (kompaktorius)

[redacted]

2009/26/A/PT/LT
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Atliekų tankintuvas (kompaktorius).
Įrangos tiekimas
Sutarties objektas yra įrangos tiekimas.
Pagal jungtinės veiklos sutartį UAB „Koger Eco" ir AS KOGER & PARTNERID" filialas
2009-11-24
2010-03-24
Pagal sutartį Nr. 2009/26/A/PT/LT į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų savartyną I sekcijai eksploatuoti pristatytas atliekų tankintuvas (kompaktorius) TANA Gx320. (Žr. 15 priedą. Įrangos pirkimo priėmimo- perdavimo aktai).
[redacted]
107 pav. Atliekų tankintuvas (kompaktorius) TANA Gx320.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTYBIŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas [illegible]

2011 -06- 29 86

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 13. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Buldozeris

2009/31/A/PT/LT
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Buldozeris.
Įrangos tiekimas
Sutarties objektas yra įrangos tiekimas.
UAB „Intrac Lietuva“
2009-11-24
2010-03-24
Pagal sutartį Nr. 2009/31/A/PT/LT į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną I sekcijai eksploatuoti pristatytas buldozeris CASE 1850 K LGP. (Žr. 15 priedą. Įrangos pirkimo priėmimo- perdavimo aktai).

100 pav. Buldozeris CASE 1850 K LGP.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 14. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Sijotuvas- būgninis rėtis

Sutarties Nr.	**2009/30/A/PT/LT**
Sutarties pavadinimas	**Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Sijotuvas- būgninis rėtis.**
Sutarties pobūdis	**Įrangos tiekimas**
Sutarties aprašymas	Sutarties objektas yra įrangos tiekimas.
Prekių tiekėjas	**UAB „Atomeksim“**
Prekių tiekimo pradžios data	2009-11-24
Prekių tiekimo pabaigos data	2010-03-24
Prekių aprašymas	Pagal sutartį Nr. 2009/30/A/PT/LT į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną kompostavimo aikštelei eksploatuoti pristatytas sijotuvas- būgninis rėtis Pezzolato L 3000M. (Žr. 15 priedą. Įrangos pirkimo priėmimo- perdavimo aktai).

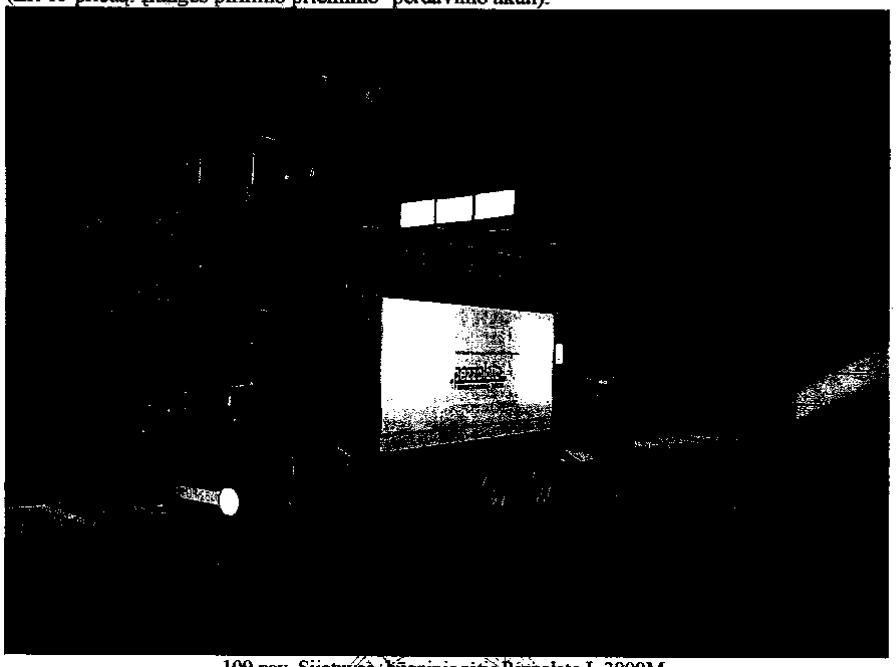

109 pav. Sijotuvas- būgninis rėtis Pezzolato L 3000M.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el.paštas info@pratc.lt

88

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 15. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Automobilis su priekaba 30 m^3 konteinerių pervežimui

Sutarties Nr.	**2009/32/A/PT/LT**
Sutarties pavadinimas	**Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Automobilis su priekaba 30 m^3 konteinerių pervežimui.**
Sutarties pobūdis	**Įrangos tiekimas**
Sutarties aprašymas	Sutarties objektas yra įrangos tiekimas.
Prekių tiekėjas	**UAB „KMT“**
Prekių tiekimo pradžios data	2009-11-24
Prekių tiekimo pabaigos data	2010-03-24
Prekių aprašymas	Pagal sutartį Nr. 2009/32/A/PT/LT į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną perkrovimo stotims eksploatuoti pristatytas automobilis Volvo FM 6*2 D13C460 Euro V su priekaba HUEFFERMANN HKA 1870 30 m^3 konteinerių pervežimui. (Žr. 15 priedą. Įrangos pirkimo priėmimo- perdavimo aktai).

110 pav. Automobilis Volvo FM 6*2 D13C460 Euro V su priekaba HUEFFERMANN HKA 1870 30 m^3 konteinerių pervežimui.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. pastas info@prate.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

89

2.7. Projekto atitikimas Europos Komisijos sprendimui

Europos Komisijos sprendime numatyti tikslai yra pasiekti, o specialiosios sąlygos ir pagrindiniai priežiūros rodikliai yra įgyvendinti laiku ir tinkamai.

2.7.1. Europos Komisijos sprendimo sąlygos

Europos Komisijos sprendimas Nr. K(2005)5289 ir sprendimas Nr. K(2009)8360 iš dalies keičiantis sprendimą Nr. K(2005)5289, pagal kurį buvo įgyvendinamas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo" projektas, 12 punktas nusako sąlygas. Pagal minėtą straipsnį Europos Bendrijų parama šiam projektui yra teiktina esant tam tikroms sąlygoms.

1. Sąlyga prielaidoms ir turto panaudojimui (EK sprendimo 12.1 papunktis):

Ši sąlyga taikoma 5 metų periodui po darbų užbaigimo, t.y. Europos Komisija turi teisę peržiūrėti Sanglaudos fondo nustatytą paramos dydį, jei per šį laikotarpį projekto veiklos sąlygos (tarifai, pajamos ir kt.) gerokai skirsis nuo pradinių sąlygų, naudotų nustatyti paramos dydį ir/ar bus padaryti reikšmingi pakeitimai:

a) kurie turės įtakos veiklos sąlygų prigimčiai ar darbo sąlygoms, ar suteiks privačiai ar viešai bendrovei pernelyg didelį privalumą; ir
b) kurie bus įtakoti pasikeitus bet kurios finansuotos infrastruktūros dalies nuosavybės formai arba nutraukus ar iš esmes pakeitus darbo sąlygas.

Po projekto užbaigimo visame Panevėžio regione yra taikoma vieninga tarifų nustatymo metodika, kuri realiai atitinka įmonės sąnaudas, reikalingas naujo sąvartyno, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelių bei kompostavimo aikštelių eksploatacijai ir priežiūrai.

Lentelėje Nr. 16 pateikiamas nustatytas atliekų priėmimo į sąvartyną mokesčio dydis ir į sąvartyną priimamų atliekų rūšių.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEISINĖS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėlienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 16. Atliekų priimamų į sąvartyną rūšys bei mokesčio dydis

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų priėmimo vieta	Kaina Lt/t be PVM
	Pavadinimas	Sąrašo kodas	Statistinis kodas		
1	Dulkių ir miltelių pavidalo atliekos	01 03 08	12.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
2	Plastikų atliekos	02 01 04	07.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
3	Agrochemijos atliekos	02 01 09	02.11	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
4	Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	02 02 03	09.11	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
5	Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	02 03 04	09.12	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
6	Žaliavos plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	02 07 01	11.12	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
7	Kizelguras	02 07 99	10.22	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
8	Makulatūros perdirbimo atliekos	03 03 05	07.23	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
9	Perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	03 03 08	07.23	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
10	Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	04 02 21	07.62	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
11	Perdirbto tekstilės pluošto atliekos	04 02 22	07.62	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
12	Bitumas	05 01 17	03.11	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
13	Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės	10 01 01	12.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
14	Lakieji anglių pelenai	10 01 02	12.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
15	Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	10 01 03	12.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
16	Stiklo atliekos	10 11 12	07.12	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
17	Mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	10 12 01	12.31	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
18	Mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	10 13 01	12.31	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
19	Kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos	10 13 04	12.51	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
20	Sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos	10 13 11	12.51	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
21	Plastiko drožlių ir nuopjovų atliekos	12 01 05	07.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
22	Suvirinimo atliekos	12 01 13	06.32	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
23	Naudot. šlifavimo dalys, šlifavimo medžiagos	12 01 21	12.51	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
24	Pašluostės (skudurai)	15 02 03	07.62	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
25	Plastikai	16 01 19	07.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
26	Netinkamų naudoti gaminių neorganinės atliekos	16 03 04	12.31	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
27	Nebereikalingos cheminės medžiagos	16 05 09	02.31	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
28	Betonas (< 150 mm frakcijos)	17 01 01	12.11	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	13,00
29	Plytos (< 150 mm frakcijos)	17 01 02	12.11	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	13,00

TIKRA
...ins vedėjo
2011 -06- 2 9
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

30	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai	17 01 07	12.11	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	13,00
31	Medis (dažytas, lakuotas)	17 02 01	07.53	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
32	Plastikas	17 02 03	07.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
33	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	17 03 02	02.14	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
34	Gruntas ir akmenys (moliniai ir smėliniai gruntai)	17 05 04	12.31	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	13,00
35	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	17 06 01*	12.21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
36	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	17 06 05*	12.21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
37	Izoliacinės medžiagos	17 06 04	12.13	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
38	Gipso izoliacinės statybos atliekos	17 08 02	12.11	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
39	Mišrios statybos ir griovimo atliekos	17 09 04	12.13	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
40	Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	18 01 04	05.21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
41	Nekompostuotos komunalinių ar panašių atliekų frakcijos	19 05 01	09.21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
42	Nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos	19 05 02	09.21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
43	Netinkamas naudoti kompostas	19 05 03	09.21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
44	Rūšiavimo atliekos	19 08 01	10.32	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
45	Smėliagaudžių atliekos	19 08 02	12.31	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
46	Pirminio geriamo ir pramoninio vandens filtravimo ir košimo atliekos	19 09 01	11.21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
47	Naudotos aktyvintos anglys	19 09 04	03.14	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
48	Plastikai ir guma	19 12 04	07.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
49	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos	19 12 12	10.32	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
50	Popierius ir kartonas	20 01 01	07.23	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
51	Stiklas	20 01 02	07.12	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
52	Drabužiai	20 01 10	07.61	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
53	Tekstilės gaminiai	20 01 11	07.62	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
54	Mediena	20 01 38	07.53	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
55	Plastikai	20 01 39	07.42	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
56	Kaminų valymo atliekos	20 01 41	12.52	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38

TIKRA
Skyriaus vedėjas
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 2 9

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

57	Biologiškai suyrančios atliekos	20 02 01	09.21	Biržų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Biržų km. Širvenos sen. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Didžiagrašių km., Noriūnų sen. Panevėžio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Dvarininkų km., Miežiškių sen. Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Levaniškio km. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Ruzgų km. Juodupės sen.	0,00
58	Gruntas ir akmenys	20 02 02	12.31	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	13,00
59	Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos	20 02 03	12.31	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
60	Mišrios komunalinės atliekos	20 03 01	10.11	Biržų rajono savivaldybė** Biržų atliekų perkrovimo stotis, Biržų km., Širvenos sen.	48,94
				Kupiškio rajono savivaldybė** Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	35,34
				Panevėžio miesto savivaldybė** Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	48,94
				Panevėžio rajono savivaldybė** Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	48,94
				Pasvalio rajono savivaldybė** Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	38,74
				Rokiškio rajono savivaldybė** Rokiškio atliekų perkrovimo stotis, Donelaičio 16, Rokiškis	48,94
				Įmonėms, organizacijoms ir gyventojams Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	48,94
61	Turgavietės atliekos	20 03 02	10.12	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
62	Gatvių valymo liekanos	20 03 03	10.12	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38
63	Didžiosios atliekos	20 03 07	10.11	Juridiniams asmenims Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	47,38

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

93

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				Fiziniams asmenims Biržų didžiųjų atliekų priėmimo aikštelė, Biržų km., Širvenos sen. Kupiškio didžiųjų atliekų priėmimo aikštelė, Technikos 6I, Kupiškis Panevėžio didžiųjų atliekų priėmimo aikštelė, Savitiškio g. 12, Panevėžys Pasvalio didžiųjų atliekų priėmimo aikštelė, Mūšos g. 12B, Pasvalys Rokiškio didžiųjų atliekų priėmimo aikštelė, Donelaičio g. 16, Rokiškis	0,00

* pavojingos atliekos
** atliekų surinkėjui/vežėjui, turinčiam pasirašytą komunalinių atliekų surinkimo sutartį su savivaldybe

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

94

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

2. Sąlygos, susiję su išankstiniu mokėjimu (EK sprendimo 12.2 papunktis) :

Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos kartu su išankstinio mokėjimo paraiška turėjo pateikti šią informaciją: patvirtinimą, kad projekto Galimybių studija turi būti laikoma Panevėžio regiono Atliekų tvarkymo planu, atitinkančiu Rėminės atliekų direktyvos, Pavojingų atliekų direktyvos, Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos reikalavimus, o taip pat įsipareigojimą, kad atitinkamos Panevėžio apskrities institucijos šią studiją patvirtins kaip Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planą ir apie tai informuos Europos Komisija per vienerius metus nuo šio sprendimo priėmimo datos.

2005 m. liepos 1 d. įsteigtas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, kuris atsakingas už regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, jos funkcionavimo organizavimą, plėtojimą ir administravimą Panevėžio regione. Projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas perduotas UAB PRATC nuosavybėn, kuris yra atsakingas už eksploataciją ir priežiūrą, kaip ir buvo numatyta projekto pradžioje.

2005 m. liepą patvirtinta projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Galimybių studija, kuri vykdant projektą buvo laikoma kaip Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo planas.

2007 m. lapkričio 6 d. Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. R 2-6 patvirtintas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2007-2010 m., kuris įvykus esminiams pokyčiams buvo koreguojamas ir 2010 m. birželio 11 d. Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. R 2-42 patvirtintas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2010-2014 m.

2008-01-04 raštu Nr. S-2 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras informavo LR Aplinkos ministeriją, kad Panevėžio apskrities (regiono) atliekų tvarkymo planas patvirtintas Panevėžio regiono plėtros tarybos 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. R 2-6.

3. Galutinės ataskaitos teikimo sąlygos (EK sprendimo 12.3 papunktis):

Užbaigus projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" darbus, Užsakovas – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras sąvartyno bei aikštelių eksploatacijai paskyrė reikalingą personalą, kuris yra tinkamai apmokytas ir turi atitinkamą išsilavinimą dirbti šioje srityje.

3.1. Sąlyga susijusi su direktyvų taikymu (EK sprendimo 12.3. a) papunktis):

Įgyvendinus projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" atliekos tvarkomos remiantis geriausiomis techninėmis žiniomis.

Atliekos tvarkomos vadovaujantis:

– Sąvartynų direktyvos Nr. 99/31/EB reikalavimais, kadangi uždraudus atliekas šalinti 95 Panevėžio apskrityje esančiuose sąvartynuose/užterštose teritorijose įrengtas Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas atitinka visus aplinkosauginius reikalavimus keliamus ES bei Lietuvos Respublikoje taip pat užkirstas kelias netinkamam atliekų šalinimui sąvartynuose, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, ypač paviršinių ir požeminių vandenų, dirvožemio, oro ir žmonių sveikatai.

– Bendrosios atliekų direktyvos Nr. 75/442/EEB, kurią papildė Tarybos direktyva Nr. 91/156/EEB reikalavimais, kadangi eksploatuojamas Panevėžio regioninis atliekų sąvartynas turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. P1-3/057, kuris griežtai apibrėžia atliekų priėmimo į sąvartyną kriterijus, aplinkos apsaugą, požeminę taršą, avarijų prevenciją ir t.t.

– Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos Nr. 94/62/EB ir Pavojingų atliekų direktyvos Nr. 91/689/EEB, kurią papildė direktyva Nr. 94/31/EB, reikalavimus, kadangi eksploatuojamose 5

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

KOPIJA
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

atliekų priėmimo aikštelėse iš gyventojų nemokamai priimamos saugojimui įvairios pakuotės bei buityje susidarančios pavojingos atliekos, vykdoma griežta kontrolė, siekiant užkirsti pakuočių ir pavojingų atliekų patekimui į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.

3.2. Sąlyga susijusi su viešųjų pirkimų vykdymu (EK sprendimo 12.3. b) papunktis):

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimo metu vykdyti pirkimai buvo atliekami laikantis Tarybos direktyvos Nr. 92/50/EEB , Tarybos direktyvos Nr. 93/36/EEB, Tarybos direktyvos Nr. 93/37/EEB dėl direktyvos Nr. 93/38/EEB, direktyvos Nr. 2004/18/EB ir direktyvos Nr. 2004/17/EK reikalavimų bei LR Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais LR teisės aktais bei konkurso sąlygomis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.

Viešųjų pirkimų dokumentuose sutarčių sąlygos darbams buvo parengtos pagal FIDIC tipinių sutarčių sąlygas, o sutarčių sąlygos paslaugoms – pagal Bendrąsias ES finansuojamų paslaugų sutarčių sąlygas.

2.7.2 Projekto tikslai ir pagrindiniai priežiūros rodikliai

Projekto tikslas – sukurti aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu darnią Panevėžio regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus ir įgyvendinanti „teršėjas moka" principą, kurio tikslas padengti visas atliekų tvarkymo sistemos patiriamas sąnaudas. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos finansavimo pagrindu vykdomas „teršėjas moka" ir „visų sąnaudų padengimo" principų įgyvendinimas. Šie principai užtikrinami, įtraukiant į įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą visas jų tvarkymo sąnaudas, įskaitant atskirą antrinių žaliavų iš didžiųjų atliekų surinkimą ir jų paruošimą perdirbti, pavojingų atliekų, esančių komunalinėse atliekose, surinkimą, biologiškai skaidžių atliekų atskirą surinkimą ir jų kompostavimą ar kitą naudojimą, sąvartyno ir regioninės infrastruktūros eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo, administracines sistemos eksploatavimo sąnaudas.

Padėti įgyvendinti šių direktyvų reikalavimus:

- Direktyvos Nr. 75/442/EEB dėl atliekų, su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva Nr. 91/156/EEB,
- Direktyvos Nr. 99/31/EB dėl atliekų sąvartynų;
- Direktyvos Nr. 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų, su pakeitimais, padarytais direktyva Nr. 94/31/EB;
- 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (OL L 30 , 6.2.1993, p. 1);
- Direktyvos Nr. 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, su pakeitimais, padarytais direktyva Nr. 2004/12/EB;
- Direktyvos Nr. 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;
- Direktyvos Nr. 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų;
- Direktyvos Nr. 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą;
- Direktyvos Nr. 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.

Projekto fizinis aprašymas:

- naujojo regioninio sąvartyno (I sekcijos) įrengimas Dvarininkų kaime. Jo plotas bus apie 5,7-6,3 ha ir juo naudosis visa apskritis; sąvartynas pradės veikti 2009 m.;
- ES reikalavimus neatitinkančio Panevėžio miesto sąvartyno uždarymas ir Asutvarkymas iki 2009 m. pabaigos;

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS SKYRIUS
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

– 5 stambiagabaričių, statybos, biodegraduojančių ir pavojingų buitinių atliekų surinkimui skirtų atliekų priėmimo aikštelių (APA) įrengimas kiekvienoje savivaldybėje;
– 2 perkrovimo stočių įrengimas šalia Rokiškio ir Biržų, siekiant sumažinti atliekų pervežimo išlaidas ir atliekų vežimo priemonių daromą žalą aplinkai;
– 1 atliekų rūšiavimo linijos įrengimas regioniniame sąvartyne;
– 5 kompostavimo aikštelių įrengimas;
– Sąvartyno ir atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo įrangos įsigijimas.

Europos komisijos sprendime iškelti fiziniai tikslai:

– Įrengti pilnai reikalavimus atitinkantį sąvartyną Dvarininkų kaime (1 sekciją) su filtrato surinkimo bei nukreipimo sistema ir atliekų rūšiavimo linija;
– Viešąsias atliekų surinkimo paslaugas papildomai teikti 60 000 žmonių ir taip iki 2010 m. pagerinti vidutinį atliekų surinkimo procentą regione nuo vidutiniškai 72 % iki 98 % miesto vietovėse ir iki 85 % kaimo vietovėse;
– Nustatyti tarifus, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir regione įtvirtina principą „teršėjas moka";
– Sukūrus naująją atliekų tvarkymo sistemą ir įrengus atliekų rūšiavimo liniją, padidinti bendrą perdirbamų atliekų surinkimo procentą (nuo 0 % 2005 m.) iki 23.6 % 2010 m.
– Įrengus 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, sumažinti į sąvartyną patenkančių biologiškai skaidžių atliekų kiekį;
– Įrengus 5 APA, užtikrinti, kad į sąvartyną nepatektų biologiškai skaidžios, statybos bei griovimo atliekos ir pavojingos atliekos;
– Uždarius ir sutvarkius reikalavimų neatitinkančio pagrindinio sąvartyno teritoriją, sumažinti požeminio ir paviršinio vandens taršą;
– Užtikrinti, kad Regioninio atliekų tvarkymo centro pajamų pakaktų eksploatavimo, techninės priežiūros ir nusidėvėjimo išlaidoms padengti.

Įgyvendinti šie fiziniai tikslai:

– Įrengtas naujas regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Dvarininkų kaime (Panevėžio raj.) atitinkantis visus Lietuvos ir Europos Sąjungoje galiojančius aplinkosauginius reikalavimus.
– Įrengtos penkios (5) kompostavimo aikštelės: Panevėžio rajone Dvarininkų k. Panevėžio regioninio sąvartyno teritorijoje, Pasvalio rajone Levaniškio k., Biržų rajone Biržų k., Kupiškio r. Didžiagrašių k. ir Rokiškio rajone Ruzgų k.. Į šias aikštelės gyventojai ir juridiniai asmenys pristato Panevėžio regione susidarančias žaliąsias atliekas. Per pirmuosius eksploatacijos metus surinkta 3.999,71 t biologiškai skaidžių atliekų.
– Projekto įgyvendinimo metu, įrengus 5 stambiagabaričių atliekų priėmimo aikšteles iš Panevėžio regiono gyventojų per pirmus aikštelių eksploatavimo metus (2009-2010 m.) buvo surinka 1481,16 t atliekų (pavojingų atliekų, antrinių žaliavų, stambiagabaričių atliekų). Galima užtikrintai teigti, kad ekologinė Panevėžio regiono gyventojų savimonė didėja, o atliekų iš bendro komunalinių atliekų srauto atskiriama vis daugiau. Per pirmuosius eksploatacijos metus surinkta 2,42 t pavojingų atliekų, 328,08 t statybinių medžiagų, turinčių asbesto, 34,72 t elektros ir elektronikos įrangos ir 1011,82 t didelių gabaritų atliekų.
– Pagal savivaldybių pateiktus duomenis, 2004 m. Panevėžio regione buvo 92 693 t. apskaitytų mišrių komunalinių atliekų. Susidariusių atliekų kiekis per 2010 m.- 89 559 t, iš jų perdirbta 12 609 t. arba 14 proc. komunalinių atliekų. Į perdirbamų atliekų kiekį Panevėžio regioniniame sąvartyne išrūšiuotų atliekų kiekis dar neįeina, nes atliekų rūšiavimo linija pradėjo darbą tik 2010 m. gruodžio mėn. Paleidus rūšiavimo liniją

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@prtc.lt

Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

projektiniu pajėgumu, per metus bus galima išrūšiuoti 7000 t atliekų ir pasiekti 21,9 % perdirbamų atliekų. Didelių gabaritų atliekų aikštelėse surenkamų atliekų kiekis per 2010 m. išaugo 45 %, lyginant su 2009 m. Gyventojų tarpe šios paslaugos žinomumas sparčiai auga, 2012 m. bus įvestos į eksploataciją dar 3 atliekų aikštelės. Skaičiuojant, kad gyventojų naudojimasis augs 2011 m. ir 2012 m. po 45 %, tai 2012 m. bus pasiektas 23,6 %.

- Uždarytas Panevėžio miesto senasis sąvartynas Dvarininkų kaime. Sumažinta paviršinio vandens tarša ir stabilizuota požeminio vandens tarša. Požeminio vandens taršos mažėjimas tikėtina bus stebimas penkerių metų laikotarpyje. Tai parodys požeminio vandens monitoringo išvados.
- Įsigyta reikalinga sąvartyno ir atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo įranga.
- Visų pristatytų į sąvartyną atliekų svėrimas bei tarifų už atliekų tvarkymą taikymas leidžia regione įgyvendinti solidarumo ir „teršėjas moka“ principus.
- Kadangi komunalinių atliekų tvarkymo paslauga yra viešoji paslauga, projekto įgyvendinimas leido pasiekti, kad, kaip nustatyta valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, savivaldybėse buvo sukurta visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkanti komunalinių atliekų tvarkymo sistema.
- Prieš pradedant įgyvendinti Panevėžio atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą, savivaldybių pateiktais 2005 m. duomenimis, Panevėžio apskrityje gyveno 251 866 gyventojai, iš kurių 139 030 gyventojų (55 proc.) buvo teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Savivaldybių pateiktais duomenimis, 2005 m. miesto vietovėse komunalinių atliekų tvarkymo paslauga naudojosi vidutiniškai 71 proc. gyventojų, kaimo vietovėse – 18 proc. 2010 m. pabaigus įgyvendinti projektą, Panevėžio regione registruoti 260 718 gyventojų, iš kurių 228 341 (88 proc.) gyventojas naudojosi komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. 2005 - 2010 m. laikotarpiu viešąja atliekų tvarkymo paslauga papildomai pradėjo naudotis 89 311 gyventojų, to pasekoje 2010 m. sukūrus komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, miesto vietovėse, kuriose gyvena daugiau kaip 1000 gyventojų, paslauga naudojosi 96 proc. gyventojų, miesto vietovėse, kuriose gyvena mažiau nei 1000 gyventojų – 69 proc. Atkreipiame dėmesį, kad kaimo vietovė gali būti laikoma gyvenviete, kurioje gali būti daugiau negu 1000 gyventojų, o savivaldybių pateikti duomenys neapibrėžia miesto ir kaimo teritorijų. Savivaldybės, kurios teikia duomenis apie gyventojų, kurie naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, skaičių, remiasi atliekų vežėjų pateikta informacija apie sudarytas atliekų vežimo sutartis. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras teikia didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo paslaugas visiems Panevėžio regiono gyventojams, suteikdama galimybę naudotis penkiomis didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėmis. Galimybė naudotis Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema yra sudaryta 100 % Panevėžio regiono gyventojams, ne tik tiems, kurie sudarę sutartis su atliekų vežėjais. Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio regione bendras komunalinių atliekų surinkimo procentas yra 88 %, o viešosios atliekų surinkimo paslaugos teikiamos papildomai 89 311 gyventojų, darytina prielaida, kad fizinis tikslas “Viešąsias atliekų surinkimo paslaugas papildomai teikti 60 000 žmonių ir taip iki 2010 m. pagerinti vidutinį atliekų surinkimo procentą regione nuo vidutiniškai 72 % iki 98 % miesto vietovėse ir iki 85 % kaimo vietovėse“ yra iš dalies įgyvendintas. Planuojama, kad projekte numatytas 98 % miesto vietovėse ir 85 % kaimo vietovėse surinkimo lygis bus pasiektas Panevėžio regione įvedus vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą. Svarbu pažymėti, kad visi projekte numatyti darbai yra atlikti, ir sudarytos visos prielaidos minėtam rodikliui pasiekti. Faktinis aukščiau nurodyto rodiklio pasiekimas šiuo metu didele dalimi priklauso ir nuo projekto pareiškėjo nepriklausančių priežasčių (gyventojų veiksmai).

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Aldona Čapiėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

- Užtikrinta, kad jungtinė atliekų tvarkymo bendrovė generuos pakankamas pajamas padengti eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudas. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras generuoja pakankamas pajamas padengti visas atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudas.

Pagal Europos Komisijos sprendimą pasiekti fiziniai rodikliai pateikti lentelėje žemiau.

EK sprendimo Nr. K(2005)5289 ir sprendimo Nr. K(2009)8360, iš dalies keičiančio sprendimą Nr. K(2005)5289, I priedo 7.3 dalyje "Pagrindiniai priežiūros rodikliai" nurodytas vienas iš priežiūros rodiklių - 1. Panevėžio miesto sąvartyno uždarymas. Šio priežiūros rodiklio viena iš sudėtinių dalių - dujų surinkimo sistemų įrengimas. Projektuotojai parengė Panevėžio m. sąvartyno uždarymo projektą, kuriame buvo numatyta dujų utilizavimo sistema (dujų deginimas fakele). Kai buvo suskaičiuota sąvartyno uždarymo ir naujojo regioninio sąvartyno statybos sąmata, buvo pradėta ieškoti būdų kaip sumažinti sąmatos dydį, kad užtektų projektui skirtų lėšų. Buvo pradėtas ruošti Europos komisijos sprendimo pakeitimas, kuris numatė senų 94 sąvartynų uždarymą perkelti į 2007-2013 m. finansavimo projektus, o iš Panevėžio m. uždaromo sąvartyno pirkimų dokumentų išimti dujų surinkimo sistemos įrengimą ir ieškoti kito finansavimo būdo kaip įrengti šią sistemą ne iš projekto lėšų. Šio indikatoriaus visiškai išbraukti iš Komisijos sprendimo nebuvo galima dėl to, kad techninis projektas numatė, jog ši sistema bus įrengta. Nes, jei šio indikatoriaus būtų nebelikę Komisijos sprendime, o sąvartynas uždarytas be dujų surinkimo sistemos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sudaryta komisija nebūtų pripažinusi sąvartyno tinkamai uždarytų. Šis indikatorius (dujų surinkimo ir utilizavimo sistema) buvo įvykdytas, tik ne iš projekto lėšų, o pasitelkus privatų investuotoją. Sutartis su investuotoju UAB "Manfula" sudaryta 15 metų laikotarpiui nuo 2009 m. vasario 12 d. iki 2024 m. vasario 12 d. su galimybe pratęsti dar penkeriems metams (nekeičiant esminių sutarties sąlygų). Šios sutarties paslaugų teikėjo (UAB "Manfula") naudos gavėjui dalis (UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui) yra 19,5 proc. nuo Paslaugos teikėjo pajamų, gautų už biodujas Panevėžio miesto ir Panevėžio regioninio buitinių atliekų sąvartynų išskiriamų dujų utilizavimo metu (į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM). Paslaugų teikėjas (UAB "Manfula") įsipareigojo instaliuoti dujų surinkimo sistemą ir avarinio utilizavimo techniką. Be kitų dalykų, paslaugų teikėjas įsipareigojo savo lėšomis padengti visus technikos priežiūros kaštus, savo sąskaita atlikti papildomus, tiesiogiai su dujų surinkimu ir utilizavimu susijusius darbus. Be to, remiantis sutarties 4.1.14 dalimi, pasibaigus sutarties galiojimui, visą dujų surinkimo įrangą UAB "Manfula" perduoda UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui LR įstatymų nustatyta tvarka, t.y. šias sudėtines dujų surinkimo dalis:

- dujų surinkimo gręžinius sąvartyne ir juose esančius dujų surinkimo vamzdžius;
- dujų surinkimo vamzdžius nuo dujų gręžinių iki kolektorių.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB "Manfula" perleido sutarties vykdymą UAB "ASK linija", 2010 m. balandžio 2 d. pasirašytas susitarimas tarp UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centroUAB "Manfula", UAB "ASK linija". Pagal minimą sutartį (įskaitant susijusius susitarimus) pirmosios pajamos buvo gautos už 2011 m. I ketv., nes jėgainė atidaryta tik 2010 m. gruodžio mėn. pabaigoje. 2011 m. I ketvirtį gauta 3 885,49 EUR (13.415,82 Lt (be PVM)) pajamų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR PERSONALO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 17. Pagal Europos Komisijos sprendimą pasiekti fiziniai rodikliai

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos	Fizinis įgyvendinimas				Finansinis įgyvendinimas			Finansinio įgyvendinimo lygis (%)	Fizinio įgyvendinimo lygis (%)
	Fiziniai rodikliai				Finansiniai rodikliai				
	vienetas	kiekis	fizinis įgyvendinimas iki 2010-12-31	fizinio įgyvendinimo eiga (%)	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (eurais)	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (%)	Padarytos išlaidos iki 2010-12-31		
Atliekų priėmimo punktų statyba, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba	**%**	**100**	**100,0**	**100,0**	**4.338.231,54**	**22,26**	**4.338.231,54**	**100,00**	**22,26**
Atliekų priėmimo aikštelių (APA) įrengimas (asfalto dangos, reikiamos infrastruktūros sukūrimas, privažiavimo kelių tiesimas, nuotekų valymo sistema, pavojingų atliekų saugykla, administracinės-buitinės patalpos, konteinerių pirkimas ir kt.)	vnt.	5	5,0	100,0					
Kompostavimo aikštelės (asfalto dangos, infrastruktūros sukūrimas, filtrato surinkimo ir nukreipimo sistema, filtrato sukauptuvai ir kt.)	vnt.	4	4,0	100,0					
Perkrovimo stotys (asfalto dangos, infrastruktūros sukūrimas, konvejerio įrengimas, presas, supresuotoms atliekoms skirtų konteinerių pirkimas ir kt.)	vnt.	2	2,0	100,0					
Projekto komponentų Panevėžyje statyba	**%**	**100**	**100,0**	**100,0**	**13.400.071,76**	**68,76**	**13.400.071,76**	**100,00**	**68,76**
Naujas regioninis sąvartynas	vnt.	1	1,0	100,0					
I sekcijos įrengimas (žemės darbai; geosintetinio molio sluoksnis, nelaidi HDPE plėvelė, apsauginė geotekstilė, drenažinis sluoksnis; filtrato surinkimo sistemos įrengimas, paviršinio vandens nukreipimo sistemos įrengimas, privažiavimo bei vidinių kelių tiesimas ir kt.)	ha	5,7-6,3	6,12	100,0					

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEISINIO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Tarnybinė zona (ratų plovimo duobė, priešgaisriniai rezervuarai, garažas, rūšiavimo pastatas ir kt.)	vnt.	1	1,0	100,0					
Administracinis pastatas	vnt.	1	1,0	100,0					
Filtrato surinkimo sistema	vnt.	1	1,0	100,0					
Paviršinio vandens ir nuotekų surinkimo sistema (dvi lietaus nuotekų siurblinės, naftos gaudyklė, gruntinio vandens drenažo siurblinė)	vnt.	1	1,0	100,0					
Kompensacinės priemonės gyventojams (langų ir durų pakeitimas, apželdinimas siekiant sumažinti triukšmą)	vnt.	1	1,0	100,0					
Panevėžio miesto sąvartyno uždarymas (atliekų kaupo uždengimas: nelaidus, drenažinis ir žemės sluoksniai; filtrato ir dujų surinkimo sistemų įrengimas, teritorijos apželdinimas ir kt.)	vnt.	1	1,0	100,0					
Kompostavimo aikštelės (asfalto dangos, infrastruktūros sukūrimas, filtrato surinkimo ir nukreipimo sistema, filtrato sukauptuvai ir kt.)	vnt.	1	1,0	100,0					
Rūšiavimo linija (konvejerių įrengimas, rūšiavimo kabina, presavimo sistemos, PET perforatorius ir kt.)	vnt.	1	1,0	100,0					
Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas	**%**	**100**	**100,0**	**100,0**	**896.901,55**	**4,60**	**896.901,55**	**100,00**	**4,60**
Rūšiavimo linijos krautuvas	vnt.	1	1,0	100,0					
Ratinis krautuvas	vnt.	1	1,0	100,0					
Žaliųjų atliekų smulkintuvas	vnt.	1	1,0	100,0					
Kompaktorius	vnt.	1	1,0	100,0					
Buldozeris	vnt.	1	1,0	100,0					
Sijotuvas-būgninis rietis	vnt.	1	1,0	100,0					

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEISINIO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Automobilis su priekaba (perkrovimo stotims aptarnauti)	vnt.	1	1,0	100,0					
Techninės pagalbos teikimas UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"	**%**	**100**	**100,0**	**100,0**	**215.215,56**	**1,10**	**215.215,56**	**100,00**	**1,10**
Visuomenės informavimas ir švietimas	**%**	**100**	**100,0**	**100,0**	**65.946,64**	**0,34**	**65.946,64**	**100,00**	**0,34**
Techninė priežiūra	**%**	**100**	**100,0**	**100,0**	**224.482,59**	**1,15**	**224.482,59**	**100,00**	**1,15**
Nepanaudotos lėšos					**346.150,36**	**1,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IŠ VISO					**19.487.000,00**	**100,00**	**19.140.849,64**	**98,22**	**98,22**
								Bendras finansinio įgyvendinimo lygis	**Bendras fizinio įgyvendinimo lygis**

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS
TIKRA
Aldona Čepiojienė
2011-06-29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Europos Komisijos sprendime numatytos darbų apimtys yra įvykdytos. Pagrindiniai darbai, kaip numatyta Europos Komisijos sprendime iki 2010 m. gruodžio 31 d. buvo užbaigti.

2.7. Projekto patikros

Lentelė Nr. 18. Projekto patikros

Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos išvados
2007-01-31	Aplinkos projektų valdymo agentūra	Atliktas sutarties „Dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tarp Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras patikrinimas. Išvada: Esminių trūkumų nebuvo nustatyta: paruoštas visuomenės informavimo veiksmų planas (Sweco BKG), pirkimų- mokėjimų planas, įrengta saugos sistema, vykdomos viešinimo ir projektavimo sutartys. Tačiau buvo pastebėta, kad vėluojama pateikti ataskaitas (paskutinio ketvirčio atskaita), nepildoma atskaita apie neatitikimus (Procedūrų vadovo 4.1.p.), neįdiegta elektroninių dokumentų tvarkymo sistema, dokumentų kokybės kontrolės ir tvarkymo sistema yra įdiegta dalinai. Vėluojama atsakyti į pagal projekto sutartis gautus rastus (privaloma atsakyti per 10 dienų). Rekomendacijos galutiniam paramos gavėjui: Nuolat koreguoti Procedūrų vadovą, atsižvelgiant į pastebėtus trūkumus ar klaidas, bei reaguojant į besikeičiančią padėtį bei vadovautis juo. Nevėluojant teikti visas ataskaitas bei kitus Procedūrų vadove numatytus dokumentus Aplinkos projektų įgyvendinimo agentūrai. Įsitikinti, kad prasidėjus rangos sutartims nekiltų problemų dėl žemės nuosavybės (ar nėra privačių valdų, gretimybės, privažiavimas). *Į rekomendacijas atsižvelgta, dėl žemės ir turto nuosavybės problemos išspręstos.*
2007-09-28	Viešųjų pirkimų tarnyba	Atliktas viešojo pirkimo Nr. 51632 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra“ patikrinimas. Pastabos: 1. Konkurso sąlygų 11.1 punkto nuostata, kad „perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą gautas ne vėliau kaip prieš 12 darbo dienų iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“ neatitinka Įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų terminų. 2. Konkurso sąlygų 3 dalies lentelėje, kurioje nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, 1,2,3 Punktuose reikalavimas kartu su kvalifikaciją įrodančiais dokumentais pateikti ir priesaikos pažymą neatitinka Įstatymo 33

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR PERSIŲSTŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

		straipsnio 5 dalies, kurioje nustatyta, kad priesaikos pažymą tiekėjas pateikia tik tada, kai jis negali pateikti kvalifikaciją įrodančių dokumentų. 3. Konkurso sąlygų 4.2 punkte įtvirtintas reikalavimas tiekėjams kartu su pasiūlymo originalu pateikti dar 3 pasiūlymo kopijas, esant didelei dokumentų apimčiai, nepagrįstai didina konkurso dalyvių išlaidas ir gali įtakoti pasiūlymo kainą. 4. Konkurso sąlygų 13.8 punkto nuostata, kad „perkančioji organizacija neprivalo atlyginti galimų nuostolių tiekėjams, netgi jei ji buvo informuota, kad tokie nuostoliai galimi" neatitinka Įstatymo 123 straipsnio, kuris numato perkančiosios organizacijos atsakomybę, jei ji nevykdo Įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia Įstatymas. 5. Konkurso sąlygų priedo Nr. 3 (viešojo pirkimo sutarties projektas) 6.1 punkto nuostata, kad „sutarties vykdymo laikotarpio esminės sutarties sąlygos negali būti keičiamos" neužtikrina Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto reikalavimo, kad viešojo pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. 6. M&S Umweltprojekt GmbH pasiūlyme klaidingai apskaičiuota bendra jo kaina su PVM- 1.177.733,30 Lt vietoje 1.177.773,34 Lt (kaina be PVM 998.113,00 Lt ir PVM 179.660,34 Lt). Į Įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas šiuo atveju atsižvelgta nebuvo, nors dėl klaidingai apskaičiuotos bendros kainos pasiūlymas atmestinas. Tuo perkančioji organizacija neužtikrino įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų pagrindinių viešųjų pirkimų principų, nes UAB „Tiltų ekspertų centras" pasiūlymas, kuro kaina mažesnė, dėl analogiškos priežasties buvo atmestas. 7. Sudarytos pirkimo sutarties bendra kaina 1.177.773,34 Lt. su PVM neatitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros kainos – 1.177.773,30 Lt su PVM. Tai neatitinka Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatų. 8. Pirkimo procedūrų ataskaitoje ir skelbime apie pirkimo sutarties sudarymą neteisingai surodyta bendra galutinė sutarties vertė – 1.177.773,30 Lt su PVM. *Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - VPT) 2007-09-28 pateikė "Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitą" (Nr. 2S-12), kurioje*

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čaplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

		pateikė išvadas jau įvykusiam pirkimui „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" (pirkimo Nr. 51632), tačiau neįpareigojo nutraukti sutarties. Aplinkos projektų valdymo agentūra atsižvelgė į VPT pastabas, vykdydama tolimesnius pirkimus.
2008-09-18	Aplinkos projektų valdymo agentūra	Atliktas sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo punktų statyba, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" patikrinimas. Išvada: Įgyvendinimas vėluoja. Patikros metu buvo rengiamas grafiko pakeitimas, rangovas dėl aukščiau nurodytų nuo jo nepriklausančių sąlygų turi teisę į pratęsimą. Šiam momentui negalima spręsti apie pratęsimo trukmę, kol nėra parengti darbo projektai. Artėjanti žiema gali sutrukdyti kelių atstatymo darbus. Iš viso numatyta 5 atliekų priėmimo punktai, 4 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės ir 2 perkrovimo stotys. Patikros momentu atlikta apie 30 % darbų. Darbai įgyvendinami, laikantis specifikacijų. Susidaręs vėlavimas įtakotas projekto neatitikimų ir praleidimų, gamtinių sąlygų, išorinių veiksnių, susijusių su paskirtais sklypais, inžinerinėm komunikacijom. Atkreiptinas dėmesys į techninio projekto rengėjo UAB „SPB" (Statinių projektavimo biuras) nekokybiškai atliktą techninį projektą, bei dalies darbų atsisakymą, kuris įtakojo projekto koregavimą. To pasekoje iš naujo teko derinti projektus bei koreguoti kai kuriuos statybos leidimus Pastabos ir rekomendacijos galutiniam paramos gavėjui (projekto vykdytojui): Galutinis paramos gavėjas kartu su jo atstovu (Inžinieriumi) turi patikrinti, kaip vykdomos aukščiau nurodytos pastabos: pašalinti netikslumai statybos žurnaluose. Pasiūlymai dėl kitos patikros vietoje atlikimo: rekomenduotina atlikti patikrą prieš darbų pabaigą, kai paaiškės sutarties pratęsimo terminas. *Netikslumai statybos žurnaluose pašalinti.*
2008-12-08	Europos rūmų auditas	Išankstinės išmokos rangovams, paslaugų tiekėjams buvo nuo 30 iki 40 % visos sutarties vertės, tokie dydžiai neatitinka įprastų rinkos sąlygų. *Europos Komisija 2010 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. REGIO J3 MB/ba D(2010) 990431 pateikė LR Finansų ministerijai parengtą Europos audito*

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR DOKUMENTŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

		rūmų atstovų pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų apžvalgą, kurioje nurodė, kad šią pastabą valstybės narė pagrindė ir šis pastebėjimas yra baigtas nagrinėti.
2009-12-08	Aplinkos projektų valdymo agentūra	Atliktas sutarties Nr. A/2007/P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba" patikrinimas. Išvados dėl sutarties veiklos įgyvendinimo: „Atlikus patikrą vietoje nenustatyta neatitikimų ar pažeidimų, kurie turėtų neigiamos įtakos sutarties įgyvendinimui. Sutartyje numatyti darbai faktiškai baigti, vyksta objekto „Panevėžio miesto sąvartyno uždarymas" pridavimo valstybinei komisijai procesas. Patikros vietoje metu apžiūrėta sąvartyno teritorija, įvykdyti darbai bei išpildomoji dokumentacija. Patikros metu buvo pateikti visi reikiami dokumentai."

2.9. Projekto pažeidimai

Įgyvendinant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"(toliau – Projektas), Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) atliko 15 pažeidimo tyrimų, o juos pabaigusi, nustatė 4 pažeidimus, kuriuos užregistravo Struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - SFMIS). 11 įtarimų dėl pažeidimų nepasitvirtino, todėl SFMIS jie nebuvo užregistruoti.

- 2010-11-08 atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Projekto sutartyje Nr. A/2007/P/34 „Atliekų priėmimo punktų, aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" numatytų lėšų, skirtų trumpalaikio turto įsigijimui, tinkamumo. Atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą nustatyta, jog trumpalaikis turtas (metalinės spintos ir priešgaisrinių apsaugos priemonių komplektas) įsigijimo išlaidos yra įtrauktos į projekto vykdytojo ilgalaikio turto aprašą ir jų įsigijimo (įsirengimo) vertė į sąnaudas nurašoma per įrangos naudojimo laikotarpį. Agentūroje nuspręsta, kad įtarimas dėl pažeidimo nepasitvirtino, netinkamų finansuoti lėšų nenustatyta.

- 2011-04-26 Agentūra pabaigė pažeidimo tyrimą dėl įtariamo pažeidimo vykdant Projekto 2006-10-17 sutartį Nr. A/2006/P/17 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: visuomenės informavimas ir švietimas" (toliau – Viešinimo sutartis). Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad pagal Viešinimo sutartį nacionalinėse ar regioninėse visuomėnės informavimo priemonėse publikuoti informaciniai straipsniai atitinka ne visus Informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklėse, patvirtintose 2006 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1043 (Žin., 2006, Nr. 114-4351, toliau – Viešinimo taisyklės), privalomoms viešinimo priemonėms (visuomenės informavimo priemonėse skelbiamai informacijai) keliamus reikalavimus. Nustatytą trūkumą įvertinti kaip

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

neesminiai, nepadarę įtakos 2004 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su Sanglaudos fondo veikla, 1 str. nurodyto tikslo pasiekimui, nes Viešinimo taisyklių 35 punkte nustatytas reikalavimas skelbti ne mažiau kaip kartą per metus trumpą įgyvendinamo Projekto ar techninės paramos priemonės pavadinimą ir Viešinimo taisyklių 34.3, 34.5 ir 34.6 punktuose nurodytą informaciją buvo įvykdytas (pagal Viešinimo sutartį viešinimo priemonių visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta net daugiau nei reikalaujama Viešinimo taisyklių 35 punkte), todėl finansinės korekcijos Projekto galutiniam paramos gavėjui nebuvo pritaikytos, įtariamo pažeidimo tyrimas užbaigtas nenustačius netinkamų finansuoti lėšų.

- SFMIS užregistruotas pažeidimas Nr. LT/11/078/SF/0 dėl pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/34 „Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“ įrengtų informacinių stendų (prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės; prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės; prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės; prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės; prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės), nes jie neatitiko Viešinimo taisyklių 17 punkto reikalavimų. Grąžintinomis pripažintos lėšos **405,47 euro**, todėl Agentūra pradėjo šių lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūrą.
- SFMIS užregistruotas pažeidimas Nr. LT/11/079/SF/0 dėl pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/35 „Projekto komponentų Panevėžyje statyba“ pastatytuose informaciniuose stenduose užfiksuotų neatitikimų Viešinimo taisyklių 17 p. reikalavimams. Grąžintinomis pripažintos lėšos **173,78 euro**, todėl Agentūra pradėjo šių lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūrą.

- SFMIS užregistruotas pažeidimas Nr. LT/11/080/SF/0 dėl rangos sutartyje Nr. A/2007/P/34 „Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“ numatytų ir vėliau patirtų išlaidų techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimui. Dalis jų, t. y. elektros energijos, remonto - 3 600 Lt, bei valymo - 6 000 Lt (pagal projekto vykdytojo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ rašte Nr. S-455 pateiktą informaciją) buvo numatytos ir techninės priežiūros sutartyje. Kadangi rangovo patirtos inžinieriaus aprūpinimo išlaidos (30 100 Lt) viršijo pagal šią rangos sutartį skirtą išlaidų sumą šiai darbų pozicijai (20 000 Lt), netinkamų finansuoti išlaidų suma yra **6 378,74 lito** ((3 600 litų + 6 000 litų)/30 100 litų*20 000 litų) arba **1 847,41 euro**, Agentūra pradėjo šių lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūrą.

- SFMIS užregistruotas pažeidimas Nr. LT/11/081/SF/0 dėl pagal rangos sutartį Nr. A/2007/P/35 „Projekto komponentų Panevėžyje statyba“, darbų kiekių žiniaraščiuose numatytos ir vėliau patirtos išlaidos techninės priežiūros inžinieriaus aprūpinimui, tačiau rangos sutartyje nebuvo numatyta atlikti darbų /suteikti paslaugų, susijusių su inžinieriaus aprūpinimu. Grąžintinomis pripažintos lėšos 4 800 litų suma, kadangi rangovo patirtos inžinieriaus aprūpinimo išlaidos (22 500 litų) viršijo pagal šią rangos sutartį skirtą išlaidų sumą šiai darbų pozicijai (20 000 litų), netinkamų finansuoti išlaidų suma yra **4 266,67 lito** (4 800/22 500 Lt*20 000 Lt) arba **1 235,72 euro**, todėl Agentūra pradėjo šių lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūrą.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

- 2011-06-17 atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Europos Komisijai deklaruotų 28 316,00 eurų įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu sutartyse „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: atliekų tankintuvas (kompaktorius)“ (Nr. 2009/26/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: krautuvas“ (Nr. 2009/27/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: ratinis frontalinis krautuvas“ (Nr. 2009/28/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas“ (Nr. 2009/29/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: Sijotuvas-būgninis rėtis“ (Nr. 2009/30/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: buldozeris“ (Nr. 2009/31/A/PT/LT), „Įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas: Automobilis su priekaba 30 m^3 konteinerių pervežimui“ (Nr. 2009/32/A/PT/LT). Agentūra nustatė, kad įrangos garantinio aptarnavimo ir techninio aptarnavimo užtikrinimas ir su tuo susijusios išlaidos yra būtinos, kad įrenginys funkcionuotų tinkamai ir be defektų (analogija – rangos sutartyse numatytas defektinis laikotarpis). Dėl šios priežasties minėtos išlaidos buvo įtrauktos į įrangos įsigijimo sutartis. Nutarta, jog įtarimas dėl pažeidimo nepasitvirtino, netinkamų finansuoti lėšų nenustatyta.

- 2011-06-21 atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Europos Komisijai deklaruotų 32 626,37 euro projekto veiklos išlaidų, padarytų pagal techninės pagalbos sutartį Nr. 2005/28/A//P/LT, tikėtinai tiesiogiai nesusijusių su projekto tikslais. Agentūra nustatė, kad deleguotos funkcijos turi būti suprantamos ne tik Agentūros deleguotos funkcijos projekto įgyvendinimui, bet ir Panevėžio apskrities savivaldybių deleguotas funkcijas, susijusias su atliekų tvarkymo sistemos organizavimu. Nutarta, jog įtarimas dėl pažeidimo nepasitvirtino, netinkamų finansuoti lėšų nenustatyta.

- 2011-06-21 Agentūra pabaigė įtariamo pažeidimo tyrimą dėl Projekto viešinimo pagal Viešinimo sutartį. Šį pažeidimo tyrimą Agentūra inicijavo remdamasi 2011-06-13 Agentūroje gauta Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento audito pastebėjimų suvestine Nr. 3, kurioje buvo pateiktos pastabos ir dėl Projekto viešinimo priemonių: 2007-03-31, 2007-04-03 per Kupiškio rajono televiziją „Kupiškio TV“, 2007-06-14 Panevėžio miesto ir rajono televiziją „KTV plius“, 2007-06-28 Panevėžio miesto ir rajono televiziją „KTV plius“ parodytų laidų, 2008-02-19 „Kupiškio žinios“ laikraštyje išspausdinto straipsnio „Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse“ ir 2008-04-17 Kupiškio rajono laikraštyje „Kupiškio žinios“ išspausdintos publikacijos „Dar šiemet Kupiškyje – didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė“. Atlikusi tyrimą, Agentūra nusprendė nekeisti 2011-04-26 Agentūros išvadoje dėl pagal viešinimo sutartį įgyvendintų viešinimo priemonių nurodyto sprendimo, kuria buvo nuspręsta, kad Viešinimo taisyklių 35 punkte nustatytas reikalavimas skelbti ne mažiau kaip kartą per metus trumpą įgyvendinamo Projekto ar techninės paramos priemonės pavadinimą ir Viešinimo taisyklių 34.3, 34.5 ir 34.6 punktuose nurodytą informaciją viešinant Projektą buvo įgyvendintas. 2011-06-21 Agentūros parengtoje išvadoje nurodyta, kad dėl Valstybės kontrolės pateiktose pastabose nurodytų viešinimo trūkumų finansinių korekcijų Projekto vykdytojui nuspręsta netaikyti, nes pastebėti trūkumai įvertinti kaip netrukdantys Reglamento 621 tikslą pasiekti.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Vidona Čepléjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Projekto Galutinėje ataskaitoje nurodyti finansinės analizės duomenys pateikti jau įvertinus šiuose 4 įgyvendinant Projektą nustatytuose pažeidimuose grąžintinomis pripažintas lėšų sumas, dėl kurių buvo pradėta lėšų susigrąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą procedūra.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

3. EKONOMINĖS NAUDOS ANALIZĖ

3.1. Įvadas

Analizė apima 2005 m. Europos Komisijai pateiktą ir patvirtintą Sanglaudos fondo projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Projektas buvo įgyvendinamas 2005 – 2010 m.

Dokumente pateikiama projekto ekonominės naudos analizė (angl. *Cost-benefit analysis*). Pagrindinis analizės tikslas – projekto finansinių ir ekonominių rodiklių vertinimas, siekiant nustatyti ar pradinės projekto prielaidos, ypač susijusios su projekto pajamomis ir sąnaudomis išlieka tokios, kurios pagrindžia Europos Sąjungos (ES) paramos poreikį projektui. Taip pat ar projekto socialinė – ekonominė nauda yra didesnė už projekto išlaidas.

Ekonominės naudos analizė vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis metodinėmis gairėmis „Investicinių projektų ekonominės naudos analizės vadovas" (angl. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects).

Atliekant analizę, laikomasi šių prielaidų:

- Investicijų sumos yra faktinės projekto investicijos atliktos projekto įgyvendinimo metu.
- Projekto finansavimo šaltiniai nustatyti projekto Europos Komisijos sprendime. ES paramos dalis projektui sudaro 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 15 proc. – bus dengiama iš valstybės biudžeto lėšų. Projekto finansiniam gyvybingumui užtikrinti pradiniais metais reikalingas finansavimas užtikrinamas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras nuosavomis lėšomis.
- Skaičiavimuose taikoma 6 proc. finansinė diskonto norma ir 5 proc. socialinė diskonto normos. Šios normos pasirinktos remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis 2000 – 2006 m. Sanglaudos fondo projektams.
- Projekte naudojamos pastovios kainos, neatliekant korekcijų dėl infliacijos.
- Projekto ataskaitinis laikotarpis pasirinktas 22 metai. Šis laikotarpis nustatytas remiantis pirminėje projekto analizėje naudotu laikotarpiu, projekto įgyvendinimo nuostatomis ir atitinka analogiškų projektų, įgyvendinamų Lietuvoje, analizėse naudojamus ataskaitinius laikotarpius.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Nadana Čepiėjienė
2011-06-29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@prate.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lentelė Nr. 19. Projekto vertė ir finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltinis	Planuota		Įvykdyta	
	KS, EUR (be PVM)	%	EUR, (be PVM)	%
Sanglaudos fondo lėšos	16.563.950,00	85	16.269.722,19	98,22
Galutinio paramos gavėjo lėšos	0,00	0	0,00	0
Bendrojo finansavimo (valstybės biudžeto) lėšos	2.923.050,00	15	2.871.127,45	98,22
Iš viso projektui	**19.487.000,00**	**100**	**19.140.849,64**	**98,22**

3.2. Finansinė analizė

Lentelė Nr. 20. Projekto komponentų vertės

Projekto vykdytojas (rangovas, paslaugų teikėjas, prekių teikėjas)	Sutarties pavadinimas, numeris	Sanglaudos fondas (EUR be PVM)	Valstybės biudžetas (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)	Iš viso EUR (be PVM)
UAB „SWECO BKG LSPI"	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" **Nr. 2005/28/A/P/LT**	*208.386,38*	*36.774,07*	-	*245.160,45*
UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė"	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: visuomenės informavimas ir švietimas" **Nr. A/2006/P/17**	*56.128,36*	*9.905,00*	-	*66.033,36*
M&S Umweltprojekt GmbH	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" **Nr. 2007/120/A/P/LT**	*245.712,48*	*43.361,03*	-	*289.073,51*
AB „Panevėžio statybos trestas"	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų	*3.690.525,39*	*651.269,19*	-	*4.341.794,58*

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TESTAMENTŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

	atliekų kompostavimo aikštelių statyba“ **Nr. A/2007/P/34**				
AB „Panevėžio statybos trestas“	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ **Nr. A/2007/P/35**	*11.585.803,86*	*2.044.553,62*	-	*13.630.357,48*
UAB „Koger Eco“	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Atliekų tankintuvas (kompaktorius)“ **Nr.2009/26/A/PT/LT**	*223.979,93*	*39.525,87*	-	*263.505,80*
UAB „Elklita“	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Krautuvas“ **Nr.2009/27/A/PT/LT**	*18.460,81*	*3.257,79*	-	*21.718,60*
UAB „Intrac Lietuva“	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Buldozeris“ **Nr.2009/31/A/PT/LT**	*144.899,79*	*25.570,55*	-	*170.470,34*
UAB „Oksata“	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas“ **Nr.2009/29/A/PT/LT**	*95.492,06*	*16.851,54*	-	*112.343,60*

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

UAB „Keltuva“	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Ratinis frontalinis krautuvas“ **Nr.2009/28/A/PT/LT**	*95.627,46*	*16.875,43*	-	*112.502,89*
UAB „KMT“	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Automobilis su priekaba 30 m3 konteinerių pervežimui“ **Nr.2009/32/A/PT/LT**	*127.015,77*	*22.414,55*	-	*149.430,32*
UAB „Atomeksim“	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Sijotuvas – būgninis rėtis“ **Nr.2009/30/A/PT/LT**	*56.890,50*	*10.039,50*	-	*66.930,00*
Iš viso:		***16.548.922,79***	***2.920.398,14***	-	***19.469.320,93***

Lentelė Nr. 21. Bendra vykdytų darbų / suteiktų paslaugų pagal sutartis mokėjimų suvestinė

Projekto komponento pavadinimas	**Bendra projekto vertė pagal sutartį EUR (be PVM)**	**Išmokėta pagal sutartį bendra lėšų suma, EUR (be PVM)**	**Netinkamų finansuoti išlaidų suma, EUR (be PVM)**	**Likusi neišmokėta pagal sutartį bendra lėšų suma, EUR (be PVM)**
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ **Nr. 2005/28/A/P/LT**	245.160,35	215.215,56		29.944,89
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo	66.033,36	65.946,64		86,72

KOPIJA TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

sistemos sukūrimas: visuomenės informavimas ir švietimas“ **Nr. A/2006/P/17**				
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra“ **Nr. 2007/120/A/P/LT**	289.073,51	224.482,59		64.590,92
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“ **Nr. A/2007/P/34**	4.341.794,58	4.340.484,42	2.252,88	1.310,16
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ **Nr. A/2007/P/35**	13.630.357,48	13.401.481,26	1.409,50	228.876,22
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Atliekų tankintuvas (kompaktorius)“ **Nr.2009/26/A/PT/LT**	263.505,80	263.505,80		-
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Krautuvas“ **Nr.2009/27/A/PT/LT**	21.718,60	21.718,60		-
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Buldozeris“ **Nr.2009/31/A/PT/LT**	170.470,34	170.470,34		-
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas“ **Nr.2009/29/A/PT/LT**	112.343,60	112.343,60		-
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Ratinis frontalinis krautuvas“ **Nr.2009/28/A/PT/LT**	112.502,89	112.502,89		-
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Automobilis su	149.430,32	149.430,32		-

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@prate.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

priekaba 30 m3 konteinerių pervežimui“ **Nr.2009/32/A/PT/LT**				
„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Sijotuvas – būgninis rėtis“ **Nr.2009/30/A/PT/LT**	66.930,00	66.930,00		-
Iš viso:	**19.469.320,93**	**19.144.512,02**	**3.662,38**	**324.808,91**

Lentelė Nr. 22. Projekto vykdytojų (rangovų, paslaugų teikėjų) mokėjimų suvestinė

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, Nr.2005/28/A/P/LT

Sąskaitos Nr., data	**Mokėjimų šaltinis**			**Suma apmokėjimui (EUR be PVM)**	**Mokėjimo data**
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	**Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)**	**Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)**		
Sąskaita Nr. 1, 2005-12-29	83.354,55		-	98.064,18	2005-12-30
		14.709,63	-		2005-12-30
Sąskaita Nr. 2, 2006-06-30	-	-	-	-	-
Sąskaita Nr. 3, 2007-03-30	406,27		-	477,96	2007-05-10
		71,69	-		2007-05-10
Sąskaita Nr. 4, 2007-11-15	37.602,31		-	44.238,01	2007-12-07
		6.635,70			2007-12-07
Sąskaita Nr. 5, 2008-08-20	61.570,10		-	72.435,41	2008-09-30
		10.865,31	-		2008-09-30
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**182.933,23**	**32.282,33**	-	**215.215,56**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	**25.453,15**	**4.491,74**	-	**29.944,89**	

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: visuomenės informavimas ir švietimas“, Nr. A/2006/P/17

Sąskaitos Nr., data	**Mokėjimų šaltinis**			**Suma apmokėjimui**	**Mokėjimo data**
	Sanglaudos	**Bendrojo**	**Galutinio**		

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. pastas info@pratc.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA * KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEKTIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

	fondo lėšos (EUR be PVM)	finansavimo lėšos (EUR be PVM)	paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Sąskaita Nr. 1, 2006-10-31	22.451,35		-	26.413,35	2006-12-18
		3.962,00	-		2006-12-18
Sąskaita Nr. 2, 2007-06-20	7.979,37		-	9.387,49	2007-08-03
		1.408,12	-		2007-08-03
Sąskaita Nr. 3, 2008-02-06	-	-	-	-	-
Sąskaita Nr. 4, 2008-07-17	4.547,79		-	5.350,34	2008-08-12
		802,55	-		2008-08-12
Sąskaita Nr. 5, 2009-01-08	1.555,13		-	1.829,57	2009-02-27
		274,44	-		2009-03-02
Sąskaita Nr. 6, 2009-06-04	9.875,73		-	11.618,51	2009-06-29
		1.742,78	-		2009-06-29
Sąskaita Nr. 7, 2009-12-11	9.645,27		-	11.347,38	2009-12-24
		1.702,11	-		2009-12-24
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**56.054,64**	**9.892,00**	**-**	**65.946,64**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	**73,72**	**13,00**	**-**	**86,72**	

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra“, Nr. 2007/120/A/P/LT

Sąskaitos Nr., data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)		
Sąskaita Nr. 1, 2007-12-03	49.142,50		-	57.814,70	2008-01-28
		8.672,20	-		2008-01-28
Sąskaita Nr. 2, 2009-03-02	61.593,74		-	72.463,23	2009-04-02
		10.869,49	-		2009-04-02
Sąskaita Nr. 3, 2009-08-27	44.187,26		-	51.985,02	2009-09-22
		7.797,76	-		2009-09-22
Sąskaita Nr. 4, 2010-05-17	22.130,67		-	26.036,08	2010-06-11
		3.905,41	-		2010-06-11
Sąskaita Nr. 5, 2010-12-15	13.756,03	2.427,53	-	16.183,56	2010-12-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**190.810,20**	**33.672,39**	**-**	**224.482,59**	
Likusi neišmokėta suma	**54.902,28**	**9.688,64**	**-**	**64.590,92**	

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėjas
2011-06-29
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

EUR (be PVM)				

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“, Nr. A/2007/P/34*

Sąskaitos Nr., data	**Mokėjimų šaltinis**			**Suma apmokėjimui (EUR be PVM)**	**Mokėjimo data**
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	**Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)**	**Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)**		
Sąskaita Nr. 1, 2007-11-23	1.107.157,62		-	1.302.538,37	2007-11-30
		195.380,75	-		2007-11-30
Sąskaita Nr. 2, 2008-04-30	66.517,12		-	78.255,44	2008-07-02
		11.738,32	-		2008-07-02
Sąskaita Nr. 3, 2008-06-30	95.844,73		-	112.758,50	2008-08-05
		16.913,77	-		2008-08-05
Sąskaita Nr. 4, 2008-07-31	146.930,02		-	172.858,84	2008-09-17
		25.928,82	-		2008-09-17
Sąskaita Nr. 5, 2008-08-29	200.430,89		-	235.801,04	2008-11-05
		35.370,15	-		2008-11-05
Sąskaita Nr. 6, 2008-09-30	265.888,85		-	312.810,41	2008-12-16
		46.921,56	-		2008-12-23
Sąskaita Nr. 7, 2008-10-31	370.244,01		-	435.581,19	2009-01-21
		65.337,18	-		2009-01-21
Sąskaita Nr. 8, 2008-11-28	428.576,89		-	504.208,10	2009-02-27
		75.631,21	-		2009-02-24
Sąskaita Nr. 9, 2008-12-31	638.880,45		-	751.624,08	2009-04-07
		112.743,63	-		2009-04-03
Sąskaita Nr. 10, 2009-08-18	368.941,18		-	434.048,45	2009-10-28
		65.107,27	-		2009-10-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**3.689.411,76**	**651.072,66**	**-**	**4.340.484,42**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	**1.113,63**	**196,53**	**-**	**1.310,16**	

* Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 2.252,88 EUR, iš jų: Sanglaudos fondo dalis - 1.914,95 EUR, LR biudžeto dalis - 337.93 EUR.

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“, Nr. A/2007/P/35**

Sąskaitos Nr., data	**Mokėjimų šaltinis**			**Suma apmokėjimui (EUR be PVM)**	**Mokėjimo data**
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	**Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)**	**Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)**		

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Sąskaita Nr. 1, 2007-12-17	3.475.741,16		-	4.089.107,24	2007-12-27
		613.366,08	-		2007-12-27
Sąskaita Nr. 2, 2008-05-30	194.511,44		-	228.836,98	2008-08-22
		34.325,54	-		2008-08-22
Sąskaita Nr. 3, 2008-06-30	186.131,18		-	218.977,87	2008-09-08
		32.846,69	-		2008-09-08
Sąskaita Nr. 4, 2008-07-31	296.804,04		-	349.181,22	2008-09-17
		52.377,18	-		2008-09-17
Sąskaita Nr. 5, 2008-08-29	457.391,94		-	538.108,17	2008-10-27
		80.716,23	-		2008-10-27
Sąskaita Nr. 6, 2008-09-30	357.417,29		-	420.490,93	2008-11-24
		63.073,64	-		2008-11-24
Sąskaita Nr. 7, 2008-10-31	379.876,55		-	446.913,58	2009-01-21
		67.037,03	-		2008-12-24
Sąskaita Nr. 8, 2008-11-28	385.944,81		-	454.052,71	2009-01-21
		68.107,90	-		2009-01-23
Sąskaita Nr. 9, 2008-12-31	214.460,37		-	252.306,32	2009-02-27
		37.845,95	-		2009-03-03
Sąskaita Nr. 10, 2009-02-27	191.645,47		-		2009-04-15
		33.819,79	-	225.465,26	2009-04-09
Sąskaita Nr. 11, 2009-03-31	186.656,60		-	219.596,00	2009-05-08
		32.939,40	-		2009-05-11
Sąskaita Nr. 12, 2009-04-30	439.490,30		-	517.047,42	2009-06-12
		77.557,12	-		2009-06-12
Sąskaita Nr. 13, 2009-05-29	689.923,02		-	811.674,14	2009-07-02
		111.357,13	-		2009-07-02
		10.393,99*			2009-07-03
Sąskaita Nr. 14, 2009-06-30	347.403,88		-	408.710,46	2009-11-02
		61.306,58	-		2009-11-02
Sąskaita Nr. 15, 2009-08-31	880.185,93		-		2009-11-18
		155.326,94	-	1.035.512,87	2009-11-18
Sąskaita Nr. 16, 2009-10-30	1.199.082,82		-	1.410.685,67	2010-02-26
		211.602,85	-		2010-02-23
Sąskaita Nr. 17, 2009-11-30	233.373,11		-	274.556,61	2010-02-26
		41.183,50	-		2010-02-23
Sąskaita Nr. 18, 2009-12-04	136.093,23		-	160.109,68	2010-02-26
		24.016,45	-		2010-02-23
Sąskaita Nr. 19, 2010-02-12	1.139.125,92		-	1.340.148,13	2010-03-31
		201.022,21	-		2010-03-31
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**11.391.259,06**	**2.010.222,20**	**-**	**13.401.481,26**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	**194.544,80**	**34.331,42**	**-**	**228.876,22**	

*Apmokėta iš palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (ISPA programos) lėšų.
** Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 1.409,50 EUR, iš jų: Sanglaudos fondo dalis - 1.198,07 EUR, LR biudžeto dalis - 211,43 EUR.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@prat.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Atliekų tankintuvas (kompaktorius)“, Nr. 2009/26/A/PT/LT

Sąskaitos Nr., data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)		
Sąskaita Nr. 1, 2009-12-23	223.979,93		-	263.505,80	2009-12-31
		39.525,87	-		2009-12-31
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**223.979,93**	**39.525,87**	**-**	**263.505,80**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	-	-	-	-	

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Krautuvas“, Nr. 2009/27/A/PT/LT

Sąskaitos Nr., data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)		
Sąskaita Nr. 1, 2009-11-30	3.692,16		-	4.343,72	2009-12-21
		651,56	-		2009-12-21
Sąskaita Nr. 2, 2010-03-24	14.768,65		-	17.374,88	2010-04-28
		2.606,23	-		2010-04-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**18.460,81**	**3.257,79**	**-**	**21.718,60**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	-	-	-	-	

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Buldozeris“, Nr. 2009/31/A/PT/LT

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)		

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el.paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Sąskaita Nr. 1, 2010-02-19	144.899,79		-	170.470,34	2010-03-19
		25.570,55	-		2010-03-19
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**144.899,79**	**25.570,55**	**-**	**170.470,34**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	-	-	-	-	

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Kompostuojamų atliekų smulkintuvas“, Nr. 2009/29/A/PT/LT

Sąskaitos Nr., data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)		
Sąskaita Nr. 1, 2009-11-24	19.098,41		-	22.468,72	2009-12-21
		3.370,31	-		2009-12-21
Sąskaita Nr. 2, 2010-05-20	76.393,65		-	89.874,88	2010-06-10
		13.481,23	-		2010-06-10
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**95.492,06**	**16.851,54**	**-**	**112.343,60**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	-	-	-	-	

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Ratinis frontalinis krautuvas“, Nr. 2009/28/A/PT/LT

Sąskaitos Nr., data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)		
Sąskaita Nr. 1, 2009-12-02	19.125,49		-	22.500,58	2009-12-21
		3.375,09	-		2009-12-21
Sąskaita Nr. 2, 2010-03-25	76.501,97		-	90.002,31	2010-04-28
		13.500,34	-		2010-04-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**95.627,46**	**16.875,43**	**-**	**112.502,89**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	-	-	-	-	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@prate.lt

120

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Automobilis su priekaba 30 m3 konteinerių pervežimui“, Nr. 2009/32/A/PT/LT

Sąskaitos Nr., data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)		
Sąskaita Nr. 1, 2009-12-24	25.403,15		-	29.886,06	2010-02-01
		4.482,91	-		2010-02-01
Sąskaita Nr. 2, 2010-03-24	101.612,62		-	119.544,26	2010-04-28
		17.931,64			2010-04-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**127.015,77**	**22.414,55**	**-**	**149.430,32**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	-	-	-	-	

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Sijotuvas – būgninis rėtis“, Nr. 2009/30/A/PT/LT

Sąskaitos Nr., data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	Sanglaudos fondo lėšos (EUR be PVM)	Bendrojo finansavimo lėšos (EUR be PVM)	Galutinio paramos gavėjo lėšos (EUR be PVM)		
Sąskaita Nr. 1, 2009-11-25	11.378,10		-	13.386,00	2009-12-21
		2.007,90	-		2009-12-21
Sąskaita Nr. 2, 2010-03-23	45.512,40		-	53.544,00	2010-04-28
		8.031,60	-		2010-04-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	**56.890,50**	**10.039,50**	**-**	**66.930,00**	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	-	-	-	-	

Lentelė Nr. 23. **Projekto išlaidų suskirstymas pagal išlaidų kategorijas**

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Išlaidų kategorija	Iš viso išlaidų, padarytų (nuo 2005/09/02([1]) iki 2010/12/31), EUR	Iš viso suplanuotų išlaidų (pradinis biudžetas), EUR	Išlaidos, padarytos iki dabar, kaip pradinio biudžeto dalis (%)

TIKRA
Aldona Čaplėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

1. Planavimas			
2. Žemės įsigijimas			
3. Statybvietės paruošimas([3])			
4. Statyba	17.738.303,30	17.972.151,00	98,70
5. Įranga	896.901,55	914.853,00	98,06
6. Techninė pagalba	439.698,15	534.233,00	82,30
7. Viešumas([2])	65.946,64	66.033,00	99,87
8. PVM arba lygiavertis mokestis			
9. Nenumatytos išlaidos			
Iš viso	**19.140.849,64**	**19.487.000,00**	**98,22**

([1]) Data, nuo kurios išlaidos tampa tinkamomis.

([2]) Pagal sprendimą 96/455/EB (OL L 188, 1996 7 27, p. 47).

([3]) Statybvietės paruošimo išlaidos yra įtrauktos į rangos darbų sutartis, todėl šios išlaidos yra sumuojamos išlaidų kategorijoje Nr. 4 „Statyba".

([4]) Pradinis biudžetas yra nurodytas pagal 2009-10-22 Europos Komisijos sprendimą K(2009)8360

3.2.1. Projekto investicijų dydis

Šioje dalyje pateikiamos patikslintos projekto investicijos remiantis projekto įgyvendinimo metu pasirašytomis sutartimis su rangovais bei galutinėmis, pagal sutartis išmokėtomis, sumomis.

Projekto komponentas	Vertė EUR
Visuomenės informavimas ir švietimas	65.946,64
Techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	215.215,56
5 atliekų priėmimo punktų, 4 žaliųjų atliekų kompostavimo ir 2 perkrovimo aikštelių statyba	4.340.484,42
Projekto komponentų Panevėžyje statyba	13.401.481,26
Įrangos įsigijimas	896.901,55

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Techninė priežiūra	224.482,59
VISO:	**19.144.512,02**

Analizėje projekto investicijos išdėstytos pamečiui pagal faktinį projekto išlaidų išmokėjimą.

Prie projekto investicijų išlaidų taip pat įtraukiamos ir reinvesticijos – tai lėšos skirtos projekto metu sukurtos infrastruktūros komponentų, kurių naudingo tarnavimo trukmė yra trumpesnė nei projekto analizės laikotarpis, įsigijimui. Projekto reinvesticijų dydžiai svyruoja nuo 5 iki 8 proc. pradinės projekto investicijų vertės.

Projekto investicijų išskaidymas pamečiui pateikiamas 1 priede.

3.2.2. Projekto veiklos sąnaudos

Projekto veiklos sąnaudas sudaro UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras dėl projekto įgyvendinimo patiriamos sąnaudos:

- Atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos;
- Perkrovimo stočių eksploatavimo sąnaudos;
- Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos;
- Naujo regioninio sąvartyno eksploatavimo sąnaudos;
- Kitos UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras išlaidos.

Analizėje pateiktos faktinės įmonės sąnaudos iki 2010 m. birželio mėn. pabaigos bei pateikiamas jų planas. Planuojama, kad realus sąnaudų augimas po projekto įgyvendinimo pabaigos sudarys po 0,5 proc. kasmet.

Detalios projekto veiklos sąnaudos pateikiamos 16 priede.

3.2.3. Projekto pajamos

Projekto veiklos pajamas sudaro UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras dėl projekto įgyvendinimo gaunamos atliekų tvarkymo pajamos. Analizėje pateiktos faktinės įmonės pajamos iki 2010 m. birželio mėn. pabaigos bei pateikiamas jų planas. Planuojama, kad realus projektui priskirtinų pajamų augimas po projekto įgyvendinimo pabaigos sudarys po 0,5 proc. kasmet.

Projekto likutinė vertė tai projekto investicijų vertė paskutiniaisiais analizės laikotarpio metais. Didžioji dalis projekto metu sukurtos infrastruktūros bus nudėvėta iki 2026 m. (projekto analizės laikotarpiu). Planuojama, kad likutinė projekto įgyvendinimo metu sukurto turto vertė sudarys apie 8 proc. pradinės investicijų kainos. Kadangi projekto analizės laikotarpio turtas nebus

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

likviduojamas ir nesukurs teigiamo pinigų srauto, ši vertė neįtraukiama į finansinio gyvybingumo skaičiavimus.

Detalūs projekto veiklos pajamų dydžiai pateikiami 16 priede.

3.2.4. ES paramos lėšos

Projektui Europos Komisijos sprendimu skirtos ES paramos lėšos negali viršyti 85 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Atnaujintoje finansinėje analizėje, įvertinus planuojamas projekto pajamas, apskaičiuotas finansavimo nepakankamumas (angl. *funding-gap*) sudaro 91,25 proc. Toks finansavimo nepakankamumo dydis rodo, kad projektui teikiant 85 proc. ES paramos lėšų projektas nebus per daug finansuojamas.

Finansinėje analizėje ES paramos lėšos išdėstomos pamečiui, proporcingai projekto investicijų dydžiui. Detalus ES paramos lėšų išskaidymas pateikiamas 17 priede.

3.2.5. Projekto finansiniai rodikliai

Atnaujintoje finansinėje analizėje skaičiuojami šie projekto finansiniai rodikliai:

- Finansinė investicijų grynoji dabartinė vertė ($FGDV_I$) (angl. *Financial Net Present Value of Investment*);
- Finansinė investicijų vidinė grąžos norma ($FVGN_I$) (angl. *Financial Internal Rate of Return of Investment*);
- Finansinė kapitalo grynoji dabartinė vertė ($FGDV_K$) (angl. *Financial Net Present Value of Capital*);
- Finansinė investicijų vidinė grąžos norma ($FVGN_K$) (angl. *Financial Internal Rate of Return of Capital*).

Apskaičiuotos minėtų rodiklių reikšmės pateikiamos lentelėje žemiau:

Rodiklis	Reikšmė
$FGDV_I$	- 46 630 928 Lt
$FVGN_I$	- 11,8 proc.
$FGDV_K$	- 3 189 358 Lt
$FVGN_K$	0,1 proc.

KONTROLIERIŲ ... III VERTINIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-2
Aldona Čepėjienė

Neigiama $FGDV_I$ reikšmė rodo, kad projekto įgyvendinimas be ES paramos būtų neįmanomas. Projekto investicijos pačios savaime neužtikrina pakankamų pinigų srautų, kurie leistų finansuoti reikalingas investicijas t.y. projekto įgyvendinimo metu uždirbamos pajamos yra per

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

mažos, kad projektą būtų įmanoma finansuoti iš paskolos lėšų užtikrinant, kad bus uždirbama pakankamai lėšų paskolai grąžinti. Projekto finansinio nuostolio dabartinė vertė yra lygi 46 630 928 Lt.

Projekto $FVGN_I$ reikšmė parodo diskonto normą, kuriai esant projekto $FGDV_I$ būtų lygi 0. Neigiama $FVGN_I$ reikšmė (nagrinėjamu atveju - 11,8 proc.), kaip ir neigiama $FGDV_I$ reikšmė reiškia, kad projekto uždirbamos pajamos yra nepakankamos projekto investicijoms finansuoti. Projektas be ES paramos yra ženkliai nuostolingas ir finansiškai neįgyvendinamas.

Projekto rodikliai $FGDV_K$ ir $FVGN_K$ skaičiuojami projektui suteikus paramą t.y. į projekto pinigų srautų analizę įtraukiamos ir paramos lėšos kaip teigiamas pinigų srautas. Šie rodikliai taip pat parodo galutinio paramos gavėjo investicijų grąžą – kokį „pelną"/„nuostolį" turės galutinis paramos gavėjas, įgyvendinęs projektą. ES paramos projektuose taikomas finansavimo nepakankamumo metodas reiškia, kad pareiškėjui turi būti teikiamas toks paramos dydis, kuris leistų padengti projekto finansavimui (projekto išlaidų daliai, kurios nedengia paramos dalis) reikalingų finansinių išteklių pritraukimo išlaidas ir tuo pačiu pareiškėjas neturėtų finansinio pelno iš projekto. Siekiant šių tikslų, projekto $FGDV_K$ reikšmė turi būti artima 0 (t.y. pareiškėjas neturi nei pelno nei nuostolio įgyvendindamas projektą), o $FVGN_K$ reikšmė atitinkamai turi būti artima projekto finansinėje analizėje taikytai diskonto normai. Nagrinėjamo projekto $FGDV_K$ reikšmė yra lygi – 3 189 358 Lt. Tai reiškia, kad net ir suteikus paramą projektui jis netampa finansiškai atsiperkantis. Tai patvirtina ir projekto $FVGN_K$ reikšmė 0,7 proc., kuri yra žemesnė už skaičiavimuose taikytą 6 proc. diskonto normą.

3.2.6. Projekto finansinio gyvybingumo vertinimas

Apibendrinant projekto finansinius rodiklius galima teigti, kad net ir suteikus paramą projektui jis tampa finansiškai neatsiperkantis. Detalūs projekto finansinių rodiklių skaičiavimai pateikiami 16 ir 17 prieduose.

Projekto finansiniam gyvybingumui įvertinti skaičiuojamas akumuliuotas pinigų srautas. Detalūs skaičiavimai pateikiami 18 priede. Būtina pažymėti, kad nacionalinė projekto finansavimo dalis bus dengiama iš valstybės biudžeto lėšų. Šios lėšos yra skiriamos projektui proporcingai projekto išlaidoms.

Neigiamam pinigų srautui finansuoti kartu su ES bei valstybės biudžeto lėšomis skirtos ir UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras lėšos.

Akumuliuotas projekto pinigų srautas yra visu laikotarpiu teigiamas, todėl galima teigti, kad projektas yra finansiškai gyvybingas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

3.2.7. Projekto jautrumo analizė

Remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis išdėstytomis Išlaidų ir naudos analizės metodikoje, atliekant jautrumo analizę nustatomi *jautrūs* arba *kritiniai* faktoriai, kurie gali turėti didžiausios įtakos projekto rezultatams bei lemti projekto sėkmę ar nesėkmę. Remiantis aukščiau minėta metodika, atliekant projekto jautrumo analizę ieškoma tokių projekto faktorių, kurių 1proc. pasikeitimas (teigiamas arba neigiamas) lemia didesnį nei 5proc. $FGDV_I$ pasikeitimą arba 1 proc. (procentinio punkto) $FVGN_I$ pasikeitimą (*Guide to cost-benefit analysis of investment projects* 39 pusl.). Laikoma, kad tie faktoriai, kurie lemia didesnį nei nurodyta pasikeitimą yra traktuojami kaip turintys didžiausios įtakos projekto finansinių rodiklių reikšmėms ir atitinkamai visam projektui. Projekto jautrumo analizės metu identifikavus projekto jautrius faktorius jie toliau turėtų būti nagrinėjami rizikos analizėje, kurioje būtų vertinama jų pasireiškimo tikimybė.

Projekto jautrumo analizė buvo atliekama paeiliui keičiant pagrindinių projekto eilučių: projekto investicijų, projekto veiklos sąnaudų bei projekto veiklos pajamų reikšmes, jas didinant 1 proc. bei vertinant projekto $FGDV_I$ ir $FVGN_I$ pasikeitimą. Atliekant projekto jautrumo analizę projekto likutinė vertė buvo įtraukta prie projekto pajamų. Projekto jautrumo analizės rezultatai pateikiami lentelėje žemiau.

Nagrinėjamas faktorius	**$FGDV_I$ pasikeitimas (proc.)**	**$FVGN_I$ pasikeitimas (procentiniais punktais)**
Projekto investicijų padidėjimas 1proc.	-1,3	0,1
Projekto veiklos sąnaudų padidėjimas 1proc.	-0,3	0,1
Projekto veiklos pajamų padidėjimas 1proc.	0,6	-0,2

Kaip matome pateiktoje jautrumo analizės rezultatų suvestinėje lentelėje, projekto investicijų, projekto veiklos sąnaudų bei projekto veiklos pajamų padidėjimas 1proc. (didinant juos atskirai) neturėjo didesnio nei 5 proc. $FGDV_I$ ar didesnio nei 1 procentinio punkto $FVGN_I$ pasikeitimo. Tai leidžia teigti, kad projekte nėra *jautrių / kritinių* faktorių, kurie keltų grėsmę projekto įgyvendinimui bei turėtų būti nagrinėjami rizikos analizėje.

Detalūs projekto jautrumo analizės skaičiavimai pateikiami 19 priede.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-29

3.2.8. Finansinės analizės išvados

Pagrindinis projekto finansinės analizės tikslas buvo nustatyti ar pradinės projekto prielaidos, susijusios su projekto pajamomis ir sąnaudomis, pagrindžia paramos poreikį projektui.

Sanglaudos fondo parama buvo teikiama projektams remiantis finansavimo nepakankamumo principu. ES finansavimo dalis negalėjo būti didesnė nei projekto finansavimo nepakankamumas arba 85 proc. priklausomai nuo to, kuri vertė buvo mažesnė. Nagrinėjamam projektui skirta parama sudarė 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Finansinės analizės metu nustatytas projekto finansavimo nepakankamumas sudarė 91,26 proc. Toks projekto finansavimo nepakankamumas reiškia, kad projektui skirta ES parama neviršija maksimaliai galimos projektui skirti paramos. Tai patvirtina ir finansiniai projekto rodikliai. Net ir suteikus ES paramą projektui jis netampa finansiškai atsiperkantis ir negeneruoja pelno pareiškėjui – nėra per didelio (angl. *over-financing*) finansavimo. Papildomos, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos buvo suteiktos iš valstybės biudžeto.

Projekto finansinio gyvybingumo skaičiavimai pagrindžia projekto finansinį gyvybingumą – akumuliuotas projekto grynųjų pinigų srautas yra teigiamas viso ataskaitinio laikotarpio metu.

3.3. Ekonominė analizė

Buvusi atliekų tvarkymo sistema apėmė daug prastai suprojektuotų sąvartynų, kurie aptarnavo atskiras bendruomenes. Ši sistema neatitiko ES direktyvų reikalavimų. Galimybių ataskaitoje buvo pasiūlyti ir mažiausių kaštų analizės metodu įvertinti alternatyvūs atliekų tvarkymo būdai, kurie užtikrintų ES direktyvų laikymąsi ir pateiktų aplinkosaugos požiūriu tinkamą sprendimą Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo sistemos problemoms išspręsti ir poreikiams patenkinti. Kaštų efektyvumas pasireikštų, jei:

- Siekiant patenkinti apskrities poreikius būtų įrengiami ir eksploatuojami vienas arba du sąvartynai;
- Atliekų transportavimo schemoje būtų naudojamos perkrovimo stotys.

Pasirinktas vieno sąvartyno ir dviejų perkrovimo stočių (Rokiškio ir Biržų rajonų savivaldybėse) variantas. Vertinant pasiūlytas atliekų tvarkymo galimybes, reikia pabrėžti, kad pasirinkta opcija turi mažiausius kaštus, o tai yra labai svarus argumentas ją įgyvendinti. Nepaisant

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

to, buvo atlikta tipinė ekonominė analizė, kurios metu buvo įvertinti ne tik projekto kaštai, bet ir teikiama nauda.

3.3.1. Nauda aplinkai

- Vanduo – sąvartynų apsauga sumažina gruntinių vandenų sluoksnio ir paviršinių vandenų šaltinių užteršimo riziką;
- Oras – geresnės metano surinkimo (ir deginimo) sistemos sumažina sprogimų riziką, mažesnis poveikis globalinio atšilimo požiūriu;
- Sveikata – didesnis atliekų surinkimo paslaugų paplitimas ir geresnis sąvartynų tvarkymas sumažina galimybes veistis parazitams, kirmėlėms ir kitiems ligų užkratų pernešėjams.

3.3.2. Veiklos efektyvumas

- Sąvartyno veikla – išteklių kaštų sutaupymas atsiranda dėl skirtumų tarp "su" ir "be" projekto scenarijų dėl sumažintų valdymo kaštų visų projekto teritorijoje eksploatuojamų sąvartynų ir statybos kaštų, įrengiant sąvartynus kiekviename rajone. Šią naudą dalinai atsvers patiriami papildomi transportavimo kaštai.
- Sąvartyno gyvavimo trukmė – nauda atsiranda dėl antrinių žaliavų surinkimo, perdirbimo bei kompostavimo veiklų plėtojimo taip prailginant sąvartyno gyvavimo laiką. Taip pat ir dėl galimo surinkimo kaštų sumažėjimo, atliekas pradėjus kompostuoti.

Taip pat pagyvės socialinė ir ekonominė plėtra, o tai taip pat galima traktuoti kaip projekto naudą. Projektas turi svarbius socialinius elementus: atitinkama infrastruktūra ir paslaugų teikimo namų ūkiams lygis yra būtinas, siekiant pritraukti naujus ir išlaikyti esamus verslo subjektus. Šis projektas prisideda prie apskrities infrastruktūros plėtros, kas pritrauks ekonomines investicijas bei užtikrins aplinkos integralumą.

Investicijų įsisavinimas užtikrins, kad atliekų tvarkymo sektoriaus veikla atitiks ES teisinius reikalavimus šioje srityje. Projekto įgyvendinimas gyvybiškai svarbus Lietuvai tapus pilnateise ES nare. Taigi šis projektas prisideda ir prie Panevėžio apskrities ekonominės plėtros, ir prie bendro šalies vystymosi. Gaunama nauda galima vadinti ir pagerintus atliekų surinkimo ir šalinimo rodiklius, jų ekonomiškumą. Reikia pastebėti, kad Panevėžio apskritis užima apie 10 proc. Lietuvos teritorijos ir gyventojų skaičiaus.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Ekonominė analizė buvo atlikta regioniniu lygiu ir vertino tiesioginę naudą, kurią planuojama, kad gaus šio projekto paveikti gyventojai. Didžioji dalis naudos bus lokali ir atsiras dėl konkrečios teritorijos aplinkos pagerėjimo.

3.3.3. Ekonominio vertinimo aspektai

Esminis ekonominio įvertinimo tikslas yra nustatyti, ar siūlomas projekto sukurta socialinė ir ekonominė gerovė yra didesnė už projekto išlaidas. Ekonominio įgyvendinamumo nustatymo pagrindas yra "su" ir "be" projekto scenarijų palyginimas. "be" projekto scenarijus yra suprantamas kaip buvusio atliekų paslaugų teikimo lygio tolimesnis palaikymas.

Aplinkosauginė ekonominė nauda atsiranda, gerinant vandens šaltinių (išvalant filtratą) ir oro (mažinant metano išskyrimą) kokybę, tiesiogiai tai bendruomenei, kurios aplinkoje investuojama, o taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai yra paveikiami ir kiti vartotojai, kurie taip pat gauna tam tikrą naudą. Nauda apima materialias ir nematerialias vertybes, kuriomis gali naudotis gyventojai, gyvenantys artimiausioje kaimynystėje ar šiek tiek toliau nuo šios aplinkos. Reikia atkreipti dėmesį į Panevėžio apskrities aplinkosauginę reikšmę - joje yra trys regioniniai parkai, o maždaug 5 proc. teritorijos yra priskiriama saugomai teritorijai. Ekonomine prasme buvo vertinamas visas projektas ir bendra teritorija, o ne atskiri projekto komponentai ar 5 rajonai atskirai.

Ekonominiu požiūriu buvo analizuojamas dvidešimt dviejų metų laikotarpis. Analizuojant buvo atsižvelgta į visą likutinį turtą, kuris gali išlikti iki analizuojamo laikotarpio pabaigos. 2005-ieji metai yra laikomi 0-iais analizės laikotarpio metais, tais metais buvo patirtos pirmosios projekto išlaidos. Laikomasi nuostatos, kad nauda bus gaunama tik galutinai įgyvendinus projektą.

3.3.4. Ekonominė diskonto norma

Remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis projekte buvo taikoma 5 proc. socialinė diskonto norma.

3.3.5. Kainodara

Kaštų, susijusių su projektu pavertimui iš finansinių kaštų, pagrįstų rinkos kainomis į socialinius ekonominius kaštus, pagrįstus socialinių galimybių verte, atliekami šie žingsniai: iš kaštų atimti mokesčiai bei subsidijos ir kaštai, pagrįsti vietinėmis rinkos kainomis socialiniu požiūriu konvertuoti taip, kad būtų įmanoma juos palyginti su tarptautinėmis kainomis. Laikoma, jog tarptautiniu mastu prekiaujamų prekių vertė yra faktinė tų prekių ekonominė vertė, tuo tarpu vietinės prekių kainos dažnai yra iškraipytos dėl rinkos netobulumo.

TIKRA
Skyrinio vedėja
Aktonė Čaplejienė
2011-06-29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt.

Lietuvoje nėra nustatyta oficialių ekonominių konversijos faktorių, kurie yra reikalingi nustatyti vietinio indėlio į projektą socialinių galimybių kaštus. Finansinėje analizėje šie kaštai yra pagrįsti Lietuvos rinkos kainomis. Todėl buvo naudojamas standartinis konversijos koeficientas:

$$SCF = \frac{M + X}{(M + T_M) + (X - T_X)}$$

kur M yra importas (iš viso), X yra eksportas (iš viso), TM yra importo mokesčiai, TX yra eksporto mokesčiai.

Lietuvos eksporto ir importo duomenys gauti iš Lietuvos Statistikos departamento ir Muitinės departamento bei yra pateikti lentelėje apačioje.

Mln. Lt

Metai	2006	2007
Importas (mln. Lt)	53275	60987
Eksportas	38888	43234
Importo mokesčiai	183	209
Eksporto mokesčiai	0	0

Iš pateiktų duomenų gauname, kad standartinis konversijos koeficientas yra 0,998, tai yra labai arti 1. Turint omenyje tai, kad medžiagos ir įrengimai, kurie bus naudojami projekto įgyvendinimo metu, kilę iš Lietuvos arba iš ES šalių bei jiems netaikomi importo bei eksporto mokesčiai, daroma prielaida, kad SKK=1.

3.3.6. Projekto ekonominiai kaštai

Projekto ekonominiai kaštai apima kapitalo ir veiklos kaštus, patiriamus dėl siūlomo regioninio Panevėžio miesto sąvartyno eksploatavimo, dėl atliekų pristatymo į regioninį sąvartyną ir surinkimo kaštus. Esamoji bendra kapitalo ir veiklos kaštų vertė visos programos metu siektų 85,1 mln. Lt (24,6 mln. eurų) taikant 5 proc. socialinę diskonto normą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR DAUGIAU SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

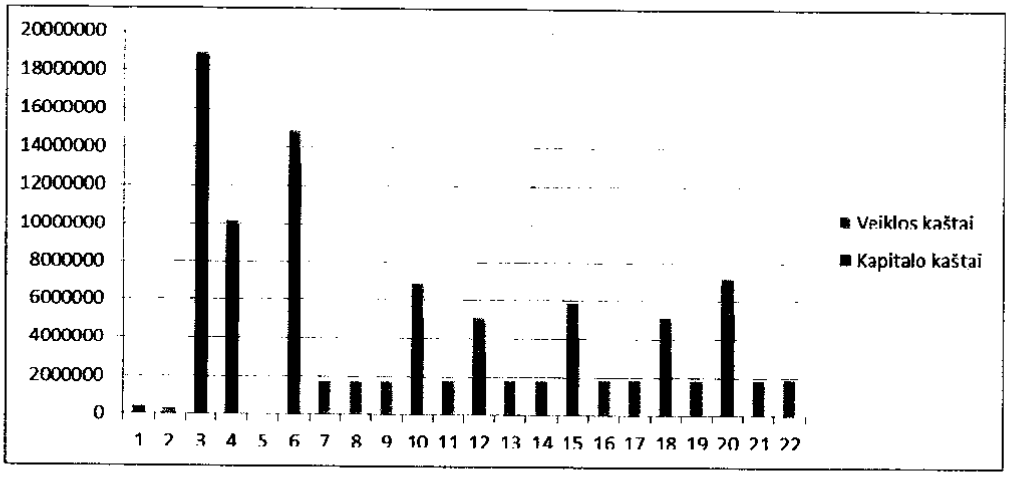

Kapitalo ir veiklos kaštai pateikti aukščiau, neįtraukiant mokesčių ir rinkliavos bei atsitiktinių, t.y. nenumatytų kainų.

3.3.7. Ekonominės naudos vertinimas

Siūlomo projekto nauda buvo įvertinta, remiantis pagrindinių tarptautinių finansavimo agentūrų ir donorų metodologinėmis gairėmis, o taip pat remiantis vadovaujantis Europos Komisijos Išlaidų ir naudos analizės metodinėmis gairėmis (angl. *Guide to cost-benefit analysis of investment projects*). Projekto ekonominę naudą sudaro:

- Nauda aplinkai ir sveikatai bei socialinei ir ekonominei plėtrai.
- Efektyvumą ir išteklių kaštų sutaupymą, pasirenkant vieną regioninį sąvartyną, aptarnaujantį visą apskritį.

Projekte įgyvendinta atliekų tvarkymo strategija numato vieną regioninio sąvartyno įkūrimą, kuris pakeičia dabar naudojamus senus sąvartynus. Taip pat yra numatomas didesnis atliekų surinkimo paslaugų teikimo paplitimas miesto ir kaimo vietovėse. Pastarasis aspektas sumažins nelegalaus atliekų šalinimo lygį ir teigiamai įtakos bendruomenės aplinką, be to, sumažės namų ūkių kaštai patiriami atsikratant atliekomis.

3.3.8. Nauda aplinkai, sveikatai ir ekonominiam vystimuisi bei socialinė nauda

Šalių kandidačių atitikimas aplinkosauginės Acquis ataskaitai, kurią pateikė Ecotec et al 2001 metais, apskaičiuota metinė nauda Lietuvoje visiškai atitinka ES aplinkosauginius standartus ir yra ekvivalenti 79 eurai ir 353 eurai vienam gyventojui. Nauda susijusi su oro, vandens ir atliekų sektoriais. Atliekų sektorius įvertinamas maždaug 2 proc. (2 eurai žmogui) ir 16proc. (55 eurai žmogui) rodikliais, atitinkamai mažiausia ir didžiausia reikšmė. Nauda atsiranda įgyvendinus ES direktyvas susijusias su atliekų tvarkymu šalinant jas sąvartynuose bei pakuotėmis (sąvartynų

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas [illegible]atc.lt

KOPIJA TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

būklės pagerėjimas perdirbant atliekas ir / ar deginant). Pakuočių sudėtis yra sprendžiama ES ir šalies mastu, todėl nėra tiesiogiai susijusi su projektu. Taigi ši nauda neturėtų būti įtraukta, vertinant ekonominį siūlomos programos įgyvendinamumą Panevėžio apskrityje. Nauda, gaunama iš pakuočių tvarkymo veiklos sudaro maždaug 10 proc. aukščiau aprašytų reikšmių.

Paslaugų lygio gerėjimas galėtų atnešti tam tikrą aplinkosauginę, socialinę, sveikatos ir ekonominės plėtros naudą. Paslaugų lygio gerėjimo masto įvertinimas yra labai subjektyvus. Dėl šios priežasties, naudos vertė, jei tokia bus, nebuvo įtraukta į kiekybinį ekonominį įvertinimą.

Žemiau pateikiama informacija kaip ši globali nauda susijusi su socialine, aplinkosaugine ir sveikatos nauda Panevėžio apskrityje.

3.3.9. Sveikata ir aplinka

Poveikis sveikatai apima tiesioginę riziką (sprogimų ir dujų patekimo į orą) sąvartyno darbuotojams bei asocialiems, sąvartyno teritorijoje gyvenantiems asmenims, ir netiesioginę riziką platesnei bendruomenės daliai. Netiesioginė rizika gali kilti dėl vandens šaltinių užteršimo galimybės, filtratui patekus į gruntą. Be to, sąvartynuose susidaro sąlygos veistis parazitams, kirmėlėms ir kitiems ligų nešiotojams. Lietuvoje nėra daug surinkta ir prieinama statistinių duomenų apie ligas, sukeltas dėl vandens šaltinių užteršimo. Duomenys apie ligas, sukeltas parazitų, kurie veisiasi kietųjų atliekų surinkimo ir šalinimo vietose taip pat nėra prieinami.

Filtratas

Esamo Panevėžio miesto sąvartyno uždarymo darbai apima ir specialius pasiūlymus, susijusius su susikaupusio filtrato šalinimu ir valymo darbais. Filtrato telkinio tūris apytiksliai sudaro apie 100 000 m^3. Šio sąvartyno sutvarkymas sumažintų susidarančio filtrato kiekį. Apskaičiuota, kad pagrindiniame sąvartyne susidaro apie 43 000 m^3 filtrato.

Reikia pažymėti, kad apskrities pagrindinis sąvartynas yra pakankamai nutolęs nuo geriamojo vandens ėmimo vietų. Todėl tikimybė, kad pasklidęs filtratas užterš geriamo vandens ėmimo šaltinius, yra labai maža. Filtrato kiekis, kuris patenka į paviršinius vandenis, lyginant su bendru vandens kiekiu upėse, taip pat yra nedidelis, todėl filtrato kiekio sumažinimo teigiamas poveikis apskrities upių vandens kokybei būtų nežymus. Tačiau kai kuriais atvejais filtrato poveikis yra labai neigiamas, prie tokių atvejų reikėtų priskirti pagrindinio apskrities sąvartyno filtrato telkinį. Upės Panevėžio apskrityje yra santykinai švarios, pagrindiniai taršos šaltiniai, neskaitant filtrato, yra išleidžiamos valytos ir nevalytos nuotėkos bei tarša iš žemės ūkio veiklos.

Europos Komisijai atliktame tyrime (COWI 2000) siūloma (išvengtos) žalos nuo (išvengtų) nuotėkų apatinė riba lygi 1 eurui savivaldybės kietųjų atliekų tonai ir viršutinė riba, atitinkanti 2 eurus / savivaldybės kietųjų atliekų tonai. Bendras savivaldybės kietųjų atliekų kiekio

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

T I K R A
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

padidėjimas Panevėžio apskrityje yra vertinamas nuo maždaug 80 000 iki maždaug 110 000 tonų per metus. Imant vidurkinę reikšmę 1,5 eurų žemiau aprašoma susidaranti situacija. Metinė ekonominė nauda sumažinus filtrato išleidimą bus 52 700 eurų (181 900 Lt) pirmais naudojimo metais (2009) ir kils iki 69 800 eurų (241 015 Lt) iki 2026.

Metanas

Metanas skatina šiltnamio efektą, todėl jo surinkimas turėtų įtakos globalinio atšilimo efekto sumažinimui, o taip pat būtų gaunama nauda, išvengiant nuostolių, patiriamų dėl globalinio atšilimo efekto. Metanas išlieka atmosferoje eilę metų, tuo ilgus metus neigiamai įtakodamas klimato kaitą. Vis dėl to, bet kokie naudos apskaičiavimai priklauso nuo pasirinktos diskonto normos - kuo aukštesnė diskonto norma, tuo mažesnė žala. Kaip ExternE programos dalis buvo atliktas ypač išsamus metano išskyrimo įtakos vertinimas.

Ecotec et al 2001 metais pateikė Aplinkosauginės Acquis ataskaitą dėl šalių kandidačių į ES veiklos atitikimo šioje ataskaitoje nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams naudos. Šioje ataskaitoje numatoma, kad potencialus metano emisijos iš sąvartynų lygis turi būti tarp 5,271 tonų per metus (žemas lygis) ir 52,714 tonos per metus (aukštas lygis). UNFCC apskaičiavo potencialų metano emisijų sumažinimą - 99,600 tonų per metus. Panevėžio apskrities sąvartyne esančių atliekų kiekis yra panašūs į kitose Lietuvos apskrityse esančius sąvartynus. Apskričiai siūloma atliekų tvarkymo programos strategija taip pat yra panaši į kitų Lietuvos apskričių strategijas. Panevėžio apskrityje gyvena maždaug 10 proc. visų Lietuvos gyventojų, pagrindiniame sąvartyne, kuris bus uždaromas projekto įgyvendinimo metu susidaro apie 69 proc. visos apskrities sąvartynų metano emisijos. Todėl būtų galima pagrįstai teigti, kad 6,9 proc. apskaičiuotos bendros metano emisijos šalies mastu sumažinimas būtų potenciali projekto nauda. Ši vertė svyruotų tarp 140 000 eurų ir 1,4 mln. eurų, priklausomai nuo sumažinimo lygio ir taikomos diskonto normos, vertinant metano emisijos įtaką.

Diskonto norma	**Neoksiduoti vienetai (CH4)** Kaštai / t CH4 - eurais	
	Žemi	Aukšti
0 proc.	527	867
3 proc.	326	413
10 proc.	25	76

Tai yra subjektyvus modeliavimas, tačiau nevaldomas atliekų išmetimas šiai dienai padidino metano skleidimo kylančio iš egzistuojančių sąvartynų tikimybę. 6,9 proc. metano dujų medianinio mato sudaro 2000 tpm. Šią reikšmę padauginus iš žemiausių taikomų kaštų (lentelė viršuje) 50,50 eurų gaunama 101 000 eurų (348 700 litų) per metus suma.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 437199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Ligų plitimas

Nekontroliuojami ir prastai prižiūrimi sąvartynai, nesurenkamos atliekos gali sukurti aplinką, kurioje susidaro sąlygos veistis parazitams. Jei šios potencialios ligų plitimo vietovės nėra atidžiai kontroliuojamos, vietiniai gyventojai gali susidurti su sveikatos pablogėjimo rizika. Tinkamas sąvartynų tvarkymas ir atliekų surinkimas gali sumažinti šią potencialią riziką. Riziką taip pat galima minimizuoti, inicijuojant parazitų naikinimo programas, kurios taip pat būtų reikalingos vykdant projektą, kad ir mažesniu mastu.

Potenciali nauda, gaunama dėl ligų protrūkio paplitimo tikimybės sumažinimo gali būti vertinama naudojant negaliai pritaikytų gyvenimo metų metodiką (disability adjusted life year (DALY)). Šis procesas numato ligų paplitimo pasikeitimus, kurie atsirastų įgyvendinus siūlomą projektą. Ligų paplitimo sumažinimas vertinamas vieno gyventojo metinių pajamų atžvilgiu. Norint atlikti tinkamą tyrimą, vertėtų įvertinti didėjančius gydymo kaštus. Šiame projekte, kaip ir daugelyje kitų, šios naudos kiekybinis įvertinimas yra ypač sudėtingas:

- Duomenys, susiję su parazitų veisimusi sąvartynuose ir parazitų veisimosi dėl neatitinkančio reikalavimo kietųjų atliekų surinkimo proceso nėra prieinami;
- Būtini duomenys apie sveikatą taip pat nepakankami;
- Yra daug veiksnių, įtakojančių ligų paplitimą ir vis dėl to nustatyti priežasties – pasekmės ryšį yra ypač sudėtinga.

Informacijos prieinamumas ir priežasties – pasekmės ryšio su socialine, aplinkos ir sveikatos nauda nustatymas dar nereiškia, kad atliktas šios naudos piniginis vertinimas. Tačiau kietųjų atliekų surinkimo paslauga yra prieinama maždaug 70 proc. gyventojų, įtraukiant 95 proc. miesto gyventojų. Todėl rizika atsirandanti dėl atliekų nesurinkimo ar atliekų surinkimo, nesilaikant nustatytų reikalavimų, yra santykinai maža ir susijusi tik su santykinai maža gyventojų dalimi. Taigi pagrindinis rizikos faktorius – sąvartynai. Dažniausiai sąvartynai yra įrengti palyginti toli nuo apgyvendintų centrų, o tai vėlgi sumažina potencialų ligų paplitimą. Nors ši nauda nebuvo apskaičiuota, planuojama, kad projekto kaštų kontekste ji bus reikšminga.

Nepatogumo vertė (Eko – sistemos)

Tik kelios studijos siekė įvertinti nepatogumą, susijusį su šalinamomis atliekomis. Manoma, kad nepatogumas priklauso nuo gyventojų tankumo bei sąvartyno tipo. Pavyzdžiui, tikėtina, kad sąvartyno, tokio kaip karjeras, nepatogumo poveikis yra santykinai 'pastovus' (būtent - jis nesikeičia radikaliai, kuomet šalinamų atliekų kiekis sąvartyne išauga).

KOPIJA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@prato.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse nėra atlikta studijų, siekiant nustatyti pasiruošimą mokėti dėl prasto sąvartynų tvarkymo atsiradusio nepatogumo vertės keitimo. Italijoje atliktas tyrimas išaiškino gyventojų pasiryžimą mokėti, siekiant sumažinti diskomfortą piniginė išraiška siekė 0,3 euro - 0,5 euro parai/namų ūkiui. Šią vertę taikant Lietuvoje reikėtų įvertinti perkamumo galios pariteto skirtumą. Metinis nepatogumo įtakos vertės sumažinimas Panevėžio apskrityje yra vertinamas maždaug 3.65 mln.[1] eurų (12.6 mln. Lt) per metus. Taip pat turi būti įvertinta ir tai, jog šis regionas per metus pritraukia turistų srautus[2], todėl turi būti įvertintas ir jų pasiryžimas mokėti.

Aplinkosaugos mokesčiai

Lietuvos įstatymuose yra apibrėžtos dvi aplinkosauginių mokesčių rūšys. Nei vienas iš šių mokesčių tiesiogiai nėra susijęs su sąvartynais. Didesni atliekų kiekiai būtų šalinami laikantis "be" projekto scenarijaus Aplinkosauginiai (aplinkos) mokesčiai iš esmės gali buti vertintini kaip lėšų perskirstymas šalies ekonomikoje, tačiau lėšų perskirstymas nesukuria papildomos naudos. Dėl šios priežasties projekto vertinime aplinkosauginiai (ar aplinkos) mokesčiai negali būti vertintini kaip ekonominė nauda.

Bendras aplinkosauginės naudos įvertinimas

Aplinkosauginė nauda yra apskaičiuojama įvertinant gamtinio turto materialinę ir nematerialinę naudą. Ši nauda gali būti vertinama įvairiai ir vienas iš būdų – naudoti atsitiktinio įvertinimo metodą (-us). Šis metodas naudojamas, siekiant nustatyti piniginę vertę, kurią gyventojai, gyvenantys tam tikru atstumu nuo šio turto dislokacijos vietos, būtų pasiryžę mokėti už aplinkos sąlygų pagerinimą. Atskiros vertės nustatomos materialioms ir nematerialioms vertybėms. Šios vertybės dažniausiai yra nustatomos naudojant detalų socio – ekonominį vertinimą bei atliekant pasiryžimo mokėti tyrimą. Tokios studijos Panevėžio apskrityje ar kurioje kitoje Lietuvos vietovėje nebuvo atliktos. Dėl šios priežasties nėra galimybės nustatyti, kuri dalis gyventojų ir kiek būtų pasiryžę mokėti.

Remiantis aukščiau nurodyta globaline nauda, metinė nauda aplinkai svyruoja nuo maždaug 3 mln. eurų (maža vertė) iki 4 mln. eurų per metus (didelė vertė). Tai yra ekvivalentas maždaug 10 eurų gyventojui ir atitinka mažiau kaip 1proc. namų ūkio pajamų. Remiantis aukščiau pateiktais duomenimis galima teigti, kad nauda sveikatai bus tik maža dalis bendros naudos. Nepaisant to, globali aplinkosauginė nauda yra labai susijusi su aplinkosauginiais ir socialiniais faktoriais.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR ĮSTAIGOS SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ
TIKRA
skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čepėjienė

[1] 100.000 namų ūkių 0,05 euro per dieną.
[2] 20.000 naktų

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

3.3.10. Efektyvumas ir išteklių kaštų taupymas

Efektyvumas ir išteklių kaštų taupymo nauda apima:

Padidėjusį surinkimo paslaugų paplitimo lygį

Projekte numatoma didinti atliekų surinkimo paslaugų paplitimo lygį tiek, kad miesto ir kaimo vietovėse būtų pasiektas 100 proc. atliekų surinkimas. Padidėjęs atliekų surinkimo lygis įtakos aplinkosauginę ir patogumo naudas. Tai taip pat sumažins namų ūkių patiriamus kaštus, susijusius su buitinių atliekų šalinimu, nesant galimybės pasinaudoti atliekų surinkimo paslaugomis. Didelė dalis namų ūkių tiesiog veža atliekas į užmiestį (pvz. miškus), kaimo vietovėse atliekos dažnai deginamos, o tai taip pat neigiamai veikia aplinką. Vartotojo mokestis gali būti taikomas kaip tarpinis ekonominės vertės įvertinimas, kad šie namų ūkiai pageidautų naudotis kietųjų atliekų surinkimo paslaugomis. Numatytas paslaugų teikimo išsiplėtimas visoje apskrityje yra vertinamas 10 000 namų ūkių. Metinė ekonominė nauda (vertė 130 Lt /tonai) vertinama maždaug 2,8 mln. Lt (0,8 mln. eurų).

Nauda įsteigus regioninį sąvartyną

Vienas gerai tvarkomas sąvartynas, aptarnaujantis regioną, žymiai naudingesnis aplinkosauginiu atžvilgiu. Vieno sąvartyno atveju yra tik vienas potencialus taršos šaltinis, kuris gali būti daug efektyviau ir patiriant mažesnius kaštus stebimas, o pasklidusi tarša, daug lengviau sutvarkoma.

"Be" projekto scenarijaus atveju, padėtis išliktų ta pati, t.y., būtų palaikoma esama sistema su dideliu sąvartynų skaičiumi. Bet kokiu atveju, ES atliekų ir sąvartyno direktyvų įgyvendinimas būtų būtinas, todėl reikėtų įrengti naujas, ES reikalavimus atitinkančias vietas atliekų šalinimui.

Projekto "be" scenarijaus atveju kiekviename sąvartyne turėtų dirbti atitinkamas skaičius žmonių, naudojama tinkama įranga. Šis naudos komponentas yra aptariamas žemiau, kalbant apie valdymo ir personalo veiklos efektyvumą.

Perdirbimo ir kompostavimo nauda

Perdirbant ir kompostuojant atliekas gaunama dviguba nauda:

- Sąvartyno eksploatavimo laiko pailginimas

Numatoma, kad projekto ataskaitinio laikotarpio metu maždaug 30 proc. komunalinių atliekų (660 000 tonų, per 22 metus) bus perdirbtos ar kompostuotos. Projekto "be" scenarijuje, šį kiekį reikėtų šalinti sąvartyne. Papildomi šalinamų atliekų kiekiai padidintų kapitalo ir veiklos kaštus. Šios naudos esamoji vertė (be papildomų sutvarkymo kaštų) yra maždaug 21 mln. Lt (taikant 5 proc. diskonto normą).

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čaplėjienė 2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432 [illegible] el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

- Antrinių žaliavų pardavimas

Antra naudos rūšis, gaunama iš antrinių žaliavų ir kompostavimo yra vertė, kurią galima gauti šias medžiagas parduodant ar pakartotinai panaudojant.

Planuojama, kad per 22 programos metų surinktų antrinių žaliavų kiekis (be bioatliekų) didės maždaug iki 27 000 tonų per metus. Numatoma, kad popieriaus žaliavos sudarys atitinkamai maždaug 60 proc. bendro kiekio, stiklas – 25 proc., metalai – 10 proc. ir plastikas (buteliai) 5 proc.

Kai kuriose Lietuvos vietovėse, o taip pat ir Panevėžio apskrityje yra galimybė parduoti antrines žaliavas. Tačiau šios rinkos yra labai mažos, o antrinių žaliavų kiekiai labai maži lyginant juos su bendrais atliekų kiekiais Panevėžio apskrityje, o ir visoje šalyje. Šiose rinkose taip pat dažniausiai superkamos tik aukščiausios rūšies medžiagos, taigi įvertinant rinkos struktūrą ir kainas, ateityje nauda nebus labai didelė. Daugumoje Vakarų Europos šalių antrinių žaliavų rinkos yra išvystytos. Kai kuriomis antrinėmis žaliavomis yra prekiaujama tarptautinėse rinkose, todėl kaina visur maždaug panaši. Supirkimo kainos Didžiojoje Britanijoje:

Stiklas	40 Lt - 130 Lt už vieną toną mišraus stiklo laužą, 150 Lt už vieną toną skaidraus stiklo laužą;
Popierius	vertinamas gamintojo kainomis ir supirkimo kainomis. Daroma prielaida, kad Panevėžyje prekybos kaina maždaug lygi 125 Lt už vieną toną.
Plastikas	spalvotų PET butelių 200 - 400 Lt už vieną toną;
Juodieji metalai	tarp 25 Lt ir 345 Lt už vieną toną.

Lietuvos bei kaimyninių šalių rinkos nėra išvystytos, todėl nėra realu, kad iš pat pradžių būtų galima gauti aukščiau nurodytas kainas. Visoje Lietuvoje sparčiai vystantis antrinių žaliavų surinkimui, būtų tikimasi jų perteklinės pasiūlos. Lyginant su kitomis Rytų Europos šalimis, jose taip pat sparčiai auga antrinių žaliavų surinkimo normos, todėl manoma, kad vietinėse eksporto rinkose taip pat atsiras perteklinės pasiūlos tendencija. Antrinių žaliavų transportavimo į Vakarų Europą kaštai gali būti neįperkami ar bent jau santykinai didesni Lietuvoje (mažesni kiekiai/ didesni atstumai) nei kitose šalyse, pvz. Lenkijoje. Esant tokiai padėčiai rinkoje, pradžioje tikimasi, kad kainos sieks 50 proc. aukščiau nurodytų kainų, per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

- Komposto pardavimas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Planuojama, kad atliekų kiekis, kuris būtų kompostuojamas, nuolat didės maždaug 5000 tonų per metus. Atliekų kiekis yra santykinai mažas. Rinkos, komposto pardavimui, kaip ir antrinių žaliavų rinkos, nėra susiformavusios. Šioms rinkoms susikurti ir įsitvirtinti reikės laiko bei gyventojų pasiryžimo mokėti už kompostavimą. Dėl nedidelių apimčių ir dažniausiai nedidelės komposto vertės ši potenciali nauda nėra įvertinta.

3.3.11. Jautrumas ir rizikos analizė

Ekonominis projekto įgyvendinamumas stipriai susijęs su šiais aspektais:

- Ekonominės naudos aplinkai vertinimas

Vertinama pagal šios naudos žemesniąją ribą. Jei būtų remiamasi viršutine riba ekonominė vidinė grąžos norma išaugtų apytiksliai 10 procentų.

- Išteklių ir veiklos kaštų taupymo įvertinimas

Taikomos konservatyvios prielaidos. Planuojama, jog antrinių žaliavų rinkos, konkrečiai įvertinant kainą, kurią galima gauti už antrines žaliavas, plėsis labai tolygiai. Optimistinės šios rinkos plėtros prognozės galėtų padidinti ekonominę vidinę grąžos normą iki 1 - 2 procentų.

- Naudos įvertinimas

Analizė parodė, kad nauda, gauta iš pajamų lygio (nepatogumo nauda) išlieka pastovi vertinamu periodu. Tačiau tikimasi, kad realios pajamos taip pat padidės. Šias pajamas turėtų padidinti sumos, kurias gyventojai būtų pasiruošę mokėti už aplinkos būklės pagerinimą, o tai pat šias pajamas padidintų užmokesčio darbuotojams skirtumas tarp "be" ir "su" projekto scenarijų.

Ekonominis projekto pagrindimas gali būti pakoreguotas, pakeitus prielaidas, kuriomis remiantis buvo atliktas ekonominės naudos įvertinimas. Projektas buvo įvertintas, remiantis labai konservatyviomis prielaidomis.

3.3.12. Ekonominės analizės išvados

Projektas buvo rengiamas, remiantis ES įstatymine baze ir stojimo reikalavimais. Didžioji dalis (85 proc.) kapitalo kaštų trumpalaikėje perspektyvoje yra skirti pakeisti prastą atliekų paslaugų teikimo veiklos sistemą. Tai suteiktų visokeriopos ekonominės naudos. Didelė dalis šios naudos pasireikštų aplinkos būklės pagerėjimu, todėl šios naudos pavertimas pinigine verte yra labai subjektyvus ir reikalautų detalesnio ekonominio įvertinimo. Nepaisant to, siūlomos tvarkymo sistemos užtikrintų pakankamą ekonominio augimo lygį.

Esamoji kapitalo kaštų vertė yra 81,0 mln. Lt, taikant 5 proc. socialinę diskonto normą. Kaštai daugiausia apima esamų sąvartynų sutvarkymo kapitalo kaštus ir atliekų surinkimo paslaugų

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 462109, el. paštas info@pratc.lt

teikimo kaštus. Kiti projekto komponentai, įtraukiant naują sąvartyną, antrinių žaliavų perdirbimo ir kompostavimo veiklą apytiksliai vertinami viena trečiąja visų projekto kaštų.

Apskaičiuota projekto nauda yra 221,9 mln. Lt, taikant 5 proc. socialinę diskonto normą. Nauda daugiausia apima diskomforto naudą ir naudą atsiradusią dėl padidėjusio efektyvumo, naudojant vieną sąvartyną ir tinkamą atliekų surinkimo sistemą. Kiekybiškai išreikšta nauda neįvertina naudos dėl sveikatos pagerėjimo ir kompostavimo veiklos. Nustatant ekonominę naudą, pagrinde buvo naudojamos konservatyvios prielaidos.

Pagrindiniai ekonominio įgyvendinamumo parametrai yra šie:

- Naudos / kaštų santykis 2,74
- Ekonominė vidinė grąžos norma 33,8 proc.
- Ekonominė grynoji dabartinė vertė (5 proc. diskonto norma) 140,9 mln. Lt

Detalūs projekto ekonominių rodiklių skaičiavimai pateikiami 20 priede.

Projekto analizė rodo, kad projekto vidinė grąža yra teigiama t.y. projektas socialiniu – ekonominiu požiūriu yra pageidaujamas - „pelningas". Didžioji dalis projekto socialinės – ekonominės naudos patiriama ilguoju laikotarpiu, kitos naudos įvertinimas yra labai subjektyvus. Ekonominės analizės rezultatai leidžia teigti, kad projektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus. Siekiant įvertinti įtaką projekto išlaidoms bei naudai buvo atlikta jautrumo ir rizikos analizė.

Ženkliai teigiama projekto ekonominė grynoji dabartinė vertė, kartu su ženkliai už taikytą socialinę diskonto normą didesne ekonomine vidinės grąžos norma pagrindžia projekto socialinę – ekonominę naudą net taikant konservatyvias prielaidas. Projekto naudos ir išlaidų santykis taip pat yra ženkliai didesnis už 1, kas reiškia, kad projekto teikiama nauda yra didesnė nei visos projekto išlaidos, ir projektas yra naudingas visuomenei.

Analizės pradžioje iškeltas tikslas pasiektas, atlikta projekto ekonominė analizė pagrindžia projekto socialinę – ekonominę naudą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

4. Projekto viešinimas

Visuomenės aplinkosaugos švietimas ir informavimas – vienas iš svarbiausių aplinkos apsaugos uždavinių ir pagrindinių visuomenės dalyvavimo realizuojant aplinkos apsaugos tikslus garantų. Visuomenės informavimo ir švietimo paslauga skirta tikslinių auditorijų (regiono fizinių ir juridinių asmenų: įmonių, gyventojų, bendruomenių, seniūnijų ir t.t.) informavimui ir švietimui bei pozityvios nuomonės formavimui apie kuriamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą per visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

Visuomenės informavimo ir švietimo paslaugos tikslai:

- ✓ Supažindinti gyventojus su kuriama regionine atliekų tvarkymo sistema ir formuoti teigimą nuomonę:
  - Kodėl reikalinga regioninė atliekų tvarkymo sistema;
  - Kaip diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema;
  - Kas finansuoja naujos regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą.
- ✓ Siekti, kad gyventojai žinotų ir turėtų teigiamą nuomonę apie atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, o taip pat, kad suvoktų:
  - Kodėl svarbu rūšiuoti atliekas;
  - Kaip jas teisingai rūšiuoti;
  - Kaip ir kur šalinti perdirbimui tinkamas medžiagas;
  - Padėti gyventojams suprasti, kodėl už skirtingą atliekų tvarkymą reikia susimokėti.
- ✓ Skatinti gyventojus atskirti pavojingas atliekas iš bendro komunalinio atliekų srauto ir siekti, kad tai jie suprastų ir teigiamai vertintų:
  - Kodėl svarbus pavojingų atliekų atskyrimas;
  - Kaip teisingai atskirti pavojingas atliekas;
  - Kaip ir kur šalinti pavojingas atliekas.

Informavimo programos tikslai:

- ✓ Informuoti apie projekto įgyvendinimo laikotarpiu vykstančius kitus svarbiausius darbus atliekų tvarkymo sektoriuje;
- ✓ Informuoti apie planuojamą įvesti atliekų surinkimo rinkliavą;
- ✓ Informuoti gyventojus apie Lietuvos atliekų tvarkymui teikiamą ES paramą, pabrėžiant šios teikiamos paramos svarbą ir naudą.

4.1. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamo projekto viešinimas

Lentelė Nr. 24 Projekto viešinimo priemonės

Eil. Nr.	*Priemonės pavadinimas*	*Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslai ir siekiami rezultatai*	*Priemonės platinimo kanalas, data*	*Priedai*
1	*Visuomenės informavimo kompanijų analizė*	*Išanalizuoti vykdytas visuomenės informavimo kampanijas šalyje, įvertinti jų trūkumus ir privalumus, suformuoti išvadas ir siūlymus visuomenės*	*Neplatinamas UAB PRATC naudojimui*	Ataskaita (Priedas CD1 Nr. 21)

TIKRA
skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

		informavimo kampanijai Panevėžio apskrityje. Kiekis – 1 ataskaita		
2	***Panevėžio regiono gyventojų sociologinė apklausa***	*Tikslas – palyginti visuomenės informuotumą ir požiūrio į projektą kitimą. Kiekis – 4 apklausos*	*Panevėžio regiono gyventojai*	2006 m. atliktos apklausos ataskaita (Priedas CD1 Nr. 22)
				2007 m. atliktos apklausos ataskaita (Priedas CD1 Nr. 23)
				2008 m. atliktos apklausos ataskaita (Priedas CD1 Nr. 24)
				2009 m. atliktos apklausos ataskaita (Priedas CD1 Nr. 25)
3	***Susitikimai su bendruomenėmis***	*Projekto pristatymas vietos bendruomenei, susipažinimas su gyventojų lūkesčiais, esamomis problemomis, požiūriu atliekų tvarkymo klausimais. Kiekis – 42 susitikimai.*	Susitikimas su Panevėžio miesto bendrijų pirmininkais (2006 12 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 26)
			Susitikimas su Biržų raj. Nemunėlio Radviliškio bendruomene (2006 12 13)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 27)
			Susitikimas su Kupiškio raj. Alizavos bendruomene (2006 12 19)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 28)
			Susitikimas su Panevėžio raj. Raguvos bendruomene (2007 01 16)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 29)
			Susitikimas su Kupiškio raj. Skapiškio bendruomene (2007 02 14)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 30)

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pranc.lt

KOPIJA TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29 141
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Susitikimas su Rokiškio raj. Pandėlio bendruomene (2007 03 14)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 31)
			Susitikimas su Rokiškio raj. Kazliškio bendruomene (2007 03 14)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 32)
			Susitikimas su Panevėžio raj. Vadoklių bendruomene (2007 03 16)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 33)
			Susitikimas su Panevėžio kolegijos bendruomenės nariais (2007 03 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 34)
			Susitikimas su Pasvalio raj. Daujėnų bendruomene (2007 03 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 35)
			Susitikimas su Pasvalio raj. Girsudų bendruomene	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 36)
			Susitikimas su Biržų raj. Vabalninko bendruomene (2007 03 27)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 37)
			Susitikimas su Panevėžio rajono bendruomenių pirmininkais (2008 03 06)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 38)
			Susitikimas su Biržų rajono Kirdonių bendruomene (2008 04 09)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 39)
			Susitikimas su Pasvalio rajono Deglėnų bendruomene (2008 04 09)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 40)
			Susitikimas su Rokiškio rajono Kamajų bendruomene (2008 04 11)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 41)
			Susitikimas su Kupiškio rajono Juodpėnų bendruomenė (2008 04 11)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 42)
			Susitikimas su Pasvalio rajono Pušaloto	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS

TIKRA
...ų jaus vedėja
...dona Čeplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			bendruomene (2008 09 22)	(Priedas CD1 Nr. 43)
			Susitikimas su Pasvalio rajono Joniškėlio bendruomene (2008 09 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 44)
			Susitikimas su Rokiškio rajono Juodupės bendruomene (2008 10 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 45)
			Susitikimas su Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties bendruomene (2008 10 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 46)
			Susitikimas su Kupiškio rajono Šepetos bendruomene (2008 10 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 47)
			Susitikimas su Kupiškio rajono Subačiaus bendruomene (2008 10 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 48)
			Susitikimas su Biržų rajono Medeikių bendruomene (2008 11 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 49)
			Susitikimas su Biržų rajono Gulbinų bendruomene (2008 11 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 50)
			Susitikimas su Panevėžio miesto Suaugusių mokymo centras bendruomene (2008 11 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 51)
			Susitikimas su Panevėžio rajono Naujarodžių miestelio bendruomene „Žėlupė"(2008 11 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 52)
			Susitikimas su Panevėžio rajono Krekenavos miestelio bendruomene „Tiltas"(2008 11 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 53)
			Susitikimas su Panevėžio rajono Smilgių kaimo bendruomene „Bitė"(2008 11 26)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 54)

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@prate.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Susitikimas su Panevėžio miesto sodininkų bendrija (2008 11 26)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 55)
			Susitikimas su Pasvalio rajono Saločių bendruomene (2009 02 18)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 56)
			Susitikimas su Biržų rajono Rinkuškių bendruomene (2009 02 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 57)
			Susitikimas su Rokiškio raj. Kavoliškio bendruomene (2009 03 17)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 58)
			Susitikimas su Panevėžio raj. Perekšlių bendruomene (2009 03 19)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 59)
			Susitikimas su Kupiškio raj. Noriūnų bendruomene (2009 03 24)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 60)
			Susitikimas su Panevėžio kolegijos aplinkos apsaugos ir statybos katedros bendruomene (2009 09 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 61)
			Susitikimas su Panevėžio gausių šeimų bendrija „Šeimyna" (2009 09 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 62)
			Susitikimas su Panevėžio miesto politikių klubu „Veiklios moterys" (2009 09 16)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 63)
			Susitikimas su Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos nariais (2009 09 25)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 64)
			Susitikimas su Biržų rajono Papilio bendruomene (2009 10 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 65)
			Susitikimas su Kupiškio rajono Palevenėlės	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS

TIKRA
vedėja
2011 -06- 29
Ariona Čepléjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			bendruomene (2009 10 06)	(Priedas CD1 Nr. 66)
			Susitikimas su Rokiškio rajono bibliotekininkų bendruomene (2009 10 06)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 67)
4	***Susitikimai su interesų grupėmis***	*Tikslas – kokybiškai atnaujinti esamą pratc.lt tinklapį ir teikti aktualią informaciją tiek bendrovės, tiek įgyvendinamo projekto eigos klausimais. Kiekis – 25 susitikimai*	Panevėžio apskrities savivaldybių atstovai (2006 11 30)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 68)
			Pasvalio raj. Vaškų vidurinė mokykla (2006 12 15)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 69)
			Rokiškio raj. ekologų klubas „Medeina" (2007 01 30)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 70)
			Panevėžio miesto A. Lipniūno vid mokykla (2007 03 01)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 71)
			Pasvalio raj. Saločių vid. mokykla (2007 03 01)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 72)
			Rokiškio raj. Pandėlio gimnazija (2007 03 14)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 73)
			Panevėžio raj. Vadoklių vid. mokykla (2007 03 16)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 74)
			Panevėžio m. Vilties vid. mokykla (2007 03 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 75)
			Panevėžio r. Upytės pagr. Mokykla (2007 03 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 76)
			Vabalninko (Biržų raj.) B. Sruogos vid. mokykla (2007 03 27)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 77)

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

2011 -06- 29 145

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Biržų Aušros vid. mokykla (2007 03 27)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 78)
			Kupiškio raj. Skapiškio vid. mokykla (2007 03 29)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 79)
			Kupiškio raj. Subačiaus vid. mokykla (2007 03 29)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 80)
			Pasvalio rajono seniūnijų seniūnai (2007 10 18)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 81)
			Biržų rajono seniūnijų seniūnai (2007 10 18)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 82)
			Panevėžio rajono seniūnijų seniūnai (2007 10 26)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 83)
			Rokiškio rajono seniūnijų seniūnai (2007 10 26)	Susitikimo dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 84)
			Kupiškio rajono seniūnijų seniūnai (2007 11 28)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1Nr. 85)
			Panevėžio Gamtos mokykla (2007 11 28)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 86)
			Panevėžio m. Senvagės m-kla (2008 09 22)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 87)
			Pasvalio raj. Joniškio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinės m-kla (2009 02 18)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 88)
			Biržų raj. Pabiržės pagrindinės m-kla (2009 02 20)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 89)
			Rokiškio raj. Panemunėlio	Susitikimo nuotraukos

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

146

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			pagrindinė mokykla (2009 03 17)	ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 90)
			Panevėžio raj. Naujamiesčio vid. mokykla (2009 03 19)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 91)
			Kupiškio raj. Noriūnų J.Černiaus pagrindinė mokykla (2009 03 24)	Susitikimo nuotraukos ir dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 92)
5	***Publikacijos nacionaliniuose dienraščiuose***	*Informuoti Lietuvos ir Panevėžio apskrities visuomenę apie projekto svarbą ir jo rezultatus.*	Dienraštis „L.T" (2006 12 27)	„Panevėžio regione kuriama nauja atliekų tvarkymo sistema" (Priedas CD1 Nr. 93)
			Dienraštis „L.T" (2006 12 29)	„Panevėžiečiai šviesti visuomenę apie atliekų tvarkymo svarbą pradeda nuo bendruomenių ir mokinių" (Priedas CD1 Nr. 94)
			Dienraštis „Lietuvos žinios" (2009 07 24)	„Atidarytas naujasis Panevėžio regiono sąvartynas" (Priedas CD1 Nr. 95)
			Dienraštis „Lietuvos žinios" (2009 10 15)	„Baigiama įgyvendinti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema" (Priedas CD1 Nr. 96)
6	***Publikacijos apskrities, regioninėje, vietos spaudoje***	*Pateikti regiono gyventojams informaciją apie svarbius projekto vykdymo etapus bei projekto naudą.*	*Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai" (2006 12 07)*	„Panevėžio regiono gyventojai supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema" (Priedas CD1 Nr. 97)
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis" (2006 12 07)	„Panevėžio regiono gyventojai supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema" (Priedas CD1 Nr. 98)
			Kupiškio rajono laikraštis	„Panevėžio regiono

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEKTINĖ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiūvienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

2011 -06- 29

147

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			„Kupiškio žinios“ (2006 12 09)	gyventojai supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema“ (Priedas CD1 Nr. 99)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“ (2006 12 28)	„UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras pristato ateities planus Alizavos bendruomenei“ (Priedas CD1 Nr. 100)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2006 12 30)	„Vaškų vidurinės mokyklos vaikai mokosi rūšiuoti atliekas“ (Priedas CD1 Nr. 101)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 02 14)	„Jaunieji Rokiškio ekologai domisi atliekų tvarkymu“ (Priedas CD1 Nr. 102)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 02 24)	„UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras pristato ateities planus Skapiškio bendruomenei“ (Priedas CD1 Nr. 103)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 02 24)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“ (Priedas CD1 Nr. 104)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 02 26)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“ (Priedas CD1 Nr. 105)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2007 02 28)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar“ (Priedas CD1 Nr. 106)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			02 28)	spręsti dabar" (Priedas CD1 Nr. 107)
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė" (2007 02 28)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar" (Priedas CD1 Nr. 108)
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis" (2007 03 01)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar" (Priedas CD1 Nr. 109)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys" (2007 03 01)	„Seni sąvartynai – problema, kurią turime spręsti dabar" (Priedas CD1 Nr. 110)
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis" (2007 03 08)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link" (Priedas CD1 Nr. 111)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis" (2007 03 08)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link" (Priedas CD1 Nr. 112)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai" (2007 03 08)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link" (Priedas CD1 Nr. 113)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas" (2007 03 08)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link" (Priedas CD1 Nr. 114)
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė" (2007 03 10)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link" (Priedas CD1 Nr. 115)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas" (2007 03 10)	„Su atliekų rūšiavimu susipažino dar viena mokykla" (Priedas CD1 Nr. 116)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios" (2007	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEKTIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čaplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			03 10)	kokybės gerinimo link" (Priedas CD1 Nr. 117)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas" (2007 03 16)	„Jaunieji Panevėžio ekologai domisi atliekų tvarkymu" (Priedas CD1 Nr. 118)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis" (2007 03 20)	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas pristatomas Rokiškio rajono bendruomenėms"(Priedas CD1 Nr. 119)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis" (2007 03 21)	„Atliekų tvarkymo patarimai Pandėlio gimnazijos moksleiviams" (Priedas CD1 Nr. 120)
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė" (2007 03 21)	„Aktyviausiems Vadoklių mokiniams – PRATC suvenyrai"(Priedas CD1 Nr. 121)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas" (2007 03 27)	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas pristatomas ir atokesniuose kampeliuose įsikūrusioms bendruomenėms" (Priedas CD1 Nr. 122)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas" (2007 03 28)	„Busimieji Panevėžio kolegijos aplinkos inžinieriai susipažino su rengiama Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema" (Priedas CD1 Nr. 123)
	LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS	TIKRA vedėja 2011-06-29 Aldona Čeplėjienė	Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė"(2007 03 28)	„Upytėje A. Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai mokėsi rūšiuoti atliekas"(Priedas CD1 Nr. 124)

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2007 03 31)	„Iš moksleivių lūpų – ne tik klausimai, bet ir patarimai Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui“(Priedas CD1 Nr. 125)
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis“(2007 04 03)	„Vabalninko B. Sruogos mokyklos mokiniai mokėsi teisingai rūšiuoti atliekas“ (Priedas CD1 Nr. 126)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 04 03)	„Atliekų tvarkymo tema svarbi ir Biržų moksleiviams“ (Priedas CD1 Nr. 127)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 04 04)	„UAB PRATC susitikimas su mokiniais – Subačiaus gimnazijoje“(Priedas CD1 Nr. 128)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 04 05)	„Dvi Pasvalio rajono bendruomenės susipažino su atliekų tvarkymo sistema“ (Priedas CD1 Nr. 129)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2007 04 07)	„Skapiškio mokyklos mokiniai mokėsi rūšiuoti atliekas“ (Priedas CD1 Nr. 130)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 04 18)	„Atliekų rūšiavimas – žingsnis gyvenimo kokybės gerinimo link“(Priedas CD1 Nr. 131)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“(2007 04 21)	„Paskutinis šį pusmetį UAB PRATC susitikimas su bendruomenėmis – Vabalninko miestelyje“ (Priedas CD1 Nr. 132)

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, AUDITO IR VIDAUS KONTROLĖS SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėlienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 04 21)	„Piešinių konkurse Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ auklėtinis pelnė antrą vietą“ (Priedas CD1 Nr. 133)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“ (2007 04 22)	„Gražiausi atliekų konteineriai – Panevėžio lopšelio – darželio auklėtinių piešiniuose“(Priedas CD1 Nr. 134)
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis“ (2007 04 24)	„Biržų lopšelio – darželio auklėtinei – trečioji vieta gražiausio konteinerio piešinių konkurse“ (Priedas CD1 Nr. 135)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“(2007 05 19)	„Didžiosios atliekos – į specialias aikšteles“(Priedas CD1 Nr. 136)
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2007 05 19)	„Didžiosios atliekos – į specialias aikšteles“(Priedas CD1 Nr. 137)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“(2007 05 22)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“ (Priedas CD1 Nr. 138)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 05 22)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“ (Priedas CD1 Nr. 139)
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2007 05 23)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“ (Priedas CD1 Nr. 140)
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“(2007 05 23)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“ (Priedas CD1 Nr. 141)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“(2007 05	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“ (Priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepiėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			23)	CD1 Nr. 142)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“(2007 05 24)	„Rūšiavimas turėtų tapti įpročiu“ (Priedas CD1 Nr. 143)
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“(2007 06 06)	„Apskrities viršininko administracijoje atidaryta piešinių paroda“ (Priedas CD1 Nr. 144)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2007 10 25)	„Prasidėjo rudenį planuotas PRATC susitikimų ciklas“ (Priedas CD1 Nr. 145)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2007 10 25)	„Susitikimų ciklas – jau prasidėjo“ (Priedas CD1 Nr. 146)
			Panevėžio miesto laikraštis “Sekundė“(2007 11 13)	„Įsibėgėjo PRATC susitikimų ciklas su seniūnais“ (Priedas CD1Nr. 147)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“(2007 11 13)	„Atliekų tvarkymo sistema domėjosi ir Rokiškio seniūnai“ (Priedas CD1 Nr. 148)
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2007 12 07)	„Panevėžio moksleiviai mokėsi rūšiuoti atliekas“ (Priedas CD1 Nr. 149)
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2008 01 17)	„Moksleiviai mokosi rūšiuoti atliekas ir piešdami“ (Priedas CD1 Nr. 150)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 01 17)	„Salamiesčio pagrindinės mokyklos penktokai – komiksų konkurso prizininkai“(Priedas CD1 Nr. 151)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2008	„Rūpinimąsi aplinka vaikai išreiškė kurdami

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA * KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
IKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			01 17)	komiksus apie atliekų tvarkymą(Priedas CD1 Nr. 152)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 01 17)	„Komiksų konkurse atliekų tvarkymo tema pirmąją vietą laimėjo Biržų moksleiviai(Priedas CD1 Nr. 153)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2008 01 19)	„Komiksų konkurse pasvalietė ketvirtoké užėmė antrąją vietą“(Priedas CD1 Nr. 154)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 01 26)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse“(Priedas CD1 Nr. 155)
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“ (2008 01 29)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse(Priedas CD1 Nr. 156)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2008 01 29)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse(Priedas CD1 Nr. 157)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 01 31)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse(Priedas CD1 Nr. 158)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2008 01 31)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse“ (Priedas CD1 Nr. 159)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 02 19)	„Komiksų konkurse apie atliekų tvarkymą aktyviausi buvo

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

154

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				panevėžiečiai (Priedas CD1 Nr. 160)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 02 19)	„Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos neleis paskęsti šiukšlėse(Priedas CD2 Nr. 161)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 02 28)	"Nauji rūšiuotinų atliekų konteineriai - jau ir Kupiškio rajone"(Priedas CD1 Nr. 162)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“(2008 03 06)	„Nauji rūšiuotinų atliekų konteineriai – jau ir Kupiškio rajone“ (Priedas CD1 Nr. 163)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ (2008 04 16)	„Nauja atliekų tvarkymo sistema domina Kamajų miestelio gyventojus“ (Priedas CD1 Nr. 164)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“(2008 04 17)	„Dar šiemet Rokiškyje – didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė“ (Priedas CD1 Nr. 165)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 04 17)	„Pradėtas trečiasis susitikimų ciklas“ (Priedas CD1 Nr. 166)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“(2008 04 17)	"Dar šiemet Biržuose - didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė"(Priedas CD1 Nr. 167)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 04 17)	Jau trečia Kupiškio rajono bendruomenė susitinka su PRATC atstovais"(Priedas CD1 Nr. 168)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“ (2008 04 17)	"Dar šiemet Kupiškyje - didžiųjų atliekų surinkimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TARNYBA
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				aikštelė"(Priedas CD2 Nr. 169)
			Pasvalio rajono laikraštis „Pasvalio balsas“ (2008 04 17)	"Švaros mėnuo kartu su apskrities bendruomenėmis“ (Priedas CD1 Nr. 170)
			Pasvalio rajono laikraštis „Pasvalio balsas“ (2008 04 17)	"Dar šiemet Pasvalyje - didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė"(Priedas CD1 Nr. 171)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 04 18)	„Didžiųjų atliekų šalinimo vieta – surinkimo aikštelėse"(Priedas CD1 Nr. 172)
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2008 04 19)	"Švaros mėnuo kartu su apskrities bendruomenėmis“ (Priedas CD1 Nr. 173)
			Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (2008 04 26)	„Didžiųjų atliekų šalinimo vieta – surinkimo aikštelėse"(Priedas CD1 Nr. 174)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 05 24)	„Naujajame sąvartyne netrukus suūš statybininkų technika““(Priedas CD1 Nr. 175)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai“ (2008 05 31)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“(Priedas CD1 Nr. 176)
	LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS	TIKRA Skyriaus vedėja 2011 -06- 29 Aldona Čepėjienė	Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“(2008 06 03)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“(Priedas CD1 Nr. 177)

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Pasvalio rajono laikraštis „Pasvalio balsas“(2008 06 05)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“(Priedas CD1 Nr. 178)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios“(2008 06 05)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“(Priedas CD1 Nr. 179)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“(2008 06 09)	„Vaikų sukurtos sentencijos skatina rūšiuoti atliekas ir saugoti aplinką“(Priedas CD1 Nr. 180)
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“(2008 06 17)	„Pradėtas statyti Panevėžio regiono sąvartynas“(Priedas CD1 Nr. 181)
			Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ (2008 09 27)	„Pušaloto bendruomenės nariai domėjosi naująja atliekų tvarkymo sistema (Priedas CD1 Nr. 182)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“ (2008 09 29)	„Panevėžio Senvagės pagrindinės mokyklos pradinukai – geriausi gamtos draugai“(Priedas CD1 Nr. 183)
			Pasvalio rajono laikraštis „Pasvalio balsas“(2008 09 30)	„Nauja atliekų tvarkymo sistema aktuali ir Joniškėlio gyventojams“(Priedas CD1 Nr. 184)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“(2008 10 25)	„Panemunėlio geležinkelio stoties bendruomenė susitiko su UAB Panevėžio

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				regiono atliekų tvarkymo centras atstovais"(Priedas CD1 Nr. 185)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškio žinios" (2008 10 28)	„Subačiaus bendruomenė – viena aktyviausių Kupiškio rajone"(Priedas CD1 Nr. 186)
			Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis"(2008 10 28)	„Naujai kuriamai atliekų tvarkymo sistemai – juodupiečių dėmesys(Priedas CD1 Nr. 187)
			Kupiškio rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys"(2008 10 28)	„Šepetos miestelio gyventojai domėjosi nauja atlieka tvarkymo sistema(Priedas CD1 Nr. 188)
			Biržų rajono laikraštis „Šiaurės rytai"(2008 11 20)	„Medikių miestelio bendruomenės nariai susitikimo su PRATC atstovu"(Priedas CD1 Nr. 189)
			Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis"(2008 11 20)	„Susitikime Gulbinų kaime virė karštos diskusijos su PRATC atstovu"(Priedas CD1 Nr. 190)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas"(2008 11 24)	„Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė susitiko su PRATC atstovu"(Priedas CD1 Nr. 191)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas"(2008 12 10)	„Naujarodžių bendruomenės „Žėlupė" nariai išgirdo apie kuriamą atliekų tvarkymo sistemą"(Priedas CD1 Nr. 192)

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS
TIKRA Skyriaus vedėja Aldona Čaplėjienė 2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“(2008 12 10)	„Krekenavos bendruomenė „Tiltas“ susitikimo su PRATC atstovu“(Priedas CD1 Nr. 193)
			Panevėžio miesto laikraštis „Sekundė“(2008 12 11)	„Panevėžio sodų bendrijų pirmininkai aktyviausiai domėjosi kuriama regiono atliekų tvarkymo sistema(Priedas CD1 Nr. 194)
			Panevėžio miesto laikraštis „Panevėžio balsas“(2008 12 11)	„Smilgių miestelio bendruomenė „Bitė“ – viena aktyviausių Panevėžio rajono bendruomenių (Priedas CD1 Nr. 195)
			Pasvalio raj. laikraštis „Darbas“(2009 03 03)	„Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės mokykloje – PRATC viktorina“ (Priedas CD1 Nr. 196)
			Biržų raj. laikraštis „Šiaurės rytai“(2009 03 03)	„PRATC atstovai lankė Biržų rajono bendruomenes“(Priedas CD1 Nr. 197)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“(2009 04 01)	„Panevėžio rajono bendruomenės susitiko su PRATC atstovais“(Priedas CD1 Nr. 198)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“(2009 04 02)	„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema – įgyvendinimas vyksta sklandžiai“(Priedas CD1 Nr. 199)
	LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORUPCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS	TIKRA Skyriaus vedėja 2011-06-29 Aldona Čaplėjienė	Rokiškio miesto ir rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“(2009 04 07)	„Rokiškio rajono bendruomenėms – paskaitos apie naują atliekų tvarkymo sistemą“(Priedas CD1

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

159

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				Nr.200)
			Biržų raj. laikraštis „Šiaurės rytai“(2009 07 28)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę(Priedas CD1 Nr.201)
			Pasvalio raj. laikraštis „Darbas“(2009 08 06)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę“ (Priedas CD1 Nr.202)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“(2009 08 11)	„Liepą atidarytas naujasis Panevėžio regiono sąvartynas“(Priedas CD1 Nr.203)
			Rokiškio miesto ir rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“(2009 08 06)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę(Priedas CD1 Nr.204)
			Kupiškio miesto ir rajono laikraštis „Kupiškėnų mintys“(2009 08 11)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę(Priedas CD1 Nr.205)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“(2009 08 11)	„Vežkime didžiąsias atliekas į didžiųjų atliekų aikštelę(Priedas CD1 Nr.206)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“(2009 09 16)	„Asbesto turinčios atliekos priimamos Panevėžio regioniniame sąvartyne(Priedas CD1 Nr.207)
			Rokiškio miesto ir rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“(2009 10 13)	„Kur priimamos didžiosios, žaliosios ir pavojingos atliekos?“(Priedas CD1 Nr.208)
			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Sekundė“(2009 10 16)	„Panevėžio apskrityje daugėja rūšiuojančių atliekas“(Priedas CD1 Nr.209)

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas“(2010 10 07)	„Regioninis sąvartynas veikia visu pajėgumu“ (Priedas Nr. 307, 1 lapas)
7	***Pranešimai spaudai***	*Platinti informaciją visais svarbiais projekto vykdymo etapais visą projekto vykdymo laikotarpį. Kiekis – 29 pranešimai*	BNS, Elta, Aina, Biznews (2006 11 27)	„Atliekų tvarkymosi mokėsi Švedijoje“ (Priedas Nr. 210)
			2006 12 01	Panevėžio regiono gyventojai bus supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema“ (Priedas Nr. 211)
			2006 12 22	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras pristato atliekų tvarkymo sistemą apskrities bendruomenėms (Priedas Nr. 212)
			2007 01 05	„Panevėžiečiams rūpi aplinkosauga, bet atliekas rūšiuoti dar reikia išmokti“ (Priedas Nr. 213)
			2007 01 30	„Raguvos gyventojai domisi kuriama atliekų tvarkymo sistema“ (Priedas Nr.214)
			2007 03 05	„2006 metais atlikti darbai postūmis tolimesnei UAB PRATC veiklai“ (Priedas Nr.215)
			2007 03 05	„Paskutinių grupių darželinukai pieš atliekų konteinerį“(Priedas Nr. 216)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VIDINĖS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			2007 03 21	„Piešinių konkursas ikimokyklinukams „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme“ pratęsiamas“ (Priedas Nr.217)
			2007 04 12	„Paskelbtas konkursas praėjo sėkmingai“(Priedas Nr.218)
			2007 06 28	„Tarptautiniame galiūnų turnyre – diskusijos aplinkosauginėmis temomis“ (Priedas Nr.219)
			2007 08 27	"Galutinis Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo plano variantas - jau rugsėjį" (Priedas CD1 Nr. 220)
			2007 08 27	"Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo technine priežiūra rūpinsis vokiečiai" (Priedas CD1 Nr. 221)
			2007 11 20	„Atliekų priėmimo, perkrovimo ir kompostavimo aikšteles statys AB „Panevėžio statybos trestas“ (Priedas CD1 Nr.222)
			2007 12 17	„Regioninį sąvartyną statys AB "Panevėžio statybos trestas" ir AB "Panevėžio keliai" (Priedas CD1 Nr.223)
			2007 12 17	„ Panevėžio apskrities gyventojai pradėjo aktyviau rūšiuoti atliekas" (Priedas CD1

LIETUVOS RESPUBLIKOS FIN. MINISTERIJA
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				Nr.224)
			2008 01 08	„Komiksų konkurse dalyvavusiems moksleiviams idėjų nepristigo“ (Priedas CD1 Nr.225)
			2008 06 11	„Panevėžio regiono sąvartyno statybos jau pradėtos“ (Priedas CD1 Nr. 226)
			2008 10 02	„Vaikai į atliekų rūšiavimą žiūri kitaip nei suaugusieji“ (Priedas CD1 Nr.227)
			2008 10 06	„PRATC paskelbė jau ketvirtą konkursą mokiniams“ (Priedas CD1 Nr.228)
			2008 12 18	„Konkurso „Mes norime gyventi švariau“ nugalėtoja – Karolina Andriulytė iš Kupiškio“ (Priedas CD1 Nr. 229)
			2009 01 19	“Atliekas rūšiuojančių Panevėžio apskrities gyventojų dalis auga” (Priedas CD1 Nr. 230)
			2009 07 21	“Panevėžio regione atidarytas naujasis sąvartynas ” (Priedas CD1 Nr. 231)
			2009 08 14	„Panevėžio apskrityje jau atidarytos didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės“ (Priedas CD1 Nr. 232)
			2009 09 16	„PRATC atstovų susitikimai su Panevėžio regiono bendruomenėmis“

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS AUDITO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				(Priedas CD1 Nr. 233)
			2009 10 05	„Kviečiame į susitikimus su PRATC atstovais“ (Priedas CD1 Nr. 234)
			2009 10 08	„Kur priimamos didžiosios, žaliosios ir pavojingos atliekos Panevėžio apskrityje?“ (Priedas CD1 Nr. 235)
			2009 10 09	„Kviečiame žiniasklaidos atstovus į spaudos konferenciją“ (Priedas CD1 Nr. 236)
			2009 10 13	„Baigiama kurti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema“ (Priedas CD1 Nr. 237)
			2009 10 15	„Kasmet vis daugiau pritariančiųjų naujajai atliekų tvarkymo sistemai Panevėžyje“ (Priedas CD1 Nr. 238)
8	Spaudos konferencija	*Pristatyti žiniasklaidai PRATC įgyvendintus darbus kiekvienais metais, vykdomų projektų aktualijų pristatymas. Kiekis – 5 konferencijos*	2006 11 30	Pristatytas projektas, numatomi įvykdyti darbai. Dalyvių sąrašas (Priedas CD1 Nr. 239)
			2007 03 01	Dalyvių sąrašas, Pristatymas nuotraukos (Priedas CD1 Nr. 240)
			2007 12 11	Dalyvių sąrašas, Pristatymas (Priedas CD1 Nr. 241)
			2008 06 10	Spaudos konferencija, pažymint regioninio sąvartyno statybos pradžią (kapsulės su laišku ateities kartoms

KOPIJA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				įbetonavimu) regioninio sąvartyno statybvietėje. Dalyvių sąrašas, Nuotraukos (Priedas CD1 Nr. 242)
			2009 10 13	Dalyvių sąrašas, nuotraukos (Priedas CD1 Nr. 243)
9	PRATC internetinio tinklapio sukūrimas/palaikymas/ atnaujinimas	*Tikslas – kokybiškai atnaujinti esamą pratc.lt tinklapį ir teikti aktualią informaciją tiek bendrovės, tiek įgyvendinamo projekto eigos klausimais*	www.pratc.lt 2006 - 2007 m. I pusmetis	Priedas CD1 Nr. 244
			2007 m. II pusmetis	Priedas CD1 Nr. 245
			2008 m. I pusmetis	Priedas CD1 Nr. 246
			2008 m. II pusmetis	Priedas CD1 Nr. 247
			2009 m. I pusmetis	Priedas CD1 Nr. 248
			2009 m. II pusmetis	Priedas CD1 Nr. 249
			2010 m. II pusmetis	Priedas Nr. 303-305, 4 lapai
10	Savivaldybių internetinių puslapių atnaujinimas	Tikslas - *informacijos tiekimas regiono savivaldybių tinklalapiams*	www.panevezys.lt 2007 – 2009 m.	Priedas C1D Nr. 250
			www.rokiskis.lt 2007-2009 m.	Priedas CD1 Nr. 251
			www.kupiskis.lt 2007 – 2009 m.	Priedas CD1 Nr. 252
			www.kupiskis.lt 2010 m.	Priedas Nr. 306, 1 lapas
		TIKRA Skyriaus vedėja Aldona Čeplėjienė 2011 -06- 29	www.pasvalys.lt 2007 – 2009 m.	Priedas CD1 Nr. 253
			www.panrs.lr 2007 – 2009 m.	Priedas CD1 Nr. 254

LIETUVOS RESPUBLIKOS FIN... KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			www.birzai.lt 2007 – 2009 m.	Priedas CD1 Nr. 255
			www.pava.lt 2007 – 2009 m.	Priedas CD1 Nr. 256
11	Žiniasklaidos monitoringas ir analize	*Tikslas – stebėti PRATC vykdomų darbų/projektų nušvietimą pagrindiniuose nacionalinės, regioninės ir vietinės žiniasklaidos priemonėse.*	Neplatinamas	Monitoringo ataskaitos (Priedas CD1 Nr. 257)
12	Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos“	Tikslas - *Tekstine ir vaizdine išraiška pateikti informaciją, žinotiną Panevėžio regiono juridiniams asmenims.*	2008 m. kovas - balandis	Leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos Nr. 1“ (Priedas Nr. 258); Patvirtinimas apie leidinio išplatinimą, nuotraukos (Priedas CD1 Nr. 259)
			2009 m. gegužė - birželis	Leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos Nr.2“ (Priedas Nr.260); Patvirtinimas apie leidinio išplatinimą (Priedas CD1 Nr.261)
			2009 m. rugsėjis - spalis	Leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos Nr.3“ (Priedas Nr. 262); Patvirtinimai apie leidinio išplatinimą (Priedas CD1 Nr. 263)
13	Konkursai ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams	*Tikslas – suaktyvinti jaunosios kartos domėjimąsi atliekų tvarkymo klausimais ir panaudoti juos kaip idėjų propaguotojus už mokyklos ribų.*	2007 m. kovas - balandis	Piešinių konkursas „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme“ (Priedas CD1 Nr. 264)
			2007 m lapkritis - gruodis	Komiksų konkursas „Kaip Tvarkiukas atliekas rūšiavo“. Kvietimas, diplomo kopija dalyvių sąrašas;

KOPIJA
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				Piešinių nuotraukos (Priedas CD1 Nr. 265)
			2008 m. vasaris - gegužė	Kūrybinis sentencijų konkursas apie atliekų rūšiavimą. Kvietimas, diplomo kopija, dalyvių sąrašas , Piešinių nuotraukos Apdovanojimų nuotraukos (Priedas CD1 Nr. 266)
			2008 m. spalis - gruodis	Kūrybinis konkursas. Kvietimas, dalyvių sąrašas nugalėtojos darbelis, Apdovanojimų nuotraukos (Priedas CD1 Nr. 267)
14	TV laida	*Tikslas – suaktyvinti bendruomenės pozityvų interesą ir domėjimąsi kuriama atliekų tvarkymo sistema.* ***Kiekis – 18 laidų.***	Kupiškio rajono televizija „Kupiškio TV“ 2007 03 31 2007 04 03	12 min. trukmės siužetas-laidelė skirta supažindinti su PRATC veikla bei informuoti gyventojus apie besikeičiančią atliekų tvarkymo sistemą. Interviu su UAB PRATC valdybos nariu Kupiškio raj. savivaldybės administracijos direktoriumi Žilvinu Aukštikalniu. (Priedas DVD1 Nr. 268)
			Kupiškio rajono televizija „Kupiškio TV“ 2007 04 14 2007 04 17	15 min. trukmės reportažas apie UAB PRATC šviečiamąją veiklą. Interviu su UAB PRATC projekto administratoriumi Vaidu Pelecku, atsitiktiniais praeiviais. (Priedas DVD2 Nr. 269)
		2011 -06- 29	Panevėžio miesto ir rajono televizija „KTV plius“	9 min trukmės reportažo metu

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			2007 06 14	pristatomas UAB PRATC įgyvendinamas investicinis projektas. Interviu su UAB PRATC direktoriumi Arturu Gruce (Priedas DVD3 Nr. 270)
			Panevėžio miesto ir rajono televizija „KTV plius“ 2007 06 28	7 min. trukmės reportažo metu pristatoma UAB PRATC visuomenės informavimo ir švietimo programa, rūšiavimo nauda. Interviu su UAB PRATC projekto administratoriumi Vaidu Pelecku (Priedas DVD4 Nr.271)
			Panevėžio miesto ir rajono televizija „KTV plius“ 2007 10 18	Tiesioginė 30 min.. diskusijų laida „Ar viskas gerai?“ Direktorius Arturas Grucė tiesioginiame eteryje pateikė informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, atsakė į žiūrovų klausimus. Laidos scenarijus (Priedas DVD5 Nr. Nr.272)
			Panevėžio miesto ir rajono televizija „KTV plius“ 2007 12 11 2007 12 12	Informacinis reportažas apie pasirašytas statybos darbų sutartis (Priedas DVD5 Nr. 273)
			Panevėžio miesto ir rajono TV „ATV“ 2008 02 13 IKRA 2011 -06- 29 Aldona Čeplėjienė	Laidoje „Sveikatos sodas“ 10 min. reportažas apie UAB „PRATC“ veiklą, įgyvendinamą projektą, sociologinio tyrimo rezultatus. (Priedas DVD7 Nr.274)

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			Panevėžio miesto ir rajono TV „KTV plius“ 2008 06 10	Laida „Panevėžio žinios“ informacinis reportažas apie pradėtas Panevėžio regioninio sąvartyno darbų pradžią (Priedas DVD8 Nr. 275)
			Panevėžio miesto ir rajono TV „KTV plius“ 2008 10 02	11 min. trukmės informacinė laida apie investicinį projektą, rengiamus susitikimus su moksleiviais ir bendruomenėmis (Priedas DVD9 Nr. 276)
			Biržų rajono TV „Rygveda“ 2008 11 14	10 min. trukmės informacinė laida apie įgyvendinamą investicinį projektą, rengiamus susitikimus su bendruomenėmis, kūrybinius konkursus mokiniams (Priedas DVD10 Nr. 277)
			Panevėžio regiono televizija „ATV“ 2009 04 08	20 min. trukmės informacinė laida apie investicinį projektą, atliekų tvarkymą (Priedas DVD11 Nr. 278)
			Panevėžio regiono televizija „ATV“ 2009 07 17	10 min. trukmės informacinė laida apie liepos 16 d. atidarytą naują Panevėžio regioninį sąvartyną. (Priedas DVD12 Nr. 279)
			Panevėžio regiono televizija „ATV“ 2009 09 24	10 min. trukmės reportažas apie Panevėžio mieste esančią didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS ... KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR ... SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čaplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				aikšteles (Priedas DVD13 Nr. 280)
			Kupiškio miesto ir rajono televizija „Kupiškio TV“ 2009 09 26	14 min. trukmės reportažas apie Kupiškio mieste atidarytą didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelę. (Priedas DVD16 Nr. 281)
			Biržų miesto ir rajono televizija „Rygveda“ 2009 09 27	14 min. 33 sek. trukmės reportažas apie susitikimus su bendruomenėmis, atidarytas atliekų priėmimo aikštelės (Priedas DVD15 Nr. 282)
			Kupiškio miesto ir rajono televizija „Kupiškio TV“ 2009 10 03	13 min. trukmės reportažas apie atidarytą naująjį Panevėžio regiono sąvartyną (Priedas DVD16 Nr. 283)
			Panevėžio regiono televizija „PAN TV“ 2009 10 15	6 min. 24 sek. trukmės reportažas apie įgyvendintą Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektą (Priedas DVD17 Nr. 284)
			Panevėžio regiono televizija „ATV“ 2009 10 16	10 min. trukmės reportažas apie įgyvendintą Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektą (Priedas DVD18 Nr. 285)
15	Radijo laida	*Tikslas – suaktyvinti bendruomenės pozityvų interesą ir domėjimąsi kuriama atliekų tvarkymo*	Panevėžio miesto ir rajono radijas „Aukštaitijos radijas“ laida „Su mumis	20 min. reportažas apie UAB PRATC vykdomą projektą. Dalyviai: UAB

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

		sistema. Kiekis – 12 laidų	lengviau“ 2007 02 12	PRATC direktorius Arturas Grucė ir valdybos narys Viktoras Trofimovas (Priedas CD1 Nr.286)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Aukštaitijos radijas“ laida „Grojame ir kalbame Jums“ 2007 03 30	15 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie PRATC įgyvendinamą visuomenės informavimo ir švietimo programą (Priedas CD1 Nr. 287)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas“ 2007 08 09	13 min. trukmės tiesioginio eterio laidos metu UAB PRATC direktorius informavo apie investicinio projekto naudą, ruošiamus atlikti darbus, jau pasirašytas darbų sutartis. (Priedas CD1 Nr. 288)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas“ laida „Su Ingrida“ 2008 02 06	10 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie atliktą sociologinę regiono gyventojų apklausą, apie pradėtus infrastruktūros objektų statybos darbus. (Priedas CD1 Nr.289)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas“ laida „Su Ingrida“ 2008 04 09	15 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie investicinį projektą, apie atliekų rūšiavimą, statomas aikšteles (Priedas CD1 Nr. 290)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Aukštaitijos radijas“ laida 2008 04 14	15 min. pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie investicinį projektą, apie atliekų rūšiavimą, statomas aikšteles

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIŲ MINISTERIJA * KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čoplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

171

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				(Priedas CD1 Nr. 291)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas“ laida „Su Ingrida“ 2008 06 11	10 min pokalbis su UAB PRATC direktoriumi apie pradėtus regioninio sąvartyno statybos darbus. (Priedas CD1 Nr.292
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Aukštaitijos radijas“ laida 2009 01 23	11 min. trukmės informacinė laidelė apie vykdomus statybos darbus, atlikto sociologinio tyrimo rezultatus (Priedas CD1 Nr. 293)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas“ laida 2009 01 28	15 min. trukmės informacinė laidelė apie vykdomus statybos darbus, atlikto sociologinio tyrimo rezultatus (Priedas CD1 Nr. 294)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas“ laida rytinė laida 2009 07 23	11 min. trukmės informacinė laidelė apie investicinio projekto rezultatus, vykdomus darbus, atidarytą naująjį regioninį sąvartyną (Priedas CD1 Nr. 295)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas“ laida 2009 08 25	10 min. trukmės reportaže pateikiama informacija apie atidarytą regioninį sąvartyną, didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės, juose priimamas atliekas, darbo laiką. (Priedas CD1 Nr. 296)
			Panevėžio miesto ir rajono radijas „Pulsas“ laida 2009 10 12	16 min. 17 sek. diskusinė laida apie įrengtus ir pradėjusius veikti atliekų tvarkymo

LIETUVOS RESPUBLIKOS TINĖ ... KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

172

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

				įrenginius. Diskusijoje apie Panevėžio regione esančias atliekų tvarkymo problemas dalyvavo PRATC direktorius ir Panevėžio raj. savivaldybės ekologė. (Priedas CD1 Nr. 297)
16	TV klipas	*Tikslas – patrauklia vizualine išraiškos forma sužadinti visuomenės dėmesį į atliekų rūšiavimą. Kiekis – 1 TV klipas rodomas 30 kartų. Demonstravimas 3 regioninėse televizijose.*	2008 – 2009 m.	TV klipas ir jo transliacijų patvirtinimas (Priedas CD1 Nr.298)
17	Spalvotos atmintinė fiziniams asmenims	*Tikslas – supažindinti visuomenę su atliekų rūšiavimo reikalingumu bei informuoti kokios bus ar gali būti rinkliavos už atliekų tvarkymą. Kiekis – 10 000 vnt*	2008 m. lapkritis	Atmintinė ir atmintinės platinimo patvirtinimas (Priedas CD1 Nr.299)
18	Spalvotos atmintinės juridiniams asmenims	*Tikslas – supažindinti visuomenę su atliekų rūšiavimo reikalingumu bei informuoti kokios bus ar gali būti rinkliavos už atliekų tvarkymą. Kiekis – 1 000 vnt*	2008 m. lapkritis	Atmintinės maketas ir atmintinės platinimo patvirtinimas (Priedas CD1 Nr. 300)
19	Informaciniai plakatai	*Tikslas – patrauklia forma teikti informaciją kaimo žmonėms apie reikalingumą tvarkyti susidarančias atliekas. Kiekis – 4000 vnt.*	2008 m. spalis	Plakato maketas, plakato platinimo patvirtinimas, nuotraukos (Priedas CD1 Nr. 301)
20	Reklaminė atributika	*Tikslas – suaktyvinti bendruomenės pozityvų interesą ir domėjimąsi kuriama atliekų tvarkymo sistema.*	2007 – 2009 m.	Atributikos nuotraukos ir platinimas (Priedas CD1 Nr. 302)
21	Viešinimas internete		Nuo 2004 m. apie projektą nuolat informuojama Finansų ministerijos	

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

			tinklalapyje adresu http://www.finmin.lt/sanglaudos_fondas, o nuo 2006 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt) adresu http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas.	

Susitikimuose su interesų grupėmis ir bendruomenėmis buvo skelbiama informacija (111 pav.) apie projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ finansavimo šaltinius, projekto vertę ir trukmę.

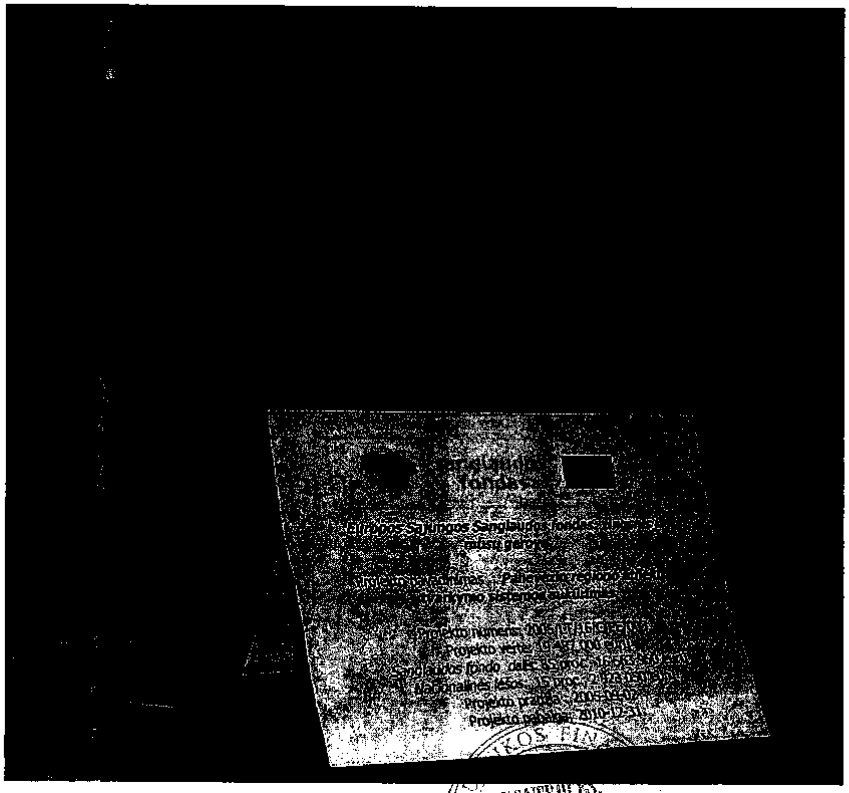

111 pav. Susitikimo informacinis stendas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

Lentelė Nr. 25. Įrengti informaciniai stendai ir atminimo lentos

Informacinis stendas	2008 m. sausis iki 2010 m. sausio	Prie Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Dvarininkų k. Panevėžio r.	Projekto komponentų Panevėžyje statyba Sutarties Nr. A/2007/P/35	112
Atminimo lenta	Nuo 2010 m. sausio iki 2015 m.	Prie Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Dvarininkų k. Panevėžio r.	Projekto komponentų Panevėžyje statyba Sutarties Nr. A/2007/P/35	113
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Savitiškio g. 12, Panevėžys.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	114
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Savitiškio g. 12, Panevėžys.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	115
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Pasvalio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Mūšos g. 12B, Pasvalys.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	116
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Pasvalio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Mūšos g. 12B, Pasvalys.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	117
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Technikos g. 6I, Kupiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	118
Atminimo	Nuo 2009 m.	Prie Kupiškio stambiagabaričių	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių	119

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapiėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

lenta	sausio iki 2014 m.	atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Technikos g. 6I, Kupiškis.	ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Rokiškio perkrovimo stoties ir stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	120
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Rokiškio perkrovimo stoties ir stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	121
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	122
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	123
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Didžiagrašių k., Kupiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	124
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Didžiagrašių k., Kupiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	125
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Ruzgų k., Rokiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	126

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapiėjienė
2011 06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Ruzgų k., Rokiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	127
Informacinis stendas	2007 m. gruodis iki 2009 m. sausio	Prie Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Levaniškio k., Rokiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	128
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. sausio iki 2014 m.	Prie Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įvažiavimo Levaniškio k., Rokiškio r.	Atliekų priėmimo punktų, perkrovimo stočių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/P/34	129

TIKRA
2011 -06- 29
Aldona Čepienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

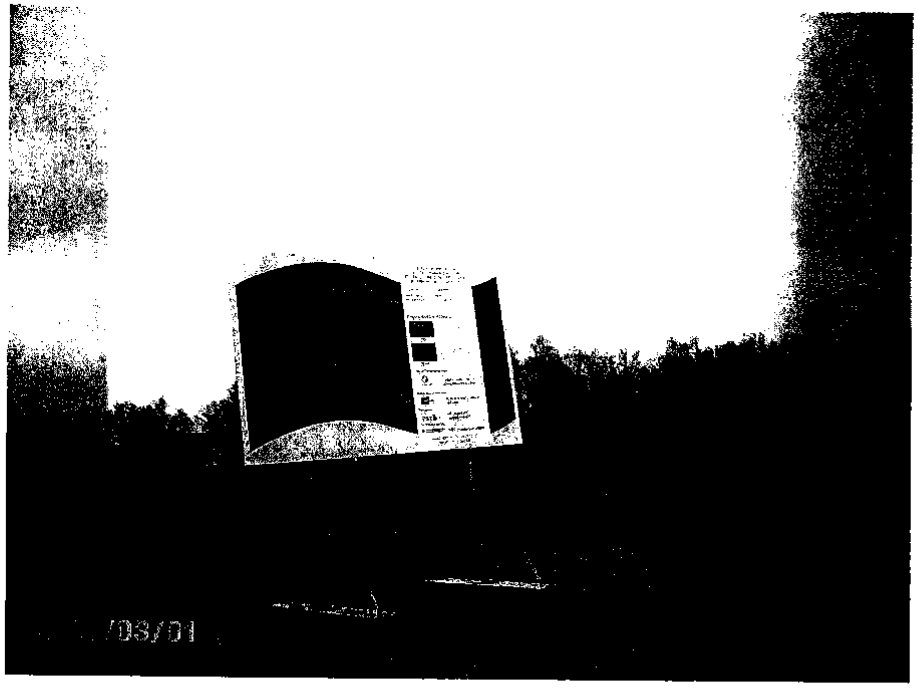

112 pav. Informacinis stendas prie Panevėžio regioninio sąvartyno (projekto komponentų Panevėžyje statyba).

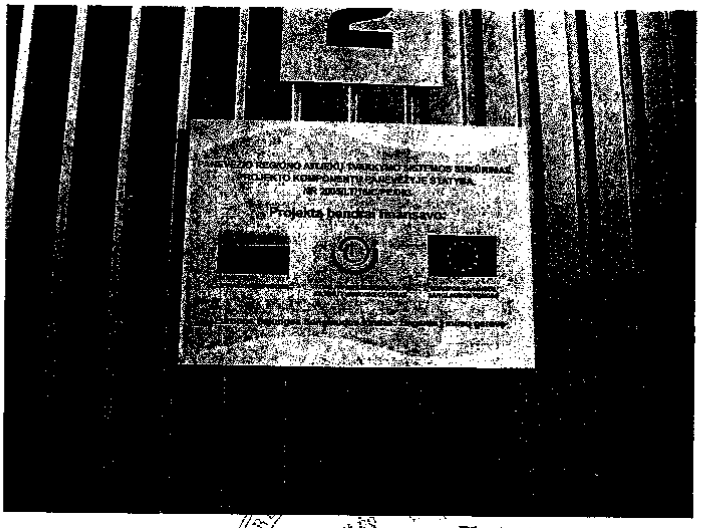

113 pav. Atminimo lenta prie Panevėžio regioninio sąvartyno (projekto komponentų Panevėžyje statyba).

TIKRA

Aldona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 4[illegible] el. paštas info@pratc.lt

2011 -06- 29

178

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

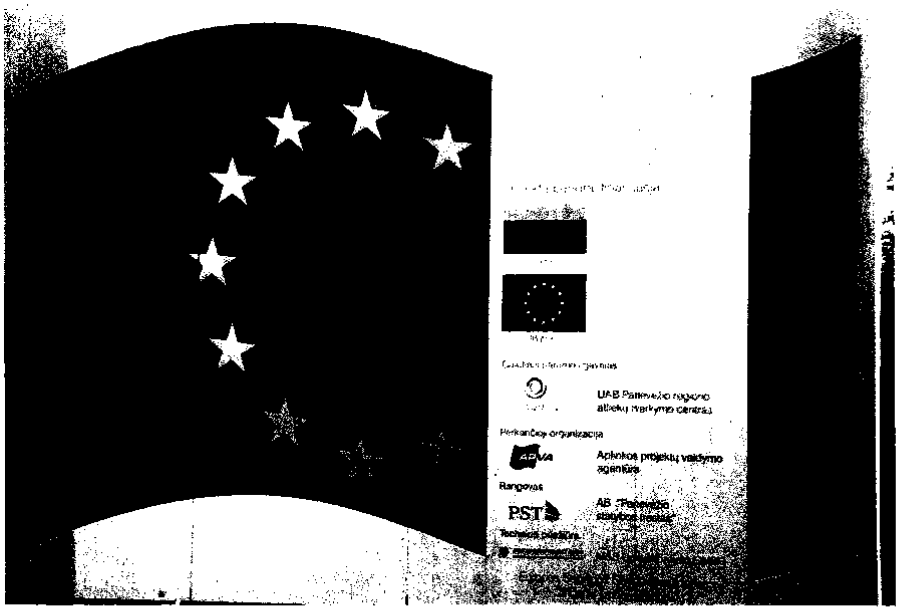

114 pav. Informacinis stendas prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės.

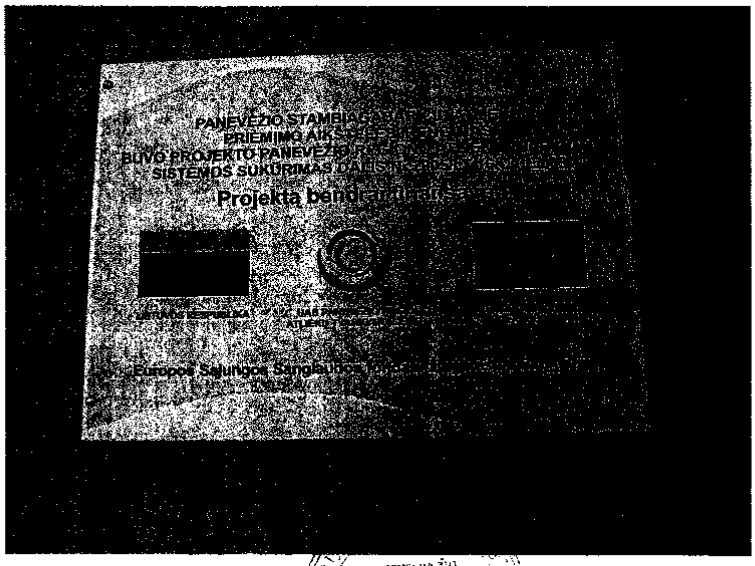

115 pav. Atminimo lenta prie Panevėžio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės.

KOPIJA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

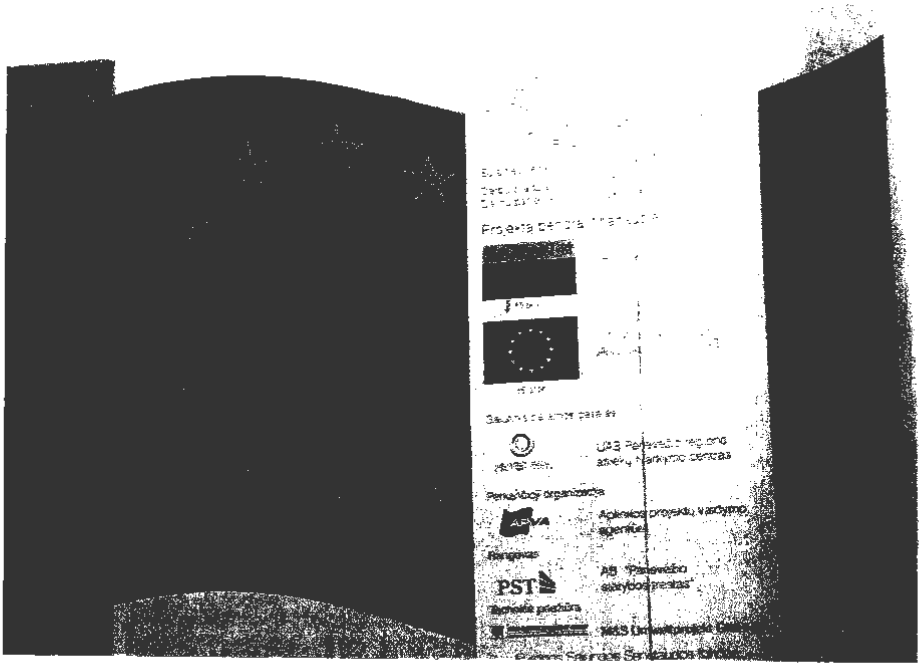

116 pav. Informacinis stendas prie Pasvalio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės.

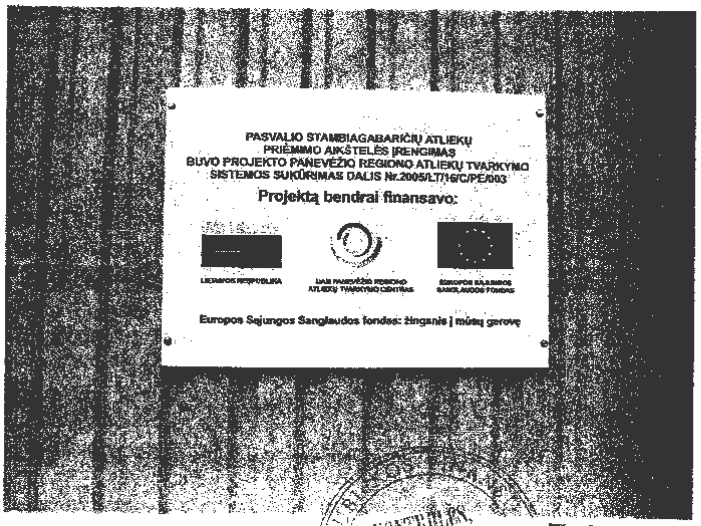

117 pav. Atminimo lenta prie Pasvalio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės.

TIKRA

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@vrac.lt Aldona Čeplėjienė

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

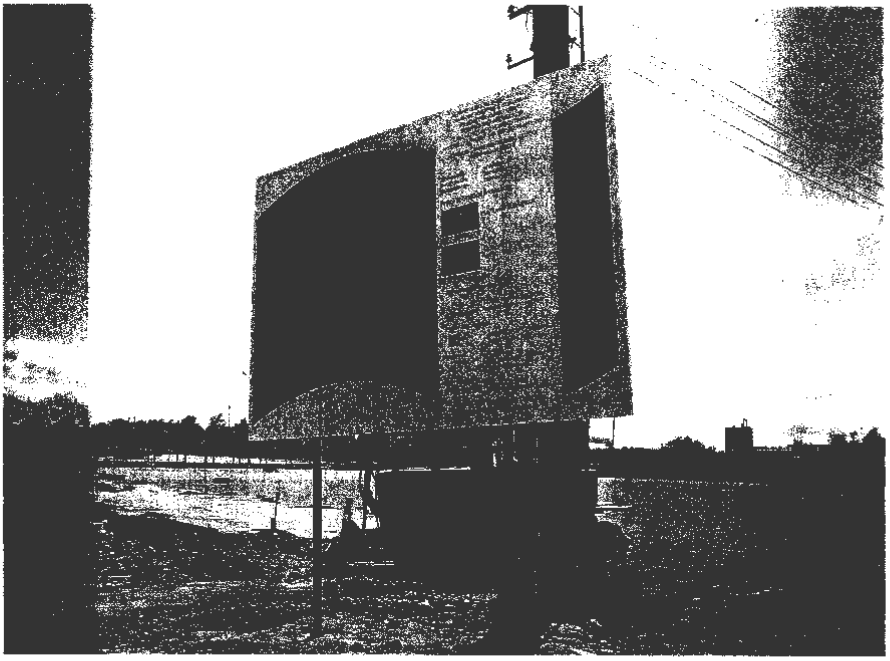

118 pav. Informacinis stendas prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės.

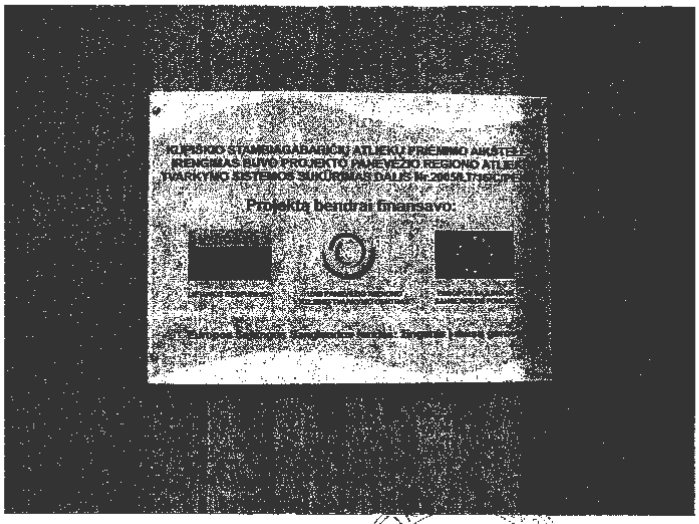

119 pav. Atminimo lenta prie Kupiškio stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės.

KOPIJA TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

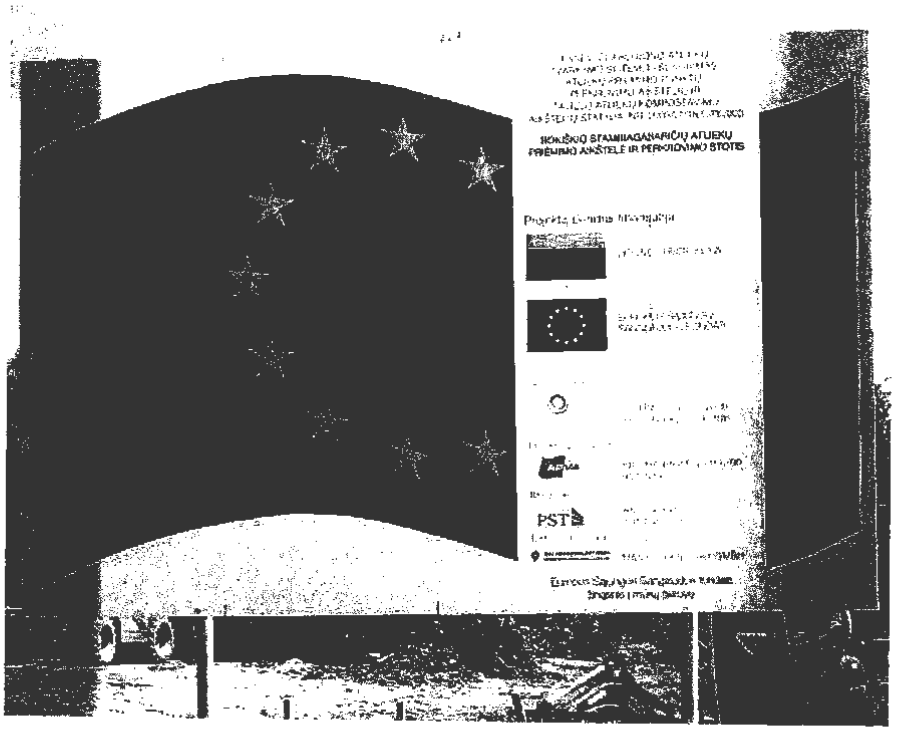

120 pav. Informacinis stendas prie Rokiškio perkrovimo stoties ir stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės.

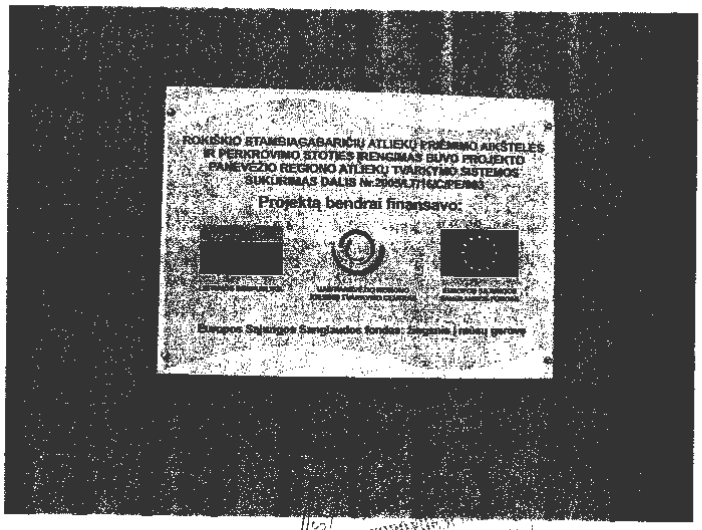

121 pav. Atminimo lenta prie Rokiškio perkrovimo stoties ir stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

T I K R A
Skyriaus vertėja
2011 -06- 29
Aldona Čaplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

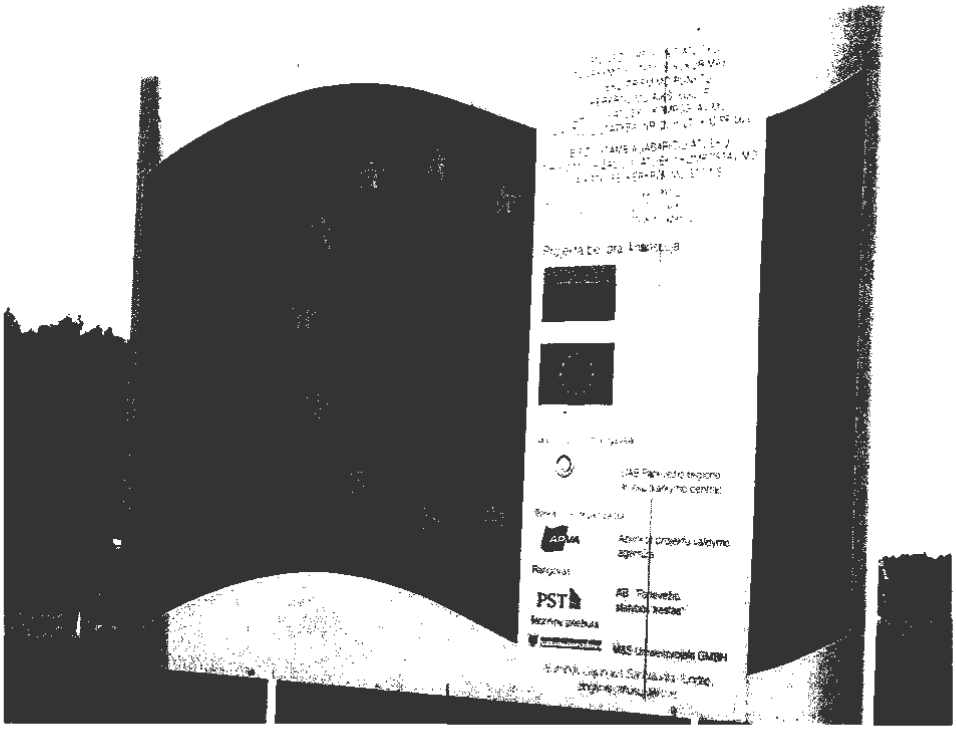

122 pav. Informacinis stendas prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

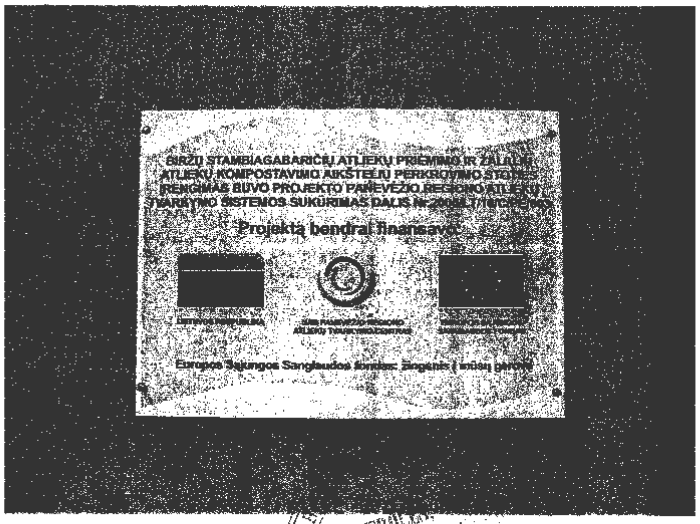

123 pav. Atminimo lenta prie Biržų perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėnienė
2017 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

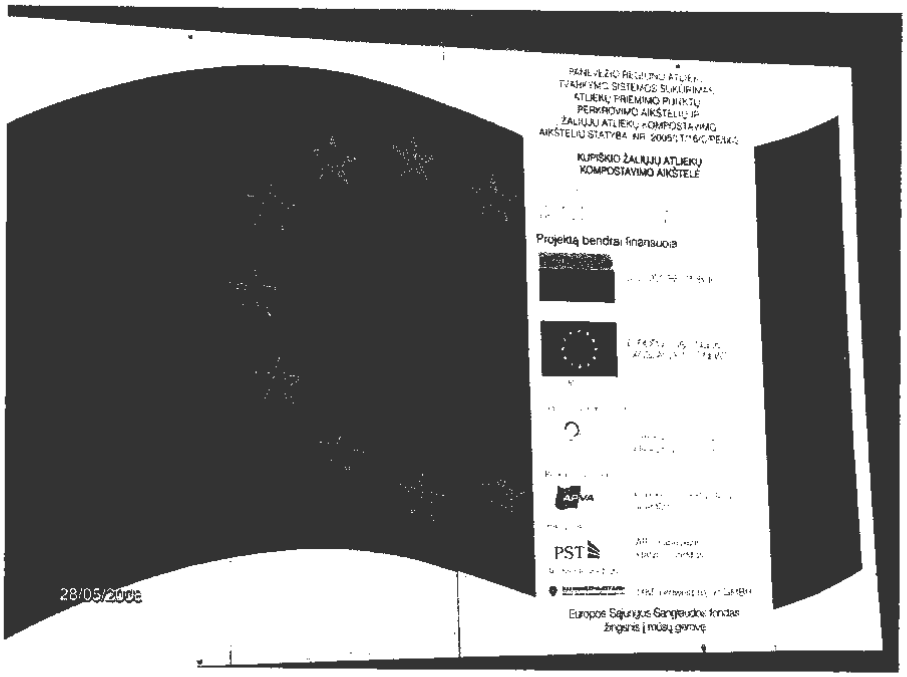

124 pav. Informacinis stendas prie Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.



UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

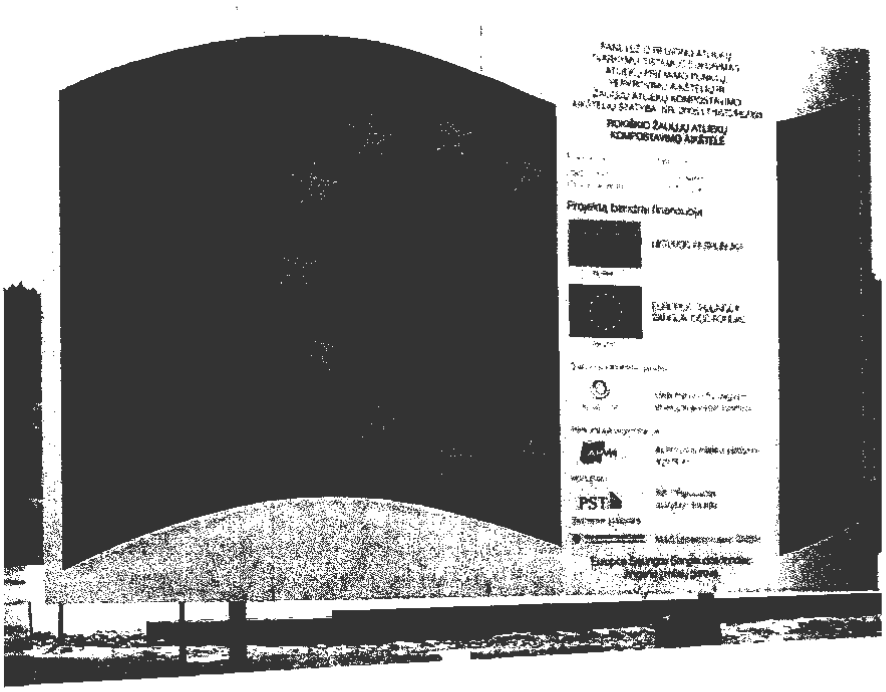

126 pav. Informacinis stendas prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

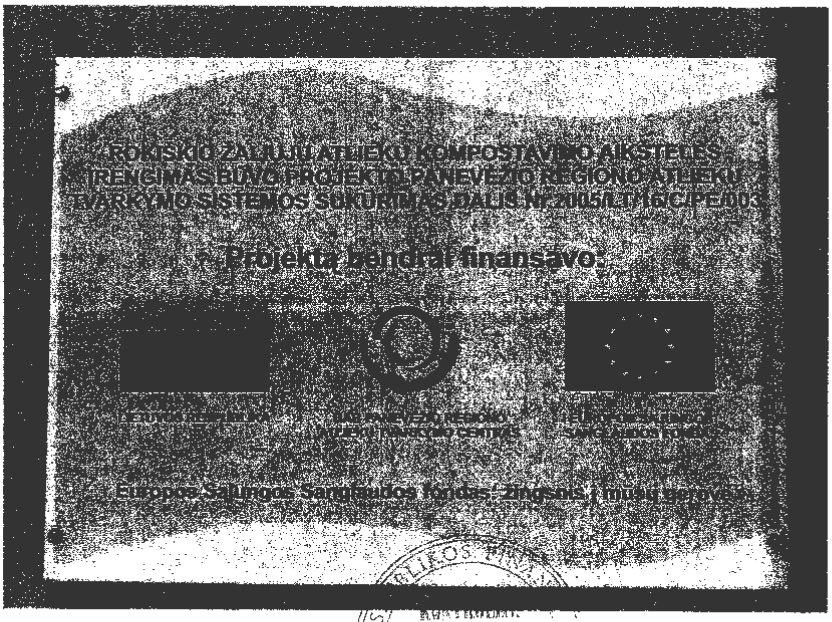

127 pav. Atminimo lenta stendas prie Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. pastas info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čepléjienė

185

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

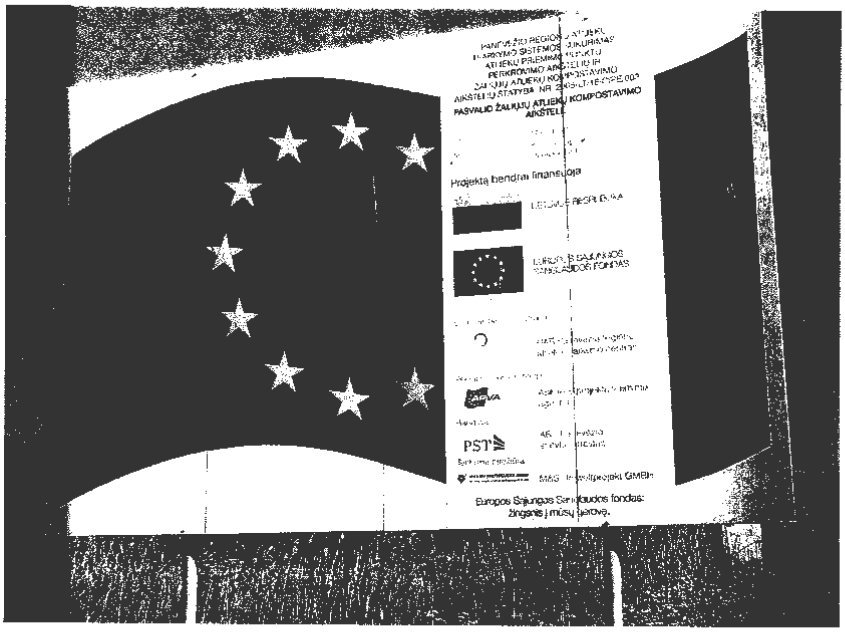

128 pav. Informacinis stendas prie Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

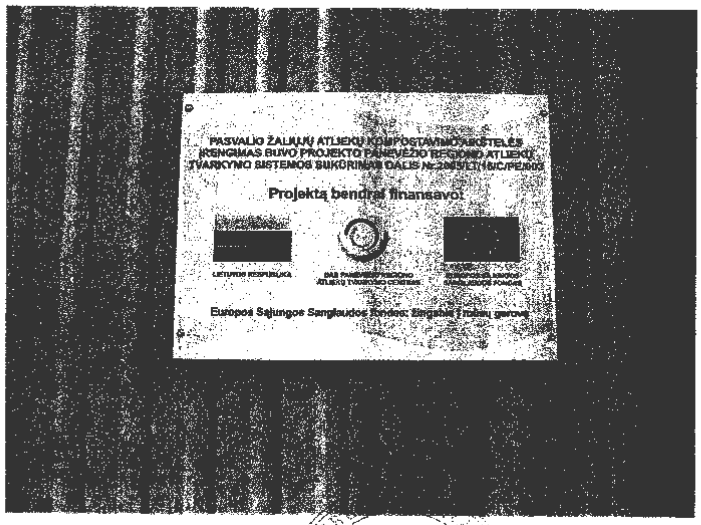

129 pav. Atminimo lenta stendas prie Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

TIKRA
Aldona Čepėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

IŠVADOS

1. Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas - sukurti aplinkosaugos požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią nacionalinių ir tarptautinių standartų bei įstatymų nustatytus reikalavimus. Padidinti atliekų tvarkymo efektyvumą ir už prieinamą mokestį teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams.
2. Bendra įgyvendinto projekto vertė 19.144.512,02 EUR. Iš šios sumos 85% lėšų projekto finansavimui skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 15% finansavimo sudaro valstybės biudžeto lėšos. Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 3.662,38 EUR Likusi neišmokėta pagal sutartis bendra lėšų suma yra 324.808,91 EUR. Neišmokėta suma pagal Komisijos sprendimą yra 342.487,98 EUR.
3. Visi projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo metu vykdyti pirkimai buvo atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.
4. Darbai, pagal dvi rangos darbų, tris paslaugų ir septynias įrangos pirkimo sutartis pilnai įvykdyti. Mokėjimai buvo vykdomi pagal sutarčių sąlygas.
5. Įgyvendinus projektą Panevėžio regione pastatyta ir eksploatuojama:
   - Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Dvarininkų k. Panevėžio raj. (įrengta I sekcija, tarnybinė zona, administracinis pastatas, filtrato surinkimo sistema, paviršinio vandens ir nuotekų surinkimo sistema, kompensacinės priemonės gyventojams, įrengta rūšiavimo linija);
   - Uždarytas ir rekultivuotas Panevėžio miesto buitinių atliekų sąvartynas Dvarininkų k. Panevėžio raj.(atliekų kaupo uždengimas, nelaidus, drenažinis ir žemės sluoksniai, filtrato ir dujų surinkimo sistemų įrengimas, teritorijos apželdinimas);
   - 5 atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles;
   - 5 kompostavimo aikšteles;
   - 2 perkrovimo stotys;
   - Įsigyta įranga naujai atliekų tvarkymo sistemai (rūšiavimo linijos krautuvas, ratinis krautuvas, žaliųjų atliekų smulkintuvas, kompaktorius, buldozeris, sijotuvas- būgninis rėtis, automobilis su priekaba- perkrovimo stotims aptarnauti).
6. Visuomenė informuota ir formuota jos palanki nuomonė apie investicinio projekto uždavinius ir tikslus, šio projekto sudėtyje vykdomų užduočių eigą ir rezultatus, atsirasiančią naudą vietos bendruomenei bei pagerėsiančią aplinkos būklę, ES paramos reikšmę šio projekto įgyvendinime. Projektą vykdė UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“. Viešinimo priemonės atitiko Europos Sąjungos Sanglaudos fondo viešinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
7. Komisijos sprendime numatyti tikslai yra pasiekti, o specialiosios sąlygos ir pagrindiniai priežiūros rodikliai yra įgyvendinti laiku ir tinkamai.
8. Po projekto užbaigimo visame Panevėžio regione yra taikoma vieninga tarifų nustatymo metodika, kuri realiai atitiktų įmonės sąnaudas, reikalingas naujo sąvartyno, kompostavimo ir atliekų priėmimo aikštelių eksploatacijai bei priežiūrai.
9. Projektas yra gyvybingas, kadangi akumuliuotas pinigų srautas yra teigiamas. Ekonominės analizės rezultatais leidžia teigti, kad projektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus.
10. Užbaigtas projektas valdomas pagal galiojančius ES ir LR teisės aktus ir kitus norminius dokumentus.
11. Sanglaudos fondo teikta parama projektui „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įsisavinta 98,22 proc.

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

IKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

12. Projektas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendintas ir atitinka ES keliamus reikalavimus.

PRIEDAI

1 priedas. Panevėžio regioninis sąvartyno Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00012, 2009-07-01 (statybos II dalies I etapas), 6 lapai;

2 priedas. Panevėžio regioninis sąvartyno Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00013, 2009-07-01 (statybos I dalis), 3 lapai;

3 priedas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00011, 2009-07-01, 3 lapai;

4 priedas. Panevėžio miesto sąvartyno Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkamai uždarytu aktas Nr. PTN-100-091209-00145, 2009-12-04, 5 lapai;

5 priedas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Didžiagrašių k. Kupiškio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-53-081230-078, 2008-12-29, 3 lapai;

6 priedas. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Savitiškio g. 12, Panevėžys pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-51-081224-073, 2008-12-22, 3 lapai;

7 priedas. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Technikos g. 6I, Kupiškis pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-53-081230-077, 2008-12-29, 3 lapai;

8 priedas. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Mūšos g. 12B, Pasvalys pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-55-081223-068, 2008-12-16, 3 lapai;

9 priedas. Perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės K. Donelaičio g. 16, Rokiškis pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-56-081223-070, 2008-12-17, 3 lapai;

10 priedas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Ruzgų k. Rokiškio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-56-081223-071, 2008-12-17, 3 lapai;

11 priedas. Perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų aikštelės, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Biržų k. Biržų r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-52-081224-072, 2008-12-22, 3 lapai;

12 priedas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Levaniškio k. Pasvalio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-55-081223-069, 2008-12-16, 3 lapai;

13 priedas. Objektų atlikimo pažymos, 12 lapų;

14 priedas. Darbų perėmimo pažymos, 12 lapų;

15 priedas. Įrangos naujai atliekų tvarkymo sistemai pirkimo priėmimo- perdavimo aktai, 7 lapai;

16 priedas. Investicijų rodiklių skaičiavimas, 1 lapas;

17 priedas. Kapitalo rodiklių skaičiavimas, 1 lapas;

18 priedas. Projekto finansinis gyvybingumas, 1 lapas;

19 priedas. Jautrumo analizė, 1 lapas;

20 priedas. Ekonominių rodiklių skaičiavimas, 1 lapas;

21 priedas. Visuomenės informavimo kompanijų analizė, CD1, Nr. 21;

22-25 priedai. Panevėžio regiono gyventojų sociologinė apklausa, CD1, Nr. 22-25;

26-67 priedai. Susitikimai su bendruomenėmis, CD1, Nr.26-67;

68-92 priedai. Susitikimai su interesų grupėmis, CD1, Nr. 68-92;

93-96 priedai. Publikacijos nacionaliniuose dienraščiuose, CD1, Nr. 93-96;

97-209 priedai. Publikacijos apskrities, regioninėje, vietos spaudoje, CD1 ir CD2, Nr. 97-209;

210-219 priedai. Pranešimai spaudai, Nr. 210-238, 37 lapai.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8-45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

188

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

220-238 priedai. Pranešimai spaudai, CD1, Nr. 220-238;
239-243 priedai. Spaudos konferencija, CD1, Nr. 239-243;
244-249 priedai. PRATC internetinio tinklapio sukūrimas/palaikymas/atnaujinimas, CD1, Nr. 244-249;
250-256 priedai. Savivaldybių internetinių puslapių atnaujinimas, CD1, Nr. 250-256;
257 priedas. Žiniasklaidos monitoringas ir analize, CD1, Nr. 257;
258 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", Nr. 258;
259 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", CD1, Nr. 259;
260 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", Nr. 260;
261 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", CD1, Nr. 261;
262 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", Nr. 262;
263 Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", CD1, Nr. 263;
264-267 priedai. Konkursai ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams, CD1, Nr. 264-267;
268 priedas. TV laida, DVD1;
269 priedas. TV laida, DVD2;
270 priedas. TV laida, DVD3;
271 priedas. TV laida, DVD4;
272 priedas. TV laida, DVD5, Nr. 272;
273 priedas. TV laida, DVD5, Nr. 2732;
274 priedas. TV laida, DVD7;
275 priedas. TV laida, DVD8;
276 priedas. TV laida, DVD9;
277 priedas. TV laida, DVD10;
278 priedas. TV laida, DVD11;
279 priedas. TV laida, DVD12;
280 priedas. TV laida, DVD13;
281 priedas. TV laida, DVD16, Nr. 281;
282 priedas. TV laida, DVD15;
283 priedas. TV laida, DVD16, Nr. 283;
284 priedas. TV laida, DVD17;
285 priedas. TV laida, DVD18;
286-297 priedai. Radijo laida, CD1, Nr. 286-297;
298 priedas. TV klipas, CD1, Nr. 298;
299 priedas. Spalvotos atmintinė fiziniams asmenims, CD1, Nr. 299;
300 priedas. Spalvotos atmintinės juridiniams asmenims , CD1, Nr. 300;
301 priedas. Informaciniai plakatai, CD1, Nr. 301;
302 priedas. Reklaminė atributika, CD1, Nr. 302;
303 priedas. PRATC internetinio tinklapio atnaujinimas, 1 lapas, Nr. 303;
304 priedas. PRATC internetinio tinklapio atnaujinimas, 2 lapai, Nr. 304;
305 priedas. PRATC internetinio tinklapio atnaujinimas, 1 lapas, Nr. 305;
306 priedas. Kupiškio r. savivaldybės internetinio puslapio atnaujinimas, 1 lapas, Nr. 306;
307 priedas. Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas", 2010-10-07, 1 lapas, Nr. 307;
308 priedas. Aiškinamieji dokumentai dėl gyvenamųjų namų arti kelio, vedančio į regioninį sąvartyną, langų ir durų keitimo ir teritorijos prie kelio Panevėžys- Miežiškiai, ties Liūdynės gyvenviete apželdinimo, 17 lapų.

KONTROLĖS, KOREGUOJAMŲJŲ IR TEISINIO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Ariona Čeplėjienė

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

12. Projektas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendintas ir atitinka ES keliamus reikalavimus.

PRIEDAI

1 priedas. Panevėžio regioninis sąvartyno Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00012, 2009-07-01 (statybos II dalies I etapas), 6 lapai;

2 priedas. Panevėžio regioninis sąvartyno Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00013, 2009-07-01 (statybos I dalis), 3 lapai;

3 priedas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00011, 2009-07-01, 3 lapai;

4 priedas. Panevėžio miesto sąvartyno Dvarininkų k. Panevėžio r. pripažinimo tinkamai uždarytu aktas Nr. PTN-100-091209-00145, 2009-12-04, 5 lapai;

5 priedas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Didžiagrašių k. Kupiškio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-53-081230-078, 2008-12-29, 3 lapai;

6 priedas. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Savitiškio g. 12, Panevėžys pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-51-081224-073, 2008-12-22, 3 lapai;

7 priedas. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Technikos g. 6I, Kupiškis pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-53-081230-077, 2008-12-29, 3 lapai;

8 priedas. Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Mūšos g. 12B, Pasvalys pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-55-081223-068, 2008-12-16, 3 lapai;

9 priedas. Perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės K. Donelaičio g. 16, Rokiškis pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-56-081223-070, 2008-12-17, 3 lapai;

10 priedas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Ruzgų k. Rokiškio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-56-081223-071, 2008-12-17, 3 lapai;

11 priedas. Perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų aikštelės, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Biržų k. Biržų r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-52-081224-072, 2008-12-22, 3 lapai;

12 priedas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Levaniškio k. Pasvalio r. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-55-081223-069, 2008-12-16, 3 lapai;

13 priedas. Objektų atlikimo pažymos, 12 lapų;

14 priedas. Darbų perėmimo pažymos, 12 lapų;

15 priedas. Įrangos naujai atliekų tvarkymo sistemai pirkimo priėmimo- perdavimo aktai, 7 lapai;

16 priedas. Investicijų rodiklių skaičiavimas, 1 lapas;

17 priedas. Kapitalo rodiklių skaičiavimas, 1 lapas;

18 priedas. Projekto finansinis gyvybingumas, 1 lapas;

19 priedas. Jautrumo analizė, 1 lapas;

20 priedas. Ekonominių rodiklių skaičiavimas, 1 lapas;

21 priedas. Visuomenės informavimo kompanijų analizė, CD1, Nr. 21;

22-25 priedai. Panevėžio regiono gyventojų sociologinė apklausa, CD1, Nr. 22-25;

26-67 priedai. Susitikimai su bendruomenėmis, CD1, Nr.26-67;

68-92 priedai. Susitikimai su interesų grupėmis, CD1, Nr. 68-92;

93-96 priedai. Publikacijos nacionaliniuose dienraščiuose, CD1, Nr. 93-96;

97-209 priedai. Publikacijos apskrities, regioninėje, vietos spaudoje, CD1 ir CD2, Nr. 97-209;

210-219 priedai. Pranešimai spaudai, Nr. 210-238, 37 lapai;

KOPIJA TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29 188

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

220-238 priedai. Pranešimai spaudai, CD1, Nr. 220-238;
239-243 priedai. Spaudos konferencija, CD1, Nr. 239-243;
244-249 priedai. PRATC internetinio tinklapio sukūrimas/palaikymas/atnaujinimas, CD1, Nr. 244-249;
250-256 priedai. Savivaldybių internetinių puslapių atnaujinimas, CD1, Nr. 250-256;
257 priedas. Žiniasklaidos monitoringas ir analize, CD1, Nr. 257;
258 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", Nr. 258;
259 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", CD1, Nr. 259;
260 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", Nr. 260;
261 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", CD1, Nr. 261;
262 priedas. Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", Nr. 262;
263 Neperiodinis leidinys „Atliekų tvarkymo aktualijos", CD1, Nr. 263;
264-267 priedai. Konkursai ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams, CD1, Nr. 264-267;
268 priedas. TV laida, DVD1;
269 priedas. TV laida, DVD2;
270 priedas. TV laida, DVD3;
271 priedas. TV laida, DVD4;
272 priedas. TV laida, DVD5, Nr. 272;
273 priedas. TV laida, DVD5, Nr. 2732;
274 priedas. TV laida, DVD7;
275 priedas. TV laida, DVD8;
276 priedas. TV laida, DVD9;
277 priedas. TV laida, DVD10;
278 priedas. TV laida, DVD11;
279 priedas. TV laida, DVD12;
280 priedas. TV laida, DVD13;
281 priedas. TV laida, DVD16, Nr. 281;
282 priedas. TV laida, DVD15;
283 priedas. TV laida, DVD16, Nr. 283;
284 priedas. TV laida, DVD17;
285 priedas. TV laida, DVD18;
286-297 priedai. Radijo laida, CD1, Nr. 286-297;
298 priedas. TV klipas, CD1, Nr. 298;
299 priedas. Spalvotos atmintinė fiziniams asmenims, CD1, Nr. 299;
300 priedas. Spalvotos atmintinės juridiniams asmenims , CD1, Nr. 300;
301 priedas. Informaciniai plakatai, CD1, Nr. 301;
302 priedas. Reklaminė atributika, CD1, Nr. 302;
303 priedas. PRATC internetinio tinklapio atnaujinimas, 1 lapas, Nr. 303;
304 priedas. PRATC internetinio tinklapio atnaujinimas, 2 lapai, Nr. 304;
305 priedas. PRATC internetinio tinklapio atnaujinimas, 1 lapas, Nr. 305;
306 priedas. Kupiškio r. savivaldybės internetinio puslapio atnaujinimas, 1 lapas, Nr. 306;
307 priedas. Panevėžio miesto ir rajono laikraštis „Panevėžio balsas", 2010-10-07, 1 lapas, Nr. 307;
308 priedas. Aiškinamieji dokumentai dėl gyvenamųjų namų arti kelio, vedančio į regioninį sąvartyną, langų ir durų keitimo ir teritorijos prie kelio Panevėžys- Miežiškiai, ties Liūdynės gyvenviete apželdinimo, 17 lapų.

TIKRA
Direktorės vardas

Kodas 300127004, Beržų g. 44, Panevėžys, tel./faks. (8~45) 432199, el. paštas info@pratc.lt

Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

Regioninio sąvartyno (statybos II dalies I etapas), unikalus Nr. 4400-1147-7746 su priklausiniais, Dvarininkų k., Panevėžio r., pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Nr. PTN-100-090702-00012

Panevėžys 2009 m. liepos 1 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2009m. birželio 23d.** įsakymu **Nr. 1V-177** šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),

Gintaras Čepas - Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas,

Albertas Činikas- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.

Marijonas Dambrauskas- Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas,

Antanas Gailiušis- Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio r. agentūros vedėjas.

Viktoras Grincevičius- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas,

Arturas Grucė- UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius,

Darius Marciuška- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas.

Raimundas Pilkauskas- UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas,

Petras Rameika - Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Valdui Grigaliūnui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3995**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**,

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą **Regioninį sąvartyną (statybos II dalies I etapas) su priklausiniais, Dvarininkų k., Panevėžio r.**, kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr. S-185**.

2. Leidimas statyti išduotas **2007 m. gruodžio 28 d., Nr. 07/21-1**.

Projektą ekspertavo **UAB „Projektų ekspertizė"**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, bendrosios ekspertizės aktas **2007-11-16 Nr.141-2007-5**.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čaplėjienė

REGION. SĄVARTYNAS (STATYBOS II D. I ETAPAS) DVARININKŲ K. PANEVĖŽIO R.

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos, Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

190

rangovas AB "Panevėžio statybos trestas", atestatas Nr.0322, galioja iki 2013-02-15. bendrieji ir specialieji statybos darbai.
Subrangovai: UAB „Santeka" atestato Nr. 0108. galioja iki 2013-02-15. UAB „Šiaulių rymota" atestato Nr. 0782 galioja 2013-10-10. UAB „Ogasta" atestatas Nr. 3935 galioja 2012-05-11. AB „Panevėžio keliai" atestatas Nr. 185 galioja 2013-02-15.

5. Statyba pradėta 2008 m. sausio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Nepavojingų atliekų sąvartynas		m^2	60000	61159,89
Kiemo aikštelė		m^2	20710,13	19773,42
Bendras plotas/statybinis tūris:				
Administracinis pastatas		m^2/m^3	154/780	153,92/732
Garažas		m^2/m^3	375,72/3162	371,74/2389
Atliekų rūšiavimo pastatas		m^2/m^3	1668,84/21520	1594,11/18511
Lietaus nuotekų tinklai, siurblinė		m/vnt. šul.	3842	1110,91/46
Buitinių nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	1438	1606,5/22
Slėginė nuotekų linija		m/vnt. šul.	280	288,25/7
Vandentiekio tinklai		m/vnt. šul.	841,45	1126,52/18
Kiemo aptvėrimas		m	1740	1740,88
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	22.321,503	24.253,069

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika:
Administracinis pastatas (11,84x15,45), garažas (12,61x30,56), rūšiavimo pastatas (24,92x66,92), antrinių žaliavų rūšiavimo linija AVOS (AVERMANN), pajėgumas 7000 t/m, artezinis gręžinys 130 m gylio, našumas 2-25 m^3/h, lietaus nuotekų valymo įrenginys Euro PEK Filtec Kombi NS 32/6000 (32 l/s), lietaus nuotekų siurblinės Nr. 1 ir Nr. 2, filtrato siurblinė, lietaus nuotekų išlyginamoji talpa 30 m^3, filtrato nuotekų avarinio sukaupimo talpa 50 m^3, drenažo vandens siurblinė, drenažo vandens sukaupimo avarinė talpa 50 m^3.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos, atliekų nukenksminimo įrangos,) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

REGION. APSAUGINIAI VIETATVARKOS IR ĮTAPAS DVARININKŲ PANEVĖŽIO
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Kuolaitis
L 191
2

Komisija pripažįsta, kad Panevėžio regioninis sąvartynas (statybos II dalies I etapas) tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti. (Statiniai ir priklausiniai nurodyti akto priede Nr. 5)

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 32 tomai.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 26 l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 3 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1 l.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų- inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 3 l.
6. Pastatų energetinio naudingumo sertifikatai 2 l.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ G.Čepas

_____ A. Činikas

_____ M.Dambrauskas

_____ A. Gailiušis

_____ V.Grincevičius

_____ A.Grucė

_____ D.Marciuška

_____ R.Pilkauskas

_____ P.Rameika

Rangovas _____ V.Grigaliūnas

Techninis prižiūrėtojas _____ J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė projekto administratorius _____ Vaidas Peleckas

Perdavė statybos vadovas _____ Valdas Grigaliūnas

2009 m. liepos 1 d.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė

192
2011-06-29

5 priedas

Statinių ir jų priklausinių, pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas

Unikalus Nr	Pavadinimas	Ilgis m./vnt.
4400-1861-5860	Nepavojingų atliekų sąvartynas	1
4400-1859-5512	Administracinis pastatas	1
4400-1859-5534	Garažas	1
4400-1859-7050	Rūšiavimo pastatas	1
4400-1861-5859	Kiemo aptvėrimas t1 t2 Iš viso	 1735,88 5 **1740,88**
4400-1861-8938	Vandentiekio tinklai d32 d50 d40 d63 Iš viso Šulinys Rezervuaras Gręžinys, d250	 278,62 247,33 48,78 163,87 **738,6** 5 3 140
4400-1861-8872	Vandentiekio tinklai d200 Šulinys	 6,87 2
4400-1861-8861	Vandentiekio tinklai d200 Šulinys	 6,04 2
4400-1861-8950	Vandentiekio tinklai d110 d200 Iš viso Šulinys Siurblynė	 164,94 6,42 **171,36** 2 1
4400-1861-8918	Vandentiekio tinklai d110 Šulinys	 23,33 1
4400-1861-8883	Vandentiekio tinklai d200 d500 Iš viso Siurblynė Šulinys Rezervuaras	 2,71 177,61 **180,32** 1 1 1
	Vandentiekio tinklai, Iš viso	**1126,52/19**
4400-1861-9059	Lietaus nuotekų tinklai d200 Šulinys	 50,1 3

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

4400-1861-9264	Lietaus nuotekų tinklai d400 d250 d400 d200 d300 Iš viso Siurblynė Šulinys Valymo įrenginys	 32,6 20,9 48,77 300,57 50,42 **453,26** 1 19 1
4400-1861-9137	Lietaus nuotekų tinklai d160	 48,57
4400-1861-9426	Lietaus nuotekų tinklai d110 Šulinys	 2,15 2
4400-1861-9180	Lietaus nuotekų tinklai d400 Šulinys	 21,1 1
4400-1861-9074	Lietaus nuotekų tinklai d200 d160 Iš viso Šulinys	 35,76 5,04 **40,8** 2
4400-1861-9104	Lietaus nuotekų tinklai d200 d110 Iš viso Šulinys Siurblynė	 263,34 121,23 **384,57** 10 1
4400-1861-9115	Lietaus nuotekų tinklai d200 Šulinys	 14,38 1
4400-1861-9215	Lietaus nuotekų tinklai d250	 39,55
4400-1861-9348	Lietaus nuotekų tinklai d250	 2,92
4400-1861-9437	Lietaus nuotekų tinklai d250	 3,17
4400-1861-9060	Lietaus nuotekų tinklai d110 Šulinys	 36,06 2
4400-1861-9159	Lietaus nuotekų tinklai d300 Šulinys	 11,86 1
4400-1861-9370	Lietaus nuotekų tinklai d160 Šulinys	 2,42 1
	Lietaus nuotekų tinklai Iš viso	**1110,91/45**
4400-1861-9391	Nuotekų šalinimo tinklai (slėginė nuotekų linija) d300 d100 Iš viso Siurblynė Šulinys	 6,62 229,25 **235,87** 1 4
	Nuotekų šalinimo tinklai (slėginė nuotekų linija)	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėljienė
2011-08-29

194

4400-1861-9404	d90	24,61
	Šulinys	2
4400-1861-9048	Nuotekų šalinimo tinklai (slėginė nuotekų linija) d200 Šulinys	 14,67 1
4400-1861-9226	Nuotekų šalinimo tinklai (slėginė nuotekų linija) d90	 13,1
	Nuotekų šalinimo tinklai (slėginė linija) Iš viso	**288,25/8**
4400-1861-9415	Nuotekų šalinimo tinklai d300 d250 Iš viso Šulinys	 272,44 980,38 **1252,82** 7
4400-1861-9304	Nuotekų šalinimo tinklai d160 d110 Iš viso Šulinys Rezervuaras	 344,52 9,16 **353,68** 13 1
	Nuotekų šalinimo tinklai Iš viso	**1606,5/21**
4400-1861-5848	Kiemo aikštelė b1 (asfaltas) b2 (betono trinkelės) b3 (žvyras) b4 (betonas) Iš viso	m2 12016,32 626,39 7051,48 79,23 **19773,42**

Statybos vadovas Valdas Grigaliūnas

Statinio techninis prižiūrėtojas Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė 195
2011 -06- 29

2

Regioninio sąvartyno (statybos I dalis), unikalus Nr. 4400-1254-1463
su priklausiniais, Dvarininkų k., Panevėžio r.,
pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Nr. PTN-100-090702-00013

Panevėžys 2009 m. liepos 1 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2009m. birželio 23 d.** įsakymu **Nr. 1V-175** šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),
Gintaras Čepas - Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas,
Albertas Činikas- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas,
Marijonas Dambrauskas- Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas,
Antanas Gailiušis- Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio r. agentūros vedėjas,
Viktoras Grincevičius- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas,
Arturas Grucė- UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius,
Darius Marciuška- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas,
Raimundas Pilkauskas- UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas,
Petras Rameika - Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Valdui Grigaliūnui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3995**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**,

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą **Regioninį sąvartyną (statybos I dalis), Dvarininkų k., Panevėžio r.**, kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr. S-185**.

2. Leidimas statyti išduotas **2009 m. birželio 1 d., Nr. 09/05**.

Projektą ekspertavo **UAB „Projektų ekspertizė"**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, bendrosios ekspertizės aktas **2007-11-16 Nr.141-2007-5**.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr. 0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieje ir specialieji statybos darbai.

TIKRA
Vyriausiasis vedėja
2011-06-29
Aldona Čepėlienė

REGION. SĄVARTYNAS (STATYBOS I D.) DVARININKŲ K. PANEVĖŽIOR

VTPSi prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

196

Subrangovai: UAB „Šiaulių rymota" atestato Nr. 0782 galioja 2013-10-10. UAB „Ogasta" atestatas Nr. 3935 galioja 2012-05-11. AB „Panevėžio keliai" atestatas Nr. 185 galioja 2013-02-15.

5. Statyba pradėta 2009 m. birželio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Kiemo aikštelė	b4	m^2	1986.5	3415,65
Kiemo aikštelė	b5	m^2	120.2	91,41
Kiemo aikštelė	b6	m^2	190	189,15
Kiemo aptvėrimas	t1	m	270	268,75
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	700.000	731,400

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika:
Rekonstruota priėmimo zonos (svarstyklių) aikštelė, įrengta mašinų ratų dezinfekavimo duobė.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos, atliekų nukenksminimo įrangos,) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

REGION ŽAVARTYNAS
ISTATYBOS IR.
DVARININKŲ L.
PANEVĖŽIOR.

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos
Kontrolės skyriaus
vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

197

Komisija pripažįsta, kad Regioninis sąvartynas (statybos 1 dalis), unikalus Nr. 4400-1254-1463, su priklausiniais: kiemo aptvėrimas (unik. Nr. 4400-1861-5826), kiemo aikštelė (unik. Nr.6699-5000-1061), Dvarininkų k., Panevėžio r., tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 32 tomai.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ G.Čepas

_____ A. Činikas

_____ M.Dambrauskas

_____ A. Gailiušis

_____ V.Grincevičius

_____ A.Grucė

_____ D.Marciuška

_____ R.Pilkauskas

_____ P.Rameika

Rangovas _____ V.Grigaliūnas

Techninis prižiūrėtojas _____ J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė projekto administratorius _____ Vaidas Peleckas

Perdavė statybos vadovas _____ Valdas Grigaliūnas

2009 m. liepos 1 d

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė
2011-06-29

Baigtos statyti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, unikalus Nr. 4400-1254-0777 ir Nr. 4400-1253-9778 su priklausiniais, Dvarininkų k., Panevėžio r., pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

NR. PTN-100-090702-00011

Panevėžys 2009 m. liepos 1 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2009m. birželio 23 d.** įsakymu **Nr. 1V- 176** šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),
Gintaras Čepas - Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas,
Albertas Činikas- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas,
Marijonas Dambrauskas- Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas,
Antanas Gailiušis- Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio r. agentūros vedėjas,
Viktoras Grincevičius- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas,
Arturas Grucė- UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius,
Darius Marciuška- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas,
Raimundas Pilkauskas- UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas,
Petras Rameika - Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Valdui Grigaliūnui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3995**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**,

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą **baigtą statyti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, Dvarininkų k., Panevėžio r.**, kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr. S-185**.
2. Leidimas statyti išduotas **2008 m. gruodžio 31 d., Nr. 08/31**.

Projektą ekspertavo **UAB „Projektų ekspertizė"**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, bendrosios ekspertizės aktas **2007-11-16 Nr.141-2007-5**.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

T I K R A
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06-
2011 -06- 2
199

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOST. AIKŠTELĖ DVARININ...
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos
Kontrolės skyriaus
vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.
Subrangovai: **UAB „Santeka"** atestato **Nr. 0108**, galioja iki **2013-02-15**. **UAB „Šiaulių rymota"** atestato **Nr. 0782** galioja **2013-10-10**. **UAB „Ogasta"** atestatas **Nr. 3935** galioja **2012-05-11**. **AB „Panevėžio keliai"** atestatas **Nr. 185** galioja **2013-02-15**.

5. Statyba pradėta 2009 m. sausio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Kiemo aikštelė	b1	m^2		24,12
Kiemo aikštelė	b2	m^2	170	143,83
Kiemo aikštelė	b1	m^2		14,69
Kiemo aikštelė	b2	m^2		96,65
Kompostavimo aikštelė	b3	m^2	14203,8	14228,04
Bendras plotas/statybinis tūris:				
Administracinis pastatas		m^2/m^3	12,08/40,77	11,57/41
Kiemo aptvėrimas	t1	m	165	164,64
Kiemo aptvėrimas	t1	m	1020	1018,36
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	3,027,230	3,278,635

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika:
Konteinerinio tipo buitinis pastatas, g/b vandens rezervuaras, laistymo siurblinė, grotų kamera.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio, lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011-06-29

ŠIAULIŲ ATLIEKŲ KOMPOST. AIKŠTELĖ DVARININKŲ, PANEVĖŽIO R.

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

200

2

Komisija pripažįsta, kad baigta statyti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-1254-0777 ir Nr. 4400-1253-9778, su priklausiniais: kompostavimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-1861-7575), administracinis pastatas (unik. Nr. 4400-1861-5737), kiemo aptvėrimas (unik. Nr. 4400-1861-5815), (unik. Nr. 4400-1861-7564) , kiemo aikštelė (unik. Nr.4400-1861-7553), (unik. Nr.4400-1861-5804), Dvarininkų k., Panevėžio r., tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 12 tomų (lapų).
2. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika. 11.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ G.Čepas

_____ A. Činikas

_____ M.Dambrauskas

_____ A. Gailiušis

_____ V.Grincevičius

_____ A.Grucė

_____ D.Marciuška

_____ R.Pilkauskas

_____ P.Rameika

Rangovas _____ V.Grigaliūnas

Techninis prižiūrėtojas _____ J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė projekto administratorius _____ Vaidas Peleckas

Perdavė statybos vadovas _____ Valdas Grigaliūnas

2009 m. liepos 1 d.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

4

Panevėžio miesto sąvartyno, unikalus Nr. 4400-1253-9778
su priklausiniais, Dvarininkų k., Panevėžio r.,
pripažinimo tinkamai uždarytu

AKTAS

Nr. PTN-100-091209-00145

Panevėžys 2009 m. gruodžio 4 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2009m. lapkričio 24 d.** įsakymu **Nr. 1V-404** šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas;

Albertas Činikas- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;

Marijonas Dambrauskas- Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas;

Antanas Gailiušis- LR aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio rajono agentūros vedėjas;

Viktoras Grincevičius- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas;

Arturas Grucė- statytojo atstovas, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras direktorius;

Darius Marciuška- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;

Raimundas Pilkauskas- projektuotojas, UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas;

Petras Rameika - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas;

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Valdui Grigaliūnui**, kvalifikacijos atestatas **Nr. 3995**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr. 3555**,

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą **uždarytą Panevėžio miesto sąvartyną su priklausiniais, Dvarininkų k., Panevėžio r.**, kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr. S-185**.

2. Leidimas statyti išduotas **2008 m. sausio 16 d., Nr. 08/01.**

Projektą ekspertavo **UAB „Projektų ekspertizė"**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, bendrosios ekspertizės aktas **2007-11-16 Nr.141-2007-5.**

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras**, Beržų g. 44, Panevėžys.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė 2011-06-29

VTPS: prie LR aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

202

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.
Subrangovai: **UAB „MJ Statyba"** atestato **Nr. 5188**, galioja iki **2010-03-14**, **UAB „Manfula"** atestato **Nr. 1337**, galioja iki **2014-05-28**.

5. Statyba pradėta 2008 m. gegužės 5 d.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Sąvartynas	h1	m^2	84000	103682
Aikštelė		m^2	743	743,56
Kelias		m^2	9720	9718,34
Kelias		km	2,4	2,37931
Galvaninių atliekų kaupas (nerekonstruotas)	h2	m^2	-	1251
Mėsos pramonės atliekų duobė Nr. 1	h3	m^2/m^3	1200/3100	1586/2700
Mėsos pramonės atliekų duobė Nr. 2	h5	m^2/m^3	1900/3100	2937/3800
Asbesto atliekų sekcija	h4	m^2/m^3	1960/4700	2645/4700
Drenažo tinklai		m/vnt. šul.	3536	3500,06/8
Ūkio nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	1960	1938,25/39
Tvora	t1	m	373	372,71
Tvora	lt	m	50	49,54
Biodujų surinkimo sistema		m/vnt. gręž.	1065/18	929,6/18
Sąvartyno kaupo laistymas		m/ vnt. šul.	965/2	896,3/2
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	16.448,718	17.948,845
Biodujų surinkimo ir sąvartyno kaupo laistymo statybos darbų kaina		tūkst. Lt	635,250	635,250

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika- sąvartyno kaupo dangos konstrukcija: suvoluotas eksploataciniu grunto sluoksniu perdengtų atliekų paviršius, 30 cm storio karjerinio žvyro drenažinis sluoksnis, 7 mm storio geosintetinio molio sluoksnis (bentonito kilimas), 70 cm sluoksnis iš inertinės medžiagos, 25 cm storio sluoksnis iš vietinio grunto, 5 cm storio sluoksnis iš augalinės žemės ir apsėjimas žole.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Projekte numatytosios aplinkos apsaugos priemonės yra įvykdytos.

10. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-2
Aldona Čeplėjienė

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos
Kontrolės skyriaus
vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis
2 203

Komisija pripažįsta, kad Panevėžio miesto sąvartynas tenkina nustatytus reikalavimus ir tinkamai uždarytas. (Statiniai ir priklausiniai nurodyti akto priede Nr. 3)
Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų- 20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 42 bylos.
2. Inžinierinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktai, Statybos darbų žur. Nr. 1,4,11,14,14.1,15,16,17,18
3. Statinių ir priklausinių (tarp jų- inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, 5 priedas, 2 l.

Komisijos pirmininkas _____ (parašas) V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ A. Činikas

_____ M. Dambrauskas

_____ A. Gailiušis

_____ V. Grincevičius

_____ A. Grucė

_____ D. Marciuška

_____ R. Pilkauskas

_____ P. Rameika

Rangovas _____ V.Grigaliūnas

Techninis prižiūrėtojas _____ J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė projekto administratorius _____ Vaidas Peleckas

Perdavė statybos vadovas _____ Valdas Grigaliūnas

2009 m. gruodžio 4 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SKYRIUS

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto

TIKRA Virginijus Kuolalis

Skyriaus vedėja

Aldona Čepėjienė

2011 -06- 29

204

5 priedas

Statinių ir jų priklausinių, pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas

Unikalus Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Ilgis m./vnt.
4400-1993-1887	Sąvartynas h1	vnt./m2	1/103682
4400-1995-5147	Aikštelė	m2	743,56
4400-1995-5147	Kelias	m2	9718,34
4400-1995-5147	Kelias	km	2,37931
4400-1993-1898	Galvaninių atliekų kaupas h2	m2	1251
4400-1993-1921	Mėsos pramonės atliekų duobė Nr. 1	m2/m3	1586/2700
4400-1993-1954	Mėsos pramonės atliekų duobė Nr. 2	m2/m3	2937/3800
4400-1993-1943	Asbesto atliekų sekcija	m2/m3	2645/4700
4400-1992-8139	Drenažo tinklai d160 d110 Iš viso Šulinys	 m m m vnt.	 179,8 164,5 **344,3** 2
4400-1992-8060	Drenažo tinklai d160 d120 Iš viso Šulinys	 m m m vnt.	 81,79 252,3 **334,09** 2
4400-1993-4679	Drenažo tinklai d160	 m	 **541,27**
4400-1992-8071	Drenažo tinklai d110	 m	 **59,97**
4400-1992-8106	Drenažo tinklai d110 d160 Iš viso Šulinys	 m m m vnt.	 479,36 35,44 **514,8** 3
4400-1992-8117	Drenažo tinklai d160	 m	 **865,56**
	Drenažo tinklai		

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

4400-1992-8093	d110	m	**99,17**
4400-1992-8082	Drenažo tinklai d160	m	**482,2**
4400-1992-8128	Drenažo tinklai d110 Šulinys	m vnt.	**258,7** **1**
	Drenažo tinklai	m/vnt. Iš viso	**3500,06/8**
4400-1992-5814	Ūkio nuotekų tinklai d300 Šulinys	m vnt.	**1938,25** 39
4400-1993-1810	Tvora	m	49,54
4400-1993-1876	Tvora	m	372,71
4400-1993-3227	Biodujų surinkimo sistema d200 d160 d90 Iš viso Gręžiniai		257,6 589,5 82,5 **929,6** 18
4400-1993-3070	Sąvartyno kaupo laistymas d63		**572,75**
4400-1993-3149	Sąvartyno kaupo laistymas d50 Šulinys		**90,93** 1
4400-1993-3081	Sąvartyno kaupo laistymas d125		**154,25**
4400-1993-3168	Sąvartyno kaupo laistymas d125 Rezervuaras		**78,37** 1
	Sąvartyno kaupo laistymas	Iš viso	**896,3/2**

Statybos vadovas Valdas Grigaliūnas

Statinio techninis prižiūrėtojas Jonas Šarakauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORUPCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

206

5

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, unikalus Nr.4400-1760-4092 su priklausiniais, Didžiagrašių k., Kupiškio r., pripažinimo tinkamu naudoti

A K T A S

Kupiškis

2008m. gruodžio 29 d.

NR. STN-53-081230-078

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2008m. gruodžio 14 d.** įsakymu **Nr. 1V-521,** šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas).

Vincas Čelkis- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Kupiškio skyriaus vedėjas,

Gintaras Čepas– LR valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas,

Arturas Grucė- UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius, statytojo atstovas,

Raimondas Kurkulis -Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos VPPP viršininkas,

Vytautas Ladauskas- Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius,

Raimundas Pilkauskas-UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas,

Kazimieras Smičius- Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas,

Vita Stančikienė– Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio r. agentūros vedėja,

Mažvydas Šalkauskas-Kupiškio r. savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Viliui Ambraškai**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3989**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**,

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Didžiagrašių k., Kupiškio r., kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatyta nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr. S-186**.

2. Leidimas statyti išduotas **2008m. gruodžio 5d. Nr.St3-53-7**.

Projektą ekspertavo **UAB "Projektų ekspertizė'**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, bendrosios ekspertizės aktas **2007-11-16 Nr.141A-2007-6**.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėnienė

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOST. AIKŠTELĖ KUPIŠKIO R.

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyr. specialistas Virginijus Kuolalis

2011-06-29

Rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.
subrangovas – **UAB „Nodama"**, atestatas **Nr.141**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai,
UAB „Vekada", atestatas **Nr.109**, galioja iki **2012-10-26**, specialieji statybos darbai,
AB "Panevėžio keliai", atestatas **Nr.185** . galioja iki **2013-02-15**, bendrieji statybos darbai.

5. Statyba pradėta 2007m. gruodžio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Kiemo ir kompostavimo aikštelė		m^2	3851	3882,82
Administracinio pastato bendras plotas/statybinis tūris:		m^2/m^3	12,08/41	11,80/41
Lietaus nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	67,00	26,76/3
Vandentiekio tinklai		m	45,00	41,12
Tvora		m	305	321,26
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	1376,22	1689,99
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt	1268,97	1611,68

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika: konteinerinio tipo buitinės patalpos (2,438x6,058), g/b vandens rezervuaras 250m³. lietaus nuotekų siurblinė 1,0m³/h, grotų kamera, šachtinis vandens šulinys.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais. kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros. vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti. reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Teritorijos apželdinimas	m^2	1400	2009-05-30

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENTINIS IR VIRTIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

ŽALIUJŲ ATLIEKŲ KOMPOST. AIKŠTELĖ KUPIŠKIO R.

VIPSI prie: P. Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas Virginijus Kuolaitis

2011 -06- 29

200
2

Komisija pripažįsta, kad Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė unikalus Nr.4400-1760-4092 ir 4400-1760-4127 su priklausiniais: administracinis pastatas(unik. Nr.4400-1760-4060), lietaus nuotekų tinklai (unik. Nr.4400-1760-3940, Nr.4400-1760-3919, Nr.4400-1760-3795), vandentiekio tinklai (unik. Nr.4400-1760-3995,), tvora (unik. Nr.4400-1760-4149,), Didžiagrašių k., Kupiškio r., tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 24 tomų (lapų).
2. Inžinierinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 2 l.
3. Statinio inžinierinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 2 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1 l.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ V. Čelkis

_____ G.Čepas

_____ A.Grucė

_____ R.Kurkulis

_____ V. Ladauskas

_____ R.Pilkauskas

_____ K. Smičius

_____ V.Stančikienė

_____ M.Šalkauskas

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOST. AIKŠTELĖ KUPIŠKIO r.
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

Rangovas _____ V.Ambraška

Techninis prižiūrėtojas _____ J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė PRATC proj. vedėja (pareigos) _____ (parašas) V. Pelecka (v. pavardė)

Perdavė stat. vad. (pareigos) _____ (parašas) V. Ambraška (v. pavardė)

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

209

6

Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė, unikalus Nr.4400-1758-1743 su priklausiniais, Savitiškio g.12, Panevėžys,

pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Nr. STN-51-081224-073

Panevėžys 2008 m. gruodžio 22 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2008m. gruodžio 11d.** įsakymu **Nr.1V-525** šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas).

Gintaras Čepas – Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas.

Marijonas Dambrauskas- Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas,

Viktoras Grincevičius- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas,

Arturas Grucė- UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius,

Antanas Karalevičius- Panevėžio m. savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjas,

Darius Marciuška- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas.

Giedrius Motiejauskas–Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio m. agentūros vedėjas.

Raimundas Pilkauskas- UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas.

Petras Rameika - Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Viliui Ambraškai**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3989**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelę Savitiškio g.12, Panevėžyje, kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatyta nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė.

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr. S-186**.

2. Leidimas statyti išduotas **2008m. gruodžio 2d., Nr.67**.

Projektą ekspertavo **UAB "Projektų ekspertizė"**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, bendrosios ekspertizės aktas **2007-11-16 Nr.141A-2007-6**.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos įrenginiai ir kitos statinio dalys atliko:

rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

STAMBIAG. ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖ PANEVĖŽIO

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

210

Subrangovai: **UAB „Vekada"**, atestatas **Nr.109**, galioja iki **2012-10-26**, specialieji statybos darbai.

5. Statyba pradėta 2007m. gruodžio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Kiemo aikštelė		m^2	1300	1254,29
Bendras plotas/statybinis tūris:				
Administracinis pastatas		m^2/m^3	12,08/41	11,56/37
Sandėlis		m^2/m^3	13,23/41	13,07/40
Sandėlis		m^2/m^3	16,23/50	13,10/40
Lietaus nuotekų tinklai, siurblynė		m/vnt. šul.	170	173,1/12
Buitinių nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	20	19,79/2
Slėginė nuotekų linija		m/vnt. šul.	130	97,95/1
Vandentiekio tinklai		m/vnt. šul.	80	82.37/1
Kiemo aptvėrimas		m	165	155.4
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	742.98	982,74
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt	585.53	904,42

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika:
Konteinerinio tipo pastatai: priėmejo ir buitinė patalpa (2,438x6,058), pavojingų atliekų skyrius (2.438x6,058), elektrotechnikos atliekų skyrius (3x6), lietaus nuotekų valymo įrenginiai NGP.S-4 (4 l/s), lietaus nuotekų siurblinė, buities nuotekų siurblinė, atliekų konteineriai 13vnt.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos, atliekų nukenksminimo įrangos.) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Teritorijos apželdinimas	m^2	700	2009-05-30

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-2
Aldona Čeplėjienė

211

STANDIAG. ATLIEKŲ PRIĖMIMO
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos kontrolės skyriaus 6/6a. stasis specialistas

2

Komisija pripažįsta, kad Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė, unikalus Nr.4400-1758-1743, su priklausiniais: administracinės patalpos (unik. Nr.4400-1758-0979), sandėlis (unik. Nr.4400-1758-1721), sandėlis (unik. Nr.4400-1758-1732), kiemo aptvėrimas (unik. Nr.4400-1758-1754), vandentiekio tinklai (unik. Nr.4400-1758-1176), lietaus tinklai (unik. Nr.4400-1758-1110), lietaus tinklai (unik. Nr.4400-1758-1087), buitinės nuotekos (unik. Nr.4400-1758-1143), slėginė nuotekų linija (unik. Nr.4400-1760-6732), Savitiškio g.12, Panevėžys, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektu-20 metu

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 12 tomų (lapų).
2. Inžinierinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu. 2 l.
3. Statinio inžinierinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai. 2 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika. 1 l.

Komisijos pirmininkas ..... (parašas) V. Kuolaitis

Komisijos nariai: G.Čepas

M.Dambrauskas

V.Grincevičius

A.Grucė

A.Karalevičius

R.Pilkauskas

D.Marciuška

G.Motiejauskas

P.Rameika

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Skyriaus vedėjas (-ja) (-ją)
Vyriausiasis darbo inspektorius
Rimantas Trota

STAMBIAG ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖ PANEVĖŽIOM

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos
Kontrolės skyrius
Vyriausiasis specialistas
Virginijus Abdolatis

Rangovas ..... V.Ambraška

Techninis prižiūrėtojas ..... J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė PRAIC projekto vadovas (pareigos) ..... (parašas) A. Peleckis (v. pavardė)

Perdavė stat. vad. (pareigos) ..... (parašas) V.Ambraška (v. pavardė)

LIETUVOS TINKLAI
KONTROLIUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ IR FILIALŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

212

7

Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-1760-4392
su priklausiniais, Technikos g.61, Kupiškis,
pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS

Nr.STN-53-081230-077

Kupiškis

2008 m. gruodžio 29 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 11d. įsakymu Nr.1V-524,
šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas).
Vincas Čelkis- Panevėžio visuomenes sveikatos centro Kupiškio skyriaus vedėjas.
Gintaras Čepas- LR valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas.
Arturas Gruce- UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius, statytojo atstovas.
Raimondas Kurkulis- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbejimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbejimo tarnybos VPPP viršininkas.
Vytautas Ladauskas- Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius.
Raimundas Pilkauskas- UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas.
Kazimieras Smičius- Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas.
Vita Stančikienė- Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio r. agentūros vedėja.
Mažvydas Šalkauskas- Kupiškio r. savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Vilini Ambraškai**, kvalifikacijos atestatas Nr.3989,

ir techniniam prižiūretojui Jonui Šarakauskui, kvalifikacijos atestatas Nr.3555,
vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė Technikos g.61, Kupiškis, kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatyta nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė UAB **"Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki 2013-08-29,
ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr.S-186**.

2. Leidimas statyti išduotas **2008m. gruodžio 5d. Nr.St3-53-6**.
Projektą ekspertavo **UAB "Projektų ekspertizė"**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, bendrosios ekspertizės aktas 2007-11-16 Nr.141A-2007-6.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
Rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.subrangovas - **UAB"Nodama"**, atestatas **Nr.141**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Četiljienė

STAMBIAG. ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTĖLĖ KUPIŠKIOM.
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

213

UAB „Vekada", atestatas Nr.109, galioja iki 2012-10-26, specialieji statybos darbai,
AB "Panevėžio keliai", atestatas Nr.185 , galioja iki 2013-02-15, specialieji statybos darbai.

5. Statyba pradėta 2007m. gruodžio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Kiemo aikštelė		m^2	3120	3282,69
Bendras plotas/statybinis tūris:				
Administracinis pastatas.		m^2/m^3	12,29/41	11,76/41
Sandėlis		m^2/m^3	13,23/41	13,01/41
Sandėlis		m^2/m^3	16,23/50	13,01/41
Lauko vandentiekis		m/vnt. šul.	120	135,33/1
Lietaus nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	310,20	331,43/20
Buitinių nuotekų tinklai		m/ vnt. šul.	150,10	170,72/7
Tvora		m	280	255,09
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	1448,40	1365,88
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt	1237,80	1287,57

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika
Konteinerinio tipo pastatai: priėmėjo ir buitinė patalpa (2,438x6,058), pavojingų atliekų skyrius (2,438x6,058), elektrotechnikos atliekų skyrius (3x6), lietaus nuotekų valymo įrenginiai NGP-10 (10 l/s), atliekų konteineriai 13vnt.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos, atliekų nukenksminimo įrangos,) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplejienė
214

STAMBIAG ATLIEKAI
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos kontrolės skyriaus

Komisija pripažįsta, kad Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė, unikalus Nr.4400-1760-4392 su priklausiniais: administracinis pastatas (unik. Nr.4400-1760-4352), sandėlis (unik. Nr.4400-1760-4366), sandėlis (unik. Nr.4400-1760-4370), vandentiekio tinklai (unik. Nr.4400-1760-4338,) nuotekų šalinimo tinklai (unik. Nr.4400-1760-4305), lietaus nuotekų tinklai (unik.Nr.4400-1760-4349), tvora (unik. Nr.4400-1760-4405), Technikos g.6I, Kupiškis, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 12 tomų (lapų).
2. Inžinierinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 2l.
3. Statinio inžinierinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 1 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1 l.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ V. Čelkis

_____ G.Čepas

_____ A.Grucė

_____ R.Kurkulis

_____ V. Ladauskas

_____ R.Pilkauskas

_____ K. Smičius

_____ V.Stančikienė

_____ M.Šalkauskas

STAMBIAG. ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖ KUPIŠKIO M.
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Kuolalis

Rangovas _____ V.Ambraška

Techninis prižiūrėtojas _____ J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė PRATC proj. adm. (pareigos) _____ (parašas) V. Pelechas (v. pavardė)

Perdavė statybos vadovas (pareigos) _____ (parašas) V. Ambraška (v. pavardė)

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2011-06-29

8

Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-1752-1121,
su priklausiniais, Mūšos g. 12b, Pasvalys,
pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS
NR. STN-55-081223-068

Pasvalys 2008m. gruodžio 16 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2008m. gruodžio 5 d.** įsakymu **Nr. 1V-502,** šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas).
Antanas Asauskas- Pasvalio r. savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vedėjas,
Juozas Baltrūnas– Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Pasvalio r. agentūros vedėjas,
Gintaras Čepas – Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas,
Leonas Gabriūnas- Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas,
Arturas Grucė - UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius, statytojo atstovas,
Violeta Juozapavičienė- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Pasvalio skyriaus vedėja,
Marius Kaulinskas- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas,
Raimundas Pilkauskas- UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas,
Petras Ramelka - Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Viliui Ambraškai**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3989**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**,

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelę Mūšos g.12b, Pasvalyje,

kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatyta nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11, Nr. S-186.**

2. Leidimas statyti išduotas 2008m. sausio 3d. Nr.35/NS.

Projektą ekspertavo **UAB "Projektų ekspertizė"**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, bendrosios ekspertizės aktas **2007-11-16, Nr.141A-2007-6.**

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

STAMBIAG. ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖ PASVALYJE
VTPSI prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyr. specialistas Virginijus Kuolalis
2011-06-29

210

Rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.
Subrangovai: **AB "Panevėžio keliai"**, atestatas **Nr.185** , galioja iki **2013-02-15**, bendrieji statybos darbai, **UAB "Vekada"**, atestatas **Nr.109**, galioja iki **2012-10-26**, specialieji statybos darbai.

5. Statyba pradėta 2008m. sausio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Bendras plotas/statybinis tūris:				
Administracinis pastatas		m^2/m^3	12,08/41	11,60/38
Sandėlis		m^2/m^3	13,23/41	13,05/40
Sandėlis		m^2/m^3	16,23/50	12,96/39
Kiemo aikštelė		m^2	1850	1784,48
Lietaus nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	205	204,44/17
Buitinių nuotekų tinklai		m /vnt. šul.	130	119,34/5
Vandentiekio tinklai		m	160	155,92
Kiemo aptvėrimas		m	200	198,69
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	829,65	842,23
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt	665,67	763,92

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika: lietaus nuotekų valymo įrenginiai NGP-5 (5 l/s), atliekų konteineriai 13vnt. konteinerinio tipo buitinės patalpos ir du sandėliai.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Teritorijos apželdinimas	m^2	415	2009-05-30

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

STAMBIAG ATLIEKŲ PRIEMIMO AIKŠTELĖ PASVALIO M
VTPSI prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas Virginijus Kuolaitis

Komisija pripažįsta, kad Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė Mūšos g. 12b, Pasvalys su priklausiniais: kiemo aikštelė (unik. Nr.4400-1752-1121), administracinis pastatas (unik. Nr.4400-1752-1043), sandėlis (unik. Nr.4400-1752-1076), sandėlis (unik. Nr.4400-1752-1098), vandentiekio tinklai (unik. Nr.4400-1752-1365), buitinių nuotekų tinklai (unik. Nr.4400-1752-1298), lietaus kanalizacija (unik.Nr.4400-1752-1265), kiemo aptvėrimas (unik. Nr.4400-1752-1165), tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 18 tomų (lapų).
2. Inžinierinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 3 lapai.
3. Statinio inžinierinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 3 lapai.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ A. Asauskas

_____ J. Baltrūnas

_____ G. Čepas

_____ L. Gabriūnas

_____ A. Grucė

STAMBIAG. ATLIEKŲ PRIEMIMO AIKŠTELE PASVALIO m.

VTPS, prie : P. Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Kuolalis

_____ V. Juozapavičienė

_____ M. Kaulinskas

_____ R. Pilkauskas

_____ P. Rameika

Rangovas _____ V. Ambraška

Techninis prižiūrėtojas _____ J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė PRATC proj. adm. (pareigos) _____ (parašas) V. Pelechas (v. pavardė)

Perdavė stat. vad (pareigos) _____ (parašas) V. Ambraška (v. pavardė)

2008m. gruodžio 16 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS MINISTERIJA KONTROLĖS KOMISIJOS IR VESTIBIO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė

2011-06-29

218
3

9

Perkrovimo stotis, stambiagabaričių atliekų aikštelė, unikalus Nr. 4400-1766-5879 su priklausiniais, K.Donelaičio g.16, Rokiškis pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Rokiškis NR. STN-56-081223-070

2008m. gruodžio 17 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2008m. gruodžio 11 d.** įsakymu **Nr. 1V-527**, šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),

Vidmantas Bražiūnas–Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiškio r. agentūros vedėjas,

Gintaras Čepas – Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas,

Danguolė Dagienė- Rokiškio r. savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja,

Arturas Grucė - UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius, statytojo atstovas,

Virginijus Lukošiūnas-Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius,

Liudas Navickas- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas,

Raimundas Pilkauskas-UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas,

Virginijus Strazdas-Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas,

Irena Uginčienė- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiskio skyriaus vedėja,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Viliui Ambraškai**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3989**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą Perkrovimo stotį, stambiagabaričių atliekų aikštelę su priklausiniais K.Donelaičio g.16, Rokiškyje,

kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatyta nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr.S-186**.

2. Leidimas statyti išduotas 2008m. gruodžio 8d. Nr.S13-22.

Projektą ekspertavo **UAB "Projektų ekspertizė'**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, **2007-11-16** bendrosios ekspertizės aktas **Nr.141A-2007-6**.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

T. L. K. R.
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 2

PERKR. STOTIS, STAMBIAGAB. ATLIEKŲ AIKŠT. ROKIŠKIO M.
VTPSI prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Kuolalis
219

rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.
Subrangovai: **UAB"Vekada"**, atestatas **Nr.109**, galioja iki **2012-10-26**, specialieji statybos darbai, **AB "Panevėžio keliai"**, atestatas **Nr.185** , galioja iki **2013-02-15**, bendrieji statybos darbai.

5. Statyba pradėta 2007m. gruodžio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Bendras plotas/statybinis tūris:				
Sandėlis		m^2/m^3	667,40/7663	668,59/7936
Administracinis pastatas		m^2/m^3	24,29/80	24,39/81
Sandėlis		m^2/m^3	13,23/41	13,13/41
Sandėlis		m^2/m^3	16,23/50	13,13/41
Asfaltuota kiemo aikštelė		m^2	1600	1556,48
Lietaus nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	225	175,55/18
Buitinių nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	149	198,47/7
Vandentiekio tinklai		m/vnt. šul.	150	215,79/1
Tvora		m	230	237,8
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	2169,21	2629,50
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt	1443,94	2551,19

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika: perkrovimo stotis-g/b kolonos 500x500, metaliniai ryšiai, lengvų metalo sijų denginys. Atliekų perkrovimo įranga-konvejeris, presas, 28m³ konteineriai-3vnt. Lietaus nuotekų valymo įrenginiai NGP-5 (5 l/s), atliekų surinkimo konteineriai 13vnt.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos, atliekų nukenksminimo įrangos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-29

PERKR. STOTIS, STAMBIAGAB. ATLIEKŲ AKŠT. ROLIŠKIO M.
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Virginius Kudalis

220

Komisija pripažįsta, kad Perkrovimo stotis, stambiagabaričių atliekų aikštelė su priklausiniais: administracinis pastatas (unik. Nr.4400-1766-5846), sandėlis (unik. Nr.4400-1766-5879, sandėlis (unik. Nr.4400-1766-5857), sandėlis (unik. Nr.4400-1766-5868), tvora (unik. Nr.4400-1766-5880), kiemo aikštelė (unik. Nr.4400-1766-5913), vandentiekio tinklai (unik. Nr.4400-1766-4454), lietaus nuotekų tinklai (unik. Nr.4400-1766-5579), nuotekų šalinimo tinklai (unik. Nr.4400-1766-5246). lietaus nuotekų tinklai (unik. Nr.4400-1766-5568), nuotekų šalinimo tinklai (unik. Nr.4400-1766-5479) K.Donelaičio g.16, Rokiškis, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 24 tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 3 l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 2 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1l.

Komisijos pirmininkas V. Kuolalis

Komisijos nariai: V.Bražiūnas

G.Čepas

D.Dagienė

A.Grucė

V.Lukošiūnas

I.Navickas

R.Pilkauskas

V.Strazdas

I.Ginčienė

Rangovas V.Ambraška

Techninis prižiūrėtojas J.Šarakauskas

PERLC. STOTIS, STAMBIAG. ATLIEKŲ AIKŠT. ROKIŠKIO M.

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Kuolalis

Rokiškio pirmininkas

ELVIRA ŠALTIS

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė PRATC proj. vedėjas (pareigos) (parašas) V. Pelec (v. pavardė)

Perdavė stat. vedėj. (pareigos) (parašas) V. Ambraška (v. pavardė)

2008m. gruodžio 17 d.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

221

10

STR 1.11.01:2002

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-1766-1735,
su priklausiniais, Ruzgų k., Rokiškio r.
pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS

Rokiškis Nr. STN-56-081223-071 2008m. gruodžio 17 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2008m. gruodžio 11 d.** įsakymu **Nr. 1V-519**, šios sudėties:

Virginijus Kuolalis- komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),
Vidmantas Bražiūnas–Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiškio r. agentūros vedėjas,
Gintaras Čepas – Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas,
Danguolė Dagienė- Rokiškio r. savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja,
Arturas Grucė - UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius, statytojo atstovas,
Virginijus Lukošiūnas-Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius,
Liudas Navickas- Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas,
Raimundas Pilkauskas-UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas,
Virginijus Strazdas-Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas,
Irena Uginčienė- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiskio skyriaus vedėja,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Viliui Ambraškai**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3989**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę su priklausiniais Ruzgų k., Rokiškio r.,

kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatyta nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr.S-186**.

2. Leidimas statyti išduotas 2008m. gruodžio 8d. Nr.S13-2 [illegible]

Projektą ekspertavo **UAB "Projektų ekspertizė'**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, **2007-11-16** bendrosios ekspertizės aktas **Nr.141A-2007-6**.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čepiėjienė

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖ RUKIŠKIO R.
VTPS prie Aplinkos ministerijos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis

222

rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji ir specialieji statybos darbai.
Subrangovai: **UAB"Vekada"**, atestatas **Nr.109**, galioja iki **2012-10-26**, specialieji statybos darbai. **AB "Panevėžio keliai"**, atestatas **Nr.185** , galioja iki **2013-02-15**, bendrieji statybos darbai.

5. Statyba pradėta 2007m. gruodžio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Administracinio pastato bendras plotas/statybinis tūris:		m^2/m^3	12,08/41	12,06/41
Kiemo ir kompostavimo aikštelė		m^2	2412	2351,58
Lietaus nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	39	37,72/5
Vandentiekio tinklai		m	65	47,23
Tvora		m	263	246,36
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	1171,11	1269,31
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt	1033,69	1190,99

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika: konteinerinio tipo buitinis pastatas, g/b vandens rezervuaras, lietaus nuotekų siurblinė 1,0m³/h, grotų kamera, šachtinis vandens šulinys.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos,) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

ŽALIUZĖ
ATHELĘ
KOMPOST.
AIKŠTELĖ
ROKISKIO R

Virginijus Kuolaitis

223

Komisija pripažįsta, kad Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, su priklausiniais: administracinis pastatas (unik. Nr.4400-1766-1713), kiemo aptvėrimas (unik. Nr. 4400-1766-1768), kiemo aikštelė (unik. Nr. 4400-1766-1724, 4400-1766-1735), vandentiekio tinklai (unik. Nr. 4400-1766-1784), lietaus nuotekų tinklai (unik. Nr. 4400-1766-1902), lietaus nuotekų tinklai (unik. Nr. 4400-1766-1835) Ruzgų k., Rokiškio r. tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio naudojimo garantinis laikas- 5metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)-10metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 14 tomų (lapų).
2. Inžinierinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 1 l.
3. Statinio inžinierinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 2 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika. 1l.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ V.Bražiūnas

_____ G.Čepas

_____ D.Dagienė

_____ A.Grucė

_____ V.Lukošiūnas

_____ L.Navickas

_____ R.Pilkauskas

_____ V.Strazdas

_____ I.Uginčienė

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOŠ. AIKŠTELĖ ROKIŠKIO R.

Vaginijus Kuolalis

Rangovas _____ V.Ambraška

Techninis prižiūrėtojas _____ J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė PRATC proj. adm. (pareigos) _____ (parašas) _____ (v. pavardė)

Perdavė stat. vad. (pareigos) _____ (parašas) _____ (v. pavardė)

2008m. gruodžio 17 d.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

224

3

11

Perkrovimo stotis unikalus numeris 4400-1766-1602, stambiagabaričių atliekų aikštelė, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, unikalus numeris 4400-1766-4749, su priklausiniais, Biržų k., Biržų raj. pripažinimo tinkamu naudoti

A K T A S

Nr. STN-52-081224-072

Biržai

2008m. gruodžio 22 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko **2008m. gruodžio 11 d.** įsakymu **Nr. 1V-528**, šios sudėties:

Virginijus Kuolalis-	komisiją paskyrusios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),
Remigijus Averinas-	Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas,
Elena Bajorūnienė-	Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų skyriaus vedėja,
Gintaras Čepas –	LR valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas,
Arturas Grucė-	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius, statytojo atstovas,
Nerijus Gudas-	Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas,
Loreta Munikienė-	Biržų r. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos l.e.p. skyriaus vedėja,
Raimundas Pilkauskas-	UAB "Statinių projektavimo biuras" direktorius, projekto vadovas,
Elona Pipiraitė–	Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Biržų r. agentūros vedėja,
Henrikas Sabaliauskas-	Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius,

dalyvaujant rangovui AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovui **Viliui Ambraškai**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3989**,

ir techniniam prižiūrėtojui **Jonui Šarakauskui**, kvalifikacijos atestatas **Nr.3555**, vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą Perkrovimo stotį, stambiagabaričių atliekų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę su priklausiniais Biržų k., Biržų raj.,

kuri nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatyta nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007m. parengė **UAB "Statinių projektavimo biuras"**, atestato **Nr.1727**, galioja iki **2013-08-29**, ir patvirtino **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"** direktorius **2007-10-11 Nr.S-186**.

2. Leidimas statyti išduotas 2007m gruodžio 6d. Nr.9-NS.

Projektą ekspertavo **UAB "Projektų ekspertizė'**, atestatas **Nr.3636**, galioja iki **2009-09-10**, **2007-11-16** bendrosios ekspertizės aktas **Nr.141A-2007-6**.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas- **UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"**, Beržų g. 44, Panevėžys.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-2
Aldona Čeplėjienė

PERKR. ST., ST. ATL. K. AIKŠT., ŽAL. ATL. COMP. AIKŠTELĖ BIRŽŲ R.
VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Virginijus Kuolalis
225

Rangovas **AB "Panevėžio statybos trestas"**, atestatas **Nr.0322**, galioja iki **2013-02-15**, bendrieji statybos darbai.
Subrangovai: **UAB"Vekada"**, atestatas **Nr.109**, galioja iki **2012-10-26**, specialieji statybos darbai, **AB "Panevėžio keliai"**, atestatas **Nr.185** , galioja iki **2013-02-15**, bendrieji statybos darbai.
UAB "Biržų ranga", atestatas **Nr.85**, galioja iki **2012-11-16** bendrieji ir specialieji statybos darbai

5. Statyba pradėta 2007m. gruodžio mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Perkrovimo stoties bendras plotas/statybinis tūris		m^2/m^3	667,40/7663	671,99/7815
Asfaltuota kiemo aikštelė		m^2	10551	7452,64
Administracinės patalpos		m^2/m^3	24,29/80	23,23/78
Sandėlis		m^2/m^3	13,23/41	13,05/40
Sandėlis		m^2/m^3	16,23/50	12,96/39
Lietaus nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	220	219,58/14
Buitinių nuotekų tinklai		m/vnt. šul.	86	80,66/4
Vandentiekio tinklai		m	190	99,00
Kiemo aptvėrimas		m	485	476,46
Rezervuaras		m^3	416,5	571
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt	4268,49	4719,25
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt	3987,58	4640,94

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika: perkrovimo stotis-g/b kolonos 500x500, metaliniai ryšiai, lengvų metalo sijų denginys. Atliekų perkrovimo įranga-konvejeris, presas, 28m³ konteineriai-3vnt. Lietaus nuotekų valymo įrenginiai NGP-16(16l/s), aerobiniai biologinio valymo įrenginiai NV-1(0,7m³/p), lietaus vandens rezervuaras 212,16m², atliekų surinkimo konteineriai 10vnt.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos, atliekų nukenksminimo įrangos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Teritorijos apželdinimas	m²	8570	2009-05-30
Sodinukai	vnt.	21	2009-05-30

Komisija pripažista, kad Perkrovimo stotis, stambiagabaričių atliekų aikštelė, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, unik. Nr.4400-1766-1602, su priklausiniais: administracinis

T I K R A

Skyriaus vedėja

2011-06-29

Aldona Čeplėjienė

PERLR. ST., ST.ATL.K.AIKŠT., ŽAL.ATL.KOMP. AIKŠTELĖ

VĮ PSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyr. specialistas

pastatas (unik. Nr.4400-1766-1568), sandėlis (unik. Nr.4400-1766-1580), sandėlis (unik. Nr.4400-1766-1594), kiemo aikštelė (unik. Nr.4400-1766-4749), kiemo aptvėrimas (unik. Nr.4400-1766-4750), vandentiekio tinklai (unik. Nr.4400-1766-1479, ilgis 99,00m), lietaus nuotekos (unik. Nr.4400-1766-1424, ilgis 219,58m), fekalinė kanalizacija (unik. Nr.4400-1766-1368, ilgis 80,66m), rezervuaras (unik. Nr.4400-1825-2005) Biržų k., Biržų raj. tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 18 tomų (lapų).
2. Inžinierinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 3 l.
3. Statinio inžinierinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 2 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1 l.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ R.Averinas

_____ E.Bajorūnienė

_____ G.Čepas

_____ A.Grucė

_____ N.Gudas

_____ L.Munikienė

_____ R.Pilkauskas

_____ E.Pipiraitė

_____ H.Sabaliauskas

Rangovas _____ V.Ambraška

Techninis prižiūrėtojas _____ J.Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė UAB PRATC _____ (pareigos) _____ (parašas) _____ (v. pavardė)

Perdavė _____ (pareigos) _____ (parašas) V. Ambraška (v. pavardė)

2008m. gruodžio 22 d.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Komisija pripažįsta, kad Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė su priklausiniais: kiemo aikštelė (unik. Nr.4400-1766-4692), administracinis pastatas (unik. Nr.4400-1766-4627), lietaus nuotekų tinklai (unik. Nr.4400-1766-1113), rezervuaras (unik. Nr.4400-1767-7359), vandentiekio tinklai (unik. Nr.4400-1766-1268), kiemo aptvėrimas (unik. Nr.4400-1766-4670) Levaniškio k., Pasvalio r., tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantinis terminas 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų-20 metų.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 24 tomų (lapų).
2. Inžinierinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, 2 l.
3. Statinio inžinierinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, 2 l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, 1 l.

Komisijos pirmininkas _____ V. Kuolalis

Komisijos nariai: _____ A. Asauskas

_____ J. Baltrūnas

_____ G. Čepas

_____ L. Gabriūnas

_____ A. Grucė

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOST. AIKŠTELĖ PASVALIOR.

VTPSI prie LR Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Kuolalis _____ V. Juozapavičienė

_____ M. Kaulinskas

_____ R. Pilkauskas

_____ P. Rameika

Rangovas _____ V. Ambraška

Techninis prižiūrėtojas _____ J. Šarakauskas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė PRATC proj. adm. (pareigos) _____ (parašas) V. Pelechas (v. pavardė)

Perdavė stat. vad. (pareigos) _____ (parašas) V. Ambraška (v. pavardė)

2008m. gruodžio 16 d.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

230

2011 -06- 29 3

13

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Gauta
2010 m. 09 mėn 09 d.
Nr. 6-263

2010-07-20 Nr.2010/AP-10

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

REGIONINIO SĄVARTYNO (STATYBOS I DALIS) SU PRIKLAUSINIAIS, DVARININKŲ KM., PANEVĖŽIO RAJ. ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB “ Panevėžio statybos trestas ” - 2010 m. liepos 20 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

FIDIC inžinierius, projekto ekspertas Nr. 1 Kai Löffler

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Gauta
2010 m. 09 mėn. 09 d.
Nr. G-263

2010-07-20 Nr.2010/AP-11

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, DVARININKŲ KM., PANEVĖŽIO RAJ. ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB “ Panevėžio statybos trestas ” - 2010 m. liepos 20 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

FIDIC inžinierius, projekto ekspertas Nr. 1 Kai Löffler

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Gauta
2010 m. 07 mėn. 29 d.
Nr. G-258

2010-07-12 Nr.2010/AP-09

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

REGIONINIO SĄVARTYNO (STATYBOS II DALIES I ETAPAS) SU PRIKLAUSINIAIS, DVARININKŲ KM., PANEVĖŽIO RAJ. ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB “ Panevėžio statybos trestas ” - 2010 m. liepos 12 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

FIDIC inžinierius, projekto ekspertas Nr. 1 Kai Löffler

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29
253

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-12-13 Nr.2010/AP-12

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

PANEVĖŽIO MIESTO SĄVARTYNO SU PRIKLAUSINIAIS DVARININKŲ K., PANEVĖŽIO RAJ., UŽDARYMO ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB “ Panevėžio statybos trestas ” - 2010 m. gruodžio 13 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26) Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-01-13 Nr.2010/AP-01

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, MŪŠOS G. 12B, PASVALYS ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB " Panevėžio statybos trestas " - 2010 m. sausio 13 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26) Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-01-13 Nr.2010/AP-02

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, LEVANIŠKIO K., PASVALIO RAJ. ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB " Panevėžio statybos trestas" - 2010 m. sausio 13 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26)

Jonas Šarakauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KOMPOSTAVIMO IR VERTIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-01-14 Nr.2010/AP-03

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

PERKROVIMO STOTIES, STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, K.DONELAIČIO G. 16, ROKIŠKYJE ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB " Panevėžio statybos trestas" - 2010 m. sausio 14 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26) Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplejienė
2011 -06- 29

237

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-01-14 Nr.2010/AP-04

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, RUZGŲ K., ROKIŠKIO RAJ. ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“ bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB “ Panevėžio statybos trestas” - 2010 m. sausio 14 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26) Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011 -06- 29

230

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-01-19 Nr.2010/AP-05

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

PERKROVIMO STOTIES, STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, BIRŽŲ K., BIRŽŲ RAJ. ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“ bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB “ Panevėžio statybos trestas” - 2010 m. sausio 19 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26) Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

239

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-01-19 Nr. 2010/AP-06

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, SAVITIŠKIO G. 12, PANEVĖŽYJE ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“ bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB “ Panevėžio statybos trestas” - 2010 m. sausio 19 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26) Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

240

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-01-26 Nr. 2010/AP-07

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, TECHNIKOS G. 6I, KUPIŠKYJE ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB " Panevėžio statybos trestas" - 2010 m. sausio 26 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26) Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29 241

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2010-01-26 Nr. 2010/AP-08

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, DIDŽIAGRAŠIŲ K., KUPIŠKIO RAJ. ATLIKIMO PAŽYMA

Pažymiu, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 11.9 p., Rangovas – AB " Panevėžio statybos trestas" - 2010 m. sausio 26 d. įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(atest. Nr.3555, galioja iki 2012-10-26) Jonas Šarakauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-29

242

14

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2009-12-04

„PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS: PROJEKTO KOMPONENTŲ PANEVĖŽYJE STATYBA" PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007//P/35 dėl projekto komponentų Panevėžyje statybos bendrųjų sutarties sąlygų bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas AB "Panevėžio statybos trestas " 2009 m. gruodžio 04 d. baigė visus darbus objekte.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2009-11-24 įsakymu Nr. 1V-404, objektą 2009-12-04 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. PNT-100-091209-00145).

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Jonas Šarakauskas

Užsakovas
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Direktorius Arturas Grucė

Rangovo atstovas
AB „Panevėžio statybos trestas" statybos vadovas, Valdas Grigaliūnas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

243

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2009-07-01

„PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS: PROJEKTO KOMPONENTŲ PANEVĖŽYJE STATYBA“ PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007//P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“ – 2009 m. liepos mėn. 01 d. baigė statybos darbus Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje su priklausiniais Dvarininkų k., Panevėžio raj.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2009-06-23 įsakymu Nr. 1V-176, objektą 2009-07-01 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. PTN-100-090702-00011).

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas Jonas Šarakauskas

Užsakovas
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Direktorius Arturas Grucė

Rangovo atstovas
AB „Panevėžio statybos trestas“ statybos vadovas Valdas Grigaliūnas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2009-07-01

„PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS: PROJEKTO KOMPONENTŲ PANEVĖŽYJE STATYBA“ PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007//P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“ – 2009 m. liepos mėn. 01 d. baigė statybos darbus Regioniniame sąvartyne (statybos II dalies I etapo) su priklausiniais Dvarininkų k., Panevėžio raj.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2009-06-23 įsakymu Nr. 1V-177, objektą 2009-07-01 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. PTN-100-090702-00012).

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas Jonas Šarakauskas

Užsakovas
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Direktorius Arturas Grucė

Rangovo atstovas
AB „Panevėžio statybos trestas“ statybos vadovas Valdas Grigaliūnas

TIKRA 2011-06-29
Skyriaus vedėja
245
Aldona Čepėjienė

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2009-07-01

„PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS: PROJEKTO KOMPONENTŲ PANEVĖŽYJE STATYBA“ PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007//P/35 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto komponentų Panevėžyje statyba“ bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“ – 2009 m. liepos mėn. 01 d. baigė statybos darbus Regioniniame sąvartyne (statybos I dalies) su priklausiniais Dvarininkų k., Panevėžio raj.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2009-06-23 įsakymu Nr. 1V-175, objektą 2009-07-01 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. PTN-100-090702-00013).

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas — Jonas Šarakauskas

Užsakovas
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Direktorius — Arturas Grucė

Rangovo atstovas
AB „Panevėžio statybos trestas“ statybos vadovas — Valdas Grigaliūnas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2008-12-16 Nr.2008/PP-01

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

9 01 13
G - 15

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, MŪŠOS G. 12B, PASVALYS PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas –AB " Panevėžio statybos trestas " 2008 m. gruodžio 16 d. baigė darbus stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės su priklausiniais, Mūšos g. 12b, Pasvalys, statyboje.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-12-05 įsakymu Nr. 1V-502, objektą 2008-12-16 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. STN-55-081223-068). Komisija leido atidėti teritorijos apželdinimo darbus (415 m^2) iki 2009-05-30.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atest. Nr.3555 Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29
247

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

9 01 13
G-16

2008-12-16 Nr.2008/PP-02

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS. LEVANIŠKIO K., PASVALIO RAJ PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba“ bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas –AB “ Panevėžio statybos trestas ” 2008 m. gruodžio 16 d. baigė darbus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės su priklausiniais, Levaniškio k., Pasvalio raj., statyboje.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-12-05 įsakymu Nr. 1V-500, objektą 2008-12-16 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. STN-55-081223-069). Komisija leido atidėti teritorijos apželdinimo darbus (700 m^2) iki 2009-05-30.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atest. Nr.3555 Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-29

240

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

9 01 13
G-17

2008-12-17 Nr.2008/PP-03

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

PERKROVIMO STOTIES, STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, K.DONELAIČIO G. 16, ROKIŠKYJE PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas –AB " Panevėžio statybos trestas " 2008 m. gruodžio 17 d. baigė darbus perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų aikštelės su priklausiniais, K.Donelaičio g. 16, Rokiškyje, statyboje.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-12-11 įsakymu Nr. 1V-527, objektą 2008-12-17 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. STN-55-081223-070).

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atest. Nr.3555 Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29
249

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

9 01 13 G-18 2008-12-17 Nr.2008/PP-04

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, RUZGŲ K., ROKIŠKIO RAJ. PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas –AB " Panevėžio statybos trestas " 2008 m. gruodžio 17 d. baigė darbus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės su priklausiniais, Ruzgų k., Rokiškio raj., statyboje.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-12-11 įsakymu Nr. 1V-519, objektą 2008-12-17 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. STN-55-081223-071).

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atest. Nr.3555 Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

250

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

9 01 B G-19

2008-12-22 Nr.2008/PP-05

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

PERKROVIMO STOTIES, STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, BIRŽŲ K., BIRŽŲ RAJ. PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas –AB " Panevėžio statybos trestas " 2008 m. gruodžio 16 d. baigė darbus perkrovimo stoties, stambiagabaričių atliekų aikštelės, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės su priklausiniais, Biržų k., Biržų raj., statyboje.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-12-11 įsakymu Nr. 1V-528, objektą 2008-12-22 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. STN-55-081223-072). Komisija leido atidėti teritorijos apželdinimo darbus (8570 m^2) ir medelių sodinimo darbus (21 sodinukas) iki 2009-05-30.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atest. Nr.3555 Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-29 251

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

9 01 B G-210

2008-12-22 Nr.2008/PP-06

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, SAVITIŠKIO G. 12, PANEVĖŽYJE PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas –AB " Panevėžio statybos trestas " 2008 m. gruodžio 22 d. baigė darbus stambiagabaričių atliekų aikštelės su priklausiniais, Savitiškio g. 12, Panevėžyje statyboje.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-12-11 įsakymu Nr. 1V-525, objektą 2008-12-22 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. STN-55-081223-073). Komisija leido atidėti teritorijos apželdinimo darbus (700 m^2) iki 2009-05-30.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atest. Nr.3555 Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

9 01 13
G-21

2008-12-29 Nr.2008/PP-07

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, TECHNIKOS G. 61, KUPIŠKYJE PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas –AB " Panevėžio statybos trestas " 2008 m. gruodžio 29 d. baigė darbus stambiagabaričių atliekų aikštelės su priklausiniais, Technikos g. 61, Kupiškyje statyboje.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-12-11 įsakymu Nr. 1V-524, objektą 2008-12-29 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. STN-55-081230-077).

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atest. Nr.3555 Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

253

M&S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de

PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

9. 01 B
G-22.

2008-12-29 Nr.2008/PP-08

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui

AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS, DIDŽIAGRAŠIŲ K., KUPIŠKIO RAJ. PERĖMIMO PAŽYMA

Pažymime, kad remiantis rangos sutarties Nr. A/2007/P/34 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statyba" bendrųjų sąlygų 10.1 p., Rangovas –AB " Panevėžio statybos trestas " 2008 m. gruodžio 29 d. baigė darbus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės su priklausiniais, Didžiagrašių k., Kupiškio raj. statyboje.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-12-14 įsakymu Nr. 1V-521, objektą 2008-12-29 pripažino tinkamu naudoti (aktas Nr. STN-55-081230-078). Komisija leido atidėti teritorijos apželdinimo darbus (1400 m^2) iki 2009-05-30.

Inžinieriaus atstovas,
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atest. Nr.3555 Jonas Šarakauskas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

15

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB „ Koger Eco“
Sutarties Nr.:2009/26/A/PT/LT
Sutarties pavadinimas: „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Atliekų tankintuvas (kompaktorius)”.

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos 2009m. gruodžio mėn. 23d., įdiegtos 2009m. gruodžio mėn. 23 d., pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Perkančioji organizacija pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų.

Šiuo aktu Perkančioji organizacija, patvirtina, kad prekės priimtos 2009m. gruodžio mėn. 23 d., ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:	**Priėmė:**
Tiekėjas	Perkančioji organizacija (Užsakovas)
UAB „ Koger Eco“	UAB „ Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“
(Parašas)	(Parašas)
Sigitas Petrauskas	Arturas Grucė
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
Direktorius	Direktorius
(Pareigos)	(Pareigos)

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29.

255

Priedas Nr.8

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas:UAB Elklita
Sutarties Nr.: 2009/27/A/PT/LT
Sutarties pavadinimas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas.Krautuvas.

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos 2010.03.24 , įdiegtos 2010.03.24 , pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Perkančioji organizacija pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų.

Šiuo aktu Perkančioji organizacija, patvirtina, kad prekės priimtos 2010.03.24 , ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

Tiekėjas
UAB Elklita
(Parašas)
Aleksandras Anbinderis
Gen.direktorius
(Antspaudas)

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * VILNIUS * Uždaroji akcinė bendrovė "ELKLITA" Joint Stock Company

Priėmė:

Perkančioji organizacija (Užsakovas)
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
(Parašas)
Arturas Grucė
Direktorius
(Antspaudas)

LIETUVOS REPUBLIKA UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Priedas Nr.8

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB „Keluva"
Sutarties Nr.: 2009/28/A/PT/LT
Sutarties pavadinimas: **Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigyjimas. Ratinis frontalinis krautuvas.**

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos **2010 m. kovo** 18 **d.**, įdiegtos **2010 m. kovo** 24 **d.**, pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Perkančioji organizacija pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, [personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų] (jei numatyta sutartyje), [laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)] (jei numatyta sutartyje).

Šiuo aktu Perkančioji organizacija, patvirtina, kad prekės priimtos **2010 m. kovo** 24 **d.**, ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:	**Priėmė:**
UAB KELUVA (Tiekėjas)	**UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (Užsakovas)**
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė) Gintautas [illegible]
(Pareigos)	(Pareigos) Eksploatacijos inžinierius
(Antspaudas)	(Antspaudas)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ DOKUMENTAMS "KELUVA"

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras RESPUBLIKA

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Priedas Nr. 8

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas:UAB" OKSATA"
Sutarties Nr.: 2009/29/A/PT/LT 2009-11-24
Sutarties pavadinimas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas : įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas .
4.Dalis.Kompostuojamų atliekų smulkintuvas.
Caravaggi BIO 900 DNC Nr. 66700

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos <2010-05-20 >, įdiegtos <2010-05-20>, pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Perkančioji organizacija pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų , laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai , pasai

Šiuo aktu Perkančioji orgaqnizacija , patvirtina, kad prekės priimtos <2010-05-20>, ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:	**Priėmė:**
Tiekėjas: UAB „ OKSATA"	Užsakovas : UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"
įmk.181308989	im.k 300 127 004
Riomerio g.8 Trakai	Beržų g.44 Panevėžys
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
Gintautas Černiauskas	Gintautas Ulys
(Pareigos) Direktorius	(Pareigos) Eksploatavimo inžinierius
(Antspaudas)	(Antspaudas)

LIETUVOS RESPUBLIKA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ OKSATA TRAKŲ RAJONAS
Direktorius Černiauskas

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras RESPUBLIKA ŠKYRIUS

TIKRA Skyriaus vedėja Aldona Čepelienė 2011-06-29

250

14

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
«ATOMEKSIM»

Taikos pr. 10, LT-31001 Visaginas
A/s LT167044060005258665, SEB Vilniaus bankas, Banko kodas 70440. Įmonės kodas 300503289
PVM kodas LT 100002009411. Tel (+370)386 70510, fax (+370) 386 70435 E-mail: atom@tts.lt

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB „Atomeksim"
Sutarties Nr.: 2009/30/A/PT/LT
Sutarties pavadinimas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Sijotuvas-būgninis rėtis

Visa tiekiama įranga, nurodytą tiekiamos įrangos sąraše, buvo pristatyta 2010-03-23, įdiegta 2010-03-23, pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Perkančioji organizacija pristatytą įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatyta įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkama naudoti, personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų, laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).

Šiuo aktu Perkančioji organizacija, patvirtina, kad įranga priimta 2010-03-23, ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:
Tiekėjas
UAB „Atomeksim"

(Parašas)
Vadim Golubev
Direktorius
A.V.

Priėmė:
Perkančioji organizacija (Užsakovas)
UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"

(Parašas)
Artūras Grucė
Direktorius
A.V.

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Tiekėjas: UAB „Intrac Lietuva"
Sutarties Nr.: 2009/31/A/PT/LT
Sutarties pavadinimas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigijimas. Buldozeris

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos , įdiegtos 2010 m. vasario 18d., pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Perkančioji organizacija pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų jei numatyta sutartyje, Šiuo aktu Perkančioji organizacija, patvirtina, kad prekės priimtos ..2010 m. vasario 19 d.., ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

UAB „Intrac Lietuva"

Arūnas Ajiulis

Statybinės technikos pardavimo direktorius

Priėmė:

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Arturas Grucė

Direktorius

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-29

260

Priedas Nr.8

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS NR. 1

Tiekėjas: UAB „KMT“
Sutarties Nr.: 2009/32/A/PT/LT
Sutarties pavadinimas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: įrangos ir įrenginių naujai atliekų tvarkymo sistemai įsigyjimas. Automobilis su priekaba 30m³ konteinerių pervežimui

Visos tiekiamos prekės/įranga, nurodytos tiekiamų prekių/įrangos sąraše, buvo pristatytos 2010m. kovo 24d., įdiegtos 2010m. kovo 24d., pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Perkančioji organizacija pristatytas prekes/įrangą priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės/įranga atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų, laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai.

Šiuo aktu Perkančioji organizacija, patvirtina, kad prekės priimtos 2010m. kovo 24d., ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė:

Tiekėjas

UAB „KMT“

(Prašas)

Andrius Litvaitis
(Vardas, pavardė)

Direktorius
(Pareigos)

(Antspaudas)

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB KMT 99 DOKUMENTAMS KAUNO MIESTAS

Priėmė:

Perkančioji organizacija
(užsakovas)
UAB PRATC

(Prašas)

Arūras Grucė
(Vardas, pavardė)

Direktorius
(Pareigos)

(Antspaudas)

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

LIETUVOS UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras REPUBLIKA

261

14 PRIEDAS – INVESTICIJŲ BIUDŽETO ŠAMALIŲJIMAS

ŠANCLIAUDIO PONIO PROJEKTO NR. 2005/LT/16/C/PT/005 FAKTINĖS BIUDŽETO ATLIKTOJO TVARKYTOJO ĮSTAIGOS BIUDŽETINĖS GRĄŽINAMOSIOS SĄNAUDOS ANALIZĖ

Pavadinimas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Metai																					
I. INVESTICIJOS	128.296	91.290	10.062.082	9.913.611	22.842.109	12.115.172	-	-	-	5.180.328	-	3.200.077	-	-	4.063.946	-	-	3.360.477	-	5.362.918	-	-
1.1. Pastato įsigijimas	128.296	91.290	10.062.082	9.913.611	22.842.109	12.115.172	-	-	-	5.180.328	-	3.200.077	-	-	4.063.946	-	-	3.360.477	-	5.362.918	-	-
1.2. Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. PROJEKTO SĄNAUDOS	85.436	109.300	162.150	347.700	1.022.300	1.749.350	1.798.650	1.757.451	1.776.398	1.783.178	1.794.095	1.803.905	1.811.143	1.819.217	1.829.277	1.839.250	1.848.896	1.857.838	1.867.118	1.876.462	1.885.946	1.896.171
2.1. Projektas vykdomas [illegible]	-	-	-	-	-	150.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450
2.2. Informacinės ir ryšių technologijos	-	-	-	-	-	45.135	315.945	294.315	299.430	304.545	309.660	315.135	320.610	326.085	331.560	337.035	342.510	347.985	353.460	358.935	364.410	369.885
2.3. Komunikacinės paslaugos [illegible]	-	-	-	-	-	30.090	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540
2.4. Nuolatinės paslaugos [illegible]	-	-	-	-	-	45.135	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810
2.5. Kitos [illegible]	85.436	109.300	162.150	347.700	1.022.300	1.328.530	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900
III. PROJEKTO PAJAMOS	-	-	-	-	1.023.300	2.254.364	3.272.476	3.309.820	3.305.495	3.325.812	3.298.622	3.353.215	3.372.893	3.390.953	3.405.997	3.437.926	3.440.041	3.457.241	3.474.237	3.491.908	3.509.269	3.526.096
3.1. Projekto [illegible]	-	-	-	-	-	3.023.364	3.236.276	3.270.476	3.309.820	3.306.495	3.325.812	3.298.622	3.353.215	3.372.893	3.390.953	3.405.997	3.437.926	3.440.041	3.457.241	3.474.237	3.491.908	3.509.269
IV. LIKUTINĖ VERTĖ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.483.633
4.1. Likutis nuo [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.483.633
V. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTAS (be pasiimtos)	204.652	200.590	10.948.772	10.179.721	23.202.809	11.600.487	1.514.918	1.551.369	1.529.196	2.566.396	2.504.527	1.749.638	1.560.811	1.571.811	2.488.296	1.562.328	1.591.444	1.101.414	1.607.400	2.747.478	1.613.514	7.057.164

Pasiimtos rodiklio skaičiavimas

Taikomas finansinė diskonto norma	6%
Grynoji dabartinė vertė (kapitalizuotas)	66.630.928
Vidinė grąžos norma (kapitalizuotas)	-11,8%
Pasiimtinas nepakankamumas	53,23%

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

17 PRIEDAS – KAPITALO BIUDŽETO ŠAMALIŲJIMAS

ŠANCLIAUDIO PONIO PROJEKTO NR. 2005/LT/16/C/PT/005 FAKTINĖS BIUDŽETO ATLIKTOJO TVARKYTOJO ĮSTAIGOS BIUDŽETINĖS GRĄŽINAMOSIOS SĄNAUDOS IR NEĮGYJAMOS ANALIZĖ

Pavadinimas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Metai																					
I. INVESTICIJOS	128.296	91.290	10.062.082	9.913.611	22.842.109	12.115.172	-	-	-	5.180.328	-	3.200.077	-	-	4.063.946	-	-	3.360.477	-	5.362.918	-	-
1.1. Pastato įsigijimas	128.296	91.290	10.062.082	9.913.611	22.842.109	12.115.172	-	-	-	5.180.328	-	3.200.077	-	-	4.063.946	-	-	3.360.477	-	5.362.918	-	-
1.2. Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. PROJEKTO SĄNAUDOS	85.436	109.300	162.150	347.700	1.022.300	1.749.350	1.798.650	1.757.451	1.776.398	1.783.178	1.794.095	1.803.905	1.811.143	1.819.217	1.829.277	1.839.250	1.848.896	1.857.838	1.867.118	1.876.462	1.885.946	1.896.171
2.1. Projektas vykdomas [illegible]	-	-	-	-	-	150.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450	90.450
2.2. Informacinės ir ryšių technologijos	-	-	-	-	-	45.135	315.945	294.315	299.430	304.545	309.660	315.135	320.610	326.085	331.560	337.035	342.510	347.985	353.460	358.935	364.410	369.885
2.3. Komunikacinės paslaugos [illegible]	-	-	-	-	-	30.090	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540	180.540
2.4. Nuolatinės paslaugos [illegible]	-	-	-	-	-	45.135	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810	270.810
2.5. Kitos [illegible]	85.436	109.300	162.150	347.700	1.022.300	1.328.530	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900
III. PROJEKTO PAJAMOS	-	-	-	-	1.023.300	2.254.364	3.272.476	3.309.820	3.305.495	3.325.812	3.298.622	3.353.215	3.372.893	3.390.953	3.405.997	3.437.926	3.440.041	3.457.241	3.474.237	3.491.908	3.509.269	3.526.096
3.1. Projekto [illegible]	-	-	-	-	-	3.023.364	3.236.276	3.270.476	3.309.820	3.306.495	3.325.812	3.298.622	3.353.215	3.372.893	3.390.953	3.405.997	3.437.926	3.440.041	3.457.241	3.474.237	3.491.908	3.509.269
IV. LIKUTINĖ VERTĖ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.483.633
4.1. Likutis nuo [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.483.633
V. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTAS (be pasiimtos)	204.652	200.590	10.948.772	10.179.721	23.202.809	11.600.487	1.514.918	1.551.369	1.529.196	2.566.396	2.504.527	1.749.638	1.560.811	1.571.811	2.488.296	1.562.328	1.591.444	1.101.414	1.607.400	2.747.478	1.613.514	7.057.164
VI. ŠĮPARAMOS LĖŠOS	201.997	75.520	10.962.432	8.216.464	19.482.359	11.247.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTAS (su pasiimtos)	104.218	202.060	1.982.623	1.962.257	3.905.176	440.791	1.514.918	1.551.369	1.529.196	2.566.396	2.504.527	1.749.638	1.560.811	1.571.811	2.488.296	1.562.328	1.591.444	1.101.414	1.607.400	2.747.478	1.613.514	7.057.164

Pasiimtos rodiklio skaičiavimas

Taikomas finansinė diskonto norma	6%
Grynoji dabartinė vertė (kapitalizuotas)	3.267.564
Vidinė grąžos norma (kapitalizuotas)	8,7%

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

10 PRIEDAS - PROJEKTO FINANSINIS GYVYBINGUMAS

SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO NR. 2005/LT/16/C/PE/003 PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS EKONOMINĖS NAUDOS ANALIZĖ

Pavadinimas	Metai																					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. INVESTICIJOS	335.896	91.200	18.883.083	9.912.011	23.842.109	13.115.173	-	-	-	5.103.330	-	3.300.877	-	-	4.063.944	-	-	3.300.877	-	5.392.915	-	-
I.1. Projekto investicijos	335.896	91.200	18.883.083	9.912.011	23.842.109	13.115.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Reinvesticijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.103.330	0	3.300.877	0	0	4.063.944	0	0	3.300.877	0	5.392.915	0	0
II. PROJEKTO SANAUDOS	55.436	109.300	162.190	267.700	1.032.290	1.749.900	1.760.460	1.767.461	1.776.280	1.785.170	1.794.098	1.803.066	1.812.081	1.821.142	1.830.247	1.839.399	1.848.596	1.857.838	1.867.128	1.876.463	1.885.846	1.895.275
II.1. [illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II.2. [illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II.3. [illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II.4. [illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II.5. PRATC lėšos	55.436	109.300	162.190	267.700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III. PROJEKTO PAJAMOS	-	-	-	-	1.522.390	3.256.394	3.272.476	3.289.639	3.305.485	3.322.012	3.338.622	3.355.315	3.372.092	3.388.953	3.405.897	3.422.926	3.440.041	3.457.241	3.474.527	3.491.900	3.509.360	3.526.906
III.1. Projekto pajamos	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IV. ES PARAMOS LĖŠOS	287.807	17.520	15.983.620	8.338.464	20.463.539	11.147.896	-	-	-													
V. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS	40.789	13.400	2.820.462	1.683.547	3.379.571	1.967.277																
VI. PRATC LĖŠOS	56.000	100.000	162.000	267.000																		
VII. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTAS	864	620	810	- 700	490.501	1.506.486	1.514.018	1.521.589	1.529.196	- 3.566.396	1.544.527	- 1.748.628	1.560.021	1.567.811	- 2.488.394	1.583.828	1.591.446	- 1.701.474	1.607.000	- 3.787.478	1.623.514	1.631.632
VIII. AKUMULIUOTAS PINIGŲ SRAUTAS	864	1.484	1.994	1.294	491.315	1.997.801	3.511.819	5.033.408	6.562.604	2.996.208	4.540.736	2.792.107	4.352.128	5.919.938	3.431.433	5.015.160	6.606.606	4.905.132	6.512.532	2.745.053	4.368.567	6.000.199

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

11 PRIEDAS - JAUTRUMO ANALIZĖ

SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO NR. 2005/LT/16/C/PE/003 PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS EKONOMINĖS NAUDOS ANALIZĖ

Pradinė situacija

Pavadinimas	Metai																					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. INVESTICIJOS	335.896	91.200	18.883.082	9.912.011	23.842.109	13.115.173	-	-	-	5.103.330	-	3.300.877	-	-	4.063.946	-	-	3.300.877	-	5.392.915	-	-
II. PROJEKTO SANAUDOS	55.436	109.300	162.190	267.706	1.032.290	1.749.900	1.758.660	1.767.451	1.776.280	1.785.170	1.794.095	1.803.066	1.812.081	1.821.142	1.830.247	1.839.399	1.848.596	1.857.838	1.867.128	1.876.463	1.885.846	1.895.275
III. PROJEKTO PAJAMOS	-	-	-	-	1.522.390	3.256.394	3.272.476	3.289.639	3.305.485	3.322.013	3.338.622	3.355.315	3.372.092	3.388.953	3.405.897	3.422.926	3.440.041	3.457.241	3.474.527	3.491.900	3.509.360	3.526.906
IV. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTAS (be paramos)	- 394.633	- 200.500	- 18.965.272	- 10.179.795	- 23.351.009	- 11.608.687	1.514.018	1.521.889	1.529.196	- 3.566.396	1.544.527	- 1.748.638	1.560.011	1.567.811	- 2.488.394	1.583.528	1.591.446	- 1.701.474	1.607.400	- 3.769.478	1.623.514	7.631.264

Finansinio rodiklio skaičiavimas

Taikoma finansinė diskonto norma	6%
Grynoji dabartinė vertė (investicijų)	- 46.630.820
Vidinė grąžos norma (investicijų)	-11,8%

Investicijos didėja 1%

Pavadinimas	Metai																					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. INVESTICIJOS	341.992	92.112	18.991.113	10.011.131	24.080.530	13.246.324	-	-	-	5.154.271	-	3.333.886	-	-	4.104.585	-	-	3.333.886	-	5.436.744	-	-
II. PROJEKTO SANAUDOS	55.436	109.300	162.190	267.700	1.032.290	1.749.900	1.758.660	1.767.451	1.776.280	1.785.170	1.794.095	1.803.066	1.812.081	1.821.142	1.830.247	1.839.399	1.848.596	1.857.838	1.867.128	1.876.463	1.885.846	1.895.275
III. PROJEKTO PAJAMOS	-	-	-	-	1.522.390	3.256.394	3.272.476	3.289.639	3.305.485	3.322.012	3.338.622	3.355.315	3.372.092	3.388.953	3.405.897	3.422.926	3.440.041	3.457.241	3.474.527	3.491.900	3.509.360	3.526.906
IV. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTAS (be paramos)	- 397.410	- 201.492	- 19.156.803	- 10.278.911	- 23.590.436	- 11.739.830	1.514.018	1.521.589	1.529.196	- 3.617.420	1.544.527	- 1.781.636	1.560.011	1.567.811	- 2.528.935	1.583.528	1.591.446	- 1.734.483	1.607.400	- 3.821.300	1.623.514	7.631.264

		% pokytis	Išvada
Taikoma finansinė diskonto norma	6%		
Grynoji dabartinė vertė (investicijų)	- 47.237.846	-1,3%	Pokytis nėra kritinis
Vidinė grąžos norma (investicijų)	-12,0%	-0,1%	Pokytis nėra kritinis

Projekto sąnaudos didėja 1%

Pavadinimas	Metai																					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. INVESTICIJOS	335.896	91.200	18.883.082	9.912.011	23.842.109	13.115.173	-	-	-	5.103.330	-	3.300.877	-	-	4.063.946	-	-	3.300.877	-	5.392.915	-	-
II. PROJEKTO SANAUDOS	55.990	110.393	163.812	270.458	1.042.613	1.767.407	1.776.244	1.785.135	1.794.081	1.803.071	1.812.036	1.821.097	1.830.202	1.839.355	1.848.550	1.857.791	1.867.081	1.876.417	1.885.799	1.895.228	1.904.704	1.914.228
III. PROJEKTO PAJAMOS	-	-	-	-	1.522.390	3.256.394	3.272.476	3.289.039	3.305.485	3.322.012	3.338.622	3.355.315	3.372.092	3.388.953	3.405.897	3.422.924	3.440.041	3.457.241	3.474.527	3.491.900	3.509.360	3.526.906
IV. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTAS (be paramos)	- 394.986	- 202.474	- 18.966.894	- 10.182.460	- 23.343.353	- 11.626.186	1.496.432	1.503.914	1.511.430	- 3.584.248	1.526.586	- 1.766.658	1.541.890	1.549.599	- 2.506.598	1.565.154	1.572.960	- 1.720.052	1.588.728	- 3.786.243	1.604.656	7.616.311

Finansinio rodiklio skaičiavimas

		% pokytis	Išvada
Taikoma finansinė diskonto norma	6%		
Grynoji dabartinė vertė (investicijų)	- 46.701.479	-0,3%	Pokytis nėra kritinis
Vidinė grąžos norma (investicijų)	-11,9%	-0,1%	Pokytis nėra kritinis

Projekto pajamos didėja 1%

Pavadinimas	Metai																					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. INVESTICIJOS	335.896	91.200	18.883.082	9.912.011	23.842.109	13.115.173	-	-	-	5.103.330	-	3.300.877	-	-	4.063.944	-	-	3.300.877	-	5.392.915	-	-
II. PROJEKTO SANAUDOS	55.436	109.300	162.190	267.706	1.032.290	1.749.900	1.758.660	1.767.451	1.776.280	1.785.170	1.794.098	1.803.066	1.812.081	1.821.142	1.830.247	1.839.399	1.848.596	1.857.838	1.867.128	1.876.463	1.885.846	1.895.275
III. PROJEKTO PAJAMOS	-	-	-	-	1.537.414	3.288.958	3.305.403	3.322.330	3.338.839	3.355.333	3.372.000	3.388.840	3.406.013	3.422.941	3.439.956	3.457.158	3.474.441	3.491.814	3.509.273	3.526.819	3.544.453	3.562.178
IV. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTAS (be paramos)	- 394.832	- 200.580	- 18.965.272	- 10.179.791	- 23.336.985	- 11.576.333	1.546.745	1.554.979	1.562.351	- 3.533.376	1.577.913	- 1.715.834	1.593.761	1.601.798	- 2.454.237	1.617.757	1.625.846	- 1.666.902	1.642.146	- 3.753.889	1.658.608	7.678.533

Finansinio rodiklio skaičiavimas

		% pokytis	Išvada
Taikoma finansinė diskonto norma	6%		
Grynoji dabartinė vertė (investicijų)	- 46.013.962	0,8%	Pokytis nėra kritinis
Vidinė grąžos norma (investicijų)	-11,8%	0,2%	Pokytis nėra kritinis

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

39 PRIEDAS – GRĮŽTAMOSIOS BIOMASĖS KRAŠTŲ NAUDA

ŽAMOJAUS TONNO PROJEKTO NR. 2005/LT/16/C/PE/003 ĮGYVENDINIMO SĄNAUDOS IR GAUTOS ŽALOS ĮVERTINIMAS EKONOMINĖS NAUDOS ANALIZĖ

Pavadinimas	Eilutė	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Eilutė																					
I. EKONOMINĖS KAŠTAI		384 652	289 580	18 965 272	18 179 791	24 874 229	14 005 081	1 758 460	1 767 452	1 774 388	4 088 404	1 784 095	5 153 543	1 817 861	1 811 142	6 894 192	1 839 397	1 848 586	5 156 715	1 867 128	7 156 279	1 885 946	1 895 375
1A. Kapitalo kainos		1A-[illegible]		91 416	18 884 400	9 810 401	8 000 144	10 012 170	-	-	-	-	3 159 320	-	3 390 477	-	4 852 246	-	2 368 571	-	5 595 014	-	-
1B. Valdymo kainos		1B-[illegible]	289 580	18 174	347 390	9 063 828	1 749 980	1 258 456	1 767 452	1 774 388	3 986 178	1 784 095	1 993 866	1 817 861	1 811 142	1 839 347	1 839 399	1 848 586	1 867 828	1 867 128	1 873 447	1 885 946	1 895 375
II. PROJEKTO TIESIOGINĖS PAJAMOS						1 822 299	3 256 901	3 271 474	3 299 637	3 387 482	3 318 813	3 296 872	3 355 312	3 173 992	3 288 502	3 455 897	3 412 952	3 448 841	3 457 341	3 474 767	3 492 200	2 385 149	3 334 986
2A. Žvejybos metai							2 492 294	2 516 174	2 573 479	2 596 629	2 642 482	2 233 813	2 306 632	2 305 318	2 171 992	2 288 502	2 455 897	2 412 952	2 448 841	2 457 341	2 474 767	2 492 200	2 385 149	2 334 986
2B. Lėšos																							1 452 032
2C. Liūdesio metai																							1 452 032
IV. EKONOMINĖ NAUDA		-	-	-	5 195 890	17 718 600	18 919 569	18 221 815	18 408 451	21 276 472	18 026 779	19 915 493	19 114 320	18 301 017	31 895 124	19 875 468	19 615 314	19 155 899	17 338 218	21 237 982	19 520 371	19 671 498	19 131 760
4A. Žlėsimo nuostolis						126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240
4A.1. Žlėsimo metai, kai [illegible]						126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240	126 240
4A.2. Sumažėjusi [illegible]						13 896 000	13 602 000	13 296 000	12 779 760	11 623 680	12 967 920	13 478 400	13 467 360	13 102 560	13 648 080	13 260 000	13 296 000	13 260 000	11 433 120	13 046 880	12 446 400	12 446 400	12 594 240
4A.3. Dėsnio nuostolis [illegible]																							
4A.4. Dėsnio nuostolis [illegible]						3 159 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4A.5. Dėsnio nuostolis [illegible]						3 159 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4A.6. Dėsnio nuostolis [illegible]						300 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III. EKONOMINIS GRYNAMĖ PENGŲ SRAUTAS		384 652	289 580	18 965 272	4 899 791	5 641 489	6 413 572	19 154 863	15 940 079	21 885 471	15 378 387	20 809 496	17 868 733	16 543 051	33 056 965	16 599 722	20 752 841	20 801 344	17 645 142	23 865 585	17 767 495	21 210 918	16 168 824

Ekonominiai rodikliai ir vidurkiai

Tikimoji ataskaitinė diskonto norma	5%
Ekonomiškai priimtinė diskonto norma	148 066 219
Ekonomiškai vidinė grąžos norma	33,8%
Naudos/sąnaudų santykis	2,16

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
ATESTAS
TIKRA KOPIJA
SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

A - Atliekų tvarkymo mokėsi Švedijoje

210

n English • По-русски

SMS užsisakymas Konferencijų salė Įvykusios konferencijos | Apie mus

ELTA

8 valandas stovime eilėje

2006 11 29, trečiadienis | POLITIKA | ŪKIS | TEISĖTVARKA | KULTŪRA | SPORTAS | ĮVAIRYB

rąsti • Eitos gidas TV p

Skaityk naujienas nemokamai! Mano ELTA: prisijungti Naujienos: - Pasirinkite

PANEŠIMAI SPAUDAI

← POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VISKAS

...TA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

)06-11-27 13:13

Atliekų tvarkymo mokėsi Švedijoje

ıformacinis pranešimas

2006 m. lapkričio 27 d.

Praėjusią savaitę Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai bei valdybos nariai kartu su Švedijos dukterinės kompanijos "S tstovais lankėsi Švedijoje, kur gilino atliekų tvarkymo sistemos kūrimo žinias bei susipažino su buitinių atliekų tvarkymo projektais.

Kaip teigia Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Arturas Grucė, šios mokomosios-pažintinės kelionės tikslas - ne tik su ienos labiausiai pažengusių šalių, tai yra Švedijos, atliekų tvarkymo sistema, bet ir pasisemti patirties bei įkvėpimo tolesniems atliekų t sistemos kūrimo darbams, kurie įgyvendinami ir Panevėžio regione.

Dešimties žmonių iš Panevėžio regiono grupė penkių dienų trukmės kelionės metu Švedijoje susipažino su sąvartynų techninio įrengim tarifų už atliekų surikimą nustatymo metodika, pavojingų atliekų tvarkymo ypatybėmis bei visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klaus ...panijomis, vykstančiomis Švedijoje.

"Labiausiai Švedijoje sužavėjo pačių gyventojų požiūris į atliekų tvarkymą. Ten per daugiau nei tris dešimtmečius sukurta tokia atliekų kuri efektyviai veikia tik sąmoningų gyventojų dėka. Žmonės patys aktyviai rūpinasi tiek atliekų rūšiavimu, tiek aplinkos apsauga šalina dalijasi įspūdžiais A.Grucė.

Švedijoje nuo 2005 metų sąvartynuose šalinamos tik degimo atliekos (pelenai, šlakai ir pan.), o kitos atliekos rūšiuojamos, perdirbamo kompostuojamos ar deginamos.
Ypač gerai šioje Skandinavijos šalyje veikia ir atliekų surinkimo aikštelės. Pavojingas atliekas gyventojai gali atvežti į specialiai įrengtas įrengtos net degalinėse, o kompostavimo ir didžiųjų atliekų aikštelės išdėstytos taip, kad kiekvienas gyventojas galėtų lengvai jas pasie

"Kadangi tiek lietuviams, tiek švedams galioja vienodi Europos Sąjungos atliekų tvarkymo reglamentai, todėl dalijimasis patirtimi su lab partneriais yra ypač svarbus. Manome, jog Lietuvoje tokia atliekų tvarkymo sistema gali efektyviai veikti po 15-20 metų," - sako Panev atliekų tvarkymo centro direktorius.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį proj 2009 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Planuojama, jog vietoj uždarytų 95 žemo, vidutinio ir didelio prioriteto sąvartyn apskrityje bus pastatytas vienas regioninis sąvartynas. Be to, numatoma pastatyti 5 žaliųjų atliekų kompostavimo bei 5 didžiagabaritinių

TIKRA

2011 -06- 29

Aldona Čeplėjienė

BNS Spaudos centras

Teisė informuoti. Teisė būti informuotam.

2006 lapkričio 27 d., pirmadienis

Prisijungti • Pagalba

INAME aktorių Laimoną NOREIKĄ --- 2006-11-27 17:00 Ūkio banke pasirašoma sindikuotos paskolos sutartis --- 2006

BNS spaudos konferencijų salė

PRANEŠIMAI: PRANEŠIMAI SPAUDAI

PRADŽIA
RENGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Anonsai
RAIT apklausos

ieškoti...

pasirinkite Jus dominančią sritį

Nekilnojamasis turtas

Butai Vilnius 600 Lt

Butai Vilnius 240 000 Lt

Butai Vilnius 1 000 Lt

Kotedžai Vilnius 1 029 000 Lt

Atliekų tvarkymo mokėsi Švedijoje

Sritys: Regionai, ES
2006-11-27 12:29

Informacinis pranešimas

2006 m. lapkričio 23 d.

Praėjusią savaitę Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai bei valdybos nariai kartu su Švedijos dukterinės kompanijos "SWECO BKG" atstovais lankėsi Švedijoje, kur gilino atliekų tvarkymo sistemos kūrimo žinias bei susipažino su buitinių atliekų tvarkymo projektais.

Kaip teigia Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Arturas Grucė, šios mokomosios-pažintinės kelionės tikslas – ne tik susipažinti su vienos labiausiai pažengusių šalių, tai yra Švedijos, atliekų tvarkymo sistema, bet ir pasisemti patirties bei įkvėpimo tolesniems atliekų tvarkymo sistemos kūrimo darbams, kurie įgyvendinami ir Panevėžio regione.

Dešimties žmonių iš Panevėžio regiono grupė penkių dienų trukmės kelionės metu Švedijoje susipažino su sąvartynų techninio įrengimo savybėmis, tarifų už atliekų surikimą nustatymo metodika, pavojingų atliekų tvarkymo ypatybėmis bei visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais kampanijomis, vykstančiomis Švedijoje.

"Labiausiai Švedijoje sužavėjo pačių gyventojų požiūris į atliekų tvarkymą. Ten per daugiau nei tris dešimtmečius sukurta tokia atliekų tvarkymo sistema, kuri efektyviai veikia tik sąmoningų gyventojų dėka. Žmonės patys aktyviai rūpinasi tiek atliekų rūšiavimu, tiek aplinkos apsauga šalinant atliekas," – dalijasi įspūdžiais A.Grucė.

Švedijoje nuo 2005 metų sąvartynuose šalinamos tik degimo atliekos (pelenai, šlakai ir pan), o kitos atliekos rūšiuojamos, perdirbamos, kompostuojamos ar deginamos.

Ypač gerai šioje Skandinavijos šalyje veikia ir atliekų surinkimo aikštelės. Pavojingas atliekas gyventojai gali atvežti į specialiai įrengtas aikštelės, kurios įrengtos net degalinėse, o kompostavimo ir didžiųjų atliekų aikštelės išdėstytos taip, kad kiekvienas gyventojas galėtų lengvai jas pasiekti.

"Kadangi tiek lietuviams, tiek švedams galioja vienodi Europos Sąjungos atliekų tvarkymo reglamentai, todėl dalijimasis patirtimi su labiau patyrusiais partneriais yra ypač svarbus. Manome, jog Lietuvoje tokia atliekų tvarkymo sistema gali efektyviai veikti po 15-20 metų," – sako Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2009 metų sukurt optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Planuojama, jog vietoj uždarytų 95 žemo, vidutinio ir didelio prioriteto sąvartynų Panevėžio apskrityje bus pastatytas vienas regioninis sąvartynas. Be to, numatoma pastatyti 5 žalių atliekų kompostavimo bei 5 didžiagabaritinių atliekų priėmimo aikšteles, 2 perkrovimo stotis Biržuose ir Rokiškyje. Šiam projektui įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondas kartu su Lietuvos Respublika skiria daugiau nei 67 mln. litų.

Kontaktinis asmuo:

KOPIJA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čepėjienė

Nemokama aljanso reklama
Padėkite globos namuose augantiems vaikams
parama

Nemokama aljanso reklama
Padėkime tiems, kam to labiausiai reikia
parama

Nemokama aljanso reklama
Padėkite globos namuose augantiems vaikams
parama

Nemokama aljan
Padėkime tiems, kar
reikia
parama

BizNews Lietuvos įmonių ir verslo naujienos

aruodas.lt

OMNI SURFPORT
wap.sp.lt

Greitai.lt
Lėktuvų bilietai

2006-12-19
Brussels
163 LTL
Kaina į vieną pusę, su visais mokesčiais

2006-12-27
Istanbul
492 LTL
Kaina į vieną pusę, su visais mokesčiais

2007-01-27
Barcelona
413 LTL
Kaina į vieną pusę, su visais mokesčiais

Atliekų tvarkymo mokėsi Švedijoje

BVRG 2006.11.27 12:28

Informacinis pranešimas
2006 m. lapkričio 27 d.

Praėjusią savaitę Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai bei valdybos ı su Švedijos dukterinės kompanijos "SWECO BKG" atstovais lankėsi Švedijoje, kur gil tvarkymo sistemos kūrimo žinias bei susipažino su buitinių atliekų tvarkymo projektais

Kaip teigia Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Arturas Grucė, šios mokomosios-pažintinės kelionės tikslas – ne tik susipažinti su vienos labiausiai paženg tai yra Švedijos, atliekų tvarkymo sistema, bet ir pasisemti patirties bei įkvėpimo tolesr tvarkymo sistemos kūrimo darbams, kurie įgyvendinami ir Panevėžio regione.

Dešimties žmonių iš Panevėžio regiono grupė penkių dienų trukmės kelionės metu Šve susipažino su sąvartynų techninio įrengimo savybėmis, tarifų už atliekų surikimą nusta metodika, pavojingų atliekų tvarkymo ypatybėmis bei visuomenės švietimo atliekų tva klausimais kampanijomis, vykstančiomis Švedijoje.

"Labiausiai Švedijoje sužavėjo pačių gyventojų požiūris į atliekų tvarkymą. Ten per da dešimtmečius sukurta tokia atliekų tvarkymo sistema, kuri efektyviai veikia tik sąmoni gyventojų dėka. Žmonės patys aktyviai rūpinasi tiek atliekų rūšiavimu, tiek aplinkos ap šalinant atliekas," – dalijasi įspūdžiais A.Grucė.

Švedijoje nuo 2005 metų sąvartynuose šalinamos tik degimo atliekos (pelenai, šlakai ir kitos atliekos rūšiuojamos, perdirbamos, kompostuojamos ar deginamos.
Ypač gerai šioje Skandinavijos šalyje veikia ir atliekų surinkimo aikštelės. Pavojingas ; gyventojai gali atvežti į specialiai įrengtas aikšteles, kurios įrengtos net degalinėse, o kompostavimo ir didžiųjų atliekų aikštelės išdėstytos taip, kad kiekvienas gyventojas g jas pasiekti.

"Kadangi tiek lietuviams, tiek švedams galioja vienodi Europos Sąjungos atliekų tvark reglamentai, todėl dalijimasis patirtimi su labiau patyrusiais partneriais yra ypač svarbı jog Lietuvoje tokia atliekų tvarkymo sistema gali efektyviai veikti po 15-20 metų," – sı Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaı lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2009 metų sukurti optimalią atliek sistemą. Planuojama, jog vietoj uždarytų 95 žemo, vidutinio ir didelio prioriteto sąvart Panevėžio apskrityje bus pastatytas vienas regioninis sąvartynas. Be to, numatoma past atliekų kompostavimo bei 5 didžiagabaritinių atliekų priėmimo aikštelės, 2 perkrovimo Biržuose ir Rokiškyje. Šiam projektui įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fonda

TAIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29
260

Priedas Nr. 211

BNS Spaudos centras

Teisė informuoti. Teisė būti informuotam.

2006 gruodžio 1 d., penktadienis

Prisijungti • Pagalba

Artin

BNS spaudos konferencijų salė

PRADŽIA
RENGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Anonsai
RAIT apklausos

ieškoti...

pasirinkite Jus dominančią sritį

Nekilnojamasis turtas

Butai Vilnius 470 000 Lt

Butai Vilnius 175 000 Lt

Butai Vilnius 3 000 Lt

Butai Vilnius 380 000 Lt

PRANEŠIMAI: PRANEŠIMAI SPAUDAI

Panevėžio regiono gyventojai bus supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema

Sritys: Regionai, ES
2006-12-01 12:14

Panevėžio regiono atliekų centro specialistai pradeda didelį darbą – supažindinti visų apskrities rajonų gyventojus, bendruomenes ir interesų grupes su nauja atliekų tvarkymo sistema.

Tai – didžiausias aplinkosaugos projektas Panevėžio apskrityje. Jo įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Tokie atliekų tvarkymo sistemos projektai, kurių tikslas – mažinti sąvartynų skaičių, modernizuoti juos, skatinti gyventojus rūšiuoti ir perdirbti atliekas, atskirti pavojingas atliekas – vyksta kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Startavę tik praėjusiais metais, panevėžiečiai šį projektą numato pabaigti 2010 metais.

Numatoma, kad Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija.

Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir didžiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys.

"Mūsų laukia daug iššūkių. Šiandieninis mūsų susitikimas – tai tik mūsų kelio pas bendruomenes pradžia. Važiuosime, kalbėsimės, tarsimės, kad žmonės suprastų tokio projekto reikalingumą ir naudą. Esu įsitikinęs, kad šis darbas ženkliai prisidės, kad mūsų kraštas taptų dar gražesnis, tvarkingesnis", - Panevėžio Regioninio atliekų tvarkymo centro (PRATC) direktorius Artūras Grucė.

Lapkričio mėnesį PRATC darbuotojai lankėsi Švedijoje, kur susipažino su jau įgyvendintais panašiais buitinių atliekų tvarkymo projektais, jų techniniu įrengimu, pavojingų atliekų tvarkymo ir visuomenės švietimo metodika.

"Švedijoje gyventojų sąmoningumo dėka sukurta ypač gera atliekų tvarkymo sistema. Žmonės supranta ir aktyviai rūpinasi tiek atliekų rūšiavimu, tiek aplinkosauga. To turėsime išmokti ir mes", - pabrėžė p. Grucė.

Siekiant sužinoti dabartinę Panevėžio apskrities gyventojų nuomonę apie atliekų tvarkymą, kitą savaitę bus pradėta reprezentatyvi Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonų gyventojų telefoninė apklausa, su kurios rezultatais taip pat bus supažindinta visuomenė.

Kontaktinis asmuo:
Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

270

KAINA
Biznews
Lietuvos įmonių ir verslo naujienos

OMNI SURFPORT™
wap.sp.lt

Panevėžio regiono gyventojai bus supažindinami su nauja atliekų tva sistema

BVRG 2006.12.01 12:20

Panevėžio regiono atliekų centro specialistai pradeda didelį darbą – supažindinti vi rajonų gyventojus, bendruomenes ir interesų grupes su nauja atliekų tvarkymo sist

Tai – didžiausias aplinkosaugos projektas Panevėžio apskrityje. Jo įgyvendinimui l daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 proce daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Tokie atliekų tvarkymo sistemos projektai, kurių tikslas – mažinti sąvartynų skaiči juos, skatinti gyventojus rūšiuoti ir perdirbti atliekas, atskirti pavojingas atliekas – kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Startavę tik praėjusiais metais, panevėžiečiai šį pr pabaigti 2010 metais.

Numatoma, kad Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks vi dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūš

Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir didžiagabaričių atliekų tvarky Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys.

„Mūsų laukia daug iššūkių. Šiandieninis mūsų susitikimas – tai tik mūsų kelio pas pradžia. Važiuosime, kalbėsimės, tarsimės, kad žmonės suprastų tokio projekto rei naudą. Esu įsitikinęs, kad šis darbas ženkliai prisidės, kad mūsų kraštas taptų dar g tvarkingesnis", - Panevėžio Regioninio atliekų tvarkymo centro (PRATC) direktor Grucė.

Lapkričio mėnesį PRATC darbuotojai lankėsi Švedijoje, kur susipažino su jau įgy panašiais buitinių atliekų tvarkymo projektais, jų techniniu įrengimu, pavojingų atl visuomenės švietimo metodika.

„Švedijoje gyventojų sąmoningumo dėka sukurta ypač gera atliekų tvarkymo siste supranta ir aktyviai rūpinasi tiek atliekų rūšiavimu, tiek aplinkosauga. To turėsime - pabrėžė p. Grucė.

Siekiant sužinoti dabartinę Panevėžio apskrities gyventojų nuomonę apie atliekų tv savaitę bus pradėta reprezentatyvi Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio ir Rokiški gyventojų telefoninė apklausa, su kurios rezultatais taip pat bus supažindinta visuo

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

Greitai.lt
Lėktuvų bilietai
2007-03-29
Milan
342 LTL
Kaina į vieną pusę, su visais mokesčiais
2007-02-02
Istanbul
492 LTL
Kaina į vieną pusę, su visais mokesčiais
2007-04-06
Paris
342 LTL
Kaina į vieną pusę, su visais mokesčiais
TradeDoubler reklama

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čapiejienė

Naujienos - Panevėžio regiono gyventojai bus supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sis... Page 1 of 2

vtv.lt Naujienos On Line

Naujienos | Skelbimai | Pažintys

2007 Balandžio 24 d. Antradienis

NAUJIENOS

- Titulinis
- Ekonomika
- IT rinka
- Kultūra
- Lietuvoje
- Nuotaikaltimai
- Sportas
- Sveikata
- Švietimas
- Žiniasklaida
- Loterijos
- RSS Naujienos

pirmoji
MARKS & SPENCER

PROGRAMOS

- Programa
- Radijo programos

LAISVALAIKIS

- Anekdotai
- Bioritmai
- Horoskopai
- Kelionės
- Moterims
- Vyrams
- Pramogos
- Sveikinimai
- Žaidimai

REDAKCIJA

- Reklama portale
- Pranešimai spaudai
- Kontaktai
- Atsakomybės apribojimas
- Sitemap

REGISTRACIJA

www.winloto.lt žaidėja laimėjo 20 000 litų! Tai didžiausias kada nors laimėtas interr

Titulinis

Panevėžio regiono gyventojai bus supažindinami su nauja atliekų tvarkymo sistema

2006 gruodžio 01

vtv.lt

Panevėžio regiono atliekų centro specialistai pradeda didelį darbą – supažindinti visų apskrities rajonų gyventojus, bendruomenes ir interesų grupes su nauja atliekų tvarkymo sistema. Tai – didžiausias aplinkosaugos projektas Panevėžio apskrityje. Jo įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Tokie atliekų tvarkymo sistemos projektai, kurių tikslas – mažinti sąvartynų skaičių, modernizuoti jupos, skatinti gyventojus rūšiuoti ir perdirbti atliekas, atskirti pavojingas atliekas – vyksta kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Startavę tik praėjusiais metais, panevėžiečiai šį projektą numato pabaigti 2010 metais.

Numatoma, kad Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija.

Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir didžiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys.

"Mūsų laukia daug iššūkių. Šiandieninis mūsų susitikimas – tai tik mūsų kelio pas bendruomenes pradžia. Važiuosime, kalbėsimės, tarsimės, kad žmonės suprastų tokio projekto reikalingumą ir naudą. Esu įsitikinęs, kad šis darbas ženkliai prisidės, kad mūsų kraštas taptų dar gražesnis, tvarkingesnis". - Panevėžio Regioninio atliekų tvarkymo centro (PRATC) direktorius Artūras Gruce.

Lapkričio mėnesį PRATC darbuotojai lankėsi Švedijoje, kur susipažino su jau įgyvendintais panašiais buitinių atliekų tvarkymo projektais, jų techniniu įrengimu, pavojingų atliekų tvarkymo ir visuomenės švietimo metodika.

"Švedijoje gyventojų sąmoningumo deka sukurta ypač gera atliekų tvarkymo sistema. Žmonės supranta ir aktyviai rūpinasi tiek atliekų rūšiavimu, tiek aplinkosauga. To turėsime išmokti ir mes". - pabrėžė p. Gruce.

Siekiant sužinoti dabartinę Panevėžio apskrities gyventojų nuomonę apie atliekų tvarkymą, kitą savaitę bus pradėta reprezentatyvi Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonų gyventojų telefoninė apklausa, su kurios rezultatais taip pat bus supažindinta visuomenė.

Cituok šį straipsnį

Komentuok pirmas!

RSS

Komentuoti

- Komentarai turi būti susiję su straipsnio turiniu.
- Kiti komentarai admin-stratoriaus nuožiūra gali būti šalinami.
- Prašome komentaruose nenaudoti nuorodų į kitas svetaines. Tokie komentarai yra trinami.
- Atnaujinkite naršyklę spausdami "Refresh", jeigu nematote saugumo kodo.

Vardas:

El. paštas

Komentaras:

Kodas:* 93353

Norėčiau gauti el. laišką, jeigu bus paskelbta daugiau komentarų

Siųsti

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

WINLOTO
Jau laimėjas 20 000 Lt prizas!

PAIEŠKA

ieškoti...

VARDADIENIUS ŠVENČIA

Kantrimas, Gražvyda, Fidelis, Ervina

APKLAUSA

Ar dažnai geriate alų?



PADARYK PIRMUOJU

- Svetainę į favoritus
- Puslapį į favoritus
- Padaryk pirmuoju

PRISIJUNGĘ

Prisijungę: 39 svečiai

Page 1 of 3

- Aukštaitijos naujienų ir pramogų portalas

Priedas Nr. 212

Reklama | Kontaktai | Padaryk pradiniu

AINA SKELBIMAI | AINA AKCIJOS | AINA PAŽINTYS | AINA AUKCIONAI

12 d. Antradienis

AINA

VISOS SĄLYGOS - MOKAMU TELEFONU 1817

Įsigalioja draudimas rūkyti viešojo maitinimo įstaigose(1)

Prezidentas Valdas Adamkus: "Puoselėkite savąjį miestą"

"Kelią į žvaigždes 2" laimėjo Merūnas(4)

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" pristato ateities atliekų tvarkymo sistemą apskrities bendruomenėms

Skaityti komentarus
Siųsti draugui

AINA
2006 12 22

Kupiškio, Pasvalio, Biržų rajono bei Panevėžio miesto bendruomenėms jau buvo pristatytas vienas didžiausių Lietuvoje aplinkosaugos projektų. Susitikimo metu „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) specialistai pristato ne tik projekto principus bei apibrėžia jo tikslus, kurie bus pasiekti projektui pasibaigus, bet taip pat domisi ir gyventojų požiūriu į šį projektą.

Seminarų tikslas – ne tik supažindinti su projektu, sukurti palankią aplinką būsimiems darbams, bet ir įskiepyti gyventojams atliekų rūšiavimo svarbą bei aktualumą.

Susitikimo metu inicijuojamas glaudus dialogas tarp bendruomenės ir ateities atliekų tvarkymo sistemą kuriančių PRATC atstovų. Diskusijos kylančios susitikimų metu leidžia abiem pusėms geriau suprasti abiejų pusių pozicijas bei ieškoti kompromisų.

Reklama

Vienas svarbiausių klausimų bendruomenėms – mokesčiai, tarifai, kurie bus įvesti projektui pasibaigus. Tačiau iki šiol nekilo aštresnių diskusijų dėl didėsiančių mokesčių.

PRATC atstovai susitikimus jau surengė Panevėžio apskrities savivaldybių specialistams ir Alizavo miestelio bendruomenėms, aplinkotvarkininkų kelias nusidriekė į bene šiauriausią Lietuvos tašką – pas Nemunėlio Radviliškio bendruomenę. Su dideliu susidomėjimu pasakojimo apie tai, kaip jų rajonas gali tapti švaresnis, klausėsi Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos vaikai.

Tam kad Panevėžio ir apskrities gyventojai geriau suvoktų atliekų tvarkymo naujoves ir svarbą, iš viso bus surengta daugiau kaip 40 susitikimų su vietos bendruomenėmis ir 25 – su kitomis interesų grupėmis.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą.

Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija.

Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos.

Vardas: El. paštas.

SKAITYTI RAŠYTI

Cituojant "AINA", būtina nurodyti šaltinį www.aina.lt

Reklama
Nemokamas el. paštas
El. pašto dėžutės talpa net 3 Gb! 143 galimos adreso galūnės!
www.draugas.lt

PAMATYK TAI, KAS GERIAUSIA INTERNETE

SPORTINIŲ ŠOKIŲ KLUBAS TANGO

Naujosios sąjungos MANIFESTAS

GEOCACHING.LT

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

mų Pasaulis

Partneriai

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2011 -06- 29

27

Mazda6 | už jubiliejinę kainą

Biznews
Lietuvos įmonių ir verslo naujienos
LT · EN

1,73 GHz
Išbandyk naujojo ASUS greitį

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" pristato ateities atliekų tvarkymo sistemą apskrities bendruomenėms

BVRG 2006-12-22 12:06

Pranešimas spaudai, 2006 gruodžio 22 d.

Kupiškio, Pasvalio, Biržų rajono bei Panevėžio miesto bendruomenėms jau buvo pristatytas vienas didžiausių Lietuvoje aplinkosaugos projektų. Susitikimo metu „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) specialistai pristato ne tik projekto principus bei apibrėžia jų tikslus, kurie bus pasiekti projektui pasibaigus, bet taip pat domisi ir gyventojų požiūriu į šį projektą.

Seminarų tikslas – ne tik supažinti su projektu, sukurti palankią aplinką būsimiems darbams, bet ir įskiepyti gyventojams atliekų rūšiavimo svarbą bei aktualumą.

Susitikimo metu inicijuojamas glaudus dialogas tarp bendruomenės ir ateities atliekų tvarkymo sistemą kuriančių PRATC atstovų. Diskusijos kylančios susitikimų metu leidžia abiem pusėms geriau suprasti abiejų pusių pozicijas bei ieškoti kompromisų.

Vienas svarbiausių klausimų bendruomenėms – mokesčiai, tarifai, kurie bus įvesti projektui pasibaigus. Tačiau iki šiol nekilo ašresnių diskusijų dėl didėsiančių mokesčių.

PRATC atstovai susitikimus jau surengė Panevėžio apskrities savivaldybių specialistams ir Alizavo miestelio bendruomenėms, aplinkotvarkininkų kelias nusidriekė į bene šiauriausią Lietuvos tašką – pas Nemunėlio Radviliškio bendruomenę. Su dideliu susidomėjimu pasakojimo apie tai, kaip jų rajonas gali tapti švaresnis, klausėsi Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos vaikai.

Tam kad Panevėžio ir apskrities gyventojai geriau suvoktų atliekų tvarkymo naujoves ir svarbą, iš viso bus surengta daugiau kaip 40 susitikimų su vietos bendruomenėmis ir 25 – su kitomis interesų grupėmis.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą.

Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija.

Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaritių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

Sužinokite daugiau!
Garažo vartai nuo 950 Lt.
PLAČIAUSIAS PASIRINKIMAS
Fauga vartai

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29
27

Spaudos centras

Savivaldybių rinkimai 200

Prisijungti • Pagalba

BNS spaudos konferencijų salė

PRADŽIA
RINGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Ansai
T apklausos

Ilnojamasis turtas

Butai Klaipėda 320 000 Lt

Butai Vilnius 780 000 Lt

Butai Vilnius 191 000 Lt

Butai Klaipėda 750 000 Lt

PRANEŠIMAI: PRANEŠIMAI SPAUDAI

Panevėžiečiams rūpi aplinkosauga, bet atliekas rūšiuoti dar reikia išmokti

Sritys: Regionai, ES
2007-01-05 11:57

Panevėžio apskrities gyventojų telefoninė apklausa parodė, kad žmonėms rūpi aplinkosauga, tačiau anaiptol ne kiekvienas įpratęs tvarkyti ir rūšiuoti atliekas.

Rengdamasi diegti naują atliekų tvarkymo sistemą apskrityje, UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" užsakė Panevėžio apskrities gyventojų telefoninę apklausą, kurią atliko UAB "Baltijos viešųjų ryšių grupė" kartu su informacijos ir paslaugų centru "Lintel". Iš viso 2006 m. gruodžio mėnesį apklausta 695 Panevėžio apskrities gyventojai nuo 16 m. amžiaus.

91 proc. apklausos dalyvių sutiko, kad "atliekų tvarkymas yra aktuali mūsų visuomenės problema", dar 6 proc. su šiuo teiginiu sutiko iš dalies. Tuo tarpu tam, kad atliekų rūšiavimą reikia laikyti svarbia atliekų tvarkymo dalimi "labai" pritarė 80 proc. apklaustųjų, iš dalies sutiko – 16 proc.

Kita situacija atsiskleidė, kai gyventojai buvo paklausti, ar jie patys rūšiuoja atliekas savo namuose. Tyrimo metu "visada" rūšiuojantys atliekas savo namuose nurodė 27 proc. apklaustų Panevėžio regiono gyventojų. "Kartais" rūšiuojantys atliekas teigė daugiau nei trečdalis – 37 proc. apklaustųjų, niekada nerūšiuojantys – 36 proc.

Klausiant apie atliekų rūšiavimą darbo, mokymosi vietoje, nuolatos rūšiuojantys sakė 20 proc. Dirbančių Panevėžio regiono gyventojų, "kartais" – 23 proc., niekados to nedarė darbo vietoje – 57 proc. į klausimą atsakiusių respondentų.

"Mūsų gyventojus dar reikia šviesti ir mokyti apie atliekų rūšiavimo naudą. Nerimą kelia toks apklausos metu paaiškėjęs faktas, kad atliekas retai rūšiuoja jaunoji karta – studentai, moksleiviai. Jų informavimui ir mokymui skirsime daugiau dėmesio", - sakė Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (PRATC) direktorius Arturas Grucė.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų Panevėžio apskrityje sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą.

Šio pranešimo spaudai priede pateikiame informaciją, kaip skiriasi gyventojų nuomonė skirtinguose Panevėžio apskrities rajonuose.

Daugiau informacijos:

Jonas Oškinis, sociologinio tyrimo vadovas

BVRG / "Baltijos viešųjų ryšių grupė"

Tel.: (5) 2153377, (650) 85115

El. paštas: joskinis@bvrg.lt

Kontaktinis asmuo:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

Biznews
Lietuvos įmonių ir verslo naujienos

SNORAS
MoneyGram

Panevėžiečiams rūpi aplinkosauga, bet atliekas rūšiuoti dar reikia

BVRG 2007.01.05 11:14

Panevėžio apskrities gyventojų telefoninė apklausa parodė, kad žmonėms aplinkosauga, tačiau anaiptol ne kiekvienas įpratęs tvarkyti ir rūšiuoti atli

Rengdamasi diegti naują atliekų tvarkymo sistemą apskrityje, UAB „Pan regiono atliekų tvarkymo centras" užsakė Panevėžio apskrities gyventojų telefoninę apklausą, kurią atliko UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė" kart informacijos ir paslaugų centru „Lintel". Iš viso 2006 m. gruodžio mėnes apklausta 695 Panevėžio apskrities gyventojai nuo 16 m. amžiaus.

91 proc. apklausos dalyvių sutiko, kad "atliekų tvarkymas yra aktuali mū visuomenės problema", dar 6 proc. su šiuo teiginiu sutiko iš dalies. Tuo t kad atliekų rūšiavimą reikia laikyti svarbia atliekų tvarkymo dalimi „laba 80 proc. apklaustųjų, iš dalies sutiko – 16 proc.

Kita situacija atsiskleidė, kai gyventojai buvo paklausti, ar jie patys rūšiu atliekas savo namuose. Tyrimo metu "visada" rūšiuojantys atliekas savo nurodė 27 proc. apklaustų Panevėžio regiono gyventojų. "Kartais" rūšiuo atliekas teigė daugiau nei trečdalis – 37 proc. apklaustųjų, niekada nerūši 36 proc.

Klausiant apie atliekų rūšiavimą darbo, mokymosi vietoje, nuolatos rūšiu sakė 20 proc. Dirbančių Panevėžio regiono gyventojų, „kartais" – 23 pro niekados to nedarė darbo vietoje – 57 proc. į klausimą atsakiusių respond

„Mūsų gyventojus dar reikia šviesti ir mokyti apie atliekų rūšiavimo nau Nerimą kelia toks apklausos metu paaiškėjęs faktas, kad atliekas retai rūš jaunoji karta – studentai, moksleiviai. Jų informavimui ir mokymui skirsi daugiau dėmesio", - sakė Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (PR direktorius Arturas Grucė.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas Europos Sa Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2 Panevėžio apskrityje sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą.

Šio pranešimo spaudai priede pateikiame informaciją, kaip skiriasi gyven nuomonė skirtinguose Panevėžio apskrities rajonuose.

I K R A
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29
270

.T.A - Panevėžiečiams rūpi aplinkosauga, bet atliekas rūšiuoti dar reikia išmokti Page 1 of 2

English • По-русски

SMS užsisakymas Konferencijų salė Įvykusios konferencijos | Apie mus

ELTA

ELTA Naują,

2 17 01 08, pirmadienis

POLITIKA | ŪKIS | TEISĖTVARKA | KULTŪRA | SPORTAS | ĮVAIRYBĖ

Skaityk naujienas nemokamai!

rasti

• Eltos gidas

TV pr

Mano ELTA: Prisijungti

Naujienos: - Pasirinkite -

PRANEŠIMAI SPAUDAI

« POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VISKAS

ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

2 17-01-05 11:29

žiečiams rūpi aplinkosauga, bet atliekas rūšiuoti dar reikia išmokti

ranešimas spaudai, 2007 01 05

evėžio apskrities gyventojų telefoninė apklausa parodė, kad žmonėms rūpi aplinkosauga, tačiau analiptoi ne kiekvienas įpratęs tvark atliekas.

Rengdamasi diegti naują atliekų tvarkymo sistemą apskrityje, UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" užsakė Panevėžio apsk telefoninę apklausą, kurią atliko UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė" kartu su informacijos ir paslaugų centru „Lintel". Iš viso 2006 m. gruo austa 695 Panevėžio apskrities gyventojai nuo 16 m. amžiaus.

1 proc. apklausos dalyvių sutiko, kad "atliekų tvarkymas yra aktuali mūsų visuomenės problema", dar 6 proc. su šiuo teiginiu sutiko iš kad atliekų rūšiavimą reikia laikyti svarbia atliekų tvarkymo dalimi „labai" pritarė 80 proc. apklaustųjų, iš dalies sutiko - 16 proc.

situacija atsiskleidė, kai gyventojai buvo paklausti, ar jie patys rūšiuoja atliekas savo namuose. Tyrimo metu "visada" rūšiuojantys a namuose nurodė 27 proc. apklaustų Panevėžio regiono gyventojų. "Kartais" rūšiuojantys atliekas teigė daugiau nei trečdalis - 37 proc. a nerūšiuojantys - 36 proc.

ausiant apie atliekų rūšiavimą darbo, mokymosi vietoje, nuolatos rūšiuojantys sakė 20 proc. Dirbančių Panevėžio regiono gyventojų, „l , niekados to nedarė darbo vietoje - 57 proc. į klausimą atsakiusių respondentų.

Mūsų gyventojus dar reikia šviesti ir mokyti apie atliekų rūšiavimo naudą. Nerimą kelia toks apklausos metu paaiškėjęs faktas, kad atlie oja jaunoji karta - studentai, moksleiviai. Jų informavimui ir mokymui skirsime daugiau dėmesio", - sakė Panevėžio regiono atliekų TC) direktorius Arturas Grucė.

vėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį proj metų Panevėžio apskrityje sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą.

ranešimo spaudai priede pateikiame informaciją, kaip skiriasi gyventojų nuomonė skirtinguose Panevėžio apskrities rajonuose.

iau informacijos:

as Oškinis, sociologinio tyrimo vadovas
/ „Baltijos viešųjų ryšių grupė"
5) 2153377, (650) 85115
paštas: joskinis@bvrg.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

.INA - Aukštaitijos naujienų ir pramogų portalas

Page 3 of 5



Darbo partija rinkimų rezultatus stebės "Forum palace"

N Sadūnaitė: prezidentą palaikinu, nes jis nežinojo, ką daro

Aktualiyvės

Panevėžiečiams rūpi aplinkosauga bet atliekų rūšiuoti jie dar neįpratę

Skaityti komentarus

Siųsti draugui

AINA
2007 03 29

Panevėžio apskrities gyventojų telefoninė apklausa parodė, kad žmonems rūpi aplinkosauga, tačiau apie pilnavertį nekenksmingo grotės tvarkymą ir rūšiuoti atliekas

Reengiamas diegti naują atliekų tvarkymo sistemą apskrityje. UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" užsakė Panevėžio apskrities gyventojų telefoninę apklausą, kurią atliko UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė". Iš viso 2006 m. gruodžio mėnesį apklausta 695 Panevėžio apskrities gyventojai nuo 16 metų

51 proc. apklausos dalyvių sutiko, kad „Atliekų tvarkymas yra aktuali mūsų visuomenės problema", dar 6 proc. su šiuo teiginiu sutiko iš dalies. Tuo tarpu tam, kad atliekų rūšiavimą reikia laikyti svarbia atliekų tvarkymo dalimi, „labai" pritarė 80 proc. apklaustųjų, iš dalies sutiko – 16 proc.

Kaip situacija atsiskleidė, kai gyventojai buvo paklausti, ar jie patys rūšiuoja atliekas savo namuose. Tyrimo metu „visada" rūšiuojantys atliekas savo namuose nurodė 27 proc. apklaustų Panevėžio regiono gyventojų, „kartais" rūšiuojantys atliekas teigė daugiau nei trečdalis – 37 proc. apklaustųjų, niekada nerūšiuojantys – 36 proc.

Klausiant apie atliekų rūšiavimą darbo vietoje, tokymosi vietoje, nuolatos rūšiuojantys sako 20 proc. dirbančių Panevėžio regiono gyventojų, „kartais" – 23 proc., niekados to nedaro darbo vietoje – 57 proc. į klausimą atsakusių respondentų.

Mūsų gyventojus dar reikia švietimo, mokyti apie atliekų rūšiavimo naudą. Nemaža kitos tokios apklausos metu paaiškėjęs faktas, kad atliekas retai rūšiuoja šeimos „kartai" – studentai, moksleiviai. Jo informavimui ir mokymui, siekiant daugiau dėmesio, – sako Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (PRATC) direktorius Algirdas Čiuce.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendinantis Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų Panevėžio apskrityje sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą.

Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veikė tik vienas pro dabartinio Panevėžio sąvartyno pirmtakas, modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaritinių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys. Apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buitinės susidarančios pavojingos atliekos.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Vardas El. paštas

SKAITYTI RAŠYTI

Cituojant AINA, būtina nurodyti šaltinį: www.aina.lt

Reklama

Garažo vartai nuo 950 Lt.

Reklama

Pigius skrydžius nuo 1 Lt
Naujena, Vilnius-Dublinas, Kaunas-Londonas, Dublinas Frankfurtas

UAB "Aukštaitijos vandenys" informuoja

Mobilios pramogos

GERAI

SPORTINĮ ŠOKĮ KLUBAS TANGO

GEOCACHING.LT

KL LIETUVOS KOLEKCINIŲ LYGA

mų Pasaulis Veri

Reklama

Partneriai

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29
270

Panevėžio balsas

214

Biznews Lietuvos įmonių ir verslo naujienos

atveriame jums platesnį pasaulį
Aberdynas | 1015 LTL KLM

Raguvos gyventojai domisi kuriama atliekų tvarkymo sistema

BVRG 2007.01.30 12:33

Praėjusią savaitę UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (P atstovai, tęsdami susitikimų su vietos gyventojais ciklą, Raguvoje (Pane rajone) susitiko su vietos bendruomenių nariais. Susitikimo metu raguvi supažindinti su PRATC įgyvendinamu investiciniu projektu, kurio metu naujoji Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema.

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" direktorius Arturas (projekto administratorius Vaidas Peleckas išsamiai pristatė būsimos atlie tvarkymo sistemos projektą bei aktyviai diskutavo su susitikime dalyvav Raguvos seniūnijos bei vietinių bendruomenių atstovais. Raguviškiai pa dideliu aktyvumu ir noru žinoti daugiau apie pokyčius, ateityje paliesian pačius ir darysiančius įtaką jų gyvenimo kokybei.

Raguvos seniūnijoje šiuo metu veikia du dar 1978 ir 1985 metais atidary sąvartynai, kurių eksploatacija reikalauja papildomų išlaidų bei kelia ner rūpesčių Raguvos seniūnijos darbuotojams bei miestelio gyventojams.

Susitikimo dalyviams aktualus pasirodė šių sąvartynų tolesnis likimas na atliekų tvarkymo sistemos kūrimo procese, bei kaip ateityje kis Raguvos įsipareigojimai esamų sąvartynų priežiūros klausimais.

Bendruomenių atstovams labiausiai rūpėjo atliekų rūšiavimo, mokesčių klausimas. Kartu su UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" specialistais buvo analizuojami esamos mokėjimo sistemos už atliekų su trūkumai, drauge buvo bandoma rasti tinkamiausią būdą, užtikrinantį vie sąžiningą gyventojų mokėjimą už buityje susidarančių atliekų surinkimą

Susitikimo metu tapo akivaizdu, jog pagrindinis tokių susitikimų organi tikslas – gyventojų informavimas bei jų sąmoningumo skatinimas – pam realybe.

Panašūs susitikimai jau buvo surengti Panevėžio miesto, Kupiškio, Pasv rajono bendruomenių nariams. Ateityje planuojama suorganizuoti dar da

Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė 2011-06-29

279

60 susitikimų su vietos bendruomenėmis bei interesų grupėmis.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendindamas Eu Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, s 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Planuojama, jog uždarytų 95 žemo, vidutinio ir didelio prioriteto sąvartynų Panevėžio ap bus pastatytas vienas regioninis sąvartynas. Be to, numatoma pastatyti 5 atliekų kompostavimo bei 5 didžiagabaritinių atliekų priėmimo aikštelės perkrovimo stotis Biržuose ir Rokiškyje. Šiam projektui įgyvendinti Eur Sąjungos Sanglaudos fondas kartu su Lietuvos Respublika skiria daugia mln. litų.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

Naujienos | Naujienos paskelbimas | Registracija | Reklama | Kontaktai | Atsakomybės apribojimas
© 2004 - 2007 BizNews.lt - verslo žinios | Visos teisės saugomos

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

280

://www.biznews.lt/?psl=naujienos&id=7710

A - Raguvos gyventojai domisi kuriama atliekų tvarkymo sistema Page 1 of 2

English › По-русски SMS užsisakymas Konferencijų salė Įvykusios konferencijos | Apie mus

ELTA

Naujienų užsisakymas SMS žinutėmis
POLITIKA: Karščiausios žinios iš LR Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės

007 01 31, trečiadienis | POLITIKA | ŪKIS | TEISĖTVARKA | KULTŪRA | SPORTAS | ĮVAIRYE

.aityk naujienas nemokamai! rasti › Eltos gidas TV p

Mano ELTA: prisijungti Naujienos: - Pasirinkite

RANEŠIMAI SPAUDAI

← POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VISKAS

LTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

2007-01-30 12:39

...uvos gyventojai domisi kuriama atliekų tvarkymo sistema

Pranešimas spaudai,

007 m. sausio 30 d.

raėjusią savaitę UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) atstovai, tęsdami susitikimų su vietos gyventojais ciklą, R Panevėžio rajone) susitiko su vietos bendruomenių nariais. Susitikimo metu raguviškiai buvo supažindinti su PRATC įgyvendinamu inv kurio metu kuriama naujoji Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema.

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" direktorius Arturas Grucė bei projekto administratorius Vaidas Peleckas išsamiai prist atliekų tvarkymo sistemos projektą bei aktyviai diskutavo su susitikime dalyvavusiais Raguvos seniūnijos bei vietinių bendruomenių ats asižymėjo dideliu aktyvumu ir noru žinoti daugiau apie pokyčius, ateityje paliesiančius juos pačius ir darysiančius įtaką jų gyvenimo k

aguvos seniūnijoje šiuo metu veikia du dar 1978 ir 1985 metais atidaryti sąvartynai, kurių eksploatacija reikalauja papildomų išlaidų b ipesčių Raguvos seniūnijos darbuotojams bei miestelio gyventojams.

...kimo dalyviams aktualus pasirodė šių sąvartynų tolesnis likimas naujosios atliekų tvarkymo sistemos kūrimo procese, bei kaip atei ...iūnijos įsipareigojimai esamų sąvartynų priežiūros klausimais.

endruomenių atstovams labiausiai rūpėjo atliekų rūšiavimo, mokesčių bei tarifų klausimas. Kartu su UAB „Panevėžio regiono atliekų t specialistais buvo analizuojami esamos mokėjimo sistemos už atliekų surinkimą trūkumai, drauge buvo bandoma rasti tinkamiausią bū ...eningą bei sąžiningą gyventojų mokėjimą už buityje susidarančių atliekų surinkimą.

Susitikimo metu tapo akivaizdu, jog pagrindinis tokių susitikimų organizavimo tikslas - gyventojų informavimas bei jų sąmoningumo sk mpa realybe.

Panašūs susitikimai jau buvo surengti Panevėžio miesto, Kupiškio, Pasvalio, Biržų rajono bendruomenių nariams. Ateityje planuojama s ugiau nei 60 susitikimų su vietos bendruomenėmis bei interesų grupėmis.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendindamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investi ...kia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Planuojama, jog vietoj uždarytų 95 žemo, vidutinio ir didelio prioriteto Panevėžio apskrityje bus pastatytas vienas regioninis sąvartynas. Be to, numatoma pastatyti 5 žalių atliekų kompostavimo bei 5 didžiag ...riėmimo aikšteles, 2 perkrovimo stotis Biržuose ir Rokiškyje. Šiam projektui įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondas kartu su

TIKRA 281
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

BNS Spaudos centras

Teisė informuoti. Teisė būti informuotam.

2007 sausio 30 d., antradienis

Savivaldybių rinkimai 2007!

Prisijungti • Pagalba

Artimiausi renginiai: 2007

BNS spaudos konferencijų salė

PRANEŠIMAI: PRANEŠIMAI SPAUDAI

PRADŽIA
RENGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Anonsai
RAIT apklausos

ieškoti...

pasirinkite Jus dominančią sritį

...nojamasis turtas

Žemė Panevėžys 441 000 Lt

Butai Kaunas 172 000 Lt

Butai Vilnius 150 000 Lt

Butai Vilnius 640 000 Lt

Raguvos gyventojai domisi kuriama atliekų tvarkymo sistema

Sritys: Regionai, ES
2007-01-30 12:27

Praėjusią savaitę UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) atstovai, tęsdami susitikimų su vietos gyventojais ciklą, Raguvoje (Panevėžio rajone) susitiko su vietos bendruomenių nariais. Susitikimo metu raguviškiai buvo supažindinti su PRATC įgyvendinamu investicinių projektu, kurio metu kuriama naujoji Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" direktorius Arturas Gruce bei projekto administratorius Vaidas Peleckas išsamiai pristatė būsimos atliekų tvarkymo sistemos projektą bei aktyviai diskutavo su susitikime dalyvavusiais Raguvos seniūnijos bei vietinių bendruomenių atstovais. Raguviškiai pasižymėjo dideliu aktyvumu ir noru žinoti daugiau apie pokyčius, ateityje paliesiančius juos pačius ir darysiančius įtaką jų gyvenimo kokybei.

Raguvos seniūnijoje šiuo metu veikia du dar 1978 ir 1985 metais atidaryti sąvartynai, kurių eksploatacija reikalauja papildomų išlaidų bei kelia nemažai rūpesčių Raguvos seniūnijos darbuotojams bei miestelio gyventojams.

Susitikimo dalyviams aktualus pasirodė šių sąvartynų tolesnis likimas naujosios atliekų tvarkymo sistemos kūrimo procese, bei kaip ateityje kis Raguvos seniūnijos įsipareigojimai esamų sąvartynų prežiūros klausimais.

Bendruomenių atstovams labiausiai rūpėjo atliekų rūšiavimo, mokesčių bei tarifų klausimas. Kartu su UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" specialistais buvo analizuojami esamos mokėjimo sistemos už atliekų surinkimą trūkumai, drauge buvo bandoma rasti tinkamiausią būdą, užtikrinantį vieningą bei sąžiningą gyventojų mokėjimą už buityje susidarančių atliekų surinkimą.

Susitikimo metu tapo akivaizdu, jog pagrindinis tokių susitikimų organizavimo tikslas – gyventojų informavimas bei jų sąmoningumo skatinimas – pamažu lampa realybė.

Panašūs susitikimai jau buvo surengti Panevėžio miesto, Kupiškio, Pasvalio, Biržų rajono bendruomenių nariams. Ateityje planuojama suorganizuoti dar daugiau, nei 60 susitikimų su vietos bendruomenėmis bei interesų grupėmis.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendindamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Planuojama, jog vietoj uždarytų 95 žemo, vidutinio ir didelio prionleto sąvartynų Panevėžio apskrityje bus pastatytati vienas regioninis sąvartynas. Be to, numatoma pastatyti 5 žalių atliekų kompostavimo bei 5 didžiagabaritinių atliekų priėmimo aikštelės, 2 perkrovimo stotis Biržuose ir Rokiškyje. Šiam projektui įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondas kartu su Lietuvos Respublika skirs daugiau nei 67 mln. litų.

Kontaktinis asmuo:
Arturas Gruce
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ VIKTORIJA JAKUBAUSKYTĖ, BALTOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ GRUPĖ

GRĮŽTI Į VIRŠŲ

"BNS Spaudos centre" skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

Apie "BNS Spaudos centrą" | Kontaktai | "BNS Spaudos centro" naudojimo sąlygos ir atsakomybė | Populiariausi

© 2005 UAB "BNS".

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

2007 Sausio 30 d. Antradienis

AINA PRAMOGOS

AINA SKELBIMAI

AINA AKCIJOS

AINA PAŽINTYS

AINA AUKCIONAI

AINA

aukštaitijos internetinė naujienų agentūra

Raguvos gyventojai domisi kuriama atliekų tvarkymo sistema

Skaityti komentarus

Siusti draugui

AINA
2007.01.30

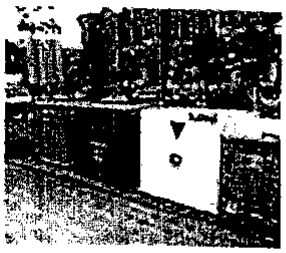

Praėjusią savaitę UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) atstovai, tęsdami susitikimų su vietos gyventojais ciklą, Raguvoje (Panevėžio rajone) susitiko su vietos bendruomenių nariais. Susitikimo metu raguviškiai buvo supažindinti su PRATC įgyvendinamu investiciniu projektu, kurio metu kuriama naujoji Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" direktorius Arturas Grucė bei projekto administratorius Vaidas Peleckas išsamiai pristatė būsimos atliekų tvarkymo sistemos projektą bei aktyviai diskutavo su susitikime dalyvavusiais Raguvos seniūnijos bei vietinių bendruomenių atstovais. Raguviškiai pasižymėjo dideliu aktyvumu ir noru žinoti daugiau apie pokyčius, ateityje paliesiančius juos pačius ir darysiančius įtaką jų gyvenimo kokybei.

Raguvos seniūnijoje šiuo metu veikia du dar 1978 ir 1985 metais atidaryti sąvartynai, kurių eksploatacija reikalauja papildomų išlaidų bei kelia nemažai rūpesčių Raguvos seniūnijos darbuotojams bei miestelio gyventojams.

Susitikimo dalyviams aktualus pasirodė šių sąvartynų tolesnis likimas naujosios atliekų tvarkymo sistemos kūrimo procese, bei kaip ateityje kis Raguvos seniūnijos įsipareigojimai esamų sąvartynų priežiūros klausimais.

Bendruomenių atstovams labiausiai rūpėjo atliekų rūšiavimo, mokesčių bei tarifų klausimas. Kartu su UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" specialistais buvo analizuojami esamos mokėjimo sistemos už atliekų surinkimą trūkumai, drauge buvo bandoma rasti tinkamiausią būdą, užtikrinantį vieningą bei sąžiningą gyventojų mokėjimą už buityje susidarančių atliekų surinkimą.

Susitikimo metu tapo akivaizdu, jog pagrindinis tokių susitikimų organizavimo tikslas – gyventojų informavimas bei jų sąmoningumo skatinimas – pamažu tampa realybe.

Panašūs susitikimai jau buvo surengti Panevėžio miesto, Kupiškio, Pasvalio, Biržų rajono bendruomenių nariams. Ateityje planuojama suorganizuoti dar daugiau nei 60 susitikimų su vietos bendruomenėmis bei interesų grupėmis.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendindamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Planuojama, jog vietoj uždarytų 95 žemo, vidutinio ir didelio prioriteto sąvartynų Panevėžio apskrityje bus pastatytas vienas regioninis sąvartynas. Be to, numatoma pastatyti 5 žaliųjų atliekų kompostavimo bei 5 didžiagabaritinių atliekų priėmimo aikšteles, 2 perkrovimo stotis Biržuose ir

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čepėjienė

ELTA - 2006-aisiais metais atlikti darbai - postūmis tolesnei UAB "Panevėžio regiono Page 1 of 1

Priedas Nr. 2/5

» In English » По-русски

SMS užsisakymas Konferencijų salė Įvykusios konferencijos | Apie mus TOP 10 Kontaktai

LIETUVOS NAUJIENŲ AGENTŪRA ELTA

ELTA Naujienų užsisakymas SMS žinutėmis

2007 03 06, antradienis

POLITIKA | ŪKIS | TEISĖTVARKA | KULTŪRA | SPORTAS | ĮVAIRYBĖS | VISKAS |

Skaityk naujienas nemokamai!

Mano ELTA: prisijungti

» Eltos gidas TV programos

Naujienos: - Pasirinkite -

PRANEŠIMAI SPAUDAI

← POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VISKAS

ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

2007-03-05 09:52

2006-aisiais metais atlikti darbai - postūmis tolesnei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" veiklai

Pranešimas spaudai,
07 m. kovo 1 d.

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", besiruošdamas bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvertina 2006 metais atliktus darbus, įgyvendinant projektą "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". Tuo pačiu nubrėžiamos gairės planuojamiems darbams 2007-aisiais.

Kaip teigia UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius Arturas Grucė, 2006 metai buvo pilni pokyčių ir darbų, tačiau jie buvo tik mažas žingsnelis prieš didžiuosius šių metų darbus.

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimui per 2006 metus panaudota daugiau nei 900 tūkst. Lt, iš jų kurių 773 tūkst. litų buvo skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir daugiau nei 136 tūkst. Lt. - iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Praėjusiais 2006 metais UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" pasirašė itin reikšmingas sutartis su UAB „Statinių projektavimo biuras" dėl projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimo bei UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė" dėl visuomenės švietimo ir informavimo. Parengti ir patvirtinti detaliejį planai, rengiami techniniai projektai. Paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas techninės priežiūros paslaugų pirkimui. Tikimasi, jog visų šių sutarčių sėkmingas įgyvendinimas pasitarnaus dar efektyvesnei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" veiklai iki pat projekto pabaigos 2010-aisiais.

Pagal „Techninės pagalbos teikimo UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" sutartį UAB „Sweco BKG" 2006-aisiais atliko paruošiamuosius-analizacinius darbus, kurių svarbiausias rezultatas yra darbo grupės, sudarytos iš visų apskrities savivaldybių atstovų, suformavimas, parengtas procedūrų vadovas, atlikti parengiamieji darbai ruošiant regioninį atliekų tvarkymo planą bei savivaldybių atliekų tvarkymo planus.

Kaip teigia A.Grucė, 2007 metais UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" tikisi įsisavinti daug daugiau nei per praėjusius metus - per 14 milijonų litų. „Pernai pradėjome projektuoti, šviesti visuomenę, o šiais metais jau vyks realūs žingsniai - skelbiami konkursai statybos darbams pradėti, kad apskrityje turėtume vieną regioninį sąvartyną, o netvarkingi nedideli sąvartynai būtų uždaryti," - sako PRATC direktorius A.Grucė.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Šio projekto įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

© 2005 Lietuvos naujienų agentūra ELTA

AINA - Aukštaitijos naujienų ir pramogų portalas

Page 3 of 5

pašalinti iš partijos

A. Brazauskas liepė neoficialinėti A. Zuokui

Archyvas

2006-aisiais metais atlikti darbai – postūmis tolesnei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" veiklai

Skaityti komentarus

Siųsti draugui

AINA
2007.03.05

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", besiruošdamas bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvertina 2006 metais atliktus darbus, įgyvendinant projektą "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". Tuo čaču nubrėžiamos gairės planuojamiems darbams 2007-aisiais.

Reklama

Kaip teigia UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius Arturas Grucė, 2006 metai buvo pilni pokyčių ir darbų, tačiau jie buvo tik mažas žingsnelis prieš didžiuosius šių metų darbus

Projekto "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimui per 2006 metus panaudota daugiau nei 900 tūkst. Lt. iš jų kurių 773 tūkst. litų buvo skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir daugiau nei 136 tūkst. Lt. – iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Praėjusiais 2006 metais UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" pasirašė itin reikšmingas sutartis su UAB "Statinių projektavimo biuras" dėl projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimo bei UAB "Baltijos viešųjų ryšių grupė" dėl visuomenės švietimo ir informavimo. Parengti ir patvirtinti detaliųjų planai, rengiami techniniai projektai. Paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas techninės priežiūros paslaugų pirkimui. Tikimasi, jog visų šių sutarčių sėkmingas įgyvendinimas pasitarnaus dar efektyvesnei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" veiklai iki pat projekto pabaigos 2010-aisiais.

Pagal "Techninės pagalbos teikimo UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" sutartį UAB "Sweco BKG" 2006-aisiais atliko paruošiamuosius–organizacinius darbus, kurių svarbiausias rezultatas yra darbo grupės, sudarytos iš visų apskrities savivaldybių atstovų, suformavimas, parengtas procedūrų vadovas, atlikti parengiamieji darbai ruošiant regioninį atliekų tvarkymo planą bei savivaldybių atliekų tvarkymo planus.

Kaip teigia A.Grucė, 2007 metais UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" tikisi įsisavinti daug daugiau nei per praėjusius metus – per 14 milijonų litų. "Pernai pradėjome projektuoti, šviesti visuomenę, o šiais metais jau vyks realūs žingsniai – skelbiami konkursai statybos darbams pradėti, kad apskrityje turėtume vieną regioninį sąvartyną, o netvarkingi nedideli sąvartynai būtų uždaryti." – sako PRATC direktorius A.Grucė.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrenglas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Šio projekto įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų. Likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Vardas: El. paštas:

SKAITYTI RAŠYTI

Cituojant "AINA", būtina nurodyti šaltinį: www.aina.lt

Reklama

Tiesiogis reklama

Nedvejokite!
4 durų Chevrolet Aveo - tik nuo 360 Lt/mėn.
www.chevrolet.lt

Reklamuokis čia

SEIKASI

UAB "Aukštaitijos vandenys" informuoja



Partneriai

Kalendorius

07 - Kovas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-29
285

Biznews Lietuvos įmonių ir verslo naujienos
LT | EN
Greitai.lt
Svajok...
Iš
Vilnius
Į
London
Išvykimas
Kovas 19
Grįžimas
Kovas 26
Čia daug

2006-aisiais metais atlikti darbai – postūmis tolesnei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" veiklai

BVRG 2007.03.05 09:51

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", besiruošdamas bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvertina 2006 metais atliktus darbus, įgyvendinant projektą "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". Tuo pačiu nubrėžiamos gairės planuojamiems darbams 2007-aisiais.

Kaip teigia UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius Arturas Grucė, 2006 metai buvo pilni pokyčių ir darbų, tačiau jie buvo tik mažas žingsnelis prieš didžiuosius šių metų darbus.

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimui per 2006 metus panaudota daugiau nei 900 tūkst. Lt, iš jų kurių 773 tūkst. litų buvo skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir daugiau nei 136 tūkst. Lt. – iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Praėjusiais 2006 metais UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" pasirašė itin reikšmingas sutartis su UAB „Statinių projektavimo biuras" dėl projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimo bei UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė" dėl visuomenės švietimo ir informavimo. Parengti ir patvirtinti detaliejі planai, rengiami techniniai projektai. Paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas techninės priežiūros paslaugų pirkimui. Tikimasi, jog visų šių sutarčių sėkmingas įgyvendinimas pasitarnaus dar efektyvesnei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" veiklai iki pat projekto pabaigos 2010-aisiais.

Pagal „Techninės pagalbos teikimo UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" sutartį UAB „Sweco BKG" 2006-aisiais atliko paruošiamuosius–organizacinius darbus, kurių svarbiausias rezultatas yra darbo grupės, sudarytos iš visų apskrities savivaldybių atstovų, suformavimas, parengtas procedūrų vadovas, atlikti parengiamieji darbai ruošiant regioninį atliekų tvarkymo planą bei savivaldybių atliekų tvarkymo planus.

Kaip teigia A.Grucė, 2007 metais UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" tikisi įsisavinti daug daugiau nei per praėjusius metus – per 14 milijonų litų. „Pernai pradėjome projektuoti, šviesti visuomenę, o šiais metais jau vyks realūs žingsniai – skelbiami konkursai statybos darbams pradėti, kad apskrityje turėtume vieną regioninį sąvartyną, o netvarkingi nedideli sąvartynai būtų uždaryti," – sako PRATC direktorius A.Grucė.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Šio projekto įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

VISKAS INTEGRUOTA!

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29 280

BNS Spaudos centras : Pranešimai: Pranešimai spaudai

Page 1 of 1

BNS Spaudos centras

Teisė informuoti. Teisė būti informuotam.

2007 kovo 6 d., pirmadienis

Prisijungti • Pagalba

Artimiaus

PRANEŠIMAI: PRANEŠIMAI SPAUDAI

PRADŽIA
RENGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Anonsai
RAIT apklausos

ieškoti...

pasirinkite Jus dominančią sritį

2006-aisiais metais atlikti darbai – postūmis tolesnei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" veiklai

Sritys: ES, Ekonomika
2007-03-05 09:56

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", besiruošdamas bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvertina 2006 metais atliktus darbus, įgyvendinant projektą "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". Tuo pačiu nubrėžiamos gairės planuojamiems darbams 2007-aisiais.

Kaip teigia UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius Arturas Grucė, 2006 metai buvo pilni pokyčių ir darbų, tačiau jie buvo tik mažas žingsnelis prieš didžiuosius šių metų darbus.

Projekto "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimui per 2006 metus panaudota daugiau nei 900 tūkst. Lt, iš jų kurių 773 tūkst. litų buvo skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir daugiau nei 136 tūkst. Lt. – iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Praėjusiais 2006 metais UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" pasirašė itin reikšmingas sutartis su UAB "Statinių projektavimo biuras" dėl projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimo bei UAB "Baltijos viešųjų ryšių grupė" dėl visuomenės švietimo ir informavimo. Parengti ir patvirtinti detaliejі planai, rengiami techniniai projektai. Paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas techninės priežiūros paslaugų pirkimui. Tikimasi, jog visų šių sutarčių sėkmingas įgyvendinimas pasitarnaus dar efektyvesnei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" veiklai iki pat projekto pabaigos 2010-aisiais.

Pagal "Techninės pagalbos teikimo UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" sutartį UAB "Sweco BKG" 2006-aisiais atliko paruošiamuosius–organizacinius darbus, kurių svarbiausias rezultatas yra darbo grupės, sudarytos iš visų apskrities savivaldybių atstovų, suformavimas, parengtas procedūrų vadovas, atlikti parengiamieji darbai ruošiant regioninį atliekų tvarkymo planą bei savivaldybių atliekų tvarkymo planus.

Kaip teigia A.Grucė, 2007 metais UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" tikisi įsisavinti daug daugiau nei per praėjusius metus – per 14 milijonų litų. "Pernai pradėjome projektuoti, šviesti visuomenę, o šiais metais jau vyks realūs žingsniai – skelbiami konkursai statybos darbams pradėti, kad apskrityje turėtume vieną regioninį sąvartyną, o netvarkingi nedideli sąvartynai būtų uždaryti," – sako PRATC direktorius A.Grucė.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Šio projekto įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Daugiau informacijos:

Arturas Grucė

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)

Direktorius

Tel. 8 45 436223

El.p.: direktorius@pratc.lt

Kontaktinis asmuo:
Viktorija Jakubauskytė
Projekto koordinatorė
Baltijos viešųjų ryšių grupė
Tel.: 8-5 215 33 77
viktorija@bvrg.lt

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ VIKTORIJA JAKUBAUSKYTĖ, BALTIJOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ GRUPĖ

-- GRĮŽTI ! Į VIRŠŲ

"BNS Spaudos centre" skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

Apie "BNS Spaudos centrą" | Kontaktai | "BNS Spaudos centro" naudojimo sąlygos ir atsakomybė | Populiariausi

© 2005 UAB "BNS".

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė
2011-06-29

07 Kovo 23 d. Penktadienis

AINA
aukštaitijos internetine naujienų agentūra

Greitai.lt

Iš Vilnius
I London
Išvykimas Balandis 6
Grįžimas Balandis 13

Nerūkantieji džiaugiasi, rūkorial jaučiasi išmesti į gatvę

Panevėžiečiams rūpi aplinkosauga, bet atliekų rūšiuoti jie dar nejprato (2)

Žydai susidraskė ir dėl intymių dalykų

aujienos
DIENOS NAUJIENOS
anevėžio naujienos
ukštaitijos naujienos
omentarai ir interviu
ietuvos naujienos
erslo naujienos
nlaskiūnas naujienos
jienos
ultūros naujienos
amogų naujienos
ožio naujienos
unimo naujienos
irenybes

)naujas
rbo pasiūlymų paleška:
ministravimas
nius
Ieškoti
rdavimo vadybininkas (-
tarplautinėje įmonėje
nansų patarėjui (-ai)
nevėžyje

a akcijos
NA Akcijos

vės aikštės kamera

pankininkystė
SEB
NORD
SNORAS

ekstra

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras planuoja 2007 metų darbus

Skaityti komentarus
Siųsti draugui

AINA
2007 03 23

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) ruošdamasis bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui įvertina 2006 metais atliktus darbus, įgyvendinant projektą "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". Tuo pačiu nubrėžiamos gairės planuojamiems darbams 2007-aisiais.

Kaip teigia PRATC direktorius Arturas Gruce, 2006 metais buvo daug pokyčių ir darbų, tačiau jie - tik mažas žingsnis prieš didžiuosius šių metų darbus.

Projektui „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinti per 2006 metus panaudota daugiau nei 900 tūkst. litų, iš jų - 773 tūkst. litų skyrė Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, o daugiau nei 136 tūkst. litų – Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš biudžeto.

Praėjusiais metais PRATC pasirašė reikšmingas sutartis su UAB „Statinių projektavimo biuras" dėl projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimo bei su UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė" dėl visuomenės svietimo ir informavimo. Parengti ir patvirtinti detalieji planai, rengiami techniniai projektai. Paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas techninės priežiūros paslaugoms pirkti. Tikimasi, jog visų šių sutarčių sekmingas įgyvendinimas lems efektyvesnę PRATC veiklą iki projekto pabaigos 2010 aisiais.

Pagal „Technines pagalbos teikimo UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" sutartį, UAB „Sweco BKG" 2006-aisiais atlikę paruošiamuosius organizacinius darbus, jų svarbiausias rezultatas yra darbo grupės, sudarytos iš visų apskrities savivaldybių atstovų, suformavimas, parengtas procedūrų vadovas, atlikti parengiamieji darbai ruošiant regioninį atliekų tvarkymo planą bei savivaldybių atliekų tvarkymo planus.

2007 metais PRATC tikisi įsisavinti per 14 milijonų litų.

Pernai pradėjome projektuoti, šviesti visuomenę, o šiais metais jau vyks realūs žingsniai – skelbiami konkursai statybos darbams pradėti, kad apskrityje turėtume vienų regioninį sąvartyną, o netvarkingi nedidelį sąvartynai būtų uždaryti – sako PRATC direktorius A. Gruce.

PRATC, įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lešomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Šiam projektui įgyvendinti bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 65 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Vardas
El. pastas

SKAITYTI
RAŠYTI

Citudjant "AINA", būtina nurodyti šaltinį www.aina.lt

Reklama

Pigus skrydžiai: nuo 1 Lt Dublinas, Londonas, Frankfurtas nuo 1 Lt, nuolaida kelionems iki 15%

Deklaravusiems pajamas elektroniniu būdu

UAB "Aukštaitijos vandenys" informuoja

Mobilios pramogos

GEGUŽĖS 3-4 d.

SPORTINĮ ŠOKĮ KLUBAS
TANGO

GEOCACHING.LT

KL LIETUVOS KNEIPRINIO LYGA

mų Pasaulis
Vert

Partneriai

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

IA - Aukštaitijos naujienų ir pramogų portalas

Page 3 of 5

Priedas Nr. 216

pašalinti iš partijos

A. Brazauskas liepė nepuldinėti A. Zuoko

Archyvas

Paskutinių grupių darželinukai pieš gražiausią atliekų konteinerį

Skaityti komentarus

Siusti draugui

AINA
2007.03.05

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras paskelbe piešinių konkursą Panevėžio regiono ikimokyklinių įstaigų vaikams, kurio tema „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme".

Konkurso, kuris prasidejo kovo 1d. ir tęsis dvi savaites, metu Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų paskutiniųjų grupių vaikai tures pasiteikti visą vaizduotę ir kuo originaliau popieriaus lape perteikti savo viziją apie tai, kaip turėtų atrodyti atliekų konteineris.



Reklama

Konkurse kviečiama dalyvauti virš 40 Panevėžio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Iš visų dalyvausiančių jaunųjų dailininkų - gamtos mytėtojų piešinukų bus išrinkta 15 originaliausių, gražiausių, linksmiausių, o jų autoriai bus apdovanoti diplomais. Pirmosios vietos nugaletojui iškilmingo apdovanojimo metu bus įteiktas specialus prizas.

Tokiu būdu bandoma ikimokyklinukus įtraukti į ugdymo apie atliekų rūšiavimo svarbą ir naudą, kadangi visuomenės informavimasis ir švietimas yra viena svarbių projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" dalių. Nuo gyventojų sąmoningumo atliekų rūšiavimo klausimais didele dalimi priklauso viso projekto sekmė. Todel visuomenes švietimas pradedamas nuo pačių mažiausiųjų, kaip imliausių ugdymui ir potencialių informacijos skleidejų.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sajungos Sanglaudos fondo lešomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2009 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus užcaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sajungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 min. litų.

Vardas: El. paštas:

SKAITYTI RAŠYTI

Citudjant "AINA", būtina nurodyti šaltinį www.aina.lt

Reklama
Textads reklama

Reikia būsto kredito?
Paprasta priimti sprendimą atėjus į Nordea – ten su jumis kalba jūsų kalba.
www.nordea.lt

Reklamuokis cia

gegužės 3-4 d.
VILNIAUS UNIVERSITETO KARJEROS MUGĖ

VISAS

UAB "Aukštaitijos vandenys" informuoja

Mobilios pramogos

SPORTINIŲ ŠOKIŲ KLUBAS
kviečia naujos narius
TANGO

ŽADSK

GEOCACHING.LT

KL
LIETUVOS KEPSINIO LYGA

mų Pasaulis
Vert

Partneriai

Juozo Miltinio Dramos teatras

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepléjienė
2011-06-29

lorius

ovas

NS Spaudos centras : Pranešimai: Pranešimai spaudai

Page 1 of 1

BNS Spaudos centras

'eisė informuoti. Teisė būti informuotam.

)07 kovo 5 d., pirmadienis

Ateik gyventi į NIDĄ!

Prisijungti • Pagalba

ąacijų susitikimas (Žalioji s.) — 2007-03-05 14:00 Prezidentas: Šalies vadovas priims Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinę sekretorę Astą Dirmaitę (Prezidento ki

PRANEŠIMAI: PRANEŠIMAI SPAUDAI

PRADŽIA
RENGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Anonsai
RAIT apklausos

eškoti...

pasirinkite Jus dominančią sritį

Paskutinių grupių darželinukai pieš gražiausią atliekų konteinerį

Sritys: Kiti pranešimai, Švietimas
2007-03-05 12:03

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras paskelbė piešinių konkursą Panevėžio regiono ikimokyklinių įstaigų vaikams, kurio tema "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kiema".

Konkurso, kuris prasidėjo kovo 1d. ir tęsis dvi savaites, metu Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų paskutiniųjų grupių vaikai turės pasitelkti visą vaizduotę ir kuo originaliau popieriaus lape perteikti savo viziją apie tai, kaip turėtų atrodyti atliekų konteineris.

Konkurse kviečiama dalyvauti virš 40 Panevėžio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Iš visų dalyvausiančių jaunųjų dailininkų - gamtos mylėtojų piešinukų bus išrinkta 15 originaliausių, gražiausių, linksmiausių, o jų autoriai bus apdovanoti diplomais. Pirmosios vietos nugalėtojui iškilmingo apdovanojimo metu bus įteiktas specialus prizas.

Tokiu būdu bandoma ikimokyklinukus įtraukti į ugdymo apie atliekų rūšiavimo svarbą ir naudą, kadangi visuomenės informavimasis ir švietimas yra viena svarbių projekto "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" dalių. Nuo gyventojų sąmoningumo atliekų rūšiavimo klausimais didele dalimi priklauso viso projekto sėkmė. Todėt visuomenės švietimas pradedamas nuo pačių mažiausiųjų, kaip imtiausių ugdymui ir potencialių informacijos skleidėjų.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2009 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:

Arturas Grucė

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)

Direktorius

Tel. 8 45 436223

El.p.: direktorius@pratc.lt

Kontaktinis asmuo:
Viktorija Jakubauskytė
Projekto koordinatorė
Baltijos viešųjų ryšių grupė
Tel.: 8-5 215 33 77
viktorija@bvrg.lt

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ VIKTORIJA JAKUBAUSKYTĖ, BALTIJOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ GRUPĖ

• GRĮŽTI | VIRŠŲ

"BNS Spaudos centre" skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

Apie "BNS Spaudos centrą" | Kontaktai | "BNS Spaudos centro" naudojimo sąlygos ir atsakomybė | Populiariausi

© 2005 UAB "BNS".

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

290



Biznews Lietuvos įmonių ir verslo naujienos

LT | EN

Greitai.lt

Svajok...

Iš
Vilnius
Į
London
Išvykimas
Kovas 19
Grįžimas
Kovas 26

Paskutinių grupių darželinukai pieš gražiausią atliekų konteinerį

BVRG 2007.03.05 12:05

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras paskelbė piešinių konkursą Panevėžio regiono ikimokyklinių įstaigų vaikams, kurio tema „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme".

Konkurso, kuris prasidėjo kovo 1d. ir tęsis dvi savaites, metu Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų paskutiniųjų grupių vaikai turės pasitelkti visą vaizduotę ir kuo originaliau popieriaus lape perteikti savo viziją apie tai, kaip turėtų atrodyti atliekų konteineris.

Konkurse kviečiama dalyvauti virš 40 Panevėžio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Iš visų dalyvausiančių jaunųjų dailininkų - gamtos mylėtojų piešinukų bus išrinkta 15 originaliausių, gražiausių, linksmiausių, o jų autoriai bus apdovanoti diplomais. Pirmosios vietos nugalėtojui iškilmingo apdovanojimo metu bus įteiktas specialus prizas.

Tokiu būdu bandoma ikimokyklinukus įtraukti į ugdymo apie atliekų rūšiavimo svarbą ir naudą, kadangi visuomenės informavimasis ir švietimas yra viena svarbių projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" dalių. Nuo gyventojų sąmoningumo atliekų rūšiavimo klausimais didele dalimi priklauso viso projekto sėkmė. Todėl visuomenės švietimas pradedamas nuo pačių mažiausiųjų, kaip imliausių ugdymui ir potenciałių informacijos skleidėjų.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2009 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

LTA - Paskutinių grupių darželinukai pieš gražiausią atliekų konteinerį Page 1 of 1

› In English › По-русски SMS užsisakymas Konferencijų salė Įvykusios konferencijos | Apie mus TOP 10 Kontaktai

LIETUVOS KAIMO ŽINIŲ AGENTŪRA ELTA

ELTA Omnitel ir Extra paslaugos vartotojams OMNITEL OMNITEL

2007 03 06, antradienis | POLITIKA | ŪKIS | TEISĖTVARKA | KULTŪRA | SPORTAS | ĮVAIRYBĖS | VISKAS |

Skaityk naujienas nemokamai! Mano ELTA: prisijungti ieškoti › Eltos gidas TV programos Naujienos: - Pasirinkite -

PRANEŠIMAI SPAUDAI

← POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VIŠKAS

ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

2007-03-05 12:28

...tinių grupių darželinukai pieš gražiausią atliekų konteinerį

Pranešimas spaudai,
2007 m. kovo 5 d.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras paskelbė piešinių konkursą Panevėžio regiono ikimokyklinių įstaigų vaikams, kurio tema „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme".

Konkurso, kuris prasidėjo kovo 1d. ir tęsis dvi savaites, metu Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų paskutiniųjų grupių vaikai turės pasitelkti visą vaizduotę ir kuo originaliau popieriaus lape perteikti savo viziją apie tai, kaip turėtų atrodyti atliekų konteineris.

Konkurse kviečiama dalyvauti virš 40 Panevėžio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Iš visų dalyvausiančių jaunųjų dailininkų - gamtos mylėtojų piešinukų bus išrinkta 15 originaliausių, gražiausių, linksmiausių, o jų autoriai bus apdovanoti diplomais. Pirmosios vietos nugalėtojui iškilmingo apdovanojimo metu bus įteiktas specialus prizas.

Tokiu būdu bandoma ikimokyklinukus įtraukti į ugdymo apie atliekų rūšiavimo svarbą ir naudą, kadangi visuomenės informavimasis ir švietimas yra viena svarbių projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" dalių. Nuo gyventojų sąmoningumo atliekų rūšiavimo klausimais didele dalimi priklauso viso projekto sėkmė. Todėl visuomenės švietimas pradedamas nuo pačių mažiausiųjų, kaip imliausių ugdymui ir potencialių informacijos s...dėjų.

...AB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2009 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje - atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

292

nonių naujienos: Piešinių konkursas ikimokyklinukams "Gražiausi šiukšlių ...

Priedas Nr. 217

NISSAN SHIFT_convention

Verslo banga

ĮMONIŲ NAUJIENOS | RENGINIAI | ŽINIŲ BANKAS | FORUMAI | VERSLO ŽURNALAI | MANO NUSTATYMAI

Balandžio 12, ketvirtadienis

Sveiki atvykę į didžiausią Lietuvoje verslo portalą!

- Kaip pradėti verslą
- Kaip kurti kolektyvą
- Kaip rasti pirkėją
- Kaip tvarkyti pinigus
- Kaip mokėti mokesčius
- Kaip ruošti sutartis
- Kaip tobulinti verslą
- Kaip plėstis į užsienį

Straipsnių sąrašas
Naujausi straipsniai
Populiariausi straipsniai

KOKS

EURUSD	1.3472	1.3475
BPUSD	1.9776	1.9779
USDLTL	2.5629	2.5629
USDCHF	1.2184	1.2188
GOLD	678.55	679.35

Reklama

Kaip apibrėžti reklamos kampanijos tikslus

Įmonės šiandien

- Molėtų vanduo
- Lietuvos paštas
- Achema
- General Motors UVDM Baltic
- Grigiškės
- Vilniaus Vingis
- Invalda
- Ūkio bankas
- Sanitas
- Vilkyškių pieninė

Įmonių naujienos »

Piešinių konkursas ikimokyklinukams "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme" pratęsiamas

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras , 2007.03.21 20:01

Kovo 1 d. paskelbtas piešinių konkursas Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų paskutiniųjų grupių vaikams, kurio tema yra "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme" pratęsiamas iki kovo 31d., o nugalėtojus planuojama paskelbti jau prieš šv. Velykas.

Konkursas susilaukė didelio susidomėjimo. Savo darbus jau suskubo atsiųsti virš 100 ikimokyklinukų iš daugiau nei 10 ikimokyklinio ugdymo įstaigų Panevėžio apskrityje. Konkurso organizatoriai buvo maloniai nustebinti vaikų aktyvumo bei neribotos fantazijos: piešiniai kuriami pasitelkiant ne vien tradicines piešimo priemones, bet ir darant aplikacijas iš nestandartinių medžiagų. Be to, piešiniuose vaizduojamos ne tik pavienės atliekų dėžės, bet ir atliekų rūšiavimui skirtieji skirtingų spalvų konteineriai. Tai rodo, jog ir patys mažiausieji jau žino apie galimybę rūšiuoti atliekas bei šalinti jas į specialiai tam skirtus konteinerius.

Kiekvienas piešinys yra savaip išskirtinis bei įdomus, todėl laukia sunki užduotis iš gausybės kandidatų išsirinkti verčiausiąjį pirmos vietos. Nei vienas jaunasis dailininkas, dalyvavęs konkurse, neliks neįvertintas- jie bus apdovanoti specialiais raštais bei paguodos prizais. Be to, numatoma surengti ir šių piešinių parodą.

Šia akcija siekiama atkreipti dėmesį bei skatinti suvokimą apie atliekų rūšiavimo būtinybę, pradedant nuo pačių mažiausiųjų. Ateityje panašius konkursus planuojama surengti taip pat vyresniems vaikams.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia Iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223El.p.: direktorius@pratc.lt

Kontaktinis asmuo:
Viktorija Jakubauskytė
Projekto koordinatorė

K R A
Skyriaus vedėja
Aldona ...
2011 -06- 29

295

Prisijunkite

El. paštas
Slaptažodis
Prisijunkite

PR FORMOS 2007
Iš Dublino
Kaina : 348 Lt

Naujienos

- Molėtų rajono vandens ūkyje - permainos
- Lietuvos pašto privatizavimas - kelias į sėkmę
- Išaugusios žaliavos kainos nepalankios "Achemos" I ketvirčio rezultatams
- G2 - nauja patikimų naudotų automobilių prekybos sistema Lietuvoje
- "Grigiškės" dividendams numato 2 mln. litų
- Biržoje perleista 8,7 proc. "Vilniaus Vingio" akcijų
- Pradėtas "Invaldos" grupei priklausančių pastatų pardavimas
- "Ūkio banko" pelnas šiemet išaugo beveik 89 proc.
- "Sanito" pirmo ketvirčio pardavimai - 77 mln. litų
- "Vilkyškių pieninės" pardavimai šiemet išaugo 34,2 proc.
- "Vilkyškių pieninė" numato mokėti 22 centus dividendų akcijai
- Vyriausybe paskirstė Privatizavimo fondo lėšas
- "Lindorff" įsigijo "Transfair"
- Pirmąją Kauno "Akropolio" darbo dieną - per 100 tūkst. lankytojų
- Šiais metais Lietuvoje atsiras 5 gamtinių dujų degalinės

BNS Spaudos centras : Pranešimai: Pranešimai spaudai

BNS Spaudos centras

Teisė informuoti. Teisė būti informuotam.

2007 kovo 21 d., trečiadienis

Ateik gyventi į NIDA!

Prisijungti

nistras pirmininkas: Gediminas Kirkilas dalyvaus tiesioginėje Žinių radijo laidoje Pozicija. ---

PRANEŠIMAI: PRANEŠIMAI SPAUDAI

BNS spaudos centras sale

PRADŽIA
RENGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Anonsai
RAIT apklausos

ieškoti...

pasirinkite Jus dominančią sritį

Piešinių konkursas ikimokyklinukams "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme" pratęsiamas

Sritys: Laisvalaikis, ES
2007-03-21 16:33

Pranešimas spaudai.

2007 m. kovo 21 d.

Kovo 1 d. paskelbtas piešinių konkursas Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų paskutiniųjų grupių vaikams, kurio tema yra "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme" pratęsiamas iki kovo 31d., o nugalėtojus planuojama paskelbti jau prieš šv. Velykas.

Konkursas susilaukė didelio susidomėjimo. Savo darbus jau suskubo atsiųsti virš 100 ikimokyklinukų iš daugiau nei 10 ikimokyklinio ugdymo įstaigų Panevėžio apskrityje. Konkurso organizatoriai buvo maloniai nustebinti vaikų aktyvumo bei neribotos fantazijos: piešiniai, kuriami pasitelkiant ne vien tradicines piešimo priemones, bet ir darant aplikacijas iš nestandartinių medžiagų. Be to, piešiniuose vaizduojamos ne tik pavienės atliekų dėžės, bet ir atliekų rūšiavimui skirtieji skirtingų spalvų konteineriai. Tai rodo, jog ir patys mažiausieji jau žino apie galimybę rūšiuoti atliekas bei šalinti jas į specialiai tam skirtus konteinerius.

Kiekvienas piešinys yra savaip išskirtinis bei įdomus, todėl laukia sunki užduotis iš gausybės kandidatų išsirinkti verčiausiąjį pirmos vietos. Nei vienas jaunasis dailininkas, dalyvavęs konkurse, neliks nejvertintas- jie bus apdovanoti specialiais raštais bei paguodos prizais. Be to, numatoma surengti ir šių piešinių parodą.

Šia akcija siekiama atkreipti dėmesį bei skatinti suvokimą apie atliekų rūšiavimo būtinybę, pradedant nuo pačių mažiausiųjų. Ateityje panašius konkursus planuojama surengti taip pat vyresniems vaikams.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrangtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buitinės susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:

Arturas Gruce

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)

Direktorius

Tel. 8 45 436223El.p.: direktorius@pratc.lt

Kontaktinis asmuo:
Viktorija Jakubauskytė
Projekto koordinatorė
Baltijos viešųjų ryšių grupė
Tel.: 8-5 215 33 77
viktorija@bvrg.lt

"BNS Spaudos centre" skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

Apie "BNS Spaudos centrą" | Kontaktai | "BNS Spaudos centro" naudojimo sąlygos ir atsakomybė | Populiariausi

© 2005 UAB "BNS".

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Iews.lt - Lietuvos įmonių ir verslo naujienos / Verslo žinios iš visos Lietuvos

KAS YRA KOMU

Lietuvos įmonių ir verslo naujienos

Greitai.lt

Gauk antrus akinių remelius už 1 Lt

Piešinių konkursas ikimokyklinukams "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme" pratęsiamas

Kovo 1 d. paskelbtas piešinių konkursas Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų paskutiniųjų grupių vaikams, kurio tema yra „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme" pratęsiamas iki kovo 31d., o nugalėtojus planuojama paskelbti jau prieš šv. Velykas

Konkursas susilaukė didelio susidomėjimo. Savo darbus jau suskubo atsiųsti virš 100 ikimokyklinukų iš daugiau nei 10 ikimokyklinio ugdymo įstaigų Panevėžio apskrityje. Konkurso organizatoriai buvo maloniai nustebinti vaikų aktyvumo bei neribotos fantazijos: piešiniai kuriami pasitelkiant ne vien tradicines piešimo priemones, bet ir darant aplikacijas iš nestandartinių medžiagų. Be to, piešiniuose vaizduojamos ne tik pavienės atliekų dėžės, bet ir atliekų rūšiavimui skirtieji skirtingų spalvų konteineriai. Tai rodo, jog ir patys mažiausieji jau žino apie galimybę rūšiuoti atliekas bei šalinti jas į specialiai tam skirtus konteinerius.

Kiekvienas piešinys yra savaip išskirtinis bei įdomus, todėl laukia sunki užduotis iš gausybės kandidatų išsirinkti verčiausiąjį pirmos vietos. Nei vienas jaunasis dailininkas, dalyvavęs konkurse, neliks neįvertintas- jie bus apdovanoti specialiais raštais bei paguodos prizais. Be to, numatoma surengti ir šių piešinių parodą.

Šia akcija siekiama atkreipti dėmesį bei skatinti suvokimą apie atliekų rūšiavimo būtinybę, pradedant nuo pačių mažiausiųjų. Ateityje panašius konkursus planuojama surengti taip pat vyresniems vaikams

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223El.p.: direktorius@pratc.lt

35%

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29
295

SMS užsisakymas Konferencijų salė Įvykusios konferencijos | Apie mus TOP 10 Kontektai

ELTA

ELTA POLITIKA

2007 03 23, penktadienis POLITIKA | ŪKIS | TEISĖTVARKA | KULTŪRA | SPORTAS | ĮVAIRYBĖS | VISKAS

Rasti » Eltos gidas ES programos

Mano ELTA: Prisijungti Naujienos - Pasirinkite -

PRANEŠIMAI SPAUDAI

← POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VIŠKAS

ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

2007-03-21 16:37

[illegible] konkursas ikimokyklinukams "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano [illegible]ie" pratęsiamas

Pranešimas spaudai,
2007 m. kovo 21 d.

Kovo 1 d. paskelbtas piešinių konkursas Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų paskutiniųjų grupių vaikams, kurio tema yra „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme" pratęsiamas iki kovo 31d., o nugalėtojus planuojama paskelbti jau prieš šv. Velykas.

Konkursas susilaukė didelio susidomėjimo. Savo darbus jau suskubo atsiųsti virš 100 ikimokyklinukų iš daugiau nei 10 ikimokyklinio ugdymo įstaigų Panevėžio apskrityje. Konkurso organizatoriai buvo maloniai nustebinti vaikų aktyvumo bei neribotos fantazijos: piešiniai kuriami pasitelkiant ne vien tradicines piešimo priemones, bet ir darant aplikacijas iš nestandartinių medžiagų. Be to, piešiniuose vaizduojamos ne tik pavienės atliekų dėžės, bet ir atliekų rūšiavimui skirtieji skirtingų spalvų konteineriai. Tai rodo, jog ir patys mažiausieji jau žino apie galimybę rūšiuoti atliekas bei šalinti jas į specialiai tam skirtus konteinerius.

Kiekvienas piešinys yra savaip išskirtinis bei įdomus, todėl laukia sunki užduotis iš gausybės kandidatų išsirinkti verčiausiąjį pirmos vietos. Nei vienas jaunasis dailininkas, dalyvavęs konkurse, neliks neįvertintas- jie bus apdovanoti specialiais raštais bei paguocos prizais. Be to, numatoma surengti ir šių piešinių parodą.

[illegible]akcija siekiama atkreipti dėmesį bei skatinti suvokimą apie atliekų rūšiavimo būtinybę, pradedant nuo pačių mažiausiųjų. Ateityje panašius konkursus [illegible]anuojama surengti taip pat vyresniems vaikams.

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje - atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat kokybiškai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223El.p.: direktorius@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29
290

:L.'A - Paskelbtas konkursas praėjo sėkmingai Priedas Nr. 218 Page 1 of 1

SMS užsisakymas Konferencijų salė Įvykusios konferencijos | Apie mus TOP 10 Kontaktai

ELTA

ELTA Omnitel ir Extra paslaugos vartotojams

2007 04 16, pirmadienis | POLITIKA | ŪKIS | TEISĖTVARKA | KULTŪRA | SPORTAS | ĮVAIRYBĖS | VISKAS

aityk naujienas nemokamai Mano ELTA: prisijungti › Eltos gidas TV programos

Naujienos: - Pasirinkite -

PRANEŠIMAI SPAUDAI

POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VISKAS

ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

07-04-12 09:14

Paskelbtas konkursas praėjo sėkmingai

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras kovo 1 dieną paskelbė piešinių konkursą „Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme", kuris tęsėsi visą vo mėnesį ir buvo skirtas Panevėžio regiono ikimokyklinių įstaigų vaikams. Jau paskelbti konkurso nugalėtojai, kuriais tapo Panevėžio, Pasvalio ir Biržų ɔšelių darželių auklėtiniai.

Konkurse, kuris prasidėjo kovo 1 dieną ir tęsėsi visą mėnesį dalyvavo dvidešimt Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų. Iš viso konkurso metu buvo siusta apie 200 piešinių. Darbų atlikimo technikai nebuvo taikomi jokie apribojimai.

...alu pasidžiaugti, jog sulaukėme piešinių iš visų Panevėžio apskrities rajonų, tad galime sakyti, jog vienaip ar kitaip ši tema yra aktuali visiems" - ...lbėjo Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras direktorius Arturas Gruce. „Šiuo konkursu siekėme kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie atliekų šiavimo specifiką bei skirtingų rūšiuotinų atliekų konteinerių paskirtį".

Iš dvidešimt dalyvavusių lopšelių darželių atsiusta apie 200 piešinių. Dalyvavo keturolika Panevėžio, trys Kupiškio, vienas Pasvalio, vienas Biržų ir vienas kiškio miesto lopšeliai darželiai. Buvo išrinkti 4 prizininkai: pirmos, antros ir skirtos dvi trečiosios vietos.

„Mūsų darbas yra ne tik tinkamai įvykdyti projektą, bet ir šviesti visuomenę. Todėl siekėme, kad kuo daugiau vaikų įsitrauktų į šį konkursą ir kuo daugiau sužinotų apie kuriamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Manome, jog labai svarbu šviesti ir mokyti pačius mažiausius mūsų apskrities ventojus" - mintimis dalinosi PRATC direktorius.

Pirmąją vietą laimėjo Panevėžio miesto lopšelio darželio „Žiburėlis" auklėtinė Neringa Šiburkytė, antra vieta Pasvalio miesto lopšelio darželio „Eglutė" auklėtinis Arnas Čekanauskas, kuris atsiuntė net du piešinius. O dvi trečiąsias vietas vertinimo komisija skyrė - Biržų miesto lopšelio darželio „Genys" klėtinei Indrei Tapulionytei ir Panevėžio miesto K.Ramanausko lopšelio darželio auklėtinei Viktorijai Kuraitytei.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įsikūręs 2005 liepos 1 d., įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą esticinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. skrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, o Biržuose ir Rokiškyje - atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat saugiai bus tva...os buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra ...daugiau nei 67 mln. litų.

...ugiau informacijos:
...uras Grucė
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
. 8 45 436223
p.: direktorius@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011 -06- 29

Audi A5. Naujos vairavimo galimybės.
Audi
Biznews Lietuvos įmonių ir verslo naujienos

Šeimos nuotraukos

Vienas geriausių automobilių

Baigėsi konkursas "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme"

BizNews.lt 2007 m. 12 [illegible]

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras kovo 1 dieną paskelbė piešinių konkursą "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme", kuris tęsėsi visą kovo mėnesį ir buvo skirtas Panevėžio regiono ikimokyklinių įstaigų vaikams. Jau paskelbti konkurso nugalėtojai, kuriais tapo Panevėžio, Pasvalio ir Biržų lopšelių darželių auklėtiniai.

Konkurse, kuris prasidėjo kovo 1 dieną ir tęsėsi visą mėnesį dalyvavo dvidešimt Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų. Iš viso konkurso metu buvo atsiusta apie 200 piešinių. Darbų atlikimo technikai nebuvo taikomi jokie apribojimai.

"Galiu pasidžiaugti, jog sulaukėme piešinių iš visų Panevėžio apskrities rajonų, tad galime sakyti, jog vienaip ar kitaip ši tema yra aktuali visiems" – kalbėjo Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras direktorius Arturas Gruce. "Šiuo konkursu siekeme kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie atliekų rūšiavimo specifiką bei skirtingų rūšiuotinų atliekų konteinerių paskirtį".

Iš dvidešimt dalyvavusių lopšelių darželių atsiusta apie 200 piešinių. Dalyvavo keturiolika Panevėžio, trys Kupiškio, vienas Pasvalio, vienas Biržų ir vienas Rokiškio miesto lopšeliai darželiai. Buvo išrinkti 4 prizininkai: pirmos, antros ir skirtos dvi trečiosios vietos.

"Mūsų darbas yra ne tik tinkamai įvykdyti projektą, bet ir šviesti visuomenę. Todėl siekeme, kad kuo daugiau vaikų įsitrauktų į šį konkursą ir kuo daugiau sužinotų apie kuriamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Manome, jog labai svarbu šviesti ir mokyti pačius mažiausius mūsų apskrities gyventojus" – mintimis dalinosi PRATC direktorius.

Pirmąją vietą laimėjo Panevėžio miesto lopšelio darželio "Žiburėlis" auklėtinė Neringa Šiburkytė, antra vieta Pasvalio miesto lopšelio darželio "Eglutė" auklėtinis Arnas Čekanauskas, kuris atsiuntė net du piešinius. O dvi trečiąsias vietas vertinimo komisija skyrė – Biržų miesto lopšelio darželio "Genys" auklėtinei Indrei Tapulionytei ir Panevėžio miesto K.Ramanausko lopšelio darželio auklėtinei Viktorijai Kuraitytei.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įsikūręs 2005 liepos 1 d., įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat saugiai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:
Arturas Gruce
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)
Direktorius
Tel. 8 45 436223
El.p.: direktorius@pratc.lt

Kontaktinis asmuo:
Viktorija Jakubauskytė
Projekto koordinatorė
Baltijos viešųjų ryšių grupė
Tel.: 8-5 215 33 77
viktorija@bvrg.lt

Įsigyk nešiojamąjį kompiuterį su [illegible] už 1 litą +
NESTE Oils
VARIKLIŲ ALYVA lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiams

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

35%

BNS Spaudos centras

Teisė informuoti. Teisė būti informuotam.

07 balandžio 12 d., ketvirtadienis

Prisijungti • Pagalba

Artimiausi renginiai: 2007-04-12 09:30 Spaudos konferencija: LRN Baia

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI SPAUDAI

BNS spaudos konferencijų salė

PRADŽIA
RENGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Anonsai
RAIT apklausos

ieškoti...

pasirinkite Jus dominančią sritį

fotobankas

Mokslas, Švietimas | Kultūra

Sportas | Kita

www.fotobankas.lt

Paskelbtas konkursas praėjo sėkmingai

Sritys: Regionai, ES
2007-04-12 09:13

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras kovo 1 dieną paskelbė piešinių konkursą "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme", kuris tęsėsi visą kovo mėnesį ir buvo skirtas Panevėžio regiono ikimokyklinių įstaigų vaikams. Jau paskelbti konkurso nugalėtojai, kuriais tapo Panevėžio, Pasvalio ir Biržų lopšelių darželių auklėtiniai.

Konkurse, kuris prasidėjo kovo 1 dieną ir tęsėsi visą mėnesį dalyvavo dvidešimt Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų. Iš visų konkurso metu buvo atsiųsta apie 200 piešinių. Darbų atlikimo technikai nebuvo taikomi jokie apribojimai.

"Galiu pasidžiaugti, jog sulaukėme piešinių iš visų Panevėžio apskrities rajonų, tad galime sakyti, jog vienaip ar kitaip ši tema yra aktuali visiems" – kalbėjo Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras direktorius Arturas Grucė. "Šiuo konkursu siekėme kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie atliekų rūšiavimo specifiką bei skirtingų rūšiuotinų atliekų konteinerių paskirtį".

Iš dvidešimt dalyvavusių lopšelių darželių atsiųsta apie 200 piešinių. Dalyvavo keturiolika Panevėžio, trys Kupiškio, vienas Pasvalio, vienas Biržų ir vienas Rokiškio miesto lopšeliai darželiai. Buvo išrinkti 4 prizininkai: pirmos, antros ir skirtos dvi trečiosios vietos.

"Mūsų darbas yra ne tik tinkamai įvykdyti projektą, bet ir šviesti visuomenę. Todėl siekėme, kad kuo daugiau vaikų įsitrauktų į šį konkursą ir kuo daugiau sužinotų apie kuriamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Manome, jog labai svarbu šviesti ir mokyti pačius mažiausius mūsų apskrities gyventojus" – mintimis dalinosi PRATC direktorius.

Pirmąją vietą laimėjo Panevėžio miesto lopšelio darželio "Žiburėlis" auklėtinė Neringa Šiburkytė, antra vieta Pasvalio miesto lopšelio darželio "Eglutė" auklėtinis Arnas Čekanauskas, kuris atsiuntė net du piešinius. O dvi trečiąsias vietas vertinimo komisija skyrė – Biržų miesto lopšelio darželio "Genys" auklėtinei Indrei Tapulionytei ir Panevėžio miesto K.Ramanausko lopšelio darželio auklėtinei Viktorijai Kuraitytei.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įsikūręs 2005 liepos 1 d., įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat saugiai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Daugiau informacijos:

Arturas Grucė

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)

Direktorius

Tel. 8 45 436223

El.p.: direktorius@pratc.lt

Kontaktinis asmuo:
Viktorija Jakubauskytė
Projekto koordinatorė
Baltijos viešųjų ryšių grupė
Tel.: 8-5 215 33 77
viktorija@bvrg.lt

PRANEŠIMĄ PAŠI ELISE VIKTORIJA JAKUBAUSKYTĖ, BALTIJOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ GRUPĖ

GRĮŽTI Į VIRŠŲ

"BNS Spaudos centre" skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

Apie "BNS Spaudos centrą" | Kontaktai | "BNS Spaudos centro" naudojimo sąlygos | Atsakomybė | Nepaliamiausi

© 2005 UAB "BNS"

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

AINA - Aukštaitijos naujienų ir pramogų portalas

Page 3 of 5

- Ar žinai, kad mūsų šefas mirė?
- Žinau. Dabar dairausi, kas mirė kartu su juo.
- Kaip tai – „kartu su juo"?
- Nekrologe juk parašyta - „kartu su juo mirė ir vienas geriausių mūsų specialistų".

Archyvas

Buivaras

A. Zuokas lieka valdančioje daugumojei?

Komjaunimo tiesa grįžta

Už Algio balsą - 100 tūkst. lt.

Virš Muntiano galvos pakibo damoklo kardas

Dirbo, kiek jėgos neša, ir įkūrė PŽPP

Archyvas

Paskelbtas konkursas praėjo sėkmingai

Skaityti komentarus

Siusti draugui

AINA
2007 04 12



UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras kovo 1 dieną paskelbė piešinių konkursą "Gražiausi šiukšlių konteineriai mano kieme", kuris tęsėsi visą kovo mėnesį ir buvo skirtas Panevėžio regiono ikimokyklinių įstaigų vaikams. Jau paskelbti konkurso nugalėtojai, kuriais tapo Panevėžio, Pasvalio ir Biržų lopšelių darželių auklėtiniai.

Konkurse, kuris prasidėjo kovo 1 dieną ir tęsėsi visą mėnesį dalyvavo dvidešimt Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų. Iš viso konkurso metu buvo atsiusta apie 200 piešinių. Darbų atlikimo technikai nebuvo taikomi jokie apribojimai.

"Galiu pasidžiaugti, jog sulaukėme piešinių iš visų Panevėžio apskrities rajonų, tad galime sakyti, jog vienaip ar kitaip ši tema yra aktuali visiems" – kalbėjo Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras direktorius Arturas Gruce. "Šiuo konkursu siekėme kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie atliekų rūšiavimo specifiką bei skirtingų rūšiuotinų atliekų konteinerių paskirtį"

Iš dvidešimt dalyvavusių lopšelių darželių atsiusta apie 200 piešinių. Dalyvavo keturiolika Panevėžio, trys Kupiškio, vienas Pasvalio, vienas Biržų ir vienas Rokiškio miesto lopšeliai darželiai. Buvo išrinkti 4 prizininkai: pirmos, antros ir skirtos dvi trečiosios vietos

"Mūsų darbas yra ne tik tinkamai įvykdyti projektą, bet ir šviesti visuomenę. Todėl siekėme, kad kuo daugiau vaikų įsitraukti į šį konkursą ir kuo daugiau sužinotų apie kuriamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Manome, jog labai svarbu šviesti ir mokyti pačius mažiausius mūsų apskrities gyventojus" – mintimis dalinosi PRATC direktorius.

Pirmąją vietą laimėjo Panevėžio miesto lopšelio darželio "Žiburėlis" auklėtinė Neringa Šiburkytė, antra vieta Pasvalio miesto lopšelio darželio "Eglutė" auklėtinis Arnas Čekanauskas, kuris atsiuntė net du piešinius. O dvi trečiąsias vietas vertinimo komisija skyrė – Biržų miesto lopšelio darželio "Genys" auklėtinei Indrei Tapulionytei ir Panevėžio miesto K.Ramanausko lopšelio darželio auklėtinei Viktorijai Kuraitytei

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įsikūręs 2005 liepos 1 d., įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lešomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 55 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone bus pastatytos kompostavimo ir didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat saugiai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 57 mln. litų.

Reklama

Nepasikliaukite atsitiktinumu!

Reklama

Agri.lt skelbimai
Lietuvos žemės ūkio technikos ir paslaugų ske bimai.
www.agri.lt

Reklamuokis čia

dalis išlaidų sugrįš per 10 dienų

UAB "Aukštaitijos vandenys" informuoja

Mobiliosi pramogos

SERASI

gėgužės 3-4 d.

SPORTINIŲ ŠOKIŲ KLUBAS
kviečia naujus narius
TANGO

Sudoku!
ŽARSK

GEOCACHING.LT

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Priedas Nr. 219

BNS Spaudos centras

Teisė informuoti. Teisė būti informuotam.

2007 birželio 28 d., ketvirtadienis

Prisijungti • Pagalba

su "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" koordinacinė komisija (Vyriausybės posėdžių salė). ...

PRANEŠIMAI: PRANEŠIMAI SPAUDAI

PRADŽIA
RENGINIAI
DARBOTVARKĖS
PRANEŠIMAI
Pranešimai spaudai
Anonsai
RAIT apklausos

ieškoti...

pasirinkite Jus dominantį sritį

fotobankas

Mokslas, Švietimas

Politika

Sportas

Kultūra

www.lotobankas.lt

Tarptautiniame galiūnų turnyre – diskusijos aplinkosauginėmis temomis

Sritys: ES, Švietimas
2007-06-28 13:39

"Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" apie aplinkosaugos svarbą priminė masinio renginio metu. Praejusį šeštadienį vykusiame "Biržų tarptautiniame galiūnų turnyre" PRATC atributika pasipuošė keli šimtai žmonių.

Didžiausią aplinkosauginį projektą Panevėžio rajone įgyvendinantis "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) tęsia aktyvią švietėjišką veiklą. Surengęs daugybę susitikimų su vietos bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis, šį kartą PRATC nešiukšlinti ir saugoti aplinką raginė masinio renginio metu.

Šeštadienio popietę Biržų miesto estradoje vykusio "Biržų tarptautinių galiūnų turnyro" dalyviams buvo dalinama PRATC atributika: kepurėlės, marškinėliai, lušinukai, pakabukai ir kt. Daug dėmesio ir klausimų sulaukta tiek iš žiūrovų, tiek iš pačių galiūnų, kuriems centro veikla buvo pristatyta persirengimui skirtoje palapinėje. PRATC atstovai džiaugiasi, kad žmonės ne tik domėjosi atributika, bet ir nuoširdžiai, aktyviai diskutavo aplinkosauginėmis temomis.

Šia inicijatyva siekta paskatinti suvokimą apie aplinkos tvarkymą, gamtos apsaugą bei priminti, kad šiukšlinti nedera. Neatsiriktinai pasirinktas atviroje erdvėje vykstantį renginys.

"Natūralu, kad žmones čia susirinko ne tik pasižiūrėti galiūnų sugebėjimų, bet ir pasilinksminti Joninių išvakarėse. Beveik po šė lūkstančio žiūrovų valšinosi alumi, ledais, šašlykais. Džiugu buvo matyti, kad vis daugiau žmonių noriai metė šiukšles ne kur papuola, o į specialiai pastatytas šiukšliadėžes. Tai rodo, kad gyventojų informavimas bei jų sąmoningumo skatinimas pamažu duoda rezultatų", - kalbėjo UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" direktorius Arturas Grucė.

Kaip parodė sausio mėnesį atlikta Panevėžio apskrities gyventojų telefoninė apklausa, žmonėms rūpi aplinkosauga, tačiau ne kiekvienas įpratęs tvarkyti ir rūšiuoti atliekas. Patys žmonės dažnai pamiršta tuo pasirūpinti. Nerimą kelią apklausos metu paaiškėjęs faktas, kad atliekas ypač retai tvarko ir rūšiuoja jaunoji karta – studentai, moksleiviai. Akivaizdu, kad Lietuvos gyventojus apie atliekų tvarkymo ir rūšiavimo naudą dar reikia mokyti, šviesti.

Šiuo metu pagrindinis PRATC uždavinys – pasiekti, kad kuo daugiau žmonių suvoktų ir aktyviai rūpintųsi atliekų rūšiavimu bei aplinkosauga. Anot A. Grucės, "svarbiausia – su atliekų tvarkymo būtinybe supažindinti kuo daugiau apskrities rajonų gyventojų, įskiepyti jiems šias vertybes. Puikus pavyzdys – Švedija, kur ypač gera atliekų tvarkymo sistema buvo sukurta būtent dėl gyventojų sąmoningumo".

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Šio projekto įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Daugiau informacijos:

Arturas Grucė

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC)

Direktorius

Tel. 8 45 436223

El.p.: direktorius@pratc.lt

Kontaktinis asmuo:
Viktorija Jakubauskytė
Projekto koordinatorė
Baltijos viešųjų ryšių grupė
Tel.: 8-5 215 33 77
viktorija@bvrg.lt

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ VIKTORIJA JAKUBAUSKYTĖ, BALTIJOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ GRUPĖ

GRĮŽTI Į VIRŠŲ

"BNS Spaudos centre" skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

Apie "BNS Spaudos centrą" | Kontaktai | "BNS Spaudos centro" naudojimo sąlygos ir atsakomybė | Paduotis

© 2005 UAB "BNS"

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

301

http://sc.bns.lt/index.php?item=36131&id=3&subid=43

2011 -06- 29

2007.06.28

ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.

2007-06-28 13:39

Tarptautiniame galiūnų turnyre - diskusijos aplinkosauginėmis temomis

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" apie aplinkosaugos svarbą priminė masinio renginio metu. Praėjusį šeštadienį vykusiame „Biržų tarptautiniame galiūnų turnyre" PRATC atributika pasipuošė keli šimtai žmonių.

Didžiausią aplinkosauginį projektą Panevėžio rajone įgyvendinantis „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) tęsia aktyvią švietėjišką veiklą. Surengęs daugybę susitikimų su vietos bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis, šį kartą PRATC nešiukšlinti ir saugoti aplinką ragino masinio renginio metu.

Šeštadienio popietę Biržų miesto estradoje vykusio „Biržų tarptautinį galiūnų turnyro" dalyviams buvo dalinama PRATC atributika: kepurėlės, marškinėliai, tušinukai, pakabukai ir kt. Daug dėmesio ir klausimų sulaukta tiek iš žiūrovų, tiek iš pačių galiūnų, kuriems centro veikla buvo pristatyta persirengimui skirtoje palapinėje. PRATC atstovai džiaugiasi, kad žmonės ne tik domėjosi atributika, bet ir nuoširdžiai, aktyviai diskutavo aplinkosauginėmis temomis.

Šia iniciatyva siekta paskatinti suvokimą apie aplinkos tvarkymą, gamtos apsaugą bei priminti, kad šiukšlinti nedera. Neatsitiktinai pasirinktas atviroje erdvėje vykstantį renginys.

„Natūralu, kad žmonės čia susirinko ne tik pasižiūrėti galiūnų sugebėjimų, bet ir pasilinksminti Joninių išvakarėse. Beveik pusė tūkstančio žiūrovų vaišinosi alumi, ledais, šašlykais. Džiugu buvo matyti, kad vis daugiau žmonių noriai metė šiukšles ne kur papuola, o į specialiai pastatytas šiukšliadėžes. Tai rodo, kad gyventojų informavimas bei jų sąmoningumo skatinimas pamažu duoda rezultatų", - kalbėjo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" direktorius Arturas Grucė.

Kaip parodė sausio mėnesį atlikta Panevėžio apskrities gyventojų telefoninė apklausa, žmonėms rūpi aplinkosauga, tačiau ne kiekvienas įpratęs tvarkyti ir rūšiuoti atliekas. Patys žmonės dažnai pamiršta tuo pasirūpinti. Nerimą kelią apklausos metu paaiškėjęs faktas, kad atliekas ypač retai tvarko ir rūšiuoja jaunoj karta - studentai, moksleiviai. Akivaizdu, kad Lietuvos gyventojus apie atliekų tvarkymo ir rūšiavimo naudą dar reikia mokyti, šviesti.

Šiuo metu pagrindinis PRATC uždavinys - pasiekti, kad kuo daugiau žmonių suvoktų ir aktyviai rūpintųsi atliekų rūšiavimu bei aplinkosauga. Anot A. Grucės, „svarbiausia - su atliekų tvarkymo būtinybe supažindinti kuo daugiau apskrities rajonų gyventojų, įskiepyti jiems šias vertybes. Puikus pavyzdys - Švedija, kur ypač gera atliekų tvarkymo sistema buvo sukurta būtent dėl gyventojų sąmoningumo".

UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Šio projekto įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Daugiau informacijos:
Arturas Grucė

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=720285&tipas=Atspausdinti 2007.07.02

Bulvaras

Atsakomybė - visuomenei, atlyginimas - valdininkei

Teroristai ar restauratoriai?

Kalmas ir vaikai

Prioritetai

Maršrutai

Archyvas

Tarptautiniame galiūnų turnyre – diskusijos aplinkosauginėmis temomis

Skaityti komentarus

Siusti draugui

AINA
2007 06 28

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" apie aplinkosaugos svarbą priminė masinio renginio metu. Praėjus šeštadienį vykusiame „Biržų tarptautiniame galiūnų turnyre" PRATC atributika pasipuošė keli šimtai žmonių.



Reklama

Didžiausią aplinkosauginį projektą Panevėžio rajone įgyvendinantis „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC) tąsia aktyvią šviesiąjišką veiklą. Surengęs daugybę susitikimų su vietos bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis, šį kartą PRATC nešiukšlinti ir saugoti aplinką raginio masinio renginio metu.

Šeštadienio popietę Biržų miesto estradoje vykusio „Biržų tarptautinį galiūnų turnyro" dalyviams buvo dalinama PRATC atributika: kepurėles, marškinėliai, lušinukai, pakabukai ir kt. Daug demesio ir klausimų sulaukta tiek iš žiūrovų, tiek iš pačių galiūnų, kuriems centro veikla buvo pristatyta persirengimui skirtoje palapinėje. PRATC atstovai džiaugiasi, kad žmones ne tik domejosi atributika, bet ir nuoširdžiai, aktyviai diskutavo aplinkosauginėmis temomis.

Šia iniciatyva siekta paskatinti suvokimą apie aplinkos tvarkymą, gamtos apsauga bei priminti, kad šiukšlinti nadera. Neatsitiktinai pasirinktas atviroje erdvėje vykstantį renginys.

„Natūralu, kad žmones čia susirinko ne tik pasižiūreti galiūnų sugebėjimų, bet ir pasilinksminti Joninių išvakarese. Beveik pusė tūkstančio žiūrovų vaišinosi alumi, ledais, šašlykais. Džiugu buvo matyti, kad vis daugiau žmonių nonai mete šiukšles ne kur papuola, o į specialiai paslalytas šiukšliadėžes. Tai rodo, kad gyventojų informavimas bei jų sąmoningumo skatinimas pamažu duoda rezultatų", - kalbejo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro" direktorius Arturas Gruce.

Kaip parodė sausio mėnesį atlikta Panevėžio apskrities gyventojų telefonine apklausa, žmonėms rūpi aplinkosauga, tačiau ne kiekvienas įpratęs tvarkyti ir rūšiuoti atliekas. Patys žmones dažnai pamiršta tuo pasirūpinti. Nerimą kelią apklausos metu paaiškėjęs faktas, kad atliekas ypač retai tvarko ir rūšiuoja jaunoji karta – studentai, moksleiviai. Akivaizdu, kad Lietuvos gyventojus apie atliekų tvarkymo ir rūšiavimo naudą dar reikia mokyti, šviesti.

Šiuo metu pagrindinis PRATC uždavinys - pasiekti, kad kuo daugiau žmonių suvoktų ir aktyviai rūpintųsi atliekų rūšiavimu bei aplinkosauga. Anot A. Gruces, „svarbiausia – su atliekų tvarkymo būtinybe supažindinti kuo daugiau apskrities rajonų gyventojų, įskiepyti jems šias vertybes. Puikus pavyzdys – Švedija, kur ypač gera atliekų tvarkymo sistema buvo sukurta būtent dėl gyventojų sąmoningumo".

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Šio projekto įgyvendinimui bus skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyre 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusius skirs Lietuvos Vyriausybė.

Partneriai

Vardas: El. paštas.

Reklama

Naujienų portalas Alfa.lt
Lietuvos politikos, verslo, sporto ir kitos aktualijos portale Alfa.lt
www.alfa.lt

Reklamuoki.me

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

303

http://www.aina.lt/index.php?article=35350

2007.07.02

258

ATLIEKŲ TVARKYMO AKTUALIJOS

Nr. 1

Leidinys skirtas Panevėžio regionui

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: *žingsnis į mūsų gerovę.*

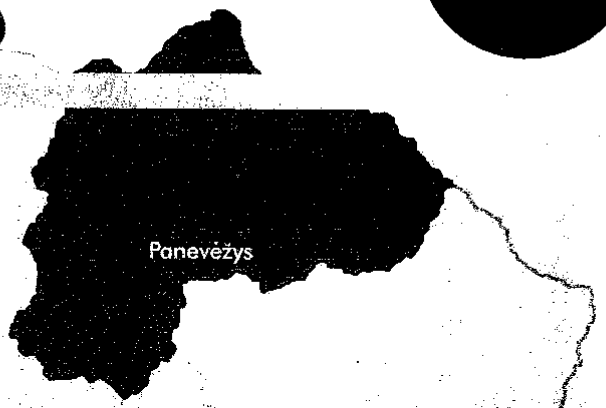

Atliekų sistemos tobulinimas – svarbi integracijos į Europos Sąjungą (ES) dalis. Todėl įstojusi į Europos Sąjungą Lietuva įsipareigojo sukurti ir įgyvendinti atliekų tvarkymo sistemas šalies regionuose ir vieningą pavojingų atliekų tvarkymo sistemą. Šiuo metu atliekų tvarkymo sistema tobulinama dešimtyje Lietuvos apskričių. Įgyvendinant ES ir LR Vyriausybės biudžeto finansuojamus projektus, siekiama išspręsti atliekų rūšiavimo bei perdirbimo problemas, modernizuoti atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemas.

Pagrindinis šių projektų tikslas – sukurti racionalią atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią visuomenės poreikius, užtikrinančią gerą aplinkos kokybę ir nepažeidžiančią rinkos ekonomikos, bei įgyvendinti ES reikalavimus atliekų tvarkymo srityje. Siekiama, kad sumažėjus į aplinką patenkančių atliekų srautui, mūsų vaikai ir anūkai turėtų švaresnį orą, vandenį bei dirvožemį.

Panevėžio apskrityje projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendina ir ateityje juo rūpinsis 2005 m. šiam tikslui įkurta UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" (PRATC). PRATC įkūrė ir šiuo metu valdo šešios Panevėžio apskritį sudarančios savivaldybės: Panevėžio miesto, Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajono savivaldybės.

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" bendra vertė – 67,29 mln. litų. Numatoma, kad įgyvendinus projektą, iki 2010 metų bus uždaryti ir sutvarkyti 95 seni, ES reikalavimų neatitinkantys, Panevėžio apskrities sąvartyniai ir šiukšlynai. Pasenusius sąvartynus pakeis vienas naujas regioninis sąvartynas Dvarininkų kaime, Miežiškių seniūnijoje, Panevėžio rajone. Projekte numatyta ne tik įrengti sąvartyną, bet ir apsodinti medžiais jo pakelę, įsigyti reikiamos sąvartyno eksploatavimo įrangos, įrengti atliekų rūšiavimo liniją. Panevėžyje, Kupiškyje ir Pasvalyje, bus įrengtos kompostavimo ir atliekų priėmimo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – dar ir perkrovimo stotys.

Rūšiuoti būtina

Buitinių ir pavojingų atliekų kiekis auga įmingais tempais. Vienas Lietuvos gyventojas per metus atsikrato vidutiniškai 300 kg, o vakarų europietis – 450 kg atliekų per metus. Ateities prognozė nedžiuginanti – aplinkosaugininkų skaičiavimais, per 5 metus nesunkiai „pasivysime" Europos vidurkį.

Rūšiuoti reikia išmokti

Didėjantis atliekų kiekis ima kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Legaliai veikiantys sąvartynai perpildyti, iš jų į atmosferą išsiskiria toksiškų ir sprogių dujų, į dirvožemį ir gruntinius vandenis patenka nuodingų sunkiųjų metalų junginių ir toksinų.

Pastaruoju metu visuomenė intensyviai skatinama dalyvauti tvarkant buitines ir pavojingas atliekas pagal nustatytus Europos Sąjungos (ES) reikalavimus. Būtina keisti žmonių požiūrį į šiukšles bei įpročius, susijusius su atliekų tvarkymu, padėti suvokti atliekų perdirbimo ekologinę bei ekonominę naudą, būtinybę išsaugoti švarią gyvenamąją aplinką.

Lietuvos gyventojams reikėtų kuo greičiau įprasti atpažinti ir išmokti rūšiuoti buitines ir pavojingas atliekas savo namuose (ir kitose jų susidarymo vietose). Be to, žmonės turėtų įsisąmoninti ekonominį principą „teršėjas moka", kuris reiškia, kad teršėjas turėtų apmokėti visą jo veiklos padarinių likvidavimo kainą, o potencialūs aplinkos ir žmonių sveikatos priežiūros kaštai dėl atliekų susidarymo, tvarkymo ir šalinimo turėtų atsispindėti gaminių kainose ir atliekų tvarkymo mokesčiuose.

Rūšiuoti atliekas galėtų išmokti darbe

Labai svarbus žingsnis švaresnės ir sveikesnės aplinkos link – darbdavių skatinimas rūpintis įmonės viduje susidarančiu atliekų srautu.

Deja, itin sudėtinga kontroliuoti mažas įmones – jų atliekos dažniausiai „keliauja" į daugiabučių kiemuose stovinčius gyventojų atliekoms skirtus konteinerius. Mažų įmonių Lietuvoje yra labai daug. Remiantis Panevėžio apskrities tinklalapyje pateiktais duomenimis, vien Panevėžyje – daugiau nei 6000. Tačiau ar tikrai visos jos turi specialius, atliekoms rūšiuoti skirtus, konteinerius?

Viena iš priežasčių, kodėl darbuotojai nėra skatinami rūšiuoti darbe susidarančias atliekas – tai užima papildomo laiko ir kainuoja šiek tiek daugiau nei įprastas atliekų šalinimas į vieną bendroms atliekoms skirtą konteinerį. Pagrindinė priežastis, kodėl nedidelėse įmonėse atliekos nėra rūšiuojamos, yra jų „jautrumas" papildomoms išlaidoms. Atliekos darbo vietose taip pat nėra rūšiuojamos ir dėl to, jog dauguma darbdavių ir darbuotojų tiesiog dar nėra pakankamai susipažinę su rūšiavimo ir atliekų perdirbimo ekologine bei ekonomine nauda, žmonėms trūksta informacijos.

Jei darbdaviai skatintų darbuotojus rūšiuoti atliekas savo įmonėje ir sudarytų tam sąlygas, yra didžiulė tikimybė, kad darbuotojai įprastų ir atliekas pradėtų rūšiuoti ir namuose.

Ypatingas dėmesys – pavojingoms atliekoms

Vienas svarbiausių atliekų tvarkymo tikslų – mažinti bendrą į sąvartynus patenkantį atliekų srautą, išskiriant iš jo rūšiuoti tinkamas ir pavojingas atliekas.

Vien elektros ir elektroninės įrangos atliekų su nuodingais priedais per metus Lietuvoje sukaupiama nuo 25 iki 30 tūkst. tonų. Elektros prietaisai, kompiuterinė ir kita biuro technika, galvaniniai elementai turėtų būti išmetami į specialiai tam skirtus konteinerius arba išvežami į specialias aikšteles. Tokios įrangos tikrai yra kiekvienoje tiek didelėje, tiek mažesnėje įmonėje, todėl svarbu nepamiršti, kur ir kaip tinkamai galima ją išmesti.

Kuriant naująją civilizuotą atliekų tvarkymo sistemą ir naudojantis kitų Europos valstybių patirtimi, svarbu pagal galimybes techninių reglamentų reikalavimus pritaikyti ir pradėti įgyvendinti regioninių sąvartynų projektus. Taip pat svarbu gerai pasirengti atliekų tvarkymo sistemos reformai ir racionaliai išnaudoti ES Sanglaudos fondo lėšas.

Algis Čepulis

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

APVA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

1

Atliekų rūšys

Kad ir kaip taupiai ar ekonomiškai gyventume, ne visus namų ūkyje susikaupiančias maisto, buities ar chemijos produktus iki galo suvartojame. Todėl nesuvartotus gaminius ar pavojingas atliekas tenka išmesti. Vis didėjantis atliekų kiekis ima kelti rimtą pavojų tiek aplinkai, tiek mūsų sveikatai.

Todėl, siekiant išsaugoti švarią gyvenamąją aplinką, tiesiog būtina keisti su atliekų tvarkymu susijusius žmonių įpročius. Visų pirma – išmokyti žmones rūšiuoti. Kol kas žmonės nėra pakankamai susipažinę su atliekų rūšiavimo ir perdirbimo ekologine bei ekonomine nauda, o būtent šios priemonės yra efektyviausias būdas saugoti aplinką ir taupyti energiją. Juk didžioji dalis kasdien išmetamų atliekų gali būti sėkmingai perdirbamos! Todėl vienas svarbiausių atliekų tvarkymo tikslų – sumažinti bendrą į sąvartynus patenkantį atliekų srautą, atskirti rūšiuoti tinkamas ir pavojingas atliekas.

Rūšiuotinos atliekos	Nerūšiuotinos atliekos	Atliekos, tinkančios kompostui	Pavojingos - atliekos	Kompostui netinka
Laikraščiai; Žurnalai; Popierius ir kiti spaudiniai; Kartonas ir gofruotasis kartonas; Kartoninės gėrimų pakuotės; Buteliai (prieš išmetant reikia nuimti foliją, kamščius ir jų žiedelius); Stiklainiai; Stiklo duženos; Stikliniai indai; Plastikiniai buteliai; Šampūno pakuotės (išplautos); Skalbiklių pakuotės (išplautos); Valiklių pakuotės (išplautos); Tetrapakai ir padažų indeliai (išplauti); Dažų ir antifrizo tara; Plastikiniai indai; Žaislai; Plėvelė; Konservų dėžutės; Gėrimų skardinės; Aliuminio lėkštelės ir kepimo skardinės; Dažais užterštos dėžutės; Aerozoliniai flakonai	Traškučių pakeliai; Tapetai; Tetrapakai; Veidrodžiai; Porcelianas; Krištolas; Keramika; Elektros lemputės; Automobilių stiklai; Akinių stiklai; Medicininės ampulės; Riebalais užteršti ir neišplauti jogurto, margarino, grietinės indeliai; Neišplauti aliejaus buteliai	Sodo atliekos (daržovių atliekos, smulkios šakos, lapai, gėlės, vaisiai); Picos dėžutės; Popierinės nosinaitės; Skystos ir kietos maisto atliekos; Naminių gyvūnų (triušių, vištų) išmatos; Kavos ir arbatos tirščiai	Pavojingų medžiagų tara arba tara, užteršta jomis; Tepalų bakeliai, tepalų filtrai, kitos su naftos produktais susijusios atliekos; Pasenę medikamentai; Akumuliatoriai; Gyvsidabrio turinčios atliekos; Kosmetikos atliekos (nagų lakas, lako nuėmėjas, lakas plaukams); Dezinfekciniai skysčiai, įvairūs valikliai; Baliklai; Galvaniniai elementai, turintys sunkiųjų metalų; Dažais užterštos dėžutės; Aerozoliniai flakonai; Dažų ir antifrizo tara	**Negalima kompostuoti:** Skerdienos (mėsos, žuvies) atliekų; Virtų daržovių; Laikraščių; Naminių gyvūnų (šunų) išmatų **Nepatartina kompostuoti** Piktžolių (piktžolių sėklos žūva tik gerai subrandintame komposte)

KODĖL RŪŠIUOJAME ATLIEKAS?

- Rūšiuotinos, t.y. perdirbamos;
- nerūšiuotinos, t.y. šalinamos sąvartynuose ;
- tinkančios kompostui, t.y. vežamos į kompostavimo aikšteles arba biodegraduojančių atliekų tvarkymo įmones;
- netinkančios kompostui;
- pavojingos, t.y. išmetamos į specialiai tam skirtus konteinerius arba išvežamos į specialias aikšteles.

ŽINOJOTE, KAD:

- 1 gėrimo skardinės perdirbimas pagamina tiek energijos, kiek reikia televizoriui veikti 3 valandas;
- 1 stiklinio butelio perdirbimas pagamina tiek energijos, kiek reikia kompiuteriui veikti 25 minutes;
- 1 plastikinio butelio perdirbimas pagamina tiek energijos, kiek reikia 60 vatų elektros lemputei veikti 3 valandas;
- Perdirbant popierių sunaudojama 70 procentų mažiau energijos nei gaminant popierių iš žaliavų.

PERDIRBTINUMAS:

- net iki 60 procentų į konteinerius išmetamų šiukšlių gali būti perdirbamos;
- energijos, kuri per metus lieka nepanaudota išmetant atliekas į vidutinio dydžio šiukšlių dėžę, užtektų televizoriui veikti 5000 valandų;
- vidutiniškai 16 procentų produkto kainos sudaro jo pakuotės, kurią galiausia išmetate, kaina;
- iki 50 procentų į vidutinio dydžio šiukšlių dėžę išmetamų atliekų gali būti paverčiamos kompostu;
- iki 80 procentų transporto priemonių gali būti perdirbamos;
- plastikui suirti reikia 500 metų;
- stiklas yra 100 procentų perdirbama medžiaga, jis gali būti panaudojamas vėl ir vėl, o į aplinką išmetamas stiklas nesuyra niekada???" suyra per 900 metų???
- perdirbtas popierius aplinką teršia 73 procentais mažiau nei popierius, pagamintas iš žaliavų;
- pagaminti 1 tonai laikraštinio popieriaus reikia 24 medžių;
- aliuminio dėžutės gali būti perdirbamos ir vėl paruoštos naudojimui vos per 6 savaites.

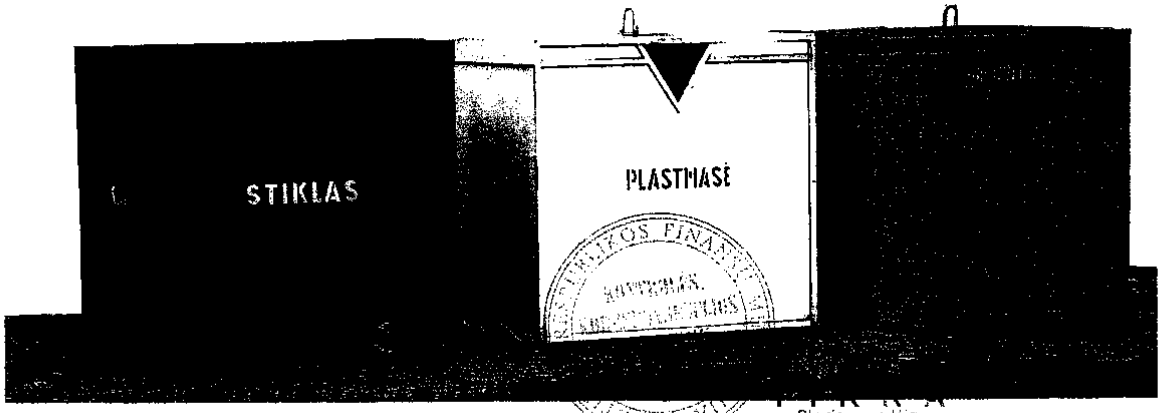

Skyriaus vedėja

2011 -06- 29 300

UAB PANEVĖŽIO BEŽONIO

APVA
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

2

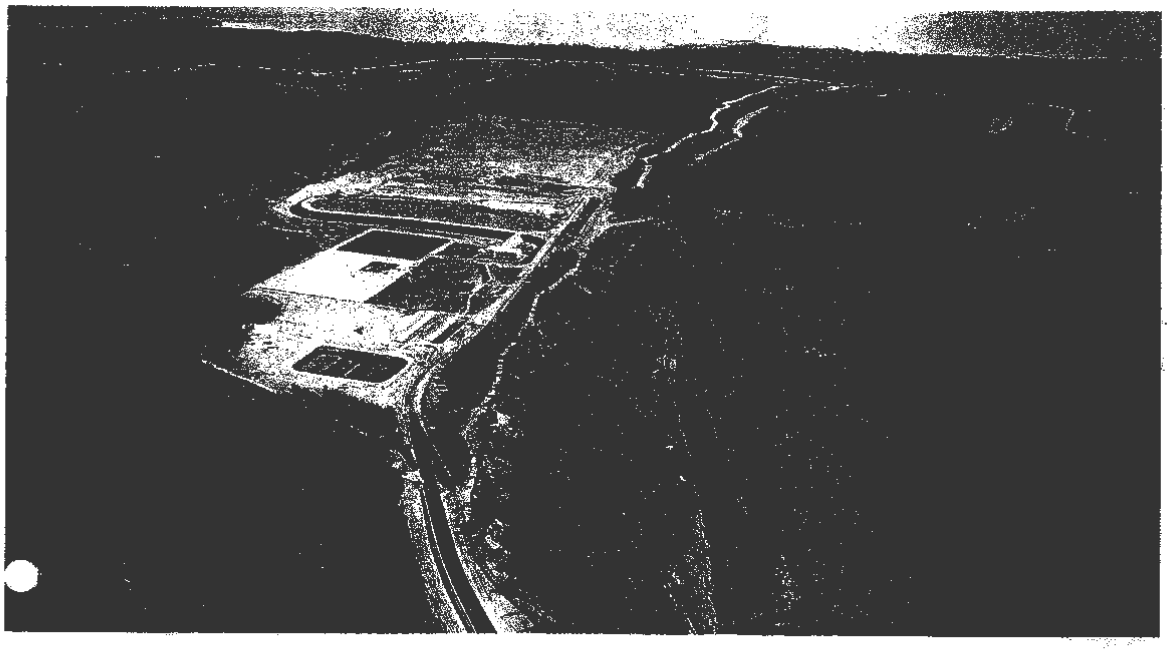

Talino sąvartynas – modernaus atliekų tvarkymo pavyzdys

Prieš keleris metus atidarytas naujasis Talino (Estija) sąvartynas iki šiol vadinamas moderniausiu Baltijos šalyse. Į jį lygiuojasi valstybės, kuriančios Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias šiuolaikines regionines atliekų tvarkymo sistemas. Nuo Talino sąvartyno labai nesiskirs ir iki 2009 m. kiekvienoje Lietuvos apskrityje atsidarysiantys modernūs sąvartynai.

Praeitis, dabartis, ateitis

Estai šiek tiek anksčiau už mus pradėjo ieškoti vienos opiausių aplinkosaugos problemų – atliekų tvarkymo – sprendimo būdų. Naujasis sąvartynas buvusioje apleistoje Maardu teritorijoje Jõelähtme municipalitete – vienas iš jų.

Atliekų tvarkymo problema Estijos sostinės ir kaimynystėje esančių municipalitetų valdžia susirūpino daugiau kaip prieš dešimtmetį. Prieita prie išvados, kad siekiant išsaugoti švarią gamtą esamoms ir ateities kartoms, būtina įrengti naują modernų sąvartyną. Iki tol apie tris dešimtmečius visos Talino atliekos buvo vežamos į laikiną sąvartyną Pääsküloje, kuris visiškai neatitiko aplinkosauginių reikalavimų.

Naujo sąvartyno įrengimo projektas gimė apie 1996 metus, kai buvo parinkta jam tinkama vieta Jõelähtme. Po daugybės atliktų studijų, tyrimų 1999 m. projektas pradėtas įgyvendinti. Kai tik pradėjo veikti naujas sąvartynas, Pääsküloje esantis senasis buvo skubiai uždarytas.

Smulkias ir stambias buitines atliekas iš Talino bei aplinkinių vietovių į šiuolaikinį, visus ES reikalavimus atitinkantį sąvartyną numatoma vežti dar apie 40 metų. Dar 20 metų bus ruošiamasi sąvartyno uždarymui, surenkamos išsiskiriančios dujos, vykdomas monitoringas.

Projekto vertė – įspudinga

500 tūkst. gyventojų aptarnaujantis Talino sąvartynas užima 67 ha žemės plotą.

Į kelias dalis padalytos teritorijos infrastruktūrą, nekenksmingų buitinių atliekų surinkimo, perkrovimo, rūšiavimo, perdirbimo, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių įrengimą investuota 150 milijonų Estijos kronų (apie 33 mln. litų).

Pagal Europos Sąjungos (ES) paramos programą ISPA ir iš Talino miesto biudžeto vien patogiems privažiavimo keliams nutiesti bei nuotekų sistemai sukurti buvo skirta papildomai 95 mln. Estijos kronų (beveik 30 mln. Lt).

Viso projekto, finansuojamo ES ir šalies biudžeto lėšomis, įgyvendinimas kainavo 900 mln. EEK (beveik 200 mln. litų).

Ypatinga konstrukcija

Iš pirmo žvilgsnio kol kas moderniausias Baltijos šalyse Talino sąvartynas beveik nesiskiria nuo kitų, kad ir Lietuvoje dabar veikiančių sąvartynų.

Sąvartyno teritorija nuolat stebima ir saugoma, todėl benamių, kuriems Lietuvos sąvartynai atstoja ir namus, ir darbovietę, ten nėra.

Nuo senų sąvartynų šiuolaikiškas Talino sąvartynas iš esmės skiriasi savo konstrukcija. Jo pagrindą sudaro aštuoni sluoksniai.

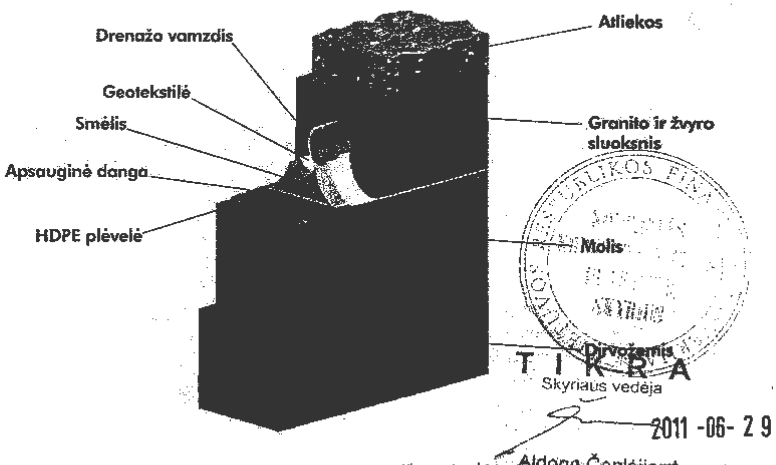

TIKRA
2011 -06- 29

Dirvožemio ir molio sluoksniai uždengti 2 mm storio HDPE (aukšto tankumo polietileno) plėvele, ant jos – centimetro storio apsauginė danga. Vėliau eina smėlio ir geotekstilės sluoksniai. Ant jų – drenažo vamzdis (diametras siekia 25 cm). Viršutinis yra granito ir žvyro sluoksniai, ant kurių pilamos atliekos.

UAB PAMEŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
APVA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
EUROPOS SĄJUNGA

300

Kaip teisingai rūšiuoti atliekas

Buityje susidarančių atliekų rūšiavimas labai svarbus, nes tik išrūšiuotos atliekos yra dar kartą perdirbamos. Perdirbant atliekas taupomi gamtiniai ištekliai, mažinamas atliekų kiekis sąvartynuose. Viena iš pagrindinių naujosios sistemos užduočių – skatinti perdirbimą bei sumažinti atliekų srautą patenkantį į regioninį sąvartyną.

	Tinka perdirbti	Netinka perdirbti
Konteineris popieriui	Laikraščiai Žurnalai Popierius ir kiti spaudiniai Kartonas ir gofruotasis kartonas Kartoninės gėrimų pakuotės	Picos dėžutės (tinka kompostuoti) Popierinės nosinaitės (tinka kompostuoti) Servetėlės (tinka kompostuoti) Traškučių pakeliai Tapetai Tetrapakai
Konteineris stiklui	Butelius (prieš išmetant reikia nuimti folija kamščius ir jų žiedelius) Stiklainius Stiklo duženas Stiklinius indus	Veidrodžiai Porcelianas Krištolas Keramikos Elektros lemputes Automobilių stiklai Akinių stiklai Medicininės ampulės
Konteineris plastikui	Plastikinius butelius Šampūno pakuotės (išplautos) Skalbiklių pakuotės (išplautos) Valiklių pakuotės (išplautos) Aliejaus ir padažų indeliai (išplauti) Plastikiniai indai Žaislai Plėvelė	Riebalais užteršti ir neišplauti jogurto margarino, grietinės indeliai Neišplauti aliejaus buteliai Tepalų bakeliai (dažų ir antifrizo tara)
Metalo gaminiai (metami į konteinerį skirtą plastikui)	Konservų dėžutės Gėrimų skardinės Aliuminio lėkštelės ir kepimo skardinės	Dažais užterštos dėžutės Aerozoliniai flakonai Pavojingų medžiagų tara

TRUMPAI

• Dar balandį pradėjęs funkcionuoti Šiaulių regiono sąvartynas, oficialiai atidarytas šių metų gegužės 5 dieną Aukštrakiuose. Tai pirmasis šalyje modernus, visus Europos sąjungos aplinkos reikalavimus atitinkantis sąvartynas. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2002 m. Šiaulių sąvartyno projekto vertė – 9,4 mln.eurų. 5,3 mln.eurų kaip negrąžinamą paramą skyrė Europos Sąjunga, 2 mln.eurų – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, likusios lėšos – banko paskola. Projekte numatyta finansuoti naujo Aukštrakių sąvartyno, atitinkančio ES reikalavimus ir naujausias technologijas, statybą, kompostavimo aikštelės. Kairių sąvartyne įrengimą, 34 atliekų priėmimo punktų įrengimą, Kairių bei 5 rajoninių, taip pat 116 mažųjų sąvartynų uždarymą ir rekultivavimą, technikos, reikalingos eksploatuoti naują sąvartyną, įsigijimą.

• Panevėžio miestas yra vienas geriausiai Lietuvoje apsirūpinęs rūšiuotinoms atliekoms skirtais konteineriais. Šiuo metu Panevėžio mieste ir rajone yra apie 275 rūšiuotinoms atliekoms skirtų aikštelių.

Didžiosioms atliekoms surinkti Panevėžio mieste yra įrengta speciali didžiųjų atliekų priėmimo aikštelė. Šiuo metu tokia aikštelė veikia Pilėnų g. 43 (939 m²), o Savitiškio g. 12 (1568 m²) pradėta statyti analogiškos paskirties didžiųjų atliekų priėmimo aikštelė. Tokios pat aikštelės ateityje bus įrengtos ir kituose didžiuosiuose Panevėžio apskrities miestuose: Biržuose, Rokiškyje, Pasvalyje ir Kupiškyje.

Regioninis Vilniaus apskrities sąvartynas veikia nuo 2007 metų lapkričio vidurio. Į komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškių seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybėje, jau vežamos buitinės atliekos. Sąvartynas įrengtas pagal visus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalavimus. Bendras sąvartyno kaupo plotas – 27,1 hektaro, kaupo aukštis virš žemės paviršiaus – 30 metrų. Sąvartyne įrengtos dujų bei filtrato surinkimo, apželdinimo, drenavimo ir kitos aplinkos apsaugos sistemos. Regioninę atliekų tvarkymo sistemą Vilniaus apskrityje koordinuoja nuo 2003 metų veikianti UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras".

• Regioninis Takniškių sąvartynas Alytaus rajone atidarytas 2007 metų lapkričio pabaigoje. Į sąvartyną priimamos komunalinės, statybinio laužo atliekos, įrengta aikštelė atliekoms su asbestu. Sąvartyne rūšiuojamos atliekos paskirstomos skirtingiems perdirbimo sektoriams, o pavojingos – tvarkomos. Naujojo sąvartyno kaupo aukštis – ne daugiau 40 metrų, numatoma, kad per 20 metų jo plotas pasieks 25 procentus senojo sąvartyno ploto. Nuo 2005 metų sąvartyną eksploatuoja UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras".

• Modernus regioninis sąvartynas Dumpių kaime prie Klaipėdos atidarytas 2007 metų gruodžio vidurysje. Dumpių sąvartyną vežamos perdirbimui netinkamos buitinės atliekos iš visos Klaipėdos apskrities. Sąvartynas įrengtas pagal griežtus aplinkosauginius ES reikalavimus. Dumpių sąvartyną numatoma eksploatuoti 20 metų. Klaipėdos regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemą įgyvendina nuo 2003 metų veikianti UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras".

Trumpa informacija apie PRATC

Pirmieji žingsniai kuriant Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemą buvo žengti 2003 m., kai buvo parengta Galimybių studija, kurioje pateiktas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros investicijų planas, finansinė investicinių kaštų bei pajamų analizė, bei poveikio aplinkai vertinimas. Patvirtintoje Galimybių studijoje pateiktas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros investicijų planas, finansinė investicinių kaštų bei pajamų analizė, bei poveikio aplinkai vertinimas. O 2005 m. liepos 1 d. šešios regiono savivaldybės Jungtinės veiklos sutarties pagrindu įkūrė UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą, o po pusmečio buvo pasirašytas Europos Komisijos sprendimas projekto finansavimui.

Pagrindinis PRATC tikslas yra sukurti racionalią atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią visuomenės poreikius, užtikrinančią gerą aplinkos kokybę ir nepažeidžiančią rinkos ekonomikos taip pat įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimus atliekų tvarkymo srityje.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras treti metai dirba siekdamas gerai, kokybiškai ir pagal visus ES reikalavimus įvykdyti užsibrėžtą tikslą – sukurti naująją atliekų tvarkymo sistemą. Per šiuos metus sudaryti planai bei darbo grupės, pradėti visuomenės švietimo bei informavimo darbai, paskelbti konkursai komponentų Panevėžyje statybos darbams atlikti. Jau išaiškintas laimėtojas atliekų priėmimo punktų, perkrovimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių, regioninio sąvartyno statybos darbams atlikti. Šiuos darbus atliks AB „Panevėžio statybos trestas".

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas – tai vienas didžiausių aplinkosaugos projektų Panevėžio apskrityje. Jo įgyvendinimui yra skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 85 procentus arba daugiau nei 57 milijonus šio projekto lėšų, likusią sumą skirs Lietuvos Vyriausybė.

Tokie atliekų tvarkymo sistemos projektai, kurių tikslas – mažinti sąvartynų skaičių, pastatyti naujus visus ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančius regioninius sąvartynus, skatinti gyventojus rūšiuoti atliekas, atskirti pavojingas atliekas – vyksta kiekvienoje Lietuvos apskrityje.

Direktorius • Arturas Grucė
direktorius@pratc.lt

Vyr. buhalterė • Dovilė Kulbienė
buhalterija@pratc.lt

Projekto administratorius • Vaidas Peleckas
pratc@pratc.lt

Beržų g. 44, Panevėžys
Tel./ faks. 8 45 432199

info@pratc.lt
T I kwwpratc.lt

Skyriaus vedėja

2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS AMINISTERIJOS

ATLIEKŲ TVARKYMO AKTUALIJOS

Nr.2

Leidinys skirtas Panevėžio regionui



Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

Siekiant, kad atliekų tvarkymas Lietuvoje atitiktų Europos Sąjungos (ES) reikalavimus, buvo būtina įdiegti kelių savivaldybių teritorijas apimančias atliekų tvarkymo sistemas. Regioninių atliekų tvarkymo sistemų diegimą sąlygojo ir ekonominės priežastys – didelius atliekų kalinimo įrenginius pigiau statyti ir eksploatuoti nei mažus.

Už šio projekto įgyvendinimą Panevėžio regione atsakingas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC). Jam, pagal 2005 liepos 1 d. šešių savivaldybių pasirašytą Jungtinės veiklos sutartį, pavesta organizuoti visų buitinių, komunalinių, gamybinių ir kitų atliekų tvarkymą Panevėžio regione. Panevėžio apskritį sudaro Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio, Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonų savivaldybės.

PRATC įgyvendinamo projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" bendra vertė – 67,29 mln. litų. Numatoma, kad įgyvendinus projektą, iki 2010 metų bus uždaryti ir sutvarkyti 95 seni, ES reikalavimų neatitinkantys, Panevėžio apskrities sąvartynai ir šiukšlynai. Senuosius sąvartynus pakeis vienas naujas regioninis sąvartynas Dvarininkų kaime, Miežiškių seniūnijoje, Panevėžio rajone. Įrengus vieną sąvartyną visai apskričiai, turi būti maksimaliai sumažinta sąvartynų į aplinką skleidžiama tarša Panevėžio apskrityje. Naujojo sąvartyno statybos pradėtos 2008 metų birželio mėnesį, kuomet simboliškai įbetonuota kapsulė su laišku ateities kartoms. Sąvartynas bus įrengtas 6 hektarų plote, o jo statybų pabaiga numatoma 2009 metų birželio mėnesį.

Šiuo metu kiekviename rajone jau įrengtos 5 stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės, 4 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, Biržuose ir Rokiškyje pastatytos atliekų perkrovimo stotys.

Tikimasi, kad kokybiškai sukurta nauja regioninė atliekų tvarkymo sistema užtikrins švaresnę ir sveikesnę aplinką Panevėžio apskrities gyventojams.

Kas jau nuveikta per metus

Miežiškių seniūnijos Dvarininkų kaime įsibėgėjo vienas didžiausių visų laikų aplinkosaugos projektų Panevėžio regione – pradėtos naujojo, visus aplinkosaugos reikalavimus atitinkančio sąvartyno statybos. Prieš tai buvo atlikti paruošiamieji darbai – iškirsti medžiai, išrauti kelmai, sutvarkytas aplink sąvartyną esančio miško plotas, įrengtas apvažiavimo kelias.

Naująjį sąvartyną stato bendrovės AB „Panevėžio statybos trestas" ir AB „Panevėžio keliai", laimėjusios viešąjį darbų pirkimo konkursą ir pasirašiusios trišalę sutartį su PRATC ir Aplinkos projektų valdymo agentūra.

2008 metų balandį įvyko trečiasiasis PRATC susitikimų ciklas su Panevėžio apskrities bendruomenėms. Susitikti su PRATC atstovais pageidavo Kirdonių, Juodupėnų, Deglėnų bei Kamajų kaimų bendruomenės. Šių susitikimų metu buvo pristatoma naujoji atliekų tvarkymo sistema, kalbėta ir kitais aktualiais, su atliekomis susijusiais, klausimais.

Naujojo apskrities sąvartyno statybos darbų pradžios akimirkos

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
APVA
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
EUROPOS SĄJUNGA
Skyriaus vedėja
Cepliejienė
2011 -06- 29

)08 metų lapkričio mėnesį baigėsi planuotas ,irtas susitikimų ciklas su bendruomenėms. ,s pirmieji pasikviesti PRATC darbuotojus kubo Panevėžio Senvagės pagrindinės moky- s pradinių klasių mokiniai ir Pasvalio rajono ıdruomenės – Pušaloto ir Joniškėlio. Per šį ,itikimų ciklą PRATC atstovai taip pat susitiko Šepetos, Subačiaus, Medeikių, Gulbinų, Kre- ıavos, Naujarodžių bendruomenėmis.

)08 metų pradžioje finišavo PRATC paskelb- komiksų konkursas „Kaip Tvarkiukas atliekas ıavo". Šiame konkurse dalyvavo Panevėžio ,iono bendrojo lavinimo įstaigų 1 – 5 klasių ›kiniai. Organizatoriai sulaukė daugiau kaip)0 piešinių, kuriuos atsiuntė net 25 mokyklų auklėtiniai. Vaikų darbai nustebino PRATC atstovus gyvybingumu, kūrybiškumu, neišsenkančiomis fantazijomis ir originaliomis idėjomis.

Gegužės mėnesį PRATC inicijavo sentencijų konkursą atliekų tvarkymo tematika. Konkurse dalyvavo 5 – 8 klasių mokiniai, gauti net 57 darbai. Daugumą sentencijų buvo originaliai iliustruotos ir apipavidalintos pačių mokinių. PRATC atstovus maloniai nustebino tai, jog mokiniai puikiai įsisąmoninę atliekų rūšiavimo būtinumą.

Panevėžio apskrities savivaldybėse pavasarį pradės veikti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Rokiškio rajone tokia aikštelė įrengta Ruzgų km., Juodupės sen.; Kupiškio rajone – Didžiagrašių km., Noriūnų sen.; Pasvalio rajone – Levaniškio sąvartyno teritorijoje, Pasvalio apyl. sen; Biržų rajone – Biržų km., Širvėnos sen.; Panevėžio rajone žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė įrenginėjama Dvarininkų km., Miežiškių sen.

Jau įrengtos 5 didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės, į kurias gyventojai galės pristatyti didelių gabaritų atliekas. Panevėžio mieste tokia aikštelė įrengta Savitiškio g. 12; Pasvalyje – Mūšos g. 12B; Biržuose – Širvėnos sen. Biržų k.; Kupiškyje – Technikos g. 6i.; Rokiškyje – K. Donelaičio g. 16. Naujų aikštelių darbo laiką, planuojama pritaikyti dirbančių gyventojų patogumui. Tad, ketindami pristatyti didžiąsias atliekas, gyventojai galės pasirinkti jiems tinkamiausią tam laiką.

:009 metais pradės veikti naujasis 'anevėžio apskrities sąvartynas

enos didžiausių visų laikų aplinkosauginių projektų Panevėžio regione įsibėgėjo – visus ɔlinkosauginius reikalavimus atitinkančio, sąvartyno statybos vyksta pagal numatytą ·afiką. Naujojo sąvartyno statyba bus baigta šių metų vasarą.

ɜtuvos apskrityse atidarinėjami visus šiuolaikiıs reikalavimus atitinkantys sąvartynai. Šaly- jau veikia aštuoni modernūs, visus Europos ,jungos (ES) atliekų tvarkymo reikalavimus itinkantys sąvartynai. Tokius jau turi Šiaulių, lniaus, Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, lenos, Telšių ir Tauragės regionai. Planuoja- a, kad naujas ir ES reikalavimus atitinkantis ,vartynas Panevėžio apskrityje, turi būti įreng- s 2009 metų vasarą.

ınevėžio apskrityje gyvena apie 290 tūkstanų gyventojų, kurie per metus buityje sukaupia ɔugiau kaip 80 tūkstančius tonų įvairių komu- ɔlinių atliekų. Didelė dalis šių atliekų kaupiama ɔvojų aplinkai ir žmonių sveikatai keliančiuose 5 apskrities sąvartynuose, o kartais – tiesiog amiškėse ar pakelėse.

ɔnevėžio regione modernaus sąvartyno sta- bos prasidėjo 2007 metų gruodžio mėnesį. uvo vykdomi paruošiamieji darbai: iškirsti mežiai, išrauti kelmai, sutvarkytas aplink sąvarty- ą esančio miško plotas, įrengtas apvažiavimo elias. 2008 metų birželio 10 dieną naujojo qvartyno administracinio pastato pamatuose buvo įbetonuota simbolinė kapsulė su laišku ateities kartoms.

Šiuo metu jau atlikti šie sąvartyno statybų darbai: įrengtas gruntinio vandens drenažas, filtrato drenažas, įrengtas sąvartyno dugnas, suformuoti pirminiai šlaitai. Iš naujojo sąvartyno bet koks taršos patekimas į paviršinius ar požeminius vandenis, dirvožemį, bus neįmanomas, kadangi sąvartyno dugnas sudarytas iš specialių apsauginių sluoksnių: sutankinto esamo natūralaus grunto, geosintetinio molio sluoksnio, HDPE geomembranos, apsauginės geotekstilės, drenuojančio sluoksnio (žvyro).

Jau pastatytas pastatas, kuriame bus įrengta atliekų rūšiavimo linija. Ši linija reikalinga tam, kad atliekos būtų išrūšiuotos pakartotiniam perdirbimui ir tik neperdirbamos atliekos pateks į naująjį sąvartyną.

Tikimasi, kad ir patys gyventojai aktyviau p(sidės prie švarios aplinkos sukūrimo sąlygų ı nenumos ranka į atliekų rūšiavimą. Išrūšiuotos atliekos gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą. Atliekų antrinis panaudojimas ar perdirbimas padeda mums saugoti gamtos išteklius, palaikyti švarią ir sveiką aplinką.



Sąvartyno dugno konstrukcija

Panevėžio apskrities sąvartyno dugno įrengimo darbai

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

2

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

EUROPOS SĄJUNGA

Didžiųjų atliekų aikštelių paskirtis

Susikaupusios didelių gabaritų atliekos – viena didžiausių miestų problemų. Nežinodami, kur dėti senus baldus, statybines atliekas ir kitus nereikalingus didesnius daiktus, gyventojai juos tiesiog sustato prie buitinių atliekų konteinerių arba išmeta, kur papuola.

Ne vietoje paliktos didžiosios atliekos trukdo prieiti prie konteinerių norintiesiems išmesti ir išvežti buitines atliekas. Taip konteinerių aikštelės virsta mažais sąvartynais. Kad išvengtumėme netvarkos ir savo gražaus žalio miesto ar miestelio nepaverstumėme sąvartynu, stambiagabarites atliekas reikia gabenti į joms skirtas didžiųjų atliekų aikšteles.

Šiose aikštelėse bus surenkamos ir laikinai saugomos stambiagabaritės, statybinės, pavojingos namų ūkio atliekos ir elektrotechninė įranga. Aikštelės yra tik atliekų surinkimo objektas, kuriame nebus vykdomi pavojingų atliekų tvarkymo ar pertvarkymo darbai.

Kuriant naują Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemą, numatoma įrengti penkias didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles Panevėžyje, Pasvalyje, Biržuose, Kupiškyje, Rokiškyje.

Jau šių metų pavasarį Panevėžio apskrities miestuose pradės veikti didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės: Pasvalyje tokia aikštelė įrengta Mūšos g. 12B; Biržuose – Širvėnos sen. Biržų k.; Kupiškyje – Technikos g. 6i; Rokiškyje – K. Donelaičio g. 16; Panevėžio mieste - Savitiškio g. 12. Į šias aikšteles gyventojai galės nemokamai pristatyti susikaupusias didžiąsias atliekas. Naujų aikštelių darbo laiką, planuojama pritaikyti dirbančiųjų patogumui. Tad, ketindami pristatyti didžiąsias atliekas, gyventojai galės pasirinkti jiems tinkamiausią tam laiką.

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė Panevėžyje: Savitiškio g. 12

Į šias aikšteles gyventojams taip pat galima ir net patartina vežti pavojingas atliekas: akumuliatorius, dienos šviesos lempas, gyvsidabrio, tepalų ir oro filtrus, naudotos alyvos atliekas. Priėmimo aikštelėse įrengti specialiai tam pritaikyti, sandarūs bei saugūs konteineriai, kurie skirti pavojingoms atliekoms saugoti. Vėliau šios atliekos perdirbamos pakartotiniam panaudojimui, deginamos tam pritaikytose gamyklose arba šalinamos pavojingų atliekų sąvartynuose.

Primename, jog dėti atliekas šalia buitinių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių draudžiama. Už atliekų tvarkymo taisyklių nesilaikymą numatomos baudos pagal LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso161 ir 51[3] straipsnius.

Gyventojai, išmetę didžiąsias atliekas kur papuola, ypač užteršia aplinką: dirvožemį, vandenį, orą. Aplinkoje susikaupusios kenksmingos medžiagos turi įtakos ir mūsų pačių sveikatai ir savijautai. Tad, tinkamai pasirūpinę atliekomis, gyvensime švariai ir būsime sveikesni.

	Tinka perdirbti	Netinka perdirbti
Konteineris popieriui	Laikraščiai Žurnalai Popierius ir kiti spaudiniai Kartonas ir gofruotasis kartonas	Picos dėžutės Popierinės nosinaitės Servetėlės Traškučių pakeliai Tapetai Tetrapakai
Konteineris stiklui	Butelius (prieš išmetant reikia nuimti folija kamščius ir jų žiedelius) Stiklainius Stiklo duženas Stiklinius indus	Veidrodžiai Porcelianas Krištolas Keramikos Elektros lemputes Automobilių stiklai Akinių stiklai Medicinines ampules
Konteineris plastikui	Plastikinius butelius Šampūno pakuotės (išplautos) Skalbiklių pakuotės (išplautos) Valiklių pakuotės (išplautos) Aliejaus ir padažų indeliai (išplauti) Dažų ir antifrizo tara Plastikiniai indai Žaislai Plėvelė Kartoninės gėrimų pakuotės	Riebalais užteršti ir neišplauti jogurto margarino, grietinės indeliai Neišplauti aliejaus buteliai Tepalų bakeliai
Metalo gaminiai (metami į konteinerį skirtą plastikui)	Konservų dėžutės Gėrimų skardinės Aliuminio lėkštelės ir kepimo skardinės	Dažais užterštos dėžutės Aerozoliniai flakonai Pavojingų medžiagų tara



Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė Panevėžyje: Savitiškio g. 12

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
APVA
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
EUROPOS SĄJUNGA
3

Buitinės technikos atliekos turi būti perdirbamos

Surūšiuotos atliekos gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą. Antrinis atliekų panaudojimas ar perdirbimas padeda mums saugoti gamtos išteklius, palaikyti švarią ir sveiką aplinką.

Vienos iš buitinę techniką superkančios įmonės duomenimis, vienas Lietuvos gyventojas per metus „sunaudoja" iki 11 kg buitinės technikos ir elektroninių atliekų. Apgailestaudami turime pastebėti, jog tik labai maža dalis šių atliekų patenka į Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EĮA) perdirbėjų rankas. Didžioji dalis smulkiųjų EĮA atliekų keliauja į buitinių atliekų konteinerius, tačiau taip neturėtų būti, nes visos šios atliekos pažymėtos specialiu ženklu:



Šis ženklas reiškia, jog elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti kartu su kitomis atliekomis.

Kas yra elektroninė ir elektros įranga? Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatyme elektroninė ir elektros įranga apibūdinama kaip įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus bei naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei. Tokios atliekos yra:

- Dideli buitiniai prietaisai (šaldytuvai, skalbimo mašinos, indaplovės, elektrinės viryklės, mikrobangų krosnelės, elektriniai radiatoriai, kt.);
- Maži buitiniai prietaisai (dulkių siurbliai, siuvimo, mezgimo prietaisai, lygintuvai, skrudintuvai, kavamalės, kt.);
- Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga (kompiuteriai, kopijavimo įranga, spausdintuvai, telefonai, kt.);
- Plataus vartojimo prietaisai (radijo aparatai, televizoriai, vaizdo kameros, vaizdo ir garso grotuvai, muzikos instrumentai, fotoaparatai, kt.);
- Apšvietimo įranga;
- Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (grąžtai, pjūklai, vejos pjovimo ir kitų sodo darbų įrankiai, kt.);
- Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga;
- Medicinos įranga;
- Priežiūros ir kontrolės įranga;
- Pardavimo automatai.

Kaip teisingai atsikratyti elektros ir elektrotechnikos atliekomis? Tinkamai atsikratyti šiomis atliekomis yra sudarytos visos sąlygos:

- yra ne viena licencijuota įmonė, turinti apmokytą personalą, gebantį saugiai iš jūsų namų išvežti šias atliekas (kiekviena įmonė turi nustačiusi skirtingus tarifus už atliekų išvežimą);
- perkant tos pačios rūšies elektros ar elektrotechnikos prekę, senąją galima atiduoti pardavėjui (pvz., perkant naują plaukų džiovintuvą, pardavėjui paliekamas senasis);
- yra didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės, kuriose iš gyventojų priimamos visos EĮA ir perduodamos perdirbėjams;
- kai kurios komunalinės paslaugas teikiančios įmonės yra sudariusios sutartis su EĮA perdirbėjais, tad EĮA atliekas galima perduoti šių įmonių darbuotojams. Be abejo, prieš tai reikia paskambinti ir įsitikinti, jog jūsų teritoriją aptarnaujantis komunalininkas surenka buitinės technikos atliekas;
- rajonuose EĮA surinkimu kartą ar du per metus turi pasirūpinti savivaldybės. Kartais savivaldybės tai įgalioja padaryti tą teritoriją aptarnaujantį komunalininką.

Didžioji dalis šių elektros ar elektrotechnikos įrangos surinkimo būdų yra nemokami.

Trumpa informacija apie PRATC

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC) – Panevėžio miesto bei Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Kupiškio ir Panevėžio rajonų savivaldybių įsteigta įmonė. PRATC įkurtas 2005 liepos 1 d., įgyvendindamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšomis finansuojamą investicinį projektą, siekia iki 2010 metų sukurti optimalią atliekų tvarkymo sistemą.

Pagrindinis PRATC tikslas yra sukurti racionalią atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią visuomenės poreikius, užtikrinančią gerą aplinkos kokybę ir nepažeidžiančią rinkos ekonomikos taip pat įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimus atliekų tvarkymo srityje.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas – vienas didžiausių aplinkosaugos projektų Panevėžio apskrityje. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta daugiau nei 67 mln. litų.

Viena iš pagrindinių projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" dalių – naujo Panevėžio apskrities sąvartyno įrengimas. Sąvartyno statybos darbus atlieka „Panevėžio statybos trestas".

Įgyvendinus projektą, Panevėžio regione bus uždaryti 95 sąvartynai. Apskrityje veiks tik vienas prie dabartinio Panevėžio sąvartyno įrengtas naujas modernus sąvartynas su atliekų rūšiavimo linija. Kiekviename rajone jau įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo ir didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – atliekų perkrovimo stotys, apskrityje taip pat saugiai bus tvarkomos buityje susidarančios pavojingos atliekos.

Tokie atliekų tvarkymo sistemos projektai, kurių tikslas – mažinti sąvartynų skaičių, modernizuoti juos, skatinti gyventojus rūšiuoti ir perdirbti atliekas, atskirti pavojingas atliekas – vyksta kiekvienoje Lietuvos apskrityje.

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Direktorius • Arturas Grucė
direktorius@pratc.lt

Vyr. buhalterė • Dovilė Kulbienė
buhalterija@pratc.lt

Projekto administratorius • Vaidas Peledas
pratc@pratc.lt

Eksploatavimo inžinierius • Alvydas Stravinskas
eksploatacija@pratc.lt

Beržų g. 44, Panevėžys
Tel./ faks. 8 45 432199

info@pratc.lt
www.pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
EUROPOS SĄJUNGA

ATLIEKŲ TVARKYMO AKTUALIJOS

Nr.3

Leidinys skirtas Panėvėžio regionui

Įžanginis žodis

Jau baigiama įdiegti naujoji Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema. Per 4 metus nuveikta tikrai nemažai: paruošta visa reikalinga dokumentacija, tyrimai, analizės, suprojektuoti bei pastatyti projekte numatyti statiniai, aikštelės, vykdoma gyventojų švietiamoji veikla ir įgyvendinama informavimo kampanija.

Šių metų liepos 16 dieną buvo atidarytas naujasis Panevėžio regiono sąvartynas. Tai reiškia, jog naujoji sistema pradeda savo veiklą.

Panevėžio regiono sąvartynas prisijungė prie naujosios atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje, kurios tikslas – uždaryti ir sutvarkyti senuosius, ES aplinkosaugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus, o vietoj jų atidaryti saugius, nekenkiančius aplinkai ir žmonių sveikatai sąvartynus.

Projekte „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" taip pat numatyta uždaryti 95 žemo, vidutinio ir aukšto prioriteto Panevėžio regiono sąvartynus. Šiems darbams įvykdyti jau paruošti visi reikalingi dokumentai.

Naujasis sąvartynas jau atidarytas, tačiau tesiami senojo Panevėžio miesto sąvartyno uždarymo darbai. Jie turi būti baigti iki šių metų gruodžio mėnesio. Taip pat laukia ilgas mokymo ir mokymosi naudotis naująja atliekų tvarkymo sistema procesas. Tikimės, kad visi apskrities gyventojai noriai naudosis atliekų tvarkymo sistema.

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: *žingsnis į mūsų gerovę.*

Kas nuveikta

- Naujasis Panevėžio regiono sąvartynas:

Šių metų liepos 16 dieną pradėjo veikti naujasis Panevėžio regiono sąvartynas. Naujasis sąvartynas pastatytas pagal visus ES reikalavimus, kuriuos Lietuva įsipareigojo įvykdyti stojimo laikotarpiu. Naujajame sąvartyne atidaryta tik viena 6 ha ploto sekcija; visas sąvartynas užima 18 ha plotą ir yra visiškai saugus. Jo dugną sudaro penki specialūs sluoksniai, kurių paskirtis – sulaikyti sąvartyne susidarantį filtratą. Tiek sąvartyno dugnas, tiek šlaitai įrengti taip, jog bet koks taršos patekimas į paviršinius ar požeminius vandenis, dirvožemį būtų neįmanomas.

Sąvartyne pastatyta ir netrukus bus atidaryta rūšiavimo linija, kurioje bus perrūšiuojamos atliekos, tinkančios antriniam perdirbimui. Šios linijos paskirtis – atliekas išrūšiuoti pagal perdirbėjų poreikius taip, kad kuo mažiau atliekų patektų į naująjį sąvartyną.

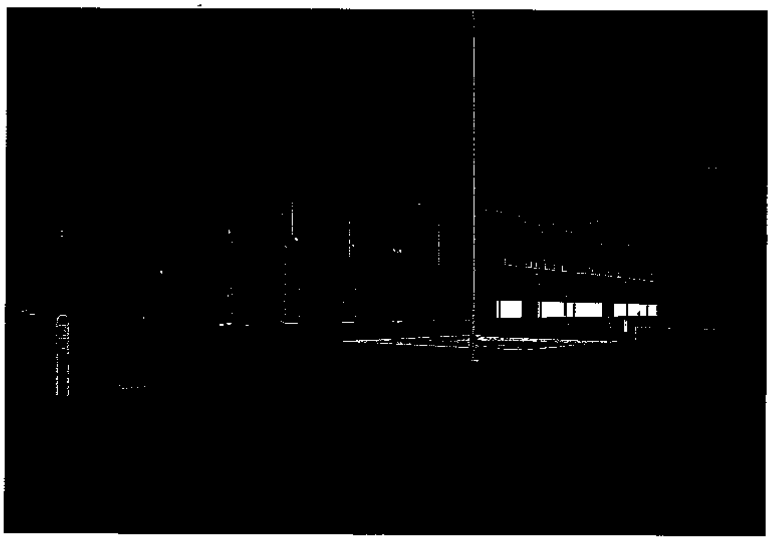

Naujojo sąvartyno statybos darbai finansuoti iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto.

- Susitikimai su interesų grupėmis:

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: visuomenės informavimas ir švietimas" projektą, baigė vieną iš viešinimo dalių – susitikimų ciklus su interesų grupėmis.

Įgyvendinant viešinimo kampaniją buvo numatyta surengti 25 susitikimus su keliomis tikslinėmis interesų grupėmis.

Susitikimams buvo pasirinktos dvi tikslinės auditorijos – mokiniai ir Panevėžio bei kitų didžiųjų apskrities miestų ir rajonų seniūnai, savivaldybių paskirti atliekų surinkėjai/vežėjai. Susitikimais buvo siekta kuo plačiau paskleisti žinią apie įgyvendinamo projekto planus, eigą, pasikeitimus bei naujoves, susijusias su atliekų šalinimu.

Susitikimai vyko nuo pat projekto pradžios – 2006 m. pabaigos iki šių metų kovo mėnesio pabaigos. Buvo aplankyta 19 mokyklų; 5 susitikimai įvyko su 5 rajonų seniūnais, vienas su Panevėžio regiono valdžios institucijų atstovais.

- Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės:

Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio veikia visos didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės. Šios aikštelės yra skirtos fiziniams asmenims, iš kurių atliekos priimamos nemokamai.

Į šias aikštelės galima vežti: baldus, naudotas automobilių padangas (du komplektai per metus), netinkamą naudojimui seną buitinę techniką, statybines ir griovimo atliekas, akumuliatorius, baterijas, dienos šviesos lempas ir gyvsidabrio tu-

Aldona Čeplėjienė 2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

APVA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

sanglaudos fondas

310

1

rinčias atliekas, užterštą pakuotę, tepalų ir oro filtrus, naudotos alyvos atliekas, asbesto turinčias atliekas.

Didžiųjų atliekų surinkimo ir priėmimo aikštelės įrengtos:

- Pasvalyje – **Mūšos g. 12B;**
- Biržuose – **Širvėnos sen. Biržų k.;**
- Kupiškyje – **Technikos g. 6i;**
- Rokiškyje – **K. Donelaičio g. 16;**
- Panevėžio mieste – **Savitiškio g. 12.**

Aikštelės darbo laikas : pirmadieniais – penktadieniais nuo 10 iki 18 val. Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Šeštadieniais nuo 9 iki 14 val.

- Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės:

Taip pat įrengtos ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, į kurias galima vežti tokias atliekas kaip žolė, lapai, smulkios medžių ir krūmų šakos.

Žaliųjų atliekų priėmimo ir kompostavimo aikštelės įrengtos:

- Rokiškio rajone – **Ruzgų km., Juodupės sen.;**
- Kupiškio rajone – **Didžiagrašių km., Noriūnų sen.;**
- Pasvalio rajone – **Levaniškio sąvartyno teritorijoje, Pasvalio apyl. sen;**
- Biržų rajone – **Biržų km., Širvėnos sen.;**
- Panevėžio rajone – **Dvarininkų km., Miežiškių sen.**

Aikštelių darbo laikas: Nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 15 d. antradieniais, ketvirtadieniais nuo 10 iki 18 val. Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Šeštadieniais nuo 9 iki 15 val.

Nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d. antradieniais, ketvirtadieniais nuo 10 iki 18 val. Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val.

- Perkrovimo stotys:

Perkrovimo stotys įrengtos labiausiai nutolusiuose nuo pagrindinio sąvartyno rajonuose – Biržuose ir Rokiškyje. Šių stočių paskirtis – perkrauti mišrias komunalines atliekas surenkamas iš gyventojų. Šiose atliekų perkrovimo stotyse atliekos bus presuojamos ir gabenamos į naująjį regioninį sąvartyną. Planuojama, kad per metus Biržuose bus perkrauta iki 8000 t, Rokiškyje iki 9000 t mišrių komunalinių atliekų.

- 94 sąvartynų uždarymas:

Šiuo metu pateikta paraiška Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Valstybės biudžeto paramai gauti. Šios paramos lėšomis bus uždaryti 94 aplinkosauginių reikalavimų neatitinkantys Panevėžio apskrities sąvartynai.



UAB "PANEVĖŽIO REGIONO

APVA
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

sanglaudos fondas

IKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čepėjienė

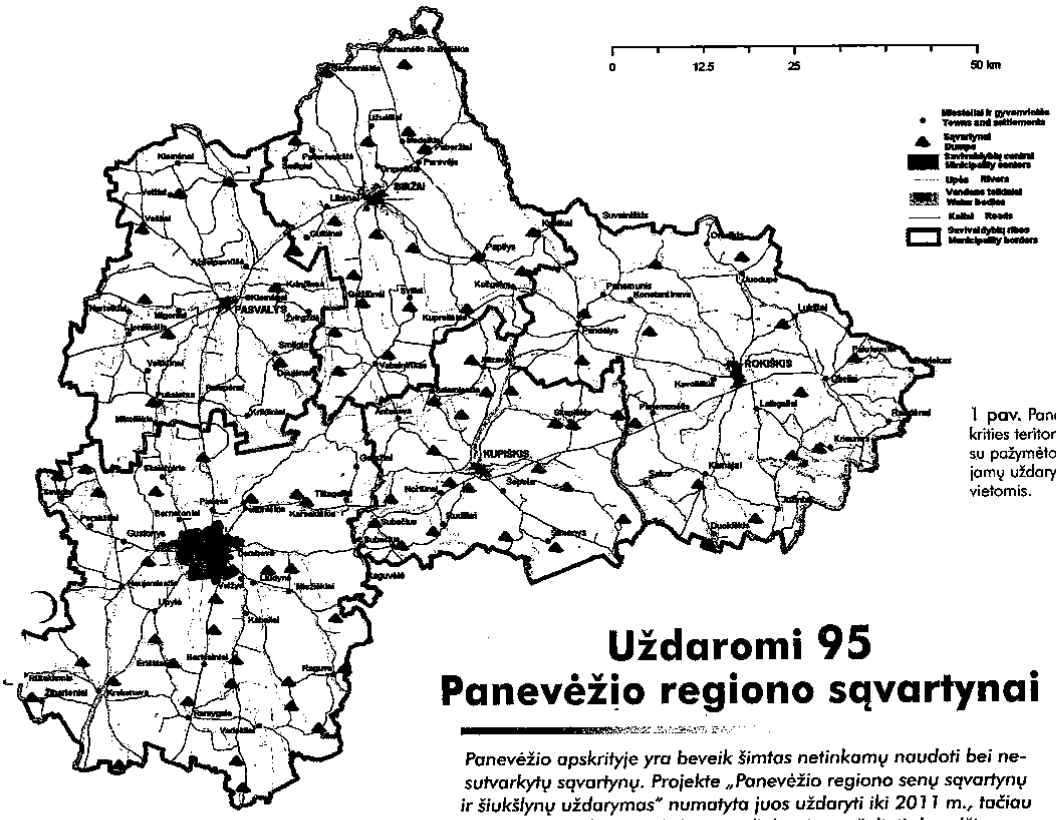

1 pav. Panevėžio apskrities teritorijos planas su pažymėtomis planuojamų uždaryti sąvartynų vietomis.

Uždaromi 95 Panevėžio regiono sąvartynai

Panevėžio apskrityje yra beveik šimtas netinkamų naudoti bei nesutvarkytų sąvartynų. Projekte „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas" numatyta juos uždaryti iki 2011 m., tačiau nuo 2009 m. liepos 16 dienos atliekas juose šalinti draudžiama.

Visi šie seni sąvartynai pagal savo dydį, ekologinį vietovės jautrumą (atstumus iki vandens telkinių, gyvenamųjų namų ir kt.) bei potencialiai daromą taršą yra suskirstyti į tris grupes: aukšto prioriteto, vidutinio prioriteto, žemo prioriteto.

PANEVĖŽIO RAJONE UŽDAROMŲ SĄVARTYNŲ SĄRAŠAS

Vilkapjūvių k.,
Meldiškių k.
Pelėdiškių k.
Vabuolų k.,
Karsakiškio k.,
Narušių k.
Žibartonių k
Krivulių k.,
Viržonių k.,
Tumagalio k.,
Kulbagalio k.,
Dvarininkų k.
Lakštingalų k.
Gegužinės k
Žaliapurvių k.,
Krityžės k.,
Šilų k.,
Masiokų k.
Utiūnų k.,
Bartkūnų k.,
Žižmių k.,
Gilbonių k.,
Naurašilio k.,
Žvalgų k.,
Vorupių k.,
Ėriškių k.,
Janionių k.,
Alančių k.,
Genėtinių k.,
Kutiškių k
Šilagalio k.,

BIRŽŲ RAJONE UŽDAROMŲ SĄVARTYNŲ SĄRAŠAS

Pučekalnės k.,
Germaniškio k.,
Bėčiūnų k.,
Užugulbinės k.,
Pagirių k.,
Pačeraukštės k.,
Kučgalio k.,
Kupreliškio k.,
Kvetkų k.,
Papilio k.,
Parovėjos k.,
Medikių k.,
Užušilių k.,
Anglininkų k.,
Kratiškių k.,
Ožkiniškių k.,
Gaižiūnų k.,
Račgalių k.,
Ančiškių k.,
Meiliūnų k.,
Šukionių k.,

ROKIŠKIO RAJONE UŽDAROMŲ SĄVARTYNŲ SĄRAŠAS

Remeikių k
Ruzgų k.
Dauliūnų k.
Kalvių k.,
Vainaikių k
Kalpokų k.
Kriaunų k.
Petrašiūnų k.,
Šetekšnų k.,
Pandėlio k.,
Sriubiškių k.,
Pakriaunių k
Audronių k
Čedosų k.

PASVALIO RAJONE UŽDAROMŲ SĄVARTYNŲ SĄRAŠAS

Levaniškio k.
Liukpetrių k.
Kelmučių k.
Miežiūnų k.
Deveitonių k.
Ditčiūnų k.
Kubiliūnų k.
Vaškų k.

KUPIŠKIO RAJONE UŽDAROMŲ SĄVARTYNŲ SĄRAŠAS

Virbališkių k.,
Paberžės k.,
Didžprūdėlių k.,
Darsiškių k.,
Repeniškio k.,
Daukučių k.,
Pabūdžių k.,
Paprūdžių k.,
Didžiagrašių k.,
Kreipšių k
Laičių k.,
Skapiškio k.,
Čivonių k.
Valakų k.,
Lukonių k,.
Paryžės k,.
Miliūnų k.,
Juodpėnų k.,
Naujikų k.,
Raugštonių k.,
Migonių k.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

UAB „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
APVA
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
sanglaudos fondas

Naujasis Panevėžio regiono sąvartynas jau veikia

Panevėžio regione baigiamas įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir LR Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". Nuo šių metų liepos 16 dienos pradėjo veikti naujasis Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų kaime. Naujasis sąvartynas pastatytas ir įrengtas pagal Europos Sąjungos aplinkosaugos reikalavimus.

Siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos, sąvartyno dugno konstrukcija įrengta iš hidroizoliacinio sluoksnio (sutankintas natūralus gruntas, geosintetinio molio sluoksnis, geomembrana, apsauginė geotekstilė, drenuojantis sluoksnis (žvyras)). Tiek sąvartyno šlaitai, tiek dugnas įrengti taip, jog bet koks taršos patekimas į paviršinius ar požeminius vandenis, dirvožemį yra neįmanomas, taip pat nėra žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Į naująjį regioninį sąvartyną yra vežamos atliekos iš visos Panevėžio apskrities, jas iš gyventojų surenka ir pristato atliekų surinkėjai/vežėjai, pasirašę komunalinių atliekų surinkimo sutartis su Panevėžio regiono savivaldybėmis. Juridiniai asmenys gali savo atliekas pristatyti patys, pasirašę atliekų tvarkymo sutartį su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Į naująjį Panevėžio regioninį sąvartyną atliekas gali atvežti ir gyventojai. ***Sąvartynas dirba kiekvieną dieną nuo 8 iki 20 val.***

Pagal šiuo metu gali[illegible] nius, už mišrių kom[illegible] priėmimą reikia s[illegible] be PVM už toną, [illegible] laužą (plytos, bet[illegible] 13 Lt/t be PVM, už kitas atliekas – 47,38 Lt/t be PVM.

Fiziniai ir juridiniai asmenys atvežę atliekas į Panevėžio regioninį sąvartyną, turi užpildyti nustatytos formos atliekų priėmimo deklaraciją.

Sąvartyno vadovas Vilius Mulevičius
El. p. savartynas@pratc.lt

UAB PANEVĖŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Direktorius • Arturas Grucė
direktorius@pratc.lt

Vyr. buhalterė • Dovilė Kulbienė
buhalterija@pratc.lt

Projekto administratorius • Vaidas Peledcas
pratc@pratc.lt

Eksploatacijos inžinierius • Gintautas Ulys
eksploatacija@pratc.lt

Beržų g. 44, Panevėžys
Tel./ faks. 8 45 432199

info@pratc.lt
www.pratc.lt

VALSTYBINIO AUDITO
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čeplėjienė

4 UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS · APVA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA · sanglaudos fondas

303 priedas

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

sanglaudos fondas

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: 3 ngenis „mūsų gerovė"

Apie mus
Atliekų tvarkymo sistema
Viešieji pirkimai
Testai žinioms patikrinti
Nuotraukų galerija
Versija neįgaliems

Baigiamas įgyvendinti projektas "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

2010-10-12

Dvarininkų kaime įrengtas visus ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkantis Panevėžio regioninis sąvartynas. Sukurta racionali atliekų tvarkymo sistema, tenkinanti visuomenės poreikius bei užtikrinanti aplinkos kokybę.

Projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pradėta įgyvendinti 2005-aisiais. Per penkmetį sukurta racionali atliekų tvarkymo sistema, nepažeidžianti rinkos ekonomikos, be to, įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimai atliekų tvarkymo srityje. Panevėžio regioninio sąvartyno I sekcija Dvarininkų kaime užima 6 hektarus ir yra visiškai saugi – dugną sudaro šeši specialūs sluoksniai, skirti sulaikyti sąvartyne susikaupiantį vandenį, jos turėtų užtekti 5–6 metams.

Į sąvartyną, oficialiai atidarytą 2009 metų liepos 16 dieną, gabenamos atliekos iš visos Panevėžio apskrities. Per 5 metus apskrities rajonų centruose: Panevėžyje, Pasvalyje, Rokiškyje, Biržuose ir Kupiškyje įrengtos 5 didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės. Tuose pačiuose miestuose veikia penkios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Be to, įrengtos dvi atliekų perkrovos stotys Biržuose ir Rokiškyje, jų paskirtis – perkrauti mišrias komunalines atliekas, surenkamas iš gyventojų. Minėtose perkrovos stotyse atliekos presuojamos ir gabenamos į regioninį sąvartyną. Per penkerius metus iš projektui įgyvendinti skirtų lėšų įsigyta atliekų tvarkymo įranga, kiti reikalingi įrengimai, uždarytas ir rekultivuotas senasis Panevėžio miesto sąvartynas. Nuo Panevėžio regioninio sąvartyno eksploatavimo pradžios - praėjusių metų liepos 16 dienos iki šių metų rugsėjo 1 dienos – priimta 90 tūkstančių 493 tonos atliekų. Vien per 2010 metų aštuonis mėnesius į regioninį sąvartyną pristatyta 52 tūkstančiai 671 tona atliekų. Panevėžio regione esančiose penkiose didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse, pradėtose eksploatuoti pernai liepą, iš gyventojų nemokamai per 2009 metų antrąjį pusmetį surinkta ir sutvarkyta 776,57 t didžiųjų, statybinių ir pavojingų atliekų, o per šių metų sausio–rugpjūčio mėnesius į šias aikšteles iš gyventojų nemokamai surinkta ir sutvarkyta 974,37 t atliekų. Į penkias įrengtas žaliųjų atliekų kompostavimo
aikšteles iš gyventojų nemokamai priimamos žaliosios kompostuojamosios atliekos - žolė, lapai, medžių ir krūmų šakos, augalų šaknys, pjuvenos, drožlės. Per praėjusių metų antrąjį pusmetį Panevėžio regione esančiose žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse priimta 2518 tonų biologiškai suyrančių atliekų. 2010 metų sausio–rugpjūčio mėnesiais į šias aikšteles tokių atliekų surinkta 1634,15 tonos. Bendrovės Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Arturas Grucė teigė, kad penkių didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo ir tiek pat žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas Panevėžio regiono rajono centruose pasiteisino. „Gyventojai ne tik domisi, – aiškino jis, – kaip veikia didysis sąvartynas Dvarininkų kaime, bet ir noriai naudojasi įrengtomis didžiųjų bei pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėmis. Juolab kad mes visi suvokiame - rūšiuoti atliekas būtina, o gamtą ypač reikia saugoti nuo pavojingų atliekų."

Įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", kartu vykdyta visuomenės informavimo ir švietimo programa. Buvo atliktos keturios sociologinės apklausos, surengti 42 susitikimai su Panevėžio regiono bendruomenėmis. Jų metu pristatytas projektas, susipažinta su gyventojų lūkesčiais, esamomis atliekų tvarkymo problemomis. Be to, surengti keturi konkursai ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams, tikslas - suaktyvinti jaunosios kartos domėjimąsi atliekų tvarkymo klausimais. Beje, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro planuose – sutvarkyti 94 Panevėžio apskrityje esančius senus sąvartynus ir šlukšlynus (Panevėžio rajone – 30, Rokiškio rajone – 14, Pasvalio rajone – 8, Kupiškio rajone – 21, Biržų rajone – 21). Dar planuojama įrengti tris didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės Panevėžio miesto, Panevėžio rajono ir Biržų rajono savivaldybių teritorijose, vieną žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

Pradėta kurti 2005 metais Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema – tai vienas didžiausių aplinkosaugos projektų Panevėžio apskrityje. Jam įgyvendinti skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Didžiąją dalį projektui reikalingų lėšų – net 57 milijonus litų – skyrė Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, dar 10 milijonų litų yra skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

© www.pratc.lt Cituojant būtina nurodyti šaltinį
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Beržų g. 44, Panevėžys
Tel./faks. 8 45 432199
info@pratc.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

JAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Home / Naujienos... http://www.pratc.lt/?id=newsmanager&s=k2&news=fa4525ed5e&l...

304 priedas

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

sanglaudos fondas

Naujienos | Kontaktai

- Apie mus
- Atliekų tvarkymo sistema
- Viešieji pirkimai
- Testai žinioms patikrinti
- Nuotraukų galerija
- **Versija neįgaliems**

Panevėžio regioniniame sąvartyne – edukacinė švietėjiška ekskursija

2010-10-26

Grūžių krašto kaimo bendruomenės jaunimo iniciatyvinė grupė įgyvendindama ES programos „Veiklus jaunimas" finansuojamą projektą „Jaunimas – žalia jėga" 2010 m. spalio 1 d. Grūžių vaikų globos namų auklėtiniams ir Grūžių pagrindinės mokyklos moksleiviams organizavo edukacinę – švietėjišką ekskursiją. Vienos dienos pažintinė ekskursija buvo organizuojama į UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, kuris įgyvendindamas ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą investicinį projektą sukūrė optimalią atliekų tvarkymo sistemą.

Pirmiausia ekskursijos dalyviai apžiūrėjo atliekų rūšiavimo liniją

ir naujojo regioninio sąvartyno pirmąją atliekų sekciją.

Čia šiukšlės atvežamos iš Panevėžio miesto ir rajono bei iš Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų, kur prieš metus buvo uždaryti visi sąvartynai. Apie naująjį regioninį sąvartyną, ir atliekų rūšiavimo liniją ekskursijos dalyviams, papasakojo UAB PRATC darbuotojas, sąvartyno vadovas, Vilius Mulevičius, lydėjęs jaunimą po visą teritoriją ir atsakęs į daugybę klausimų.

Visa Panevėžio regiono sąvartyno teritorija pavyzdingai sutvarkyta, aptverta metaline tvora, yra procesų automatinis valdymas, teritorija stebima vaizdo kameros. Centre įrengtas modernus administracijos pastatas, kuriame dirba daug specialistų ir kitų darbuotojų.

Sekantis apžiūrėtas objektas buvo kompostavimo aikštelė. Čia ekskursijos dalyviai iš arti pamatė iš ko, ir kaip, daromas parduotuvėse perkamas kompostas gėlių ir daigų sodinimui. Čia suvežamos pasenusios daržovės, nupjauta vejų žolė, lapai, medžių šakos, viskas susmulkinama ir pūdoma tvarkinguose kaupuose. Pasirodo, kad kompostą nesunku pasigaminti ir namuose. Apie kompostavimo aikštelės veikimo principus ir senojo Panevėžio miesto sąvartyno uždarymą pasakojo UAB PRATC darbuotojas, projekto administratorius, Vaidas Peleckas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-2
Aldona Čepiėjienė

Didžiulio ekskursijos dalyvių dėmesio sulaukė įspūdingai atrodantis uždarytas, senojo Panevėžio miesto sąvartyno, atliekų kaupas, kurio vienas iš uždarymo darbo projekto rengėjų buvo projekto „Jaunimas – žalia jėga" koordinatorius, Vytautas Urbikas. Jis jaunimui papasakojo, kaip šiukšlės buvo apdengtos, kad jos nebeterštų aplinkos, kaip iš jų surenkamos biodujos. Taip pat supažindino

JAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Home / Naujienos... http://www.pratc.lt/?id=newsmanager&s=k2&news=fa4525ed5e&l...

su atliekų tvarkymo ypatumais Lietuvoje ir apie naudą jas rūšiuojant ir perdirbant.
Po įdomaus pasakojimo ir pasivaikščiojimo po didžiulį kalną jaunimui buvo leista nusileisti nuo 20 metrų aukščio senojo atliekų kaupo šlaito. Ekskursijos dalyviai sunkiai galėjo patikėti, kad po jų kojomis esantis kalnas tai – tūkstančiai tonų buitinių atliekų!

© www.pratc.lt Cituojant būtina nurodyti šaltinį
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Beržų g. 44, Panevėžys
Tel./faks. 8 45 432199
info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011 -06- 29

JAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Home / Naujienos... http://www.pratc.lt/?id=newsmanager&s=k2&news=b2ca4ca9a7&l...

305 priedas

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Sanglaudos fondas

"Europos Sąjungos Sanglaudos fondas. Žingsnis į mūsų gerovę"

- Apie mus
- Atliekų tvarkymo sistema
- Viešieji pirkimai
- Testai žinioms patikrinti
- Nuotraukų galerija
- **Versija neįgaliems**

Tinkamai tvarkykime naudotas automobilių padangas

2010-10-27

Nuo lapkričio visi Lietuvos vairuotojai privalės vasarines automobilių padangas pakeisti žieminėmis. Kaip ir kiekvieną rudenį keičiant ratus kyla klausimas: kur dėti nebetinkamas naudoti padangas?

Dažnai padangos sumetamos į konteinerius arba paliekamos šalia jų. Taip daugiabučių kiemuose ar pakelėse, pamiškėse susiformuoja nedideli padangų sąvartynai. Naudotas padangas vis dar bandoma sudeginti. Liepsnojančią gumą sunku užgesinti, o degantis didelis padangų kiekis kenkia aplinkai ir gyventojų sveikatai, nes išsiskiria vėžį sukeliančios medžiagos. Automobilių padangos yra specifinės atliekos ir jų į bendrus sąvartynus vežti negalima – reikia atiduoti į specialias surinkimo aikštelės.

Priminame gyventojams, kad UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras didžiųjų atliekų priėmimo aikštelėse iš gyventojų **nemokamai** priimamos po 4 naudotas automobilių padangas.

Didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių adresai: Panevėžyje, Savitiškio g. 12; Pasvalyje, Mūšos g. 128; Biržų raj., Biržų km.; Kupiškyje, Technikos g. 61; Rokiškyje, Donelaičio g. 16.

Aikštelių darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 10–18 val., šeštadieniais 9–14 val., pietų pertrauka 14–15 val.

© www.pratc.lt Cituojant būtina nurodyti šaltinį
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Beržų g. 44, Panevėžys
Tel./faks. 8 45 432199
info@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-29

.upiškio rajono savivaldybė http://www.kupiskis.lt/index.php/lt/67253/

306 priedas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Naujienos Rajonas Struktūra ir kontaktai Veikla Paslaugos, informacija Teisinė informacija Klausimai Nuorodos

English По русски Paieška Įveskite žodį

» Titulinis » Naujienos » Savivaldybės aktualijos » Kur priimamos didžiosios, pavojingos, žaliosios ir kitos atliekos?

Naujienos

- » Savivaldybės aktualijos
- » Renginiai
- » Skelbimai, konkursai
- » Prenumerata

Kur priimamos didžiosios, pavojingos, žaliosios ir kitos atliekos?

2010-06-28

Gyventojų dėmesiui
Kur priimamos didžiosios, pavojingos, žaliosios ir kitos atliekos?

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras atliekų surinkimo aikštelėje Technikos g. 6I, Kupiškyje priima iš gyventojų didžiąsias bei buityje susidarančias pavojingas atliekas. Pavojingoms buitinėms atliekoms priskiriamos nuodingos, degios, sprogstančios, chemiškai aktyvios kenksmingos žmogaus sveikatai ir aplinkai medžiagos: gyvsidabrio lempos, dažų, lakų, tirpiklių atliekos ir jų tara, galvaniniai elementai, asbesto atliekos, naftos produktų atliekos bei naftos produktais užteršti skudurai, pjuvenos, poplerius, naudoti tepalo filtrai, rūgštys, buityje naudojami plovikliai, naudotos alyvos.

Iš gyventojų taip pat priimamos ir namų ūkio atliekos: smulkios statybos ir griovimo atliekos, automobilių padangos (du komplektai per metus), makulatūra, plastiko, stiklo atliekos, buitinė technika, baldai. Aikštelės darbo laikas: pirmadieniais –penktadieniais nuo 10 iki 18 val. Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. šeštadieniais nuo 9 iki 14 val.

Žaliosios atliekos (žolė, lapai, medžių ir krūmų šakos, pjuvenos ir kt.) priimamos žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje Didžiagrašių k., Noriūnų sen. Kupiškio r. Aikštelės darbo laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais nuo 9 iki 15 val. (nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 15 d.)

Atvežtos į aikštelės rūšiuotos atliekos iš gyventojų, kurie yra sudarę sutartis su atliekų vežėjais, priimamos nemokamai.

Gyventojai nepavojingas atliekas gali pristatyti ir į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų km., Miežiškių sen., Panevėžio raj., kiekvieną dieną nuo 8 iki 20 val. Mišrių komunalinių atliekų priėmimo įkainis – 59,22 Lt už toną.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, tel. (8 45) 432199
www.pratc.lt

Savivaldybės aktualijų paieška

Savivaldybės naujienos

2011-01-03
Informacija statinių savininkams dėl statinių naudojimo ir priežiūros

2011-01-03
Skapagirio miške - trichineliozės židinys

2011-01-04
Kviečiame dalyvauti pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija"

2011-01-07
Vėluos socialinių išmokų mokėjimas

2011-01-14
Minėjome Laisvės gynėjų dienos 20 -metį

2011-01-17
Socialinės pašalpos už gruodį bus išmokėtos šiandien

2011-01-19
Išperkami sodininkų bendrijų elektros tinklai

2011-01-20
Policija įspėja apie sukčių skambučius

2011-01-21
Renginamas Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginis planas

2011-01-24
Informacija gyventojams dėl pirminės nemokamos teisinės pagalbos

Iš viso: 12 1 | 2

© 2006 Kupiškio rajono savivaldybė. Sprendimas: Linkarta, Idea.lt.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

sanglaudos fondas

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

APVA

Regioninis sąvartynas veikia visu pajėgumu

Dvarininkų kaime įrengtas visus ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkantis Panevėžio regioninis sąvartynas. Sukurta racionali atliekų tvarkymo sistema, tenkinanti visuomenės poreikius bei užtikrinanti aplinkos kokybę.

Raimonda MIKUČIONYTĖ

* * *

Projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pradėta įgyvendinti 2005-aisiais. Per penkmetį sukurta racionali atliekų tvarkymo sistema, nepažeidžianti rinkos ekonomikos, be to, įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimai atliekų tvarkymo srityje. Panevėžio regioninio sąvartyno I sekcija Dvarininkų kaime užima 6 hektarus ir yra visiškai saugi – dugną sudaro šeši specialūs sluoksniai, skirti sulaikyti sąvartyne susikaupiantį vandenį, jos turėtų užtekti 5–6 metams.

I sąvartyną, oficialiai atidarytą 2009 metų liepos 16 dieną, gabenamos atliekos iš visos Panevėžio apskrities. Per 5 metus apskrities rajonų centruose: Panevėžyje, Pasvalyje, Rokiškyje, Biržuose ir Kupiškyje įrengtos 5 didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės. Tuose pačiuose miestuose veikla penkios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Be to, įrengtos dvi atliekų perkrovos stotys Biržuose ir Rokiškyje, jų paskirtis – perkrauti mišrias komunalines atliekas, surenkamas iš gyventojų. Minėtose perkrovos stotyse atliekos presuojamos ir gabenamos į regioninį sąvartyną. Per penkerius metus iš projektui įgyvendinti skirtų lėšų įsigyta atliekų tvarkymo įranga, kiti reikalingi įrengimai, uždarytas ir rekultivuotas senasis Panevėžio miesto sąvartynas.

Nuo Panevėžio regioninio sąvartyno eksploatavimo pradžios – praėjusių metų liepos 16 dienos ir šių metų rugsėjo 1 dienos – priimta 90 tūkstančių 493 tonos atliekų. Vien per 2010 metų aštuonis mėnesius į regioninį sąvartyną pristatyta 52 tūkstančiai 671 tona atliekų.

Panevėžio regione esančiose penkiose didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse, pradėtose eksploatuoti pernai liepą, iš gyventojų nemokamai per 2009 metų antrąjį pusmetį surinkta ir sutvarkyta 776,57 t didžiųjų, statybinių ir pavojingų atliekų, o per šių metų sausio–rugpjūčio mėnesius į šias aikštelės iš gyventojų nemokamai surinkta ir sutvarkyta 974,37 t atliekų.

I penklas įrengtas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės iš gyventojų nemokamai priimamos žaliosios kompostuojamosios atliekos – žolė, lapai, medžių ir krūmų šakos, augalų šaknys, pjuvenos, drožlės. Per praėjusių metų antrąjį pusmetį Panevėžio regione esančiose žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse priimta 2518 tonų biologiškai suyrančių atliekų. 2010 metų sausio–rugpjūčio mėnesiais į šias aikštelės tokių atliekų surinkta 1634,15 tonos.

Bendrovės Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Arturas Gruodė teigė, kad penkių didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo ir tiek pat žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas Panevėžio regiono rajono centruose pasiteisino. „Gyventojai ne tik domisi, – aiškino jis, – kaip veikia didysis sąvartynas Dvarininkų kaime, bet ir noriai naudojasi įrengtomis didžiųjų bei pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėmis. Juolab kad mes visi suvokiame – rūšiuoti atliekas būtina, o gamtą ypač reikia saugoti nuo pavojingų atliekų. Todėl norėčiau priminti, kad pavojingas atliekas panevėžiečiai gali vežti į aikštelę Savitiškio gatvėje 12, o žaliąsias – į įrengtą aikštelę Dvarininkų kaime."

Įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", kartu vykdyta visuomenės informavimo ir švietimo programa. Buvo atliktos keturios sociologinės apklausos, surengti 42 susitikimai su Panevėžio regiono bendruomenėmis. Jų metu pristatytas projektas, susipažinta su gyventojų lūkesčiais, esamomis atliekų tvarkymo problemomis. Be to, surengti keturi konkursai ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams, tikslas – suaktyvinti jaunosios kartos domėjimąsi atliekų tvarkymo klausimais.

Beje, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro planuose – sutvarkyti 94 Panevėžio apskrityje esančius senus sąvartynus ir šiuo kriterijumi Panevėžio rajone – 30, Rokiškio rajone – 14, Pasvalio rajone – 8, Kupiškio rajone – 21, Biržų rajone – 21). Dar planuojama įrengti tris didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės Panevėžio miesto, Panevėžio rajono ir Biržų rajono savivaldybių teritorijose, vieną žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

Pradėta kurti 2005 metais Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema – tai vienas didžiausių aplinkosaugos projektų Panevėžio apskrityje. Jam įgyvendinti skirta daugiau nei 67 milijonai litų. Didžiąją dalį projektui reikalingų lėšų – net 57 milijonus litų – skyrė Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, dar 10 milijonų litų yra skirti iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Aldona Gaižutienė

2011-09-07

30 priedas

SPB

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Užsakovas – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.

Kompleksas – Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.

Objektas – gyvenamųjų namų arti kelio, vedančio į regioninį sąvartyną, langų ir durų keitimas ir teritorijos prie kelio Panevėžys-Miežiškiai, ties Liūdynės gyvenviete, apželdinimas.

Adresas – Liūdynės k., Panevėžio r.

Kelias į naująjį regioninį sąvartyną eina per Liūdynės gyvenvietę. Pradėjus eksploatuoti naują regioninį sąvartyną, siekiant sumažinti poveikį aplinkai ir nepatogumus, padidėjus eismo srautui, atsižvelgiant į gyventojų prašymus bei remiantis Panevėžio rajono savivaldybės sprendimu, numatyta įstatyti padidintos akustinės izoliacijos langus bei duris šalia kelio, einančio į naują regioninį sąvartyną, esančiuose namuose.

Iškilus ginčytinam klausimui, kokiu atstumu nuo kelio langai turėtų būti keičiami, Panevėžio apskrities viršininko įsakymu buvo sudaryta gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos komisija, kuriai buvo pavesta nustatyti gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos kriterijus bei sudaryti sąrašą.

Panevėžio visuomenės sveikatos centras atliko triukšmo lygio nustatymo matavimus Liūdynėje, prie esančio vandens gręžinio bei 10 gyvenamųjų namų, esančių Liūdynės bei Pakalnių kaimuose. Gauti triukšmo matavimo protokolai, kuriuose pateikiamos išvados, kad maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo lygiai neviršija HN 33-1:2003 leidžiamų triukšmo lygių 6-18 val. Nutarta kreiptis į Aplinkos ministeriją ir Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl techninės specifikacijos 2 priedo „Langų ir durų keitimo Liūdynės ir Pakalnių kaimuose, Panevėžio rajone, sąrašas" papildymo Liūdynės kaimo 4 gyvenamaisiais namais, esančiais pakeliui į regioninį sąvartyną ir patenkančiais į 100m zoną nuo kelio briaunos.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-29
Aldona Čaplėjienė

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Įmonė		Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
SPB		PV	Raimundas Pilkauskas	1856		2007-05
			Daiva Bručienė			2007-05

Kompleksas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
Panevėžio regioninis savartynas. Dvarininkai k., Panevėžio r.

P/0243-TP AD

SPB

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija išnagrinėjusi situaciją pateikė atsakymą, kad langai ir durys turi būti pakeisti šiems namų savininkams:

1. Z.Karvelienei;
2. V.Zaurai;
3. A.Vėberiui;
4. G.Polikevičiui;
5. G.Stankevičiui;
6. P.Petruliui;
7. A.Krivickui.

Gauti šių gyventojų sutikimai, kad jiems būtų keičiami langai bei durys, atlikti keičiamų langų bei durų matavimai, padarytos nuotraukos.

Likusiems namų savininkams, kurie gyvena ne šalia kelio, vedančio į regioninį sąvartyną, langai ir durys, pagal projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", negali būti keičiami, nes šios išlaidos būtų laikomos netinkamomis. Atsižvelgiant į tai, kad šio projekto įgyvendinimas nuo pat pradžių buvo komplikuotas ir gyventojai prieštaravo naujo regioninio sąvartyno įrengimui, siekiant išvengti didesnių konfliktų ateityje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija siūlo namų savininkams, kurie gyvena šalia kelio, vedančio į regioninį sąvartyną, langus ir duris pakeisti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras arba savivaldybių lėšomis.

Svarbi priemonė, mažinanti poveikį aplinkai – medžių sodinimas gyvenvietėje pagal kelią, vedantį į regioninį sąvartyną. Želdiniai sulaiko ir sugeria triukšmą tarsi filtras. Pavyzdžiui, 500 Hz dažnio garso bangos, patekusios į medžių arba krūmų lajas, susiduria su akustine kliūtimi nuo kurios atsimuša apie 32% garso energijos, o kita dalis – 68% – susigeria, nes įvairiomis kryptimis orientuoti lapai išsklaido garso bangas, o elastingi lapkočiai silpnina garso bangų energiją.

Triukšmo slopinimo juostoms geriausiai tinka aukšti, tankūs ir smulkialapiai medžiai bei krūmai, tokie kaip paprastasis skirpstas, paprastasis skroblas, paprastasis bukas, grakščioji, sidabrinė ir mažalapė liepa, paprastasis lazdynas, skėstašakė slyva, vienapiestė gudobelė, raudonoji sedula, dygioji slyva, totorinis sausmedis, paprastasis ligustras, kalninis serbentas ir kt.

Panevėžio r. savivaldybės administracija kreipėsi į VĮ „Panevėžio regiono keliai" su prašymu suderinti medžių sodinimo vietą kelio Anykščiai-Troškūnai-Panevėžys ruožo kairėje pusėje, ties Liūdynės gyvenviete. VĮ „Panevėžio regiono keliai" pateikė suderinimo raštą ir nurodė vietą medžių sodinimui.

KOPIJA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Kompleksas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.

SPB

Panevėžio r. savivaldybės administracija išsiuntė prašymą gyventojai R.Naruševičienei leisti sodinti medžius asmeninio naudojimo žemės sklypo pakraštyje. Gavus neigiamą atsakymą, medžiai sodinami valstybinėje žemėje.

Numatoma sodinti 24 liepos mažalapės sodinukus 6,0 m atstumu vienas nuo kito. Sodinimo vieta paruošiama iškasant 0,5-0,7m gylio duobes, pridedant iki 50% augalinio dirvožemio. Medžių sodinimui tinkamas laikas – pavasaris arba ruduo. Po medelių pasodinimo pirmąjį vasaros sezoną juos prižiūrės ir laistys rangovas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Kompleksas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.

SPB

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PLASTIKINIAI LANGAI IR DURYS

Užsakovas – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.

Kompleksas – Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.

Adresas – Liūdynės k., Panevėžio r.

1. Bendrieji reikalavimai

PVC langų profiliai turi būti pagaminti (pagal EN ISO 9001) iš medžiagų, atitinkančių RAL-GZ 716/1 (arba Din 7746) arba adekvačių normų reikalavimus.

Profilių gamintojas turi nustatyti garantiją baltiems profiliams, ne mažiau 10 metų.

PVC profilių gamintojas privalo sužymėti profilius, nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilių pagaminimo datą.

PVC profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai ir vidutiškai agresyviai aplinkai.

PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, turi neišskirti į aplinką sveikatai potencialiai pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus.

PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Langai ir durys būti padidintos akustinės izoliacijos ir atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus.

Bendras langų šilumos pralaidumo koeficientas Uiang turi būti ne didesnis nei 1,9W/m^{2}K.

Langų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN ISO 9001, atspari vidutiniškai agresyviai aplinkai.

Visuose pirmo aukšto duryse ir languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai apsunkinantys uždaro lango varčios iškėlimą.

PVC langai privalo būti nepralaidūs vandeniui (pagal per EN 1027), kai oro slėgis Ap

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Įmonė		Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS"		PV	Raimundas Pilkauskas	1856		2007-04
			Daiva Bručienė			2007-04

TIKRA Skyriaus vedėja Aldona Čepienė 2011-06-21

Kompleksas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Panevėžio regiono [illegible]

SPB

yra iki 450Pa.

PVC langų kampinių sujungimo stiprio riba turi būti:

- staktoms, ne mažiau 5700N;
- varčioms, ne mažiau 4800N.

Langų garso izoliavimo rodiklis (pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 $R_w(C_9C_{tr})$ turi būti ne mažesnis nei 33 (-2;-6)dB.

Langų kostrukcija ir atidarymas turi būti suderinta su užsakovu.

Prieš pradedant darbus langų matmenis tikslinti vietoje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

Kompleksas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Panevėžio regiono

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTO GALIMYBIŲ STUDIJAI IR ŠIO PROJEKTO PARAIŠKAI SANGLAUDOS FONDUI

2005 m. kovo 25 d. Nr. T-740
5 šaukimo 21 posėdis
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) 7 str. 18 p., 11 str. 2 p., 17 str. 17 p. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr.519 "Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr.40-1499) bei atsižvelgdama į Panevėžio regiono plėtros tarybos 2005 m. kovo 7 d. sprendimą Nr.R-3 "Dėl priemonių Panevėžio rajono Liūdynės kaimo gyventojų gyvenimo kokybei gerinti" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2005 m. kovo 10 d. raštą Nr.(15-1)-D8-2001 "Dėl Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo" , rajono savivaldybės Taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto Galimybių studijai ir šio projekto paraiškai Sanglaudos fondui.
2. Įgalioti rajono savivaldybės merą Povilą Žagunį pasirašyti regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto paraišką Sanglaudos fondui.
3. Reikalauti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įtraukti į Panevėžio regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto Galimybių studiją:
   3.1. antrinio atliekų rūšiavimo linijos įrengimą;
   3.2. Liūdynės gyvenvietės parko sutvarkymą;
   3.3. teritorijos prie kelio Panevėžys – Miežiškiai ties Liūdynės kaimu apželdinimą;
   3.4. gyvenamųjų namų ir butų, arčiausiai esančių prie numatomo rengti buitinio atliekų tvarkymo sąvartyno bei pakeliui į Liūdynės sąvartyną, langų pakeitimą plastikiniais pagal veikiančias ES sanitarines normas ir gyventojų pageidavimus.
4. Reikalauti iš Panevėžio apskrities savivaldybių iki 2005 m. birželio 1 d. papildyti jungtinę veiklos sutartį, pasirašytą 2004 m. birželio 28 d. tarp Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų priemonėmis, priimtomis Panevėžio regiono plėtros Tarybos 2005 m. kovo 7 d. sprendime Nr.R2-3 "Dėl priemonių Panevėžio rajono Liūdynės kaimo gyventojų gyvenimo kokybei gerinti".
5. Tęsti derybas tarp Panevėžio regiono plėtros Tarybos ir Liūdynės kaimo bendruomenės dėl visiško Liūdynės kaimo sutvarkymo.
6. Pripažinti netekusiais galios rajono savivaldybės Tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr.T-487 "Dėl pritarimo Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto Galimybių studijai ir šio projekto paraiškai Sanglaudos fondui" 2 ir 3 punktus.

Savivaldybės meras
Povilas Žagunis

Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

T I K R A
2011 -06- 29

SPB
UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS"
UAB „STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS"
Kodas 147680287. J.Basanavičiaus g. 50, LT-36205 Panevėžys. Tel. (8~45) 50 82 59, faksas (8~45) 50 82 58.
E-paštas: biuras@erdves.lt

PROJEKTAS „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS"

UAB „Statinių projektavimo biuras" laimėjo konkursą ir pasirašė sutartį (pirkimo sutartis Nr.2006/32/ND/P/LT, 2006m. kovo 3d.) su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras ir Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas" vykdymo.

Sutartis finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.

Sutarties vykdymas apima visas Panevėžio apskrities savivaldybes: Panevėžio miesto, Panevėžio r., Rokiškio r., Pasvalio r., Kupiškio r. ir Biržų r. savivaldybes.

Kelias į naująjį regioninį sąvartyną eina per Liūdynės gyvenvietę ir Pakalnių kaimą. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, sukeliamą gabenant atliekas į sąvartyną, o būtent triukšmą ir nepatogumus, padidėjus eismo srautui, bei atsižvelgiant į gyvenvietės gyventojų prašymus, numatoma (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-740, 2005-03-25d.) remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštu Dėl projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas" Techninės specifikacijos 2 priedo sąrašo papildymo, langus ir duris pakeisti Liūdynės gyvenvietės gyventojams, gyvenantiems šalia kelio, vedančio į regioninį sąvartyną.

GYVENTOJAI SUTINKA KAD BŪTŲ KEIČIAMI LANGAI IR DURYS:

Eil. Nr.	Namo savininko vardas, pavardė	Adresas	Parašas
1	Z.Karvelienė	Liūdynės k.	
2	V.Zaura	Liūdynės k.	
3	A.Vėberis	Pakalnių k.	
4	G.Polikevičius	Liūdynės k.	
5	G.Stankevičius	Liūdynės k.	
6	P.Perulis	Liūdynės k.	
7	A.Krivickas	Liūdynės k.	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-06-29

Gauta:

2006 -10- 2 7

PANEVĖŽIO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

Raimundui Pilkauskui
UAB „Statinių projektavimo biuras“
direktoriui
J. Basanavičiaus g. 50
LT-36205 Panevėžys

2006-10-24
Nr. 10-2597-11.23.)-110
Nr.

DĖL PANEVĖŽIO REGIONO BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO

Siunčiame gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos komisijos 2006 m. spalio 16 d. posėdžio protokolą Nr. V1-1.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Apskrities viršininko pavaduotojas,
pavaduojantis apskrities viršininką

Alfonsas Pulokas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011 -06- 29

Rasa Daraškevičienė, (8 45 505763), el. p. r.daraskeviciene@pava.lt

Kodas 8860772
Respublikos g. 38
LT-5300 Panevėžys
Tel. (8-45) 50 57 00
Faks. (8-45) 46 55 17

320

GYVENAMŲJŲ NAMŲ, KURIEMS PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTO LĖŠOMIS BUS KEIČIAMI LANGAI IR DURYS, ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2006 m. spalio 16 d. Nr. V1-1
Panevėžys

Posėdžio pirmininkas – Arturas Grucė
Posėdžio sekretorė – Rasa Daraškevičienė

DALYVAVO:
Arturas Grucė – UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius, komisijos pirmininkas, Viktoras Grincevičius – Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktoriaus pavaduotojas, Angelė Plančiūnaitė - Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotoja, Sigita Biveinienė – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė, Albertas Činikas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, Daiva Bručienė – UAB „Statinių projektavimo biuras" Aplinkos apsaugos projektų vadovė, Vydmantas Gendvilas – VĮ „Panevėžio regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas, Gintautas Valkūnas – Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorius, Alfonsas Bakšys – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Velžio seniūnas, Titas Mindaugas Steponavičius – Panevėžio apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Rasa Daraškevičienė – Panevėžio apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ:
Gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos, sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos kriterijų nustatymas.

SVARSTYTA. Gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos kriterijai.
Arturas Grucė priminė, kad 2005 m. kovo 25 d. Panevėžio rajono savivaldybės Taryba sprendimo Nr. T-740 punktu 3.4. nusprendė reikalauti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įtraukti į Panevėžio regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto Galimybių studiją gyvenamųjų namų, arčiausiai esančių prie numatomo rengti buitinio atliekų tvarkymo sąvartyno bei pakeliui į Liūdynės sąvartyną, langų pakeitimą plastikiniais pagal veikiančias ES sanitarines normas ir gyventojų pageidavimus. 2005 m. gruodžio 8 d. Europos Komisija priėmė sprendimą pakeisti langus ir duris namams, esantiems palei kelią, vedantį į naująjį regioninį sąvartyną. Pristatė Aplinkos ministerijos poziciją šiuo klausimu, kad panaudotos lėšos bus pripažintos netinkamomis, jei langai ir durys bus keičiami namams, kurie nepatenka į sanitarinę apsaugos zoną ar yra ne Liūdynės kaime prie kelio, vedančio į naująjį regioninį sąvartyną. Priminė, kad anksčiau sudarytame sąraše yra 10 namų, iš kurių tik 2 yra Liūdynės kaime, kiti 8 – Pakalnių kaime. Paprašė pateikti pasiūlymus, kokiais kriterijais remiantis būtų galima atrinkti namus, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis būtų keičiami langai ir durys. Taip

KOPIJA TEISINGA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė 2011-06-29

pat paminėjo, kad Kauno apskrityje jau Galimybių studijoje buvo numatytas kriterijus, kuriuo remiantis buvo atrenkami namai, kuriems projekto lėšomis bus keičiami langai. Kriterijus – pirma eilė namų, esančių palei kelią, vedantį į Lapių regioninį sąvartyną.
Titas Mindaugas Steponavičius pažymėjo, kad Kauno apskrityje kelias į regioninį sąvartyną eina per pačią gyvenvietę. Ir jau Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje buvo nustatyta, kad triukšmas tikrai padidės. Dėl to numatyta pakeisti langus.
Viktoras Grincevičius pasiūlė atlikti triukšmo lygio matavimus. Pristatė metodiką, kaip yra atliekami triukšmo lygio matavimai.
Vydmantas Gendvilas pristatė anksčiau atliktų stebėjimų duomenis tam tikrame Liūdynės kaimo taške: per parą pravažiuoja 104 krovininiai automobiliai, 2048 lengvieji automobiliai, triukšmo lygis buvo 55 decibelai. Tačiau atidarius naująjį regioninį sąvartyną, eismo intensyvumas padidės.
Alfonsas Bakšys uždavė klausimą, o kas bus daroma su tais namais, kuriuose langus pasikeitė patys gyventojai savo lėšomis.

NUTARTA.

1. Remiantis 2005 m. kovo 25 d. Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-740 ir 2005 m. gruodžio 8 d. Europos Komisija sprendimu pakeisti langus ir duris namams, esantiems palei kelią, išskirti 2 etapai, kurių metu bus keičiami langai. 1 etapo metu planuojama pakeisti langus ir duris Liūdynės kaimo gyvenamiesiems namams, palei kelią vedantį į regioninį sąvartyną. 2 etapo metu planuojama keisti gyvenamųjų namų, esančių šalia regioninio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos, langus.

2. Kreiptis į Panevėžio visuomenės sveikatos centrą su paraiška užsakyti triukšmo lygio nustatymo matavimus prie Liūdynės kaime esančio vandens gręžinio ir šiems asmenims priklausantiems gyvenamiesiems namams Liūdynės ir Pakalnių kaimuose:

R. Janauskui ir R. Kvietkauskui;
V. Vaitkevičienei (anksčiau priklausė Ungailiui);
V. Zaurai;
E. Repšienei;
Z. Karvelienei;
O. Gurskiui ir A. Gurskienei;
Gudavičienei;
R. Stapulioniui;
J. Baltušnikienei.

3. Langai bus keičiami tik gyvenamiesiems pastatams.

4. Sekantį gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos komisijos posėdį organizuoti, iš Panevėžio visuomenės sveikatos centro gavus triukšmo lygio matavimų rezultatus.

Posėdžio pirmininkas Arturas Grucė

Posėdžio sekretorius Rasa Daraškevičienė

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

32

28 Nov 2006 14:54 HP LASERJET 3330

Gauta: 1

2006 -11- 28

PANEVĖŽIO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

Raimundui Pilkauskui
UAB „Statinių projektavimo biuras"
direktoriui
J. Basanavičiaus g. 50
LT-36205 Panevėžys

2006-11-28
[

Nr. 10-3668-(1.22)-10
Nr.

DĖL KOMISIJOS POSĖDŽIO

Kviečiame Jus į gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos komisijos posėdį š. m. lapkričio 30 d. 15 val. Panevėžio apskrities viršininko administracijoje (Respublikos g. 38, 2 aukšto salėje).

PRIDEDAMA. Triukšmo lygių matavimo protokolai. 2 lapai.

Apskrities viršininkė

Gema Umbrasienė

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 29

Rasa Daraškevičienė, (8 45 505763), el. p. r.daraskeviciene@pava.lt

Kodas 8860772
Respublikos g. 38
LT-5300 Panevėžys
Tel (8-45) 50 57 00
Faks. (8-45) 46 55 17
p.m.apskritis@pava.lt

32

Panevėžio VSC Laboratorinių tyrimų skyrius Respublikos g.13,Panevėžys, tel. 461081	**TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAS Nr. 2006/53-2/66**	PATVIRTINTA Panevėžio VSC direktoriaus 2004 09 06 įsakymu Nr.V-41 Laboratorijos atestavimo pažymėjimo Nr.PR-8 Užpildytų puslapių skaičius (2)

2006 m spalio mėn. 30 d.

1.Objekto pavadinimas,adresas: Panevėžio apskrities viršininko administracija , Respublikos g.38, Panevėžys.

2.Matuota prietaisu(tipas,Nr.patikros data,liudijimo Nr): Integruotas triukšmo ir vibracijos matuoklis 2239-B-001,Nr.2449161, 2006- 06- 20, Nr.0887030

3.Pagrindiniai triukšmo šaltiniai: transporto srautas.

4.Normatyviniai techniniai dokumentai matavimų atlikimui(žymuo): HN 33-1 2003 „Akustinis triukšmas Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai", „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos mažinimo patvirtinimo" 2005 balandžio 15d įsakymu Nr.A1-103/V-265

5.Matavimų rezultatai:

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Triukšmo pobūdis: Pagal spektrą Pl	Tn	Pagal laiko charakteristiką Ps	Sv	Pt	Im	Tr	Garso slėgio lygis dB oktaviniuose dažniuose 31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Bendras triukšmo lygis, dBA	Maksimalus garso lygis, dBA	Ekvivalentinis garso lygis, dBA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Romualdas Zaura, Liūdynės vienkiemis,Panevėžio raj.																			
1.1	Gyvenamasis kambarys. 8.30-9.00 val.	+				+			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	31
2.	Vidos Naujokienės sodyba. Pakalnių km.,Panevėžio raj.																			
2.1	Gyvenamasis kambarys. 9.05- 9.35 val.	+		+					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
3.	J.Baltušnikienės sodyba Liūdynės km. ,Panevėžio raj.																			
3.1	Gyvenamasis kambarys 10.10-10.40 val.	+		+					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30

Pastabos:Pl-plačiajuostis, Tn-toninis, Ps-pastovus,Sv-svyruojantis, Pt-pertrūkstantis, Im-impulsinis, Tr-transporto

6.Matavimus atliko(pareigos,vardas,pavardė,parašas): laborantė Violeta Šaparnienė

7.Išvados: *Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo lygiai neviršija HN 33-1:2003 leidžiamų triukšmo lygių 6-18 val. Leidžiamas maksimalaus triukšmo lygis - 55 dBA, ekvivalentinio triukšmo lygis - 40 dBA*

Pareigos,vardas,pavardė,parašas: Panevėžio VSC Gydytojas-apskrities vyriausiojo higienės ekspertas E. VIŠČINSKAS **Data:** 2006-10-31

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Panevėžio VSC Laboratorinių tyrimų skyrius Respublikos g.13, Panevėžys, tel.467963	**TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAS Nr.2006/53-1/57**	PATVIRTINTA Panevėžio VSC direktoriaus 2004 09 06 įsakymu Nr.V-41,2005 12 16,PR-8 Laboratorijos atestavimo pažymėjimas Nr.54 užpildytų puslapių skaičius (1)

2006 m.spalio mėn.30d.

1.Objekto pavadinimas, adresas: Panevėžio apskrities viršininko administracija,Respublikos g.38,Panevėžys.

2.Matuota prietaisu (tipas, Nr. patikros data, liudijimo Nr.): Integruotas triukšmo ir vibracijos matuoklis2239-B-001,Nr.2449161,2006 06 20,Nr.0887030.

3.Pagrindiniai triukšmo šaltiniai: mašinų keliamas,buitinis triukšmas.

4.Normatyviniai techniniai dokumentai matavimų atlikimui (žymuo): HN 33-1 2003"Akustinis triukšmas.Leidžiami lygiai gyvenamoje ir darbo aplinkoje.Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai".LST ISO 1999."Akustika.Darbo vietų triukšmo ekspozicijos nustatymas ir klausos pablogėjimo dėl triukšmo poveikio įvertinimas."

5. Matavimų rezultatai:

Eil.Nr.	Matavimo vieta	Triukšmo pobūdis: pagal spektrą Pl	Tn	pagal laiko charakteristiką Ps	Sv	Pt	Im	Tr	Garso slėgio lygis dB oktaviniuose dažniuose 31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Bendras triukšmo lygis, dBA	Maksimalus garso lygis, dBA	Ekvivalentinis garso lygis, dBA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Liūdynės kaimas. E.Rapševičienės gyv.namas.																			
1.1	Miegamasis kambarys(08,33-08,43)	+		+					N	E	M	A	T	U	O	T	A	Nema tuota	Nema Tuota	29,8
2	R.Janausko gyv.namas.																			
2.1	Gyvenamasis kambarys(09,14-09,24)	+		+					N	E	M	A	T	U	O	T	A	Nema Tuota	Nema Tuota	29,9
3.	A.Karvelio gyv.namas																			
3.1	Vaikų kambarys(09,34-10,04))	+				+			N	E	M	A	T	U	O	T	A	Nema Tuota	Nema Tuota	40,9
4	P.Petrulio gyv.namas,Parko g.3.																			
4.1	Vaikų kambarys(10,28-10,58)	+				+			N	E	M	A	T	U	O	T	A	Nema Tuota	46,6	33.3

Pastabos : Pl-plačiajuostis, Tn-toninis, Ps-pastovus, Sv-svyruojantis, Pt-pertrūkstantis, Im-impulsinis, Tr-transporto

6.Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): Rasytė Benaitienė

7.Išvados. *Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo lygiai neviršija HN 33-1:2003 leidžiamų triukšmo lygių 6-18 val. Maksimalaus triukšmo leidžiamas lygis – 55 dBA, ekvivalentinio triukšmo lygis – 40 dBA*

pareigos, vardas, pavardė, parašas: Panevėžio VSC Gydytojas-apskrities vyriausiojo higienės ekspertas E. VIŠČINSKAS **Data:** 2006-10-31

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

Gauta:
2006 -12- 21

PANEVĖŽIO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

Pagal pridedamą sąrašą

2006-12-20 Nr. 20-3544-(1.20.)-110
Į Nr.

DĖL KOMISIJOS POSĖDŽIO

Siunčiame gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos komisijos 2006 m. lapkričio 30 d. posėdžio protokolą Nr. V1-2.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Apskrities viršininkė Gema Umbrasienė

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

Rasa Daraškevičienė, (8 45 505763), el. p. r.daraskeviciene@pava.lt

Kodas 188607727
http://www.pava.lt
Respublikos g. 38
35173 Panevėžys
Tel. (8-45) 50 57 00
Faks. (8-45) [illegible]

GYVENAMŲJŲ NAMŲ, KURIEMS PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTO LĖŠOMIS BUS KEIČIAMI LANGAI IR DURYS, ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. V1-2
Panevėžys

Posėdžio pirmininkas – Arturas Grucė
Posėdžio sekretorė – Rasa Daraškevičienė

DALYVAVO:
Arturas Grucė – UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius, komisijos pirmininkas, Eugenijus Vilčinskas – Panevėžio visuomenės sveikatos centro gydytojas - apskrities vyr. higienos ekspertas, Sigita Biveinienė – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė, Albertas Činikas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, Raimundas Pilkauskas – UAB „Statinių projektavimo biuras" direktorius, Vydmantas Gendvilas – VĮ „Panevėžio regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas, Gintautas Valkūnas – Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorius, Alfonsas Bakšys – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Velžio seniūnas, Titas Mindaugas Steponavičius – Panevėžio apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Virginijus Tamošiūnas – Liūdynės kaimo gyventojų bendruomenės centro „Pastogė" pirmininkas, Rasa Daraškevičienė – Panevėžio apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ:
Gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos kriterijų nustatymas.

T. I. K. R. A
Skyriaus vedėja
2011-06-2.
Aldona Čeplėjienė

SVARSTYTA. Gyvenamųjų namų, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys, atrankos kriterijai.

Arturas Grucė priminė, kad spalio 16 d. vykusiame posėdyje buvo nuspręsta kreiptis į Panevėžio visuomenės sveikatos centrą su prašymu atlikti triukšmo lygių matavimus 10 sodybų. Spalio 31 d. ryte ir dieną atlikti triukšmo lygio matavimai. Gauti triukšmo matavimo protokolai Nr. 2006/53-1/57 ir Nr. 2006/53-2/66, kuriuose pateikiamos išvados, kad maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo lygiai neviršija HN 33-1:2003 leidžiamų triukšmo lygių 6-18 val.

Arturas Grucė priminė, kad 2005 m. kovo 25 d. Panevėžio rajono savivaldybės Taryba sprendimo Nr. T-740 punktu 3.4. nusprendė reikalauti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos į Panevėžio regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto Galimybių studiją įtraukti gyvenamųjų namų ir butų, arčiausiai esančių prie numatomo rengti buitinio atliekų tvarkymo sąvartyno bei pakeliui į Liūdynės sąvartyną, langų pakeitimą plastikiniais pagal veikiančias ES sanitarines normas ir gyventojų pageidavimus. Paminėjo, kad projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektavimo ir konkursinės dokumentacijos

parengimas (sutarties Nr. 2006/32/ND/P/LT)“ techninės specifikacijos 2 priede pateiktame Langų ir durų keitimo Liūdynės ir Pakalnių kaimuose Panevėžio rajone sąraše yra tik 3 sodybos, esančios palei kelią vedantį į regioninį sąvartyną, iš kurių tik 2 sodybos yra Liūdynės kaime, nors kelias į regioninį sąvartyną eina per Liūdynės kaimą. 2005 m. gruodžio 8 d. Europos Komisija priėmė sprendimą pakeisti langus Liūdynės gyvenvietės gyventojams. Paprašė pateikti pasiūlymus, kokiais kriterijais remiantis būtų galima atrinkti namus, kuriems Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys.

Vydmantas Gendvilas paminėjo, kad kelininkai namams patenkantiems į kelio apsauginę zoną (šio kelio apsauginė zona yra 50 m) langus keičia gyvenamosiose patalpose iš trijų namo pusių. Vyko diskusijos dėl atstumo, kuriuo nutolusiems Liūdynės ir Pakalnių kaimų namams Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto lėšomis bus keičiami langai ir durys.

NUTARTA.

1. Kreiptis į Aplinkos ministeriją ir Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas (sutarties Nr. 2006/32/ND/P/LT)“ techninės specifikacijos 2 priedo Langų ir durų keitimo Liūdynės ir Pakalnių kaimuose Panevėžio rajone sąrašo papildymo Liūdynės kaimo namais, esančiais pakeliui į regioninį sąvartyną ir patenkančiais į 100 m zoną nuo kelio briaunos:

   1. G. Polikevičiaus;
   2. G. Stankevičienės;
   3. P. Petrulio;
   4. A. Krivicko.

2. Langai bus keičiami gyvenamosiose patalpose.
3. Langai bus keičiami iš trijų namo pusių.

Posėdžio pirmininkas — Arturas Grucė

Posėdžio sekretorė — Rasa Daraškevičienė

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

07-MAY-2007 20:05 From:UAB PRATC 845 432199 To:0 P.1
02/01 07 TUE 11:59 FAX +370 5 2663865 LR APLINKOS MINISTERIJA

Gauta:
2007 -05- 0

Gauta
2007 m. 01 mėn. 09
Nr. A-1

p Dawai

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Juridinių asmenų registras. Kodas 188602370, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius. Tel. (8-5) 266 3661. Faks. (8-5) 266 3663
El. p. info@am.lt http://www.am.lt PVM mokėtojo kodas LT100001029812

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"

2006-12-29 Nr. (15-1)-D8-10789

Į 2006-12-20 Nr. S-203

Kopija
Aplinkos projektų valdymo agentūrai

DĖL PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS: PROJEKTAVIMO IR KONKURSINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS" TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2 PRIEDO SĄRAŠO PAPILDYMO

Aplinkos ministerija išnagrinėjo Jūsų 2006 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. S-203 pateiktą informaciją dėl langų ir durų keitimo Liūdynės ir Pakalnių kaimuose Panevėžio rajone

Vadovaujantis projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Sanglaudos fondo paraiška (15 ir 40 psl.), numatyta pakeisti langus ir duris gyventojams, gyvenantiems šalia kelio, vedančio į regioninį sąvartyną. Tuo tarpu Europos Komisijos sprendime (11 psl.) numatyta įsigyti triukšmą mažinančias priemones, t. y. pakeisti langus Liūdynės gyvenvietės gyventojams. Taigi, langai ir durys turi būti pakeisti Liūdynes gyvenvietės gyventojams, gyvenantiems šalia kelio, vedančio į regioninį sąvartyną.

Išnagrinėjus Jūsų 2006 m. gruodžio 20 d. rašte Nr. S-203 pateiktą informaciją, langai ir durys turi būti pakeisti šiems namų savininkams: Z. Karvelienei, V. Zaurai, A. Veberiui, G. Polikevičiui, G. Stankevičiui, P. Peruliui ir A. Krivickui. Likusiems namų savininkams, kurie gyvena ne šalia kelio, vedančio į regioninį sąvartyną, langai ir durys projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" lėšomis negali būti keičiami, nes šios išlaidos būtų laikomos netinkamomis

Atsižvelgiant į tai, kad šio projekto įgyvendinimas nuo pat pradžių buvo komplikuotas ir gyventojai prieštaravo regioninio sąvartyno įrengimui šalia Panevėžio miesto sąvartyno, siūlome, kad ateityje nekiltų didesnių konfliktų, namų savininkams, kurie gyvena ne šalia kelio, vedančio į regioninį sąvartyną, langus ir duris pakeisti UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" arba savivaldybių lėšomis.

Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 29

L. Mačiulytė, 266 3531, el. p. l.maciulyte@am.lt

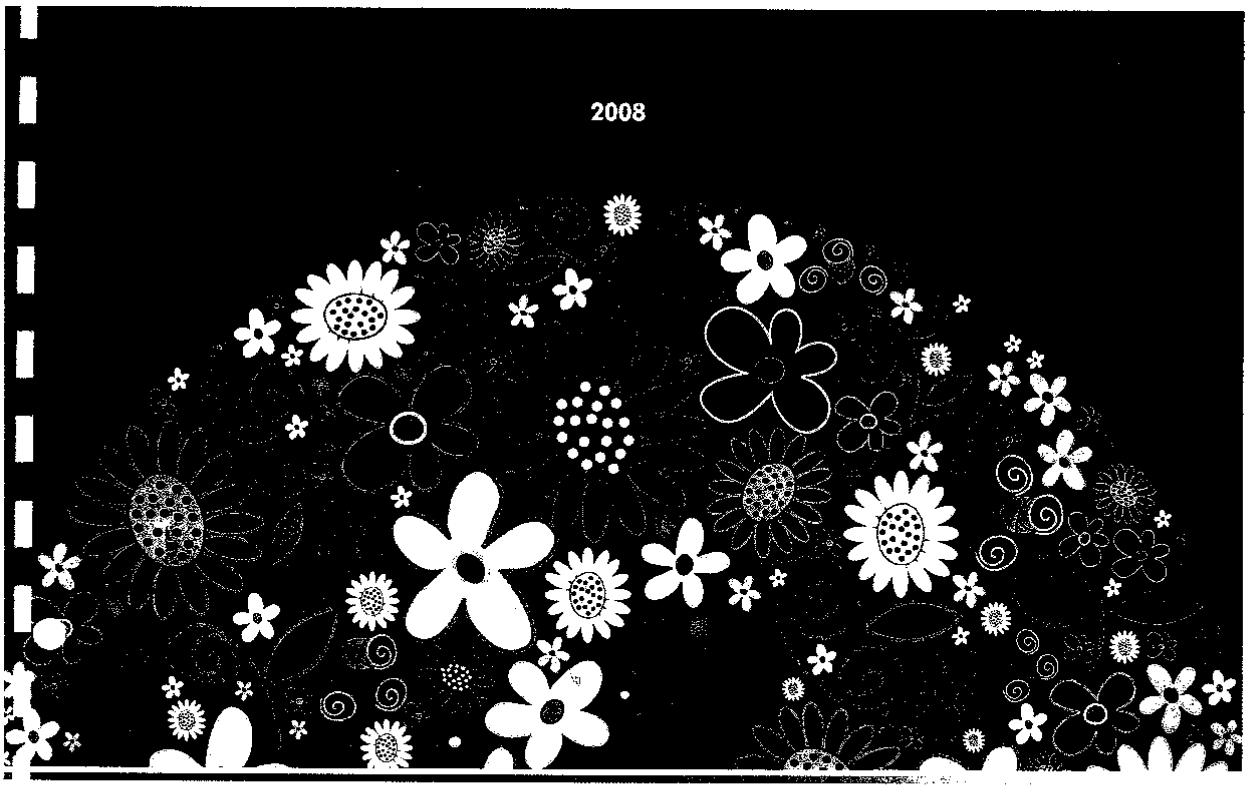

ATLIEKŲ TVARKYMO ATMINTINĖ

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Pastaraisiais metais atliekų utilizavimas bei rūšiavimas tapo ypač populiaria tema tarp aplinkosauginių institucijų ir atliekų verslu užsiimančių įmonių. Vis daugiau organizacijų skelbia įvairias akcijas, skatinančias atliekų rūšiavimą bei tinkamą jų utilizavimą. Visa tai tik patvirtina, kokia opi problema tampa vis didėjantis atliekų kiekis.

Lietuvoje atliekų problemoms spręsti įkurti regioniniai (apskričių) atliekų tvarkymo centrai, kurių pagrindinis tikslas – tvarkyti susidarančias atliekas pagal visus Europos Sąjungos keliamus aplinkosauginius reikalavimus.

2005 m. buvo įkurtas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC), kurio pagrindinis uždavinys – rūpintis naujos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimu Panevėžio apskrityje. Deja, uždaryti nelegalius sąvartynus bei įkurti vieną sąvartyną nepakanka – norint, jog sistema veiktų, reikia, kad ja naudotųsi ir pagrindinė šios sistemos dalis – gyventojai.

Tik veikdami išvien galėsime pasiekti geriausių rezultatų. Todėl rūšiuoti buityje susidarančias atliekas skatiname kiekvieną iš mūsų.

Direktorius • Arturas Grucė
direktorius@pratc.lt
Vyr. buhalterė • Dovilė Kulbienė
buhalterija@pratc.lt
Projekto administratorius • Vaidas Peleckas
pratc@pratc.lt
Ekspoatavimo inžinierius • Alvydas Stravinskas
ekspoatacija@pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

Beržų g. 44, Panevėžys
Tel./ faks. 8 45 432199
info@pratc.lt
www.pratc.lt

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas:
žingsnis į mūsų gerovę.

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

APVA
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

EUROPOS SĄJUNGA

TRUMPA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Pagrindinis PRATC įgyvendinamo projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" tikslas – sukurti racionalią visuomenės poreikius tenkinančią, gerą aplinkos kokybę užtikrinančią ir rinkos ekonomikos nepažeidžiančią atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinti ES reikalavimus atliekų tvarkymo srityje.

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" bendra vertė – 67,29 mln. litų. Numatoma, kad įgyvendinus projektą, iki 2010 metų bus uždaryti ir sutvarkyti 95 seni, ES reikalavimų neatitinkantys, Panevėžio apskrities sąvartynai ir šiukšlynai. Senuosius sąvartynus pakeis vienas naujas regioninis sąvartynas Dvarininkų kaime, Miežiškių seniūnijoje, Panevėžio rajone. Projekte numatyta ne tik įrengti sąvartyną, bet ir apželdinti jo pakelę, įsigyti reikiamos sąvartyno eksploatavimo įrangos, įrengti atliekų rūšiavimo liniją. Panevėžyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose ir Rokiškyje bus įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo ir didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – dar ir perkrovimo stotys.

RŪŠIUOTI PAPRASTA IR LABAI

Vienas didžiausių į sąvartyną patenkančių atliekų srautų yra buityje susidarančios atliekos. Daugumą atliekų galima išrūšiuoti ir perdirbti „antram gyvenimui", taip sutaupant nemažai gamtinių išteklių bei energijos šaltinių.

2006 ir 2007 m. buvo atliktos Panevėžio regiono gyventojų apklausos, kurių metu išsiaiškinta, kad pagrindinės nerūšiavimo priežastys rajonuose – ne visiems gyventojams sudarytos sąlygos rūšiavimui bei sąmoningumo stoka. Dalis gyventojų vis dar nesupranta buitinių atliekų rūšiavimo svarbos. Tai bene svarbiausias veiksnys, įtakojantis žemą rajonuose surenkamų rūšiuotinų atliekų kiekį.

Rūšiuojant atliekas, atsiranda galimybė antriniam atliekų perdirbimui, todėl sąvartynai lėčiau užsipildo, į juos patenka mažesni atliekų kiekiai. Toksiškos medžiagos atskiriamos nuo kitų atliekų ir saugiai utilizuojamos. Be to, tausojami sparčiai senkantys gamtiniai resursai. Žmogus, rūšiuojantis atliekas, per metus sumažina savo išmetamų atliekų kiekį bent 20 procentų, o dažnai ir daugiau.

Kiekvienas gyventojas, išmokdamas rūšiuoti atliekas, gali prisidėti prie naujos atliekų tvarkymo sistemos kūrimo. O tam reikia visai nedaug. Atliekų (stiklo, popieriaus, plastmasės) sumetimas į specialiai tam skirtus konteinerius – veiksmas, nereikalaujantis daug pastangų.

DIDŽIŲJŲ (IR PAVOJINGŲ) ATLIEKŲ SURINKIMO

Dažnai pastebime, jog šalia buitinių atliekų ar rūšiuotinoms atliekoms skirtų konteinerių sudėtos ir didžiosios atliekos, tokios kaip: baldai, nudėvėtos automobilių padangos, sena buitinė technika, dviračiai, statybinės atliekos ir pan. Kartais tai reiškia, jog šalia turime nesąmoningą kaimyną, kartais – jog namus ar butą tvarkantis žmogus nežino, kur išmesti susikaupusias didžiąsias atliekas.

Tam, kad išvengtume netvarkos savo mieste, susikaupusias didžiąsias atliekas reikia vežti į specialias, tam pritaikytas, aikšteles.

Į šias aikšteles gyventojams taip pat galima, ir net patartina, vežti ir pavojingas atliekas: akumuliatorius, dienos šviesos lempas, gyvsidabrio, tepalų ir oro filtrus, naudotas alyvas atliekas. Priėmimo aikštelėse įrengti specialiai tam pritaikyti, sandarūs bei saugūs konteineriai, skirti pavojingoms atliekoms saugoti. Vėliau šios atliekos perdirbamos pakartotiniam panaudojimui, deginamos tam pritaikytose gamyklose arba šalinamos pavojingų atliekų sąvartynuose.

Įrengiant didžiąsias (ir pavojingas) atliekų priėmimo aikšteles siekiama sumažinti atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekį ir padidinti perdirbamų atliekų kiekį.

Primename, jog dėti atliekas šalia buitinių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių draudžiama. Už atliekų tvarkymo taisyklių nesilaikymą baudžiama iki 2000 Lt bauda, pagal LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 ir 51[3] straipsnius.

Dar šių metų pabaigoje bus baigtos įrengti didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės didžiuosiuose Panevėžio apskrities miestuose. Nau aikštelių darbo laiką planuojama pritaikyti dirbančių gyventojų patogumui. Tad, ketindami pristatyti didžiąsias atliekas, gyventojai galės pasirinkti jiems tinkamiausią laiką.

Statomų didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių adresai:

- Rokiškyje: K.Donelaičio g. 16. Aikštelės plotas – 1518 m^2;
- Kupiškyje: Technikos g. 6i. Aikštelės plotas – 3500 m^2;
- Biržuose: Širvėnos sen. Biržų k. Aikštelės plotas – 1820 m^2;
- Pasvalyje: Mūšos g. 12. Aikštelės plotas – 2100 m^2;
- Panevėžyje: Savitiškio g. 12. Aikštelės plotas – 1568 m^2;

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čepėjienė

ELEKTROS ĮRENGINIAI

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA) priskiriamos prie pavojingų atliekų. Šių atliekų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis joms skirtuose konteineriuose. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), jos užteršia ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis: gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu.

Ant elektros ir elektroninės įrangos prekių, kurių negalima šalinti su bendromis atliekomis, pakuočių yra specialus ženklas, žymintis, kokia tai atlieka ir koks jos šalinimo būdas.

EEĮA sąrašas yra apibrėžtas LR Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje. Šis straipsnis taip pat apibrėžia, kas yra elektros ir elektronikos įranga.

Pagal minėtą apibrėžimą, elektros ir elektroninė įranga yra skirstoma į dešimt kategorijų:

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai (šaldytuvai, skalbimo mašinos, indaplovės, maisto ruošimo mašinos, elektriniai radiatoriai ir pan.);
2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai (dulkių siurbliai, keptuvės, smulkintuvai, lygintuvai, kavamalės ir pan.);

3. IT ir telekomunikacinė įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo įranga, telefonai, faksai, garso ir vaizdo perdavimo priemonės ir pan.);
4. Vartojimo įranga (radijo aparatai, televizoriai, garso grotuvai, muzikos instrumentai, fotoaparatai ir pan.);
5. Apšvietimo įranga (fluorescentinių lempų šviestuvai, tiesios fluorescentinės lempos, kompaktinės fluorescentinės lempos, žemo slėgio natrio lempos ir kt. apšvietimo įranga);
6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius) (pjūklai, grąžtai, siuvimo, tekinimo, malimo mašinos, sodo, virinimo, tekinimo įrankiai ir pan.);
7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai, monetiniai aparatai, elektroninių komponentų turinti sporto įranga ir pan.);
8. Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus) (radioterapijos įranga, respiratoriai, kardiologiniai aparatai, laboratorinė įranga ir pan.);
9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai (dūmų detektoriai, šilumos reguliatoriai, termostatai, matavimo, vėrimo ar derinimo prietaisai ir pan.);
10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (automatiniai karštų gėrimų išdavimo įtaisai, automatiniai kietų produktų išdavimo įtaisai, automatiniai pinigų išdavimo aparatai, automatiniai kietų produktų išdavimo įtaisai, visi įtaisai, automatiškai išduodantys bet kuriuos produktus).

Jei namuose ar biure turite elektros ar elektroninės įrangos atliekų, jas reikia šalinti tinkamu būdu. Tinkami tokių atliekų šalinimo būdai yra šie:

- Išvežti į savivaldybių didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikšteles;
- Palikti EĮĄ prekybos centruose stovinčiuose konteineriuose;
- Atiduoti sugedusį ar nenaudojamą buities arba kitą EĮĄ prekybos tinklams, prekiaujantiems tokia įranga. Parduotuvė, kuri prekiauja EĮĄ įranga, privalo iš jūsų priimti seną, jei jūs iš jos perkate tokios pat rūšies naują pritaisą. Pavyzdžiui, jūs galite priduoti seną plaukų kirpimo mašinėlę, jei perkate naują;
- Skambinti jūsų gyvenamąją teritoriją aptarnaujančiam komunalininkui. Dauguma tokio pobūdžio įmonių surenka ir EĮĄ įrangą. Tačiau tai daro tik tam tikromis dienomis ir jiems priklausančioje teritorijoje.

DAŽNIAUSIAI PERDIRBAMOS ATLIEKOS

Beveik pusė namų ūkyje susidarančių atliekų yra virtuvės atliekos. Kita pusė – buityje reikalingų priemonių pakuotės (plastikiniai indeliai nuo šampūno, želės, stiklinė kvepalų ar padažo tara, įvairiausios kartono pakuotės). Jas išrūšiavus, liktų tik apie 8 proc. nerūšiuotinų atliekų, kadangi didžiąją dalį atliekų galima sėkmingai perdirbti.

Vienos sėkmingiausiai perdirbamų atliekų – popierius, plastmasė, stiklas bei metalas. Šios atliekos – ypač dažnas „svečias" mūsų virtuvėje bei buityje.

Popierius. Popieriaus atliekos – vienos mažiausiai kenksmingų. Popieriaus gaminiuose paprastai nebūna ypač kenksmingų priemaišų, be to, popierius gamtoje suyra per dvejus metus. Tačiau šias atliekas galima sėkmingai perdirbti. Gaminat popierių iš makulatūros, kiekvienai jo tonai išsaugoma vidutiniškai po 17 medžių. Į popieriui skirtus konteinerius negalima mesti „tetrapakų", kadangi jie susideda iš įvairių priemaišų: popieriaus, kartono, polietileno, folijos.

Plastmasė. Plastmasiniai gaminiai taip pat yra vienos iš lengvai perdirbamų atliekų. Šios atliekos bendrame srautė sudaro žymią dalį, kadangi daugelis tiek skysto, tiek biraus pavidalo maisto produktų bei gėrimų pilstomi į plastmasines taras arba pakuojami į plastikinius maišelius. Reiktų pažymėti, jog prieš metant PET butelius i konteinerį, reikia nusukti kamštelius, kadangi jie pagaminti iš kitos (neperdirbamos) rūšies plastiko. O butelius nuo aliejaus ir kitų riebaluotų produktų prieš išmetant reikia išplauti ir suspausti, kad jie įmtų kuo mažiau vietos konteineryje.

Stiklas. Stiklas – viena populiariausių perdirbamų atliekų. Didžioji dalis stiklo taros yra superkama prekybos vietose. Tačiau tokie stiklo gaminiai kaip stiklainiai, stiklo duženos – ne. Būtent tokioms atliekoms skirti užrašu „Stiklas" pažymėti konteineriai. Kaip ir plastikines, taip ir stiklines riebaluotas stiklo atliekas prieš šalinant reikia išplauti, pašalinti popieriaus likučius. Į stiklui skirtą konteinerį negalima mesti porceliano, keramikos ar veidrodžio šukių.

Metalas. Metalo atliekas galima mesti į konteinerius, pažymėtus užrašu „Plastikas". Į šiuos konteinerius galima šalinti: konservų dėžutes, gėrimų skardines, aliumininius indus, stalo įrankius bei kepimo skardos. Tačiau į šios paskirties konteinerius negalima mesti pavojingomis medžiagomis užterštų metalinių pakuočių. Tokias atliekas reiktų šalinti didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, kuriose yra pavojingoms medžiagoms pritaikyti konteineriai.

KAS YRA PAVOJINGOS ATLIEKOS IR

Ne visus buities chemijos produktus iki galo suvartojame. Tenka išmesti tiek pasenusius vaistus, tiek kosmetiką, tiek nebetinkamus naudoti elektros elementus, automobilių tepalo ar kuro filtrus. Dažniausiai nesivargindami metame šias atliekas kartu su kitomis, nė nesusimąstydami, kokią didelę žalą aplinkai padarome.

PAVOJUS VISIEMS

Pavojingos atliekos – tai nuodingos, degios, sprogstančios, radioaktyvios ir kitokios kenksmingos medžiagos:

- galvaniniai elementai, turintys sunkiųjų metalų (švino, nikelio ar kitų pavojingų metalų);
- akumuliatoriai;
- pasenę vaistai;
- dezinfekcijos skysčių, baliklių, įvairių valiklių atliekos;
- lakų, dažų, skiediklių atliekos;

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė

- kosmetikos – nagų lako, lako valiklio, plaukų lako – liekanos;
- cheminėmis medžiagomis užterštos pakuotės;
- panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos;
- gyvsidabrio turinčios atliekos – liuminescencinės lempos, termometrai ir kt.

Šių medžiagų **jokiais būdais negalima** maišyti su kitomis buities atliekomis. Taip pat negalima jų pilti į praustuvę ar klozetą, lietaus nuotekų šulinius ar tiesiog ant žemės, nes, patekusios į aplinką, jos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti tiek aplinkai, tiek žmonių bei gyvūnų sveikatai. Juk nenorėtume gerti vandens, užteršto pačių išmestomis pavojingomis atliekomis...

Geriausias atliekų (ypač elektroninių) tvarkymo būdas – jų perdirbimas. Pavyzdžiui, kompiuteris yra sudarytas iš daugelio medžiagų: plastmasės, stiklo, plieno, aukso, švino ir kitokių. Visas šias medžiagas galima perdirbti ir dar kartą panaudoti, o išmetus kompiuterį, aplinka užteršiama įvairias toksinais.

Pagrindinis atliekų perdirbimo tikslas – tausoti gamtos išteklius ir mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį. Gaminti naujus daiktus iš antrinių žaliavų daug paprasčiau, pigiau, mažiau teršiama aplinka. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų, tuo daugiau sutaupoma žemės turtų – gamtinių išteklių

Svarbiausia perdirbėjų užduotis – surinkti atliekas ir perdirbti jas taip, kad būtų galima panaudoti dar kartą. Panaudotos technikos detalės neprikeliamos antram gyvenimui – jos perdirbamos iki žaliavos. Iš vario atliekų gaminamos apvijos, detalės iš juodojo metalo perlydomos, iš aliuminio laužo gaminami automobilių pavarų dėžių ir variklių blokai.

Į sąvartynus patekti negali ir padangos – jos, kaip ir kitos didesnės pavojingos atliekos, turi būti gabenamos į specialias atliekų surinkimo aikštelės. Panaudotos padangos dar gali būti naudingos kaip energijos šaltinis: jas galima efektyviai panaudoti kaip papildomą kurą cemento krosnims.

Tačiau tai jau perdirbėjų darbas. O kiekvieno iš mūsų pareiga gamtai ir sau patiems – nepatingėti padaryti taip, kad pavojingo atliekos atsidurtų ten, kur jomis bus atitinkamai pasirūpinta. Ir galbūt jau po kelių metų galėsime pasigirti esantys atsakinga, aplinkai neabejinga tauta.

BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIOS ATLIEKOS

Kiekvienas žemės savininkas turėtų išmokti susikaupusias žaliąsias ir biologiškai skaidžias atliekas panaudoti taip, jog jų nebereiktų vežti į sąvartyną ar artimiausią miškelį. Iš sodo ir daržo atliekų nesunkiai galima pasigaminti vertingo komposto, kuris vėliau gali būti panaudojamas kaip trąša gėlėms ar daržovėms auginti.

Kas yra biologiškai skaidžios atliekos? Biologiškai skaidžios atliekos, sudarančios nemažą bendrojo atliekų srauto dalį, paprastai skirstomos į žaliąsias ir maisto atliekas bei yra surenkamos atskirai. Žaliosios atliekos – tai sodų, daržų, parkų, kapinių, kitų apželdintų teritorijų priežiūros atliekos: medžių ir krūmų genėjimo atliekos, nušienauta žolė, lapai, gėlės, drožlės ir pan.

Biologiškai skaidžių atliekų daugiausiai susidaro gaminant ar realizuojant maistą maisto gamybos bei perdirbimo procesuose. Tai atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu. Tačiau Lietuvoje tokios atliekos vis dar būna sumaišytos su kitomis medžiagomis ir nėra tinkamos perdirbimui. Dėl šios priežasties biologiškai skaidžias atliekas, susidarančias maisto gamybos bei perdirbimo įmonėse, siūloma atskirti ir rūšiuoti į tam skirtus konteinerius.

Nauda. Du skirtingi biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo būdai leidžia šias atliekas paversti naudingais produktais. Atliekų skaidymas aerobiniu būdu, dar vadinamu kompostavimu, yra natūralus gamtoje vykstantis augalų likučių, atliekų ir panaudotų medžiagų irimo procesas. Jo metu gamtoje susidaro humusinga žemė. O tokią terpę, kurioje gausu svarbiausių augalų mitybos elementų, mėgsta įvairūs augalai. Be to, humusas yra vienas iš dirvos derlumo faktorių.

Pradėti kompostuoti rekomenduojama pavasarį arba vasaros pabaigoje, o vietą parinkti kur nors šešėlyje, kad komposto vieta a. konteineris (priklausomai, ką pasirinksite) neišdžiūtų ir vyktų irimo procesas. Kompostui svarbūs keli rodikliai: vėdinimas, drėgmė (ne mažiau 50-60 proc.) ir tinkama temperatūra (apie 50° C). Tik tuomet, kai sąlygos atitinka šiuos rodiklius, galima tikėtis vertingo komposto. Subrendęs kompostas sijojamas per retą tinklą, kad nuo jo atsiskirtų akmenukai, nesuirusios šakutės ir kitos priemaišos, kurias vėliau bus galima panaudoti gaminant kitą kompostą.

Skaidant biologiškai skaidžias atliekas anaerobiniu būdu gaunamos dirvožemio trąšos bei organinis kuras, naudojamas transportui, šildymui, maisto ir vartojimo prekių gamybai. Biodujų gamybai tinkamos ir skerdyklų atliekos, kurios taip pat naudojamos kaip priedai biodujų išeigai didinti.

Kompostuoti galima daržovių atliekas, lukštus, kevalus, gėles, vaisius, kavos ir arbatos tirščius, taip pat ir žaliąsias atliekas: gėlių ir daržovių liekanas, nupjautą žolę, medžių lapus, smulkias šakeles, naminių gyvūnų (triušių, vištų ir kt.) išmatas.

Kompostuoti negalima mėsos ir žuvies atliekų, virtų daržovių, skerdienos. Piktžolių su sėklomis kompostuoti nepatartina, kadangi paskleidus tokį kompostą, užteršiama dirva.

Gyventojai, neturintys galimybės žaliųjų atliekų kompostuoti patys, visas namų ūkiuose susikaupiančias žaliąsias ir biologiškai skaidžias atliekas galės pristatyti į Panevėžio apskrities didžiuosiuose miestuose baigiamas įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

Statomų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių adresai:
- Rokiškio rajone: Ruzgių km., Juodupės sen. Aikštelės plotas – 1890 m²;
- Panevėžio rajone: Dvarininkų km., Panevėžio raj. Aikštelės plotas – 17151,38 m²;
- Kupiškio rajone: Didžiagrašių km., Noriūnų sen. Aikštelės plotas – 3408 m²;
- Pasvalio rajone: Levaniškio sąvartyno teritorijoje. Aikštelės plotas – 3082 m²;
- Biržų rajone: Biržų km., Širvėnos sen. Aikštelės plotas – 3180 m².

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 29

UAB „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"

APVA
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

EUROPOS SĄJUNGA

300

ATLIEKŲ TVARKYMO ATMINTINĖ

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

2008

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas:
žingsnis į mūsų gerovę"

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

EUROPOS SĄJUNGA

ĮŽANGA

Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) dalimi, buvo priimtas sprendimas reorganizuoti atliekų tvarkymo sektorių. Naujoji sistema turi ne tik apsaugoti gamtą nuo taršos, o žmogaus sveikatą nuo kenksmingų atliekų ir jų poveikio, bet ir atitikti visus ES reikalavimus.

Naujosios atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje uždaviniai – pastatyti 11 regioninių sąvartynų ir uždaryti senuosius, neatitinkančius aplinkosauginių reikalavimų, o visą atliekų tvarkymo infrastruktūrą perduoti administruoti regioniniams atliekų tvarkymo centrams. Naujai įkurti regioniniai centrai rūpinsis apskrities, kurioje įsikūrę, naujosios atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimu. Vienas iš atliekų tvarkymo sistemos tikslų – keisti gyventojų ir įmonių požiūrį į atliekų tvarkymą.

Kol kas naujausios technologijos neišsprendžia vis didėjančio atliekų kiekio problemos, tad prie taršos mažinimo reikia prisidėti ir kitais būdas. Vienas paprasčiausių – atliekų rūšiavimas.

Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas ne tik gyventojams, bet ir atliekas „gaminančioms" įmonėms, net jei tai tik biuras, kuriame dirba vos keli darbuotojai.

Dažniausiai įstaigų darbuotojams trūksta praktinių žinių apie atliekų tvarkymo principus įmonėse. Todėl šia atmintine siekiama suteikti šiek tiek informacijos, padėsiančios pradėti rūšiuoti atliekas, kurių daugiausia sukaupia biurai, gamybos, prekybos, maitinimo ir kitos įstaigos. O pradėjus rūšiuoti darbo vietoje, galbūt įprasime taip elgtis ir namuose, paskatinsime tvarkyti atliekas ir savo šeimą, draugus, pažįstamus.

KAS MES ESAM?

2005 m. liepos 1 d. šešios Panevėžio regiono savivaldybės (Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Biržų rajono, Kupiškio rajono, Rokiškio rajono) Jungtinės veiklos sutarties pagrindu įkūrė UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą (PRATC).

Pagrindinis PRATC tikslas yra sukurti racionalią visuomenės poreikius tenkinančią, gerą aplinkos kokybę užtikrinančią ir rinkos ekonomikos nepažeidžiančią atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinti ES reikalavimus atliekų tvarkymo srityje.

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" bendra vertė – 67,29 mln. litų. Numatoma, kad įgyvendinus projektą, iki 2010 metų bus uždaryti ir sutvarkyti 95 seni, ES reikalavimų neatitinkantys, Panevėžio apskrities sąvartynai ir šiukšlynai. Senus sąvartynus pakeis vienas naujas regioninis sąvartynas Dvarininkų kaime, Miežiškių seniūnijoje, Panevėžio rajone. Projekte numatyta ne tik įrengti sąvartyną, bet ir apželdinti jo pakelę, įsigyti reikiamos sąvartyno eksploatavimo įrangos, įrengti rūšiavimo liniją. Panevėžyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose ir Rokiškyje bus įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo ir didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės, o Biržuose ir Rokiškyje – dar ir perkrovimo stotys.

ANTRINĖS ATLIEKOS – POPIERIUS, PLASTIKAS IR STIKLAS

2008-ieji Jungtinių Tautų paskelbti Tarptautiniais Žemės planetos metais. Turime suprasti, jog gamtos išteklių tausojimas yra būtinybė, bei prie to prisidėti patys. Atliekų rūšiavimas – vienas iš paprastesnių būdų padėti gamtai ir išsaugoti antrinių žaliavų kokybę.

Kas yra antrinės atliekos? Šiuo metu geriausios sąlygos sudarytos antrinių atliekų rūšiavimui – joms yra skirti spalvoti konteineriai. Antrinės atliekos – tos, kurios tinkamos perdirbti ar naudoti, tai yra, popierius, stiklas, plastikas.

Tokių atliekų ypač daug susidaro buityje – juk dauguma maisto produktų, gėrimų, kosmetikos pakuočių yra stiklinės arba pagamintos iš plastiko.

Popierinių atliekų bene daugiausia susikaupia biuruose, kur dokumentams spausdinti, kopijuoti naudojamas popierius, taip pat vokai, užrašų sąsiuviniai, kalendoriai ir kita. Tačiau rūšiuoti tokias antrines atliekas įmonėse dar nėra įprasta. Galbūt dėl įtemptų dienotvarkių bei laiko stygiaus, galbūt dėl to, jog iš rūšiavimo įmonėms nėra tiesioginės ekonominės naudos. Tad dauguma atliekų vežamos ne perdirbti, bet gabenamos į sąvartynus.

Nauda. Galima kalbėti ir ne tik apie ekonominę antrinių atliekų rūšiavimo naudą – tą, kuri pasieks ne tik mus, bet ir ateities kartas, bei prisidės prie aplinkos tausojimo. Pavyzdžiui, kiekviena perdirbto popieriaus tona išsaugo septyniolika medžių, daugiau nei dvidešimt šešis tūkstančius litrų vandens ir tiek energijos, kad jos užtektų namo apšildymui pusei metų. Naudojant stiklo atliekas, sutaupoma ne tik smėlio, klinčių, sodos, bet ir apie trisdešimt penkis procentus energijos, kuri reikalinga stiklo gamybai.

Iš perdirbtų antrinių atliekų gaunama įvairiausių produktų. Indai, baldai, įvairios buityje, statybose naudojamos detalės, sintetiniai drabužiai gali būti pagaminami iš perdirbto plastiko. Antrinis popierius yra pigesnis, mažina atliekų kiekį ir anglies dvideginio emisiją, iš perdirbto popieriaus gaminami popieriaus gaminiai – tualetinis popierius, vienkartiniai rankšluosčiai. Stiklo žaliava yra tinkama statybinė medžiaga cemento mišiniams.

Nerūšiuojant antrinių atliekų, jos, vietoje to, kad būtų panaudojamos pakartotinai, vežamos į sąvartyną. Stiklas gamtoje išsilaiko net 900 metų, plastikas dūlėti pradeda po 200 metų, popierius nesuiręs sąvartyne gali išbūti iki dviejų metų.

Į popieriui skirtus konteinerius galima mesti žurnalus, laikraščius, pakavimo popierių, kartoninės dėžutes, gofruoto kartono dėžes, kartonines gėrimų pakuotes. Tačiau **netinka mesti** tapetus, servetėles, popierines nosines, pokelius nuo traškučių, kalkinį ir riebalais suteptą popierių.

Stikliniai buteliai, stiklainiai, stikliniai indai, stiklo duženos turi būti **metami į stiklui skirtus konteinerius**. Popierinių etikečių pašalinti nebūtina, tačiau butelius ir stiklainius reikia išplauti. Kartu su stiklinėmis atliekomis **negalima mesti** porceliano, elektros lempučių bei dažais ar tepalais užterštos taros, ampulių, stiklinių vaistų buteliukų, keramikos šukių, veidrodžių, automobilių langų stiklų, lempų ir dujinių lempų, stiklo lakštų, armuoto stiklo, kristalų, kadangi šios atliekos turi priemaišų, netinkančių perdirbimui.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepulienė
2011-06-29

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

EUROPOS SĄJUNGA

Į plastikui skirtą konteinerį taip pat galima mesti metalo atliekas – konservų dėžutes, metalines skardines nuo gėrimų, aliuminio lėkšteles ir kepimo skardas, metalinius dangtelius, dėžutes ir visas kitas buityje susidarančias metalinių pakuočių atliekas. Tačiau aerozolių flakonai, pavojingų cheminių medžiagų pakuotės **netinka** perdirbimui. Metalines atliekas perdirbimui galima pristatyti ir į metalo supirktuvę.

Plastiko atliekos, tokios kaip plastikiniai PET buteliai nuo vandens, aliejaus, kitų gėrimų, indeliai nuo padažų, majonezo, ploviklių, šampūno, polietileno plėvelės, **turi keliauti į plastikui skirtus konteinerius.**

ELEKTROS PRIETAISAI. DIRBANTIEMS OFISUOSE ARBA REMONTUOJANTIEMS BUITINĘ TECHNIKĄ

Elektroninių atliekų daugėja bene triskart greičiau nei kitos rūšies atliekų. Juk biuruose, įstaigose, įmonėse darbas neįsivaizduojamas be kompiuterių, telefonų, kopijavimo aparatų, kitos elektroninės įrangos ir buitinių prietaisų. Šiais technologijų pažangos laikais nuolat susiduriame su sparčia technologijų kaita, tad dažnai prireikia darbui reikalingą įrangą keisti, atnaujinti, o seną ir sugedusią – atsikratyti.

Tačiau ar žinome, jog elektros, elektroninės įrangos ir buities prietaisų negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis, palikti prie konteinerių ar, dar blogiau, pamiškėse, laukuose ar greta gyvenamųjų namų? Šios atliekos turi pavojingų žmogui ir gamtai medžiagų, tad patekusios į buitinių atliekų sąvartyną ar į aplinką, išskiria kenksmingas medžiagas. Be to, prarandamos antrinės žaliavos ir netaupoma energija.



Elektroninė įranga, kurios negalima šalinti su kitomis atliekomis, žymima tokiu ženklu:

Kas yra elektroninė ir elektros įranga? Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatyme elektroninė ir elektros įranga apibūdinama kaip įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus ir skirta naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei. Tokios atliekos yra:

- Dideli buitiniai prietaisai (šaldytuvai, skalbimo mašinos, indaplovės, elektrinės viryklės, mikrobangų krosnelės, elektriniai radiatoriai, kt.);
- Maži buitiniai prietaisai (dulkių siurbliai, siuvimo, mezgimo prietaisai, lygintuvai, skrudintuvai, kavamalės, kt.);
- Informacinės technologijos ir telekomunikacijų įranga (kompiuteriai, kopijavimo įranga, spausdintuvai, telefonai, kt.);
- Plataus vartojimo prietaisai (radijo aparatai, televizoriai, vaizdo kameros, vaizdo ir garso grotuvai, muzikos instrumentai, fotoaparatai, kt.);
- Apšvietimo įranga;
- Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (grąžtai, pjūklai, vejos pjovimo ir kitų sodo darbų įrankiai, kt.);
- Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga;
- Medicinos įranga;
- Priežiūros ir kontrolės įranga;
- Pardavimo automatai.

Kaip šalinti elektroninę ir elektros įrangą? Įstaigoms šalinti elektroninę įrangą ir buitinius prietaisus neturėtų būti sudėtinga, kadangi yra įvairių patogių būdų jomis atsikratyti. Pristatyti nereikalingą elektroninę įrangą ir buitinius prietaisus galima į savivaldybių didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikšteles, palikti specialiuose konteineriuose prie didžiųjų prekybos centrų, atiduoti prekybos vietose kai įsigyjate tokios pat rūšies naują įrangą ar prietaisą, perduoti teritoriją aptarnaujantiems komunalininkams. Taip pat veikia keletas bendrovių, galinčių surinkti elektros ir elektronikos įrangą bei buitinius prietaisus tiesiog iš jūsų įstaigos jums patogiu laiku.

Elektronikos įtaisus ir buitinę techniką pristatyti reikia licencijuotoms įmonėms, kurios turi teisę tokias atliekas rinkti ir perdirbti, bei kurių darbuotojai yra išklausę specialius kursus ir turi leidimus vežti pavojingas atliekas. Kitu atveju, jos gali patekti nelegaliems supirkėjams, kurie, neišėmę pavojingų detalių, gali pakenkti sau ir aplinkiniams. Tačiau nebandykite senų elektros prietaisų ardyti ir patys, siekdami surūšiuoti atskiras prietaisų dalis.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymu užsiimantys asmenys ir bendrovės turi užtikrinti, jog tokia įranga ir joje esančios medžiagos bei dalys būtų panaudotos pakartotinai, o netinkamos pakartotiniam naudojimui turi būti tvarkomos pagal aplinkosaugos įstatymus ir laikantis numatytų taisyklių bei reikalavimų.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 7 g
Aldona Čeplėjienė

PADANGOS. METALO ATLIEKOS. PAVOJINGOS ATLIEKOS

Automobilinių, metalo bei kitokių pavojingų, tačiau vertingų atliekų, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, daugiausia sukaupia ne pavieniai gyventojai, bet tam tikrą veiklą vykdančios įmonės, ypač užsiimančios automobilių priežiūra, remontu.

Vienos iš automobilinių atliekų yra **padangos**, kurios sunkiai suyra natūraliomis sąlygomis. Jose yra priemaišų, stabdančių senėjimo ir oksidacijos procesus, tad padangos yra tinkamos perdirbti arba utilizuoti. Kaupti padangas sąvartynuose ar kitur yra pavojinga, kadangi jos yra itin degios ir užsidegusios gali sukelti ekologinę avariją bei pakenkti žmonių sveikatai.

Todėl negalima palikti padangų kur papuola, kaupti aikštelėse, vežti į sąvartynus. Į didžiųjų atliekų aikšteles padangas pristatyti gali tik pavieniai gyventojai, kurie sukaupia nedidelį kiekį padangų. Todėl automobilių remonto, padangų montavimo įmonės turi pačios pasirūpinti sukauptų padangų šalinimu.

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

EUROPOS SĄJUNGA

Tinkamiausias būdas jomis atsikratyti – atiduoti jas utilizuojančioms ar perdirbančioms įmonėms. Taip pat patariama stebėti savivaldybių ir seniūnijų informaciją – keletą kartų per metus būna rengiamos padangų atliekų surinkimo akcijos. Taip pat verta pabandyti tartis su padangų vežėjais ar importuotojais, kurie galėtų priimti padangas.

Nauda. Perdirbus padangas gaunami gumos miltai, kurie vėliau gali būti panaudojami stogo ir grindų dangoms gaminti. Iš gumos miltų gaunamas medžiagas tinka naudoti ir sporto aikštynams iškloti, asfaltui gerinti ir pan.

Nemaži nereikalingo **metalo** ir plastiko kiekiai taip pat susikaupia įvairiose įstaigose ir automobiliais besirūpinančiose įmonėse. **Metalo atliekomis atsikratyti** gali padėti ir atliekų surinkimo ir tvarkymo bendrovės bei metalo supirktuvės. Metalą taip pat tinka mesti į konteinerius, skirtus plastikui.

Nauda. Perdirbtos metalo atliekos sutaupo ne tik energijos, bet ir naudingųjų žemės išteklių. Pavyzdžiui, viena tona perlydyto plieno išsaugo pusantros tonos geležies rūdos. Kiekvienai tonai aliuminio sutaupomos keturios tonos boksitų.

Kitos atliekos, kurių nemažai sukaupia automobilių servisai, yra įvairios **automobilinės atliekos.** Tai amortizatoriai, filtrai, katalizatoriai, sunkiųjų metalų turintys galvaniniai elementai ir pan. Panašių atliekų, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų akumuliatorių, baterijų, įvairių priedų, laidų ir kitų atliekų, susirenka ir elektronikos prietaisų taisyklose. Šias atliekas šalinti taip pat reikia tvarkingai, kad nebūtų pakenkta aplinkai ir žmonių sveikatai, kadangi jos priskiriamos **pavojingų atliekų** kategorijai. Tai tokios atliekos, kurios pasižymi pavojingumą lemiančiomis savybėmis – yra sprogstamosios, degios, oksiduojamosios, dirginančios, kenksmingos, kancerogeninės, toksiškos, ėdžios, teratogeninės, mutageninės, pavojingos aplinkai.

Taip pat **pavojingais laikomi** ir negalimi šalinti su kitomis atliekomis yra sunkiųjų metalų turintys galvaniniai elementai, akumuliatoriai, pasenę vaistai, dezinfekcijos skysčių, baliklių, valiklių atliekos, lakų, dažų, skiediklių liekanos, nagų lako, lako nuėmėjo, plaukų lako likučiai, cheminėmis medžiagomis užterštos pakuotės, panaudotos tepalų, tepalų filtrų ir kitų naftos produktų atliekos, gyvsidabrio turinčios atliekos – liuminescencinės lempos, termometrai ir pan.

Pavojingas atliekas galima atiduoti pavojingų atliekų priėmimo aikštelėse ar atliekų tvarkytojams. Dar vienas būdas sumažinti pavojingų atliekų kiekį įmonėse – naudoti mažiau kenksmingą ir toksiška produkciją.

Reikia skatinti įmonių darbuotojus bei įstaigų ir biurų tvarkymu užsiimančius asmenis ar bendroves atskirti šias pavojingas atliekas nuo bendro atliekų srauto. Taip bus išvengta tokių atliekų sąlyčio su dirvožemiu, vandens telkiniais bei neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Išmesti galima tik tuščią, švarią ir sausą tokių pavojingų gaminių pakuotę.

STATYBOS-GRIOVIMO ATLIEKOS

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, turi paisyti jos reikalavimų. Todėl daug dėmesio skiriama atliekų tvarkymui. Taigi ir statybinėms bei griovimo atliekoms, kuriomis dažniausiai turi rūpintis statybos bendrovės. **Statybinės atliekos** – tai atliekos, susidarančios statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo metu.

Nauda. Daugelis statybos ir griovimo atliekų gali būti perdirbtos. Iš jų gaunamos žaliavos – akmenys, skalda, žvyras, smėlis – gali būti panaudotos įvairiose statybos srityse. Tad tokios atliekos, patekusios į tam skirtą vietą, turi būti sutvarkomos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir kartu būtų tinkamai panaudojamos.

Kaip rūšiuoti statybos ir griovimo atliekas? Tokios atliekos turi būti rūšiuojamos dar statybvietėje. Reikia atskirti perdirbim tinkamas atliekas, pakartotiniam naudojimui tinkamas medžiagas, konstrukcijas bei kitas – antrines žaliavas, pavojingas atliekas.

Kai kurios nepavojingos neapdorotos statybos, remonto, griovimo darbų metu susidariusios atliekos gali būti naudojamos vietoje, pavyzdžiui, smulkinamos mobilia įranga, panaudojamos kaip užpildas. Kurį laiką statybos ir griovimo atliekos gali būti laikomos ir statybvietėje.

Statiniams ir įvairioms konstrukcijoms, taip pat kaip izoliacinė medžiaga dažnai naudojamas asbestas. Šis mineralas tampa ypač pavojingas laužant, griaunant, ardant ar kitaip apdorojant jo turinčius gaminius. Todėl svarbu, kad asbesto turinčios atliekos būtų tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų. Siekiant nepakenkti aplinkai bei žmonių sveikatai, tokias pavojingas atliekas rekomenduojama perduoti jas šalinančioms įmonėms.

Taip pat reikia nepamiršti, jog statybos ir griovimo atliekoms laikyti, gabenti yra keliami tam tikrai reikalavimai, kad būtų išvengta neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Direktorius • Arturas Grucė
direktorius@pratc.lt
Vyr. buhalterė • Dovilė Kulbienė
buhalterija@pratc.lt
Projekto administratorius • Vaidas Peleckas
pratc@pratc.lt
Eksploatavimo inžinierius • Alvydas Stravinskas
ekspoatacija@pratc.lt

Beržų g. 44, Panevėžys
Tel./ faks. 8 45 432199
info@pratc.lt
www.pratc.lt

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 29
Aldona Čeplėjienė
