LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO NR. 2004/LT/16/C/PE/001 „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“

2012 m. liepos 31 d. Nr. FA-P-70-3-54
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant
2011-09-13 pavedimą Nr. P-70-3

Auditą atliko valstybiniai auditoriai:
Vytenis Laukys (grupės vadovas)
Aistė Rumbutytė
Inga Norkevičiūtė-Birenė

Auditas pradėtas 2011-09-15
Auditas baigtas 2012-07-31

Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti
Valstybės kontrolės interneto puslapyje
adresu www.vkontrole.lt

TURINYS

Santrauka 3

Įžanga 5

Audito apimtis ir metodai 7

1. **Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančios institucijos** 7
2. **Bendroji informacija apie projektą** 7
3. **Reikšmingumas ir patikimumas** 12
4. **Audito metodai** 13

Pastebėjimai ir išvados 23

5. **Pažeidimai** 23
6. **Patikrinimai** 24
7. **Viešieji pirkimai** 25
8. **Išlaidų tinkamumas** 34
9. **Audito seka ir apskaitos sistemos** 35
10. **Viešinimas** 35
11. **Projekto galutinė ataskaita** 37
12. **Projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška** 42
13. **Klaidų vertinimas** 43

Priedai 44

SANTRAUKA

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti baigiamąją audito deklaraciją dėl Sanglaudos fondo projektų rengiančios institucijos funkcijas pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1386/2002.

Audito subjektas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (vadovaujančioji institucija), audito procedūros atliktos – Finansų ministerijoje (mokėjimo institucijoje), Aplinkos ministerijoje (tarpinėje ir atrankinius patikrinimus atliekančioje institucijoje), Aplinkos projektų valdymo agentūroje (įgyvendinančiojoje institucijoje), VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centre“, kuri yra galutinis paramos gavėjas.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, Finansinio audito vadovu, Tarptautiniais audito standartais ir 2005 m. balandžio 15 d. EK rekomendacijomis „Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą“, 2008 m. balandžio 23 d. Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000–2006 m. uždarymo gairėmis. Audito ataskaita parengta remiantis mūsų atliktu darbu, kuris pradėtas 2011 m. rugsėjo 15 d., gavus pavedimą atlikti projekto baigiamąjį auditą.

Audituojamam projektui Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ parama iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo buvo patvirtinta 2005 m. gegužės 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2005)1610. Jis buvo keičiamas 2010 m. birželio 2 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2010)3625.

Auditas suplanuotas ir atliktas siekiant pakankamai įsitikinti, kad išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje Bendrijos pagalbos likučiui gauti nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal Europos Komisijos sprendimo sąlygas ir nustatytus tikslus. Audito metu surinkti visi reikalingi paklausimai siekiant užtikrinti, kad išlaidų ataskaitos yra teisingos, pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingai atliktos, o projektas įgyvendintas laikantis Europos Komisijos sprendimo skirti paramą sąlygų ir projekto tikslų.

Audito metu atlikta valdymo ir kontrolės sistemos apžiūra, įvertinta projekto galutinio mokėjimo paraiška ir galutinė ataskaita. Nustatyta **113 145,40 EUR** netinkamų finansuoti išlaidų, tai sudaro 0,46 proc. deklaruotų Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų. Pateikti svarbūs pastebėjimai:

- Perkančioji organizacija, APVA, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 7 dalies nuostatų, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatų, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti tikslūs ir aiškūs. Atsižvelgiant į pastebėjime nurodytas pažeidimo aplinkybes, finansinė pataisa yra 2 proc. sutarties vertės – **3 032,91 EUR;**

- **101 489,28 EUR** APVA pažeidimų tyrimų metu nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma nebuvo įvertinta rengiant Audituojamo projekto išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo paraišką;
- **8 623,21 EUR** išlaidos, patirtos nesilaikant sutarties sąlygų ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 [13] 4 straipsnio reikalavimų, yra netinkamos finansuoti;
- valdymo ir kontrolės sistemos institucijos neužtikrino, kad kokybiškai parengtos projekto galutinė ataskaita, išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška Valstybės kontrolei būtų pateiktos laiku.

Audito ataskaitoje pateikti vidutinės ir nedidelės svarbos pastebėjimai, susiję su viešųjų pirkimų ir viešinimo priemonių vykdymu; patikromis, kurias vykdė įgyvendinančioji ir mokėjimo institucijos.

Iš esmės šio projekto valdymo ir kontrolės sistema atitinka Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 nuostatas ir Europos Komisijos sprendimo skirti paramą reikalavimus, išskyrus prieš tai nurodytus pastebėjimus. Projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo padarytas išlaidas, o galutinė ataskaita parengta pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 reikalavimus, joje atskleisti projektui nustatyti tikslai, išskyrus minėtus pastebėjimus.

Prie audito ataskaitos pridedama deklaracija baigus teikti paramą (valstybinio audito išvada) yra parengta pagal Europos Komisijos sprendimą skirti paramą ir Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos, III priede pateiktą formą.

Audito ataskaita ir deklaracija baigus teikti paramą (valstybinio audito išvada) pagrįsta iki 2012 m. liepos 30 d. surinktais audito įrodymais.

ĮŽANGA

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti baigiamąją audito deklaraciją dėl Sanglaudos fondo projektų rengiančios institucijos funkcijas pagal 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1386/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 1995 m. gegužės 30 d. įstatymą[1] Nr. I-907 [2], Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija, nepriklausoma nuo mokėjimo, vadovaujančiosios, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijų.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, Finansinio audito vadovu, Tarptautiniais audito standartais (toliau – TAS), 2005 m. balandžio 15 d. EK rekomendacijomis „Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą“ [3] (toliau – EK rekomendacijos), 2008 m. balandžio 23 d. Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000–2006 m. uždarymo gairėmis [4]. Kaip numatyta Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] 14 straipsnio 1 dalyje, deklaracija parengta atsižvelgiant į valdymo ir kontrolės sistemų apžiūrą, jau atliktų patikrinimų išvadas ir į papildomą atrankinį operacijų patikrinimą, galutinę ataskaitą, parengtą pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 [6] II priedo F straipsnio 4 dalį.

Auditas suplanuotas ir atliktas siekiant pakankamai įsitikinti, kad išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje Bendrijos pagalbos likučiui gauti nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal sprendimo sąlygas ir nustatytus tikslus. Audito metu surinkome visus reikalingus įrodymus siekdami užtikrinti, kad išlaidų ataskaitos yra teisingos, pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingai atliktos, o projektas įgyvendintas laikantis sprendimo skirti paramą sąlygų ir projekto tikslų.

Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotojo 2011 m. rugsėjo 13 d. pavedimu Nr. P-70-3 atlikome Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Audituojamas projektas) baigiamąjį auditą, privalomą pagal Komisijos sprendimo [7] 1 priedo III skyriuje ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [5] nustatytus reikalavimus dėl Bendrijos pagalbos likučio mokėjimo. Pagal teisės aktų reikalavimus prie Audituojamo projekto išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos turi būti

[1] Su vėlesniais pakeitimais.

pridėta deklaracija baigus teikti paramą (toliau – Deklaracija), parengta pagal Komisijos sprendimo [7] III. 4. C priede ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] III priede pateiktą formą.

Teikti pastebėjimai suskirstyti į kategorijas pagal svarbą, kuri, mūsų įsitikinimu, turi būti jiems priskirta:

- *Didelės svarbos pastebėjimai* – dalykai, susiję su Audituojamo projekto įgyvendinimu ir turį įtakos išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos tikslumui ir teisingumui, į kuriuos aukščiausiojo lygio VI, MI, TI, ir ĮI vadovai turi nedelsdami atkreipti dėmesį ir imtis atitinkamų priemonių.
- *Vidutinės svarbos pastebėjimai* – dalykai, susiję su Sanglaudos fondo aplinkos sektoriaus projektus administruojančių institucijų vidaus kontrolės sistema, į kuriuos nedelsiant turėtų būti atkreiptas šių institucijų atitinkamo lygio vadovų dėmesys.
- *Nedidelės svarbos pastebėjimai* – dalykai, kurie neprieštarauja Komisijos reglamentams ir Komisijos sprendimams [7, 8] ir yra susiję su vidaus kontrolės nedideliais trūkumais, kuriuos reikia spręsti, siekiant užtikrinti visapusę atitiktį nacionaliniams teisės aktams.

Mes turime pareikšti nuomonę, ar išlaidų ataskaitoje pateikta informacija visais svarbiais aspektais yra teisinga, išlaidos padarytos pagal reglamentus, sprendimo dėl projekto reikalavimus ir jo tikslus, o paraiška Komisijai gauti Bendrijos pagalbos likutį yra pagrįsta. Ši nuomonė reiškiama atskirai pateikiamoje Deklaracijoje.

Audito ataskaita parengta remiantis mūsų atliktu darbu, kurį pradėjome 2011 m. rugsėjo 15 d., gavę pavedimą atlikti Audituojamo projekto baigiamąjį auditą. Audito ataskaita ir Deklaracija pagrįsta iki 2012 m. liepos 30 d. surinktais audito įrodymais.

Ataskaitos 1 priede pateikiamas ataskaitoje vartojamų santrumpų sąrašas.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

1. Sanglaudos fondo (ISPA) projektus administruojančios institucijos

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Sanglaudos fondo administravimui taikomi Europos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentai. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [5] valstybei, gaunančiai Sanglaudos fondo lėšas, nustatyti reikalavimai dėl valdymo ir kontrolės sistemos.

Vykdydama minėtą reglamentą Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 [9] patvirtino Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisykles, kuriose nustatė institucijų funkcijas ir teises. Šiuo metu visus Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus aplinkos apsaugos projektus administruojančios institucijos yra šios:

LR finansų ministerija	– vadovaujančioji;
	– auditą koordinuojanti;
	– mokėjimo;
LR aplinkos ministerija	– tarpinė;
	– atrankinius patikrinimus atliekanti;
Aplinkos projektų valdymo agentūra	– įgyvendinančioji;
Europos Komisijos, vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovai	– SF priežiūros komitetas;
VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“	– galutinis paramos gavėjas.

2. Bendroji informacija apie projektą

Sanglaudos fondo projektas Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ buvo patvirtintas 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2005)1610 [7]. Jis pakeistas[2] 2010 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2010)3625 [8].

Pagrindiniai Audituojamo projekto tikslai:

Sukurti aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu darnią Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus. Ypač padėti įgyvendinti šių direktyvų reikalavimus:

- Atliekų direktyva Nr. 2006/12/EB;
- Sąvartynų direktyva Nr. 1999/31/EB;
- Pavojingų atliekų direktyva Nr. 91/689/EEB, kurią pakeitė direktyva Nr. 94/31/EB;

[2] Pakeitimas nekeičia Komisijos paramos dydžio, bet yra susijęs su Projekto apimčių bei išlaidų tinkamumo termino keitimu.

- Reglamentas Nr. EEB/259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijoje, į ir iš jos;
- Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva Nr. 2004/12/EB, iš dalies keičianti direktyvą Nr. 94/62/EB;
- Direktyva Nr. 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;
- Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra tam tikrų pavojingų medžiagų, direktyva Nr. 91/157/EEB;
- Nuotekų dumblo direktyva Nr. 86/278/EEB, skirta apsaugoti aplinką, o ypač dirvožemį, kai nuotekų dumblas naudojamas žemės ūkyje;
- Direktyva Nr. 2000/53/EB dėl netinkamų naudoti automobilių.

Fiziniai tikslai:

- įrengti reikalavimus atitinkančių sąvartynų Lapėse ir Zabieliškyje sekcijas ir, uždarius bei sutvarkius 59 veikiančius sąvartynus ir šiukšlynus, įskaitant ir Lapių sąvartyno 1-ą lauką, sumažinti požeminio ir paviršinio vandens taršą;
- viešąsias atliekų surinkimo paslaugas teikti papildomai 121 877 žmonių ir tokiu būdu iki 2010 m. pagerinti vidutinį surinkimo procentą iki 93 proc.;
- taikyti tarifus, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir regione įtvirtina „teršėjas moka“ principą;
- pastačius 6 atliekų priėmimo aikšteles pasiekti, kad komunalinių atliekų atskyrimas sudarytų 7 proc. 2006 m.;
- įrengus žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles sumažinti į sąvartyną patenkančių biodegraduojančių atliekų kiekį;
- sumažinti reikalavimų neatitinkančių sąvartynų skaičių regione nuo 59 iki 2, ES reikalavimus atitinkančių, regioninių sąvartynų iki 2010 m.;
- užtikrinti, kad Kauno regiono atliekų tvarkymo centras generuos pakankamas pajamas padengti eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudas.

1 lentelėje pateikiama informacija apie Komisijos sprendimais projektui patvirtintas išlaidas ir jų tinkamumo laikotarpį.

1 lentelė. Komisijos sprendimais Audituojamam projektui patvirtintos išlaidos

Komisijos sprendimais projektui patvirtintos išlaidos	**EUR**	**proc.**
Projekto bendrosios išlaidos	25 388 987	
Tinkamos finansuoti projekto išlaidos	18 432 000	
Sanglaudos fondo paramos dydis nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų	13 824 000	75
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų laikotarpiai		
Darbams, prekėms ir paslaugoms, patvirtintoms Komisijos sprendimu[3]	2004-07-30–2010-12-31	

Šaltinis – Komisijos sprendimai [7, 8]

[3] 2010 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2010)3625, pakeitusiu 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimą Nr. K(2005)1610, išlaidų tinkamumo terminas pratęstas iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Komisijos sprendimą dėl paramos skyrimo pakeitusiu / papildžiusiu 2010-06-02 Komisijos sprendimu Nr. K(2010)3625 [8] patvirtinti Audituojamo projekto pagrindiniai priežiūros rodikliai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė. 2010-06-02 Komisijos sprendimu Nr. K(2010)3625 patvirtinti priežiūros rodikliai

Priežiūros rodiklis	Mato vienetas	Rodiklis
1. Uždarytų sąvartynų skaičius	vnt.	58
2. Atliekų priėmimo aikštelių skaičius	vnt.	6
Konteinerinio tipo administracinis, pavojingų atliekų ir stambiagabaričių atliekų saugojimo pastatai, biologinių nuotekų valykla ir kt. reikalinga infrastruktūra		
3. Kompostavimo aikštelių skaičius	vnt.	1
Komposto sunkos siurblinė ir kaupimo rezervuaras, laistymo tinklai ir kt. reikalinga infrastruktūra		
4. Atliekų konteineriai transporto priemonėms atliekų pervežimui iš APA	vnt.	9
5. Konteineriai buitinių ir perdirbamų atliekų surinkimui	vnt.	99
6. Statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir perdirbimo aikštelių skaičius	vnt.	1
Įskaitant reikalingos infrastruktūros įrengimą		
7. Regioninio sąvartyno Lapių kaime statyba:		
7.1. 5 naujų sekcijų įrengimas	ha	9–10
Sutankinto vietinio grunto sluoksnis, geosintetinio molio paklotas, HDPE geomembrana, geotekstilė, drenažinis sluoksnis; gruntinio vandens pažeminimo sistema, filtrato surinkimo drenos; reikalingos infrastruktūros įrengimas		
7.2 Tarnybinės zonos įrengimas	vnt.	1
Buitinis pastatas su pagalbinėmis patalpomis, priešgaisriniai rezervuarai, kt. reikalinga infrastruktūra		
7.3 Administracinio pastato zonos įrengimas	vnt.	1
Administracinis pastatas su pagalbinėmis patalpomis, svarstyklės, ratų plovimo ir dezinfekavimo duobė, kt. reikalinga infrastruktūra		
7.4 Nuotekų ir paviršinio vandens surinkimo sistemų įrengimas	vnt.	1
Buitinių nuotekų tinklai, surinkimo rezervuaras, biologiniai valymo įrenginiai, paviršinių nuotekų/paviršinio vandens surinkimo tinklai, siurblinė ir kt.		
7.5. Filtrato sistemos surinkimo sistemos įrengimas	vnt.	1
Drenažinis sluoksnis su filtrato surinkimo drenomis, magistraliniai savitakiniai ir slėginiai vamzdynai, filtrato tvenkiniai, užterštо gruntinio vandens atsiurbimo gręžiniai, siurblinė		
7.6.1 kaupimo lauko uždarymas	ha	11,7–12,6
Įskaitant dujų drenažinį sluoksnį, kt.		
7.7 110 kV ir 10 kV elektros oro linijų iškėlimas	vnt.	2
8. Regioninio sąvartyno Zabieliškio kaime statyba		
8.1.2 naujų sekcijų įrengimas	ha	2,4–2,7
Sutankinto vietinio grunto sluoksnis, geosintetinio molio paklotas, HDPE geomembrana, geotekstilė, drenažinis sluoksnis; gruntinio vandens pažeminimo sistema, filtrato surinkimo drenos; reikalingos infrastruktūros įrengimas		
8.2. Tarnybinės zonos įrengimas	vnt.	1
Ratų plovykla, svarstyklės, garažas, kt. reikalinga infrastruktūra, esamos sekcijos laikinas uždengimas gruntu		
8.3. Administracinio pastato kartu su pagalbinėmis patalpomis	vnt.	1
8.4. Nuotekų ir paviršinio vandens sistemos įrengimas	vnt.	1
Buitinių nuotekų tinklai, paviršinio vandens surinkimo tinklai ir kt.		
8.5. Filtrato surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas	vnt.	1
Drenažinis sluoksnis su filtrato surinkimo drenomis, magistraliniai savitakiniai		

ir slėginiai vamzdynai, nauja ir rekonstruojama siurblinės ir kt.		
8.6. Privažiavimo kelias	km	3,3-3,6
Naujo kelio įrengimas ir esamo remontas		
9. Biuro ir kompiuterinė įranga Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	vnt.	1
10. Triukšmą mažinančių langų keitimas	vnt.	157
11. Šeimos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos	vnt.	1

Šaltinis – Komisijos sprendimas [7; 8]

Įgyvendinant Audituojamą projektą pasirašytos keturios rangos darbų, keturios paslaugų teikimo, trys įrangos tiekimo ir viena žemės įsigijimo sutartys. Informacija apie Audituojamo projekto sutartis ir atliktus mokėjimus pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Projekto įgyvendinimo statybos darbų rangos, paslaugų teikimo, įrangos tiekimo ir žemės pirkimo sutartys

Sutarties pasirašymo data	Sutarties Nr.	Rangovas / paslaugų teikėjas / prekių tiekėjas	Sutarties objektas	Sutarties suma be PVM, EUR
Statybos darbų rangos sutartys				
2007-11-13	A/2007/Z/32	UAB „Kamesta“	Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba	4 276 440,33
2007-12-27	A/2007/K/37[4]	UAB „Sienojus“ ir UAB „Laugina“	Lapių regioninio sąvartyno statyba	10 208 090,75
2007-12-27	A/2007/K/38	AB „Raseinių melioracija“ ir UAB „Laugina“	Atliekų priėmimo aikštelių statyba	3 321 874,69
2008-09-18	A/2007/K/40	UAB „Luidas“ ir UAB „Kauno keliai“	Sąvartynų uždarymas	5 620 344,42
Paslaugų sutartys				
2007-12-17	966-07[5]	AB „Lietuvos energija“	Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos	1 223 405,03
2008-10-13	2008/137/ND/P/LT (IŠK-07-02-0055)	AB „VST“	Elektros įrenginių iškėlimas (rekonstrukcija)	26 857,18
2006-12-22	2006/96/A/K/LT[6]	UAB „COWI Baltic“	Techninė pagalba Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	207 324,49
2007-03-29	A/2007/K/24	UAB „SWECO BKG LSPI“	Techninė projekto priežiūra	362 169,83
Įrangos tiekimo sutartys				
2006-08-24	A/2006/K/14	UAB „Via Regia“	Triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas	32 459,45
2006-04-03	2006/8/IPK/PT/LT	UAB „Narbutas ir KO“	Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	2 944,83
2006-06-15	06-18	UAB „Sekolda“	Biuro organizacinės įrangos tiekimas	5 708,99
Žemės pirkimo sutartis				
2009-08-06	Nenurodyta	D. Danauskienė	Šeimos iškėlimas iš sąvartyno sanitarinės zonos	101 367,01
			Iš viso	**25 388 987,00**

Šaltinis – APVA

[4] 2008-06-26 sutarties pakeitimu Nr. 1 sutarties kaina išskaidyta pagal finansavimo šaltinius (sutarties kaina nekinta). 2009-12-07 sutarties pakeitimu Nr. 2 sutarties kaina išskaidyta pagal finansavimo šaltinius (sutarties kaina nekinta).

[5] 2008-08-29 sutarties pakeitimu Nr. 1 paslaugos suteikimo (oro linijos dalies kabelinės linijos perkėlimas) terminas pratęstas 1 mėn.

[6] 2007-04-27 sutarties pakeitimu Nr. 1 pakeistos faktinės pinigų sumos mokamos po avansinio mokėjimo, darbų pasiskirstymo dalių išdėstymas, pirkimo sutartis papildyta patikslintomis finansinės ataskaitos formomis. 2008-12-19 sutarties pakeitimu Nr. 2 sutartyje numatytų užduočių įgyvendinimas pratęsiamas nuo 24 mėnesių iki 30 mėnesių.

3. Reikšmingumas ir patikimumas

Auditas buvo suplanuotas taip, kad atitiktų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] reikalavimus ir būtų atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Finansinio audito vadovą ir Tarptautinius audito standartus (toliau – TAS).

Projekto baigiamojo audito reikšmingumą nustatėme remdamiesi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. birželio 28 d. raštu Nr. (18.52.1-01)-6K-1106727 mums vertinti pateikta išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška. Projekto baigiamajam auditui taikytas reikšmingumo lygis – 2 proc. visų EK deklaruotų Audituojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų (24 391 585,53 EUR). Atliekamo audito reikšmingumo suma – 487 831,71 EUR, tai didžiausia priimtina klaidų suma.

Pagal reikšmingumo lygį nustatoma, ar pastebėtos pavienės klaidos, praleisti ar netinkamai pateikti duomenys arba jų visuma rodo, kad EK pateikiama išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška Bendrijos pagalbos likučiui gauti visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo padarytas išlaidas.

Auditą suplanavome ir atlikome taip, kad būtume 95 proc. tikri pareikšdami nuomonę dėl išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos Bendrijos pagalbos likučiui gauti teisingumo ir pagrįstumo. Tokį patikimumo lygį pasiekėme:

- vertindami Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistemą ir vykdomų kontrolės priemonių veikimą;
- atlikę detaliuosius testus.

Audito metu pasiekėme patikimumo lygį, atsižvelgę į šiuos dalykus:

- išsamią rizikos analizę, atliktą audito planavimo stadijoje, kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;
- rašytinių procedūrų (pakeitimų) peržiūrą;
- rašytinių procedūrų laikymosi patikrinimą (kontrolės testai), įskaitant patikras vietoje;
- savarankiškas audito procedūras (detaliuosius testus);
- Sanglaudos fondo projektus aplinkos apsaugos srityje administruojančių institucijų patikrų vietoje / patikrinimų rezultatų peržiūrą;
- išorės auditorių ataskaitų peržiūrą;
- auditų Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančiose institucijose patirtį.

4. Audito metodai

Atsižvelgdami į audito tikslus ir siekdami gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų audito įrodymų, atlikome Valstybinio audito reikalavimuose ir 500 TAS numatytas audito procedūras:

- įrašų ir dokumentų tikrinimą;
- projekto lėšomis įsigyto turto tikrinimą;
- paklausimus (į valstybinio auditoriaus paklausimą pateikta nusimanančių asmenų finansinio ir nefinansinio pobūdžio informacija);
- perskaičiavimą (dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio tikslumo tikrinimą);
- patvirtinimą (valstybinių auditorių gaunamus tiesioginius rašytinius trečiosios (patvirtinančios) šalies atsakymus);
- analitines procedūras.

Audito tikslams atskleisti buvo parengtos trys audito programos:

- valdymo ir kontrolės sistemos veikimui įvertinti;
- Audituojamo projekto tikslų atskleidimui galutinėje ataskaitoje įvertinti;
- išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje nurodytoms išlaidoms, pagrindinių operacijų atlikimui įvertinti.

Vienas audito tikslų – atlikti Audituojamo projekto valdymo ir kontrolės sistemos vertinimą, todėl audito metu Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų vidaus kontrolės veikimui įvertinti skirtas atitinkamas dėmesys. Siekdami įsitikinti vidaus kontrolės procedūrų teoriniu buvimu ir pakankamu praktiniu veikimu, atlikdami audito procedūras vertinome tam tikrų kontrolės grupių – veiklos kontrolės, patikrų vietoje / patikrinimų, apskaitos ir mokėjimų kontrolės – buvimą, veikimą praktikoje, atlikimą laiku, taikymą visiems atvejams ir gebėjimą nustatyti ir taisyti klaidas. Šiems tikslams pasiekti parengta audito programa.

Audito metu vertinome šias Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų taikomas kontrolės priemones:

- APVA kontrolės priemones, taikomas sąskaitai (mokėjimo prašymui) vertinti;
- APVA, MI, VI kontrolės priemones, susijusias su patikromis vietoje / patikrinimais, viešaisiais pirkimais, mokėjimo procedūromis, apskaita ir kt.

Vidaus kontrolę testavome šiais audito metodais:

- kontrolės testais;
- patikromis vietoje / patikrinimais, ataskaitų peržiūra (kur tinkama);
- išorės audito ataskaitų peržiūra (kur tinkama).

Norėdami įsitikinti, ar Sanglaudos fondo aplinkos sektoriaus projektus administruojančiose institucijose sukurta valdymo ir kontrolės sistema atitinka Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [5] ir Komisijos sprendime [7] nustatytus reikalavimus, vertinome:

- likutinę riziką, susijusią su valdymo ir kontrolės sistema;
- viešuosius pirkimus;
- techninį valdymą ir įgyvendinimą, kiek tai susiję su išlaidų tinkamumu;
- lėšų apskaitą, mokėjimo procedūras ir audito seką;
- Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimus;
- informavimą ir viešinimą;
- VI, MI, APVA atliktas Audituojamo projekto patikras vietose, AM VAS atrankinius patikrinimus.

Vertindami viešųjų pirkimų sistemą, peržiūrėjome:

- pirkimo dokumentus;
- visas sudarytas sutartis ir jų pakeitimus.

Siekiant įvertinti viešųjų pirkimų sistemą, patikrintos 4 rangos darbų sutartys (Nr. A/2007/Z/32, A/2007/K/37, A/2007/K/38, A/2007/K/40), 1 įrangos įsigijimo (Nr. 06-18) ir 1 paslaugų sutartys (Nr. 2006/96/A/K/LT).

Audito metu vertindami, ar viešieji pirkimai vykdyti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, atlikome kontrolės (atitikimo) testus – išskyrėme klausimų grupes pagal šias viešųjų pirkimų sritis:

- konfidencialumo reikalavimas;
- pirkimo būdas;
- pirkimo vertės skaičiavimas;
- viešojo pirkimo komisija, pirkimų ataskaitos;
- viešųjų pirkimų skelbimai;
- pirkimo dokumentai, pirkimo dokumentų teikimas tiekėjams;
- paraiškų ir pasiūlymų pateikimas, vokų su pasiūlymais atplėšimas;
- tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas;
- pasiūlymų vertinimas ir palyginimas;
- pirkimo sutarties sudarymas ir informacijos apie sudarytą sutartį paskelbimas.

Bendra patikrintų sutarčių suma 23 639 783,67 Lt, arba 93,11 proc. visų pasirašytų sutarčių verčių sumos.

Atlikę viešųjų pirkimų sistemos patikrinimus, pagal Finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo rekomendacijas [10] įvertinome finansinių pataisų taikymo tikslingumą.

Europos Audito Rūmai DAS 2008 audito misijos metu vertino 10-ties Sanglaudos fondo Lietuvoje finansuojamų projektų, taigi ir Audituojamą projektą (žr. 4 priedą). Europos Komisija 2012 m. birželio 25 d. raštu Nr. ARES (2012) 764464 informavo, kad dėl Europos Audito Rūmų DAS 2008 audito misijos metu Audituojamame projekte nustatytų neatitikimų, finansinių pataisų netaiko.

Europos Komisijos kvietimu 2012-02-07 dalyvavome susitikime, kurį organizavo Regioninės politikos generalinis direktoratas (Briuselyje), vykdydamas finansinių koregavimų procedūrą, numatytą Tarybos reglamento Nr. 1164/1994 II priedo H straipsnyje, kur buvo svarstomas Audituojamo projekto finansinių pataisų taikymo tikslingumas.

Vertindami Projekto administracinį techninį valdymą ir įgyvendinimą:

- peržiūrėjome SFMIS duomenų bazės Sanglaudos fondo modulyje esančią informaciją, susijusią su Audituojamu projektu;
- peržiūrėjome rangos darbų ir paslaugų sutartis, jų pakeitimus / papildymus, pagal FIDIC Raudonąją knygą pasirašytų sutarčių kiekio žiniaraščius;
- peržiūrėjome Audituojamo projekto techninio prižiūrėtojo parengtą galutinę techninės priežiūros ataskaitą;
- teikėme paklausimus galutiniam paramos gavėjui, APVA, VI atsakingiems darbuotojams;
- testais patikrinome, ar:
  - visiems darbams, nurodytiems rangos darbų sutartyse, buvo išduoti statybos leidimai;
  - visi darbai (statiniai), nurodyti rangos darbų sutartyse, buvo pripažinti tinkamais naudoti, ar jiems išduotos atlikimo ir perėmimo pažymos;
  - faktiškai atlikti darbai atitinka Komisijos sprendimuose [7, 8] patvirtintus Audituojamo projekto pagrindinius priežiūros rodiklius;
  - išlaidos visiems darbams, kurie numatyti Komisijos sprendimuose [7, 8], patirtos išlaidų tinkamumo laikotarpiu;
- audito metu nustatę dvigubo finansavimo riziką, atlikome susijusias audito procedūras.

Įvertinome Sanglaudos fondo projektus administruojančių institucijų atliktas patikras vietose / patikrinimų rezultatus ir jų įforminimą pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] ir Procedūrų vadovo [12] reikalavimus.

Siekdami surinkti informaciją, susijusią su Audituojamo projekto administruojančių institucijų atliktomis patikromis vietose ir patikrinimais, išsiuntėme paklausimus:

- Aplinkos misterijos Vidaus audito skyriui[7], kad pateiktų Audituojamo projekto atrankinių patikrinimų (valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo vertinimo ir išlaidų) ataskaitų sąrašą. Vidaus audito skyrius 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. (4-1)-D8-8428 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad atliko vieną projekto deklaruotų finansuoti išlaidų atrankinį patikrinimą. Audito metu nusprendėme nesinaudoti Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus atliktu darbu;
- VI, MI, kad pateiktų ataskaitas patikrinimų, atliktų pagal Komisijos reglamento (EB) 1386/2002 [5] 4 straipsnį ;
- APVA, kad pateiktų ataskaitas patikrų vietoje, atliktų pagal Komisijos reglamento (EB) 1386/2002 [5] 4 straipsnį.

Vertindami Audituojamą projektą administruojančių ir kontrolės institucijų Audituojamo projekto patikras vietose ir patikrinimus žiūrėjome, ar jos atliktos laikantis nurodytų reglamentų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

Peržiūrėjome visas turimas Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų audito ataskaitas, EK auditorių prašymu Aplinkos ministerijos atliktų APVA 2005 m. lapkričio 30 d. – 2006 m. spalio 31 d. vykdytų ES sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų dokumentų 62-jų viešųjų pirkimų patikrinimų lapus, siekdami nustatyti, ar šiose ataskaitose nėra pateikta informacijos apie Audituojamą projektą.

Vertindami, ar Audituojamo projekto apskaitos sistema ir audito seka yra tinkama, atlikome išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje nurodytų visų EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos sutikrinimus su visais APVA pateiktais:

- išlaidas pateisinančiais dokumentais[8];
- išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais[9];
- sąskaitų duomenimis.

Audito metu atlikome Europos Komisijai pateiktų mokėjimo paraiškų ir jų apmokėjimų sutikrinimus, taip pat pagal visas sutartis atliktų mokėjimų rangovams / paslaugų teikėjams / įrangos tiekėjams bendros sumos sutikrinimus su MI ir APVA apskaitos duomenimis.

Vertinome, ar visas už paramos lėšas įsigytas turtas tinkamai nurodytas galutinio paramos gavėjo apskaitoje.

[7] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2011-09-16 raštas Nr. S-(70-2334)-1852 „Dėl informacijos pateikimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriui.
[8] Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-08-16 įsakymo Nr. 1K-288 2 p. – išlaidas pateisinantys dokumentai: rangovų (paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai ir kt. dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas.
[9] Ten pat, išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai – banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš banko sąskaitos ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

Siekdami įsitikinti, kad Audituojamo projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi padarytas išlaidas, parengėme Audituojamo projekto išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos audito programą.

Didžioji dalis įrodymų dėl audito patikimumo turi būti gauta atlikus detaliuosius testus, taigi, atlikome pakankamos apimties išlaidų testavimo savarankiškas procedūras.

Atsižvelgdami į tai, kad išlaidų ataskaitose ir tarpinėse ir galutinėje mokėjimo paraiškose EK tinkamos finansuoti išlaidos deklaruotos remiantis apmokėtomis sąskaitomis, siekdami tam tikrų Audituojamo projekto deklaraciją baigus teikti paramą rengiančiai institucijai iškeltų tikslų ir spręsdami atitinkamus uždavinius, audito metu atlikome šiuos pagrindinius darbus:

- kontrolės (atitikimo) testavimą ir sąskaitų administravimo kontrolės testus;
- apmokėtų sąskaitų detalųjį testavimą.

Siekdami padidinti audito poveikį, išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detaliojo patikrinimo testus sujungėme. Taigi, atlikome tiek pat išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detaliųjų testų. Atlikdami kontrolės (atitikimo) ir detalųjį testavimą išskyrėme šias su pagrindinėmis kontrolės priemonėmis susijusias klausimų grupes:

- sąskaitos pagrįstumas / išlaidų tinkamumo vertinimas;
- mokėjimo atlikimas;
- mokėjimų apskaita.

Pavyzdžius kontrolės (atitikimo) ir detaliajam testavimui atrinkome remdamiesi Finansų ministerijos 2011 m. birželio 28 d. raštu Nr. (18.52.3-01)-6K-1106727 mums vertinti pateiktos projekto išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos duomenimis, kurioje EK tinkamų finansuoti išlaidų suma – 24 391 585,53 EUR. Tinkamų projekto išlaidų laikotarpiu išrašytos ir apmokėtos 79 sąskaitos (mokėjimo prašymai) – 24 391 585,53 EUR.

Siekdami padidinti audito efektyvumą, gauti pakankamų, tinkamų ir patikimų audito įrodymų, reikalingų nuomonei Deklaracijoje pareikšti, ir vadovaudamiesi išankstinio planavimo metu surinkta informacija, tiriamąją duomenų visumą (generalinę aibę) suskirstėme pagal sutarčių rūšis (statybos rangos darbų, paslaugų teikimo, įrangos tiekimo, žemės įsigijimo). 4 lentelėje pateikiama Audituojamo projekto išlaidų duomenų visuma – projekto tinkamų finansuoti išlaidų laikotarpiu apmokėtos sąskaitos (mokėjimo prašymai) – detalizuota pagal sutartis ir atliktų darbų aktų išlaidų pozicijas (statybos rangos darbų sutarčių atveju).

Pavyzdžius išlaidų kontrolės (atitikimo) ir detaliajam testavimui atrinkome šiais būdais:

- *Statybos rangos darbų sutarčių* atveju atliktų darbų aktų individualių išlaidų pozicijų pavyzdžių atrinkimui taikėme stratifikuotą atranką. Taikydami skirtingus TAS numatytus atrankos

ir parinkimo būdus patikrinome atliktų darbų pozicijas, kurių suma – 11 455 535,50 EUR (46,97 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų):

- *Teigiamos pozicijos*. Atliktų darbų aktų teigiamų pozicijų pavyzdžių atrinkimui taikėme:

– rizikos analizę. Planavimo metu nustatėme galimus informacijos iškraipymus vertinant atliktus darbus. Iš šių įrašų suformuota pavisumė, kurioje pagal 500 TAS taikytas visų elementų pasirinkimo būdas. Pavisumę sudaro 4 darbų pozicijos, kurių bendra vertė 69 074,37 EUR;

– naudodami programinę įrangą IDEA taikėme piniginio vieneto atranką (angl. *MUS*). Pavisumę sudarė 3674 darbų pozicijos, kurių vertė 22 414 239,71 EUR. Faktinę pavyzdžių imtį kontrolės (atitikimo) ir detaliajam testavimui sudarė 147 pavyzdžiai, kurių suma – 11 387 186,68 EUR.

- *Nulinės pozicijos*. Atsižvelgdami į didelį atliktų darbų aktų pozicijų su nulinėmis reikšmėmis skaičių, nusprendėme surinkti papildomus įrodymus ir IDEA programine įranga atsitiktinės atrankos būdu atsirinkome ir patikrinome 10 atliktų darbų aktų pozicijų, kurių suma lygi 0.

- *Paslaugų teikimo sutarčių* atveju: elektros oro linijų iškėlimo sutarčių išlaidoms, siekdami audito racionalumo, taikėme visų objektų parinkimo būdą, likusioms sutartims atsirinkome po 1 rizikos analizės, 1 atsitiktinės atrankos būdu ir 1 didžiausią sąskaitą – patikrinome 11 pagal šias sutartis išrašytas sąskaitas, kurių suma – 1 653 389,14 EUR (6,78 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų).

- *Įrangos tiekimo sutarčių* atveju taikytas visų objektų parinkimo būdas – patikrinome visas pagal šias sutartis išrašytas sąskaitas, kurių suma – 36 906,55 EUR (0,15 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų).

- *Žemės įsigijimo sutarties* atveju taikytas visų objektų parinkimo būdas – patikrinome visas pagal šią sutartį patirtas išlaidas, kurių suma – 101 367,01 EUR (0,42 proc. EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų).

4 lentelė. Audituojamo projekto išlaidų duomenų visuma (detalizuota pagal sutartis ir atliktų darbų aktų pozicijas)

Sutarties Nr.	EK deklaruotų Audituojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų visuma							
	sąskaitos (mokėjimo prašymai)		atliktų darbų aktų pozicijos, iš jų:		teigiamos pozicijos		nulinės pozicijos	
	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR
Statybos darbų rangos sutartys								
A/2007/Z/32	14	4 097 775,64	688	4 097 775,64	657	4 097 775,64	31	-
A/2007/K/37	18	9 686 733,56	929	9 686 733,56	822	9 686 733,56	107	
A/2007/K/38	15	3 172 106,72	1267	3 172 106,72	1 046	3 172 106,72	221	
A/2007/K/40	13	5 526 698,16	1168	5 526 698,16	1 153	5 526 698,16	15	-
Iš viso darbų sutartys:	**60**	**22 483 314,08**	**4 052**	**22 483 314,08**	**3 678**	**22 483 314,08**	**374**	**-**
Paslaugų teikimo sutartys								
2006/96/A/K/LT	6	178 363,27	-	-	-	-	-	-
A/2007/K/24	4	343 501,35						
966-07	3	1 222 325,09	-	-	-	-	-	-
2008/137/ND/P/LT (IŠK-07-02-0055)	2	25 808,18	-	-	-	-	-	-
Iš viso paslaugų teikimo sutartys:	**15**	**1 769 997,89**	-	-	-	-	-	-
Įrangos tiekimo sutartys								
2006/8/IPK/PT/LT	1	2 944,84	-	-	-	-	-	-
A/2006/K/14	1	32 459,45	-	-	-	-	-	-
06-18	1	1 502,26	-	-	-	-	-	-
Iš viso įrangos teikimo sutartys:	**3**	**36 906,55**						
Žemės įsigijimo sutartis			-	-	-	-	-	-
D. Danauskienė	1	101367,01	-	-	-	-	-	-
Iš viso žemės įsigijimo sutartis:	**1**	**101 367,01**	-	-	-	-	-	-
Iš viso	**79**	**24 391 585,53**	x	x	x	x	**x**	**x**

Šaltinis – Valstybės kontrolė

5 lentelėje pateikiami kontrolės (atitikimo) ir detaliajam išlaidų testavimui Audituojamo projekto baigiamojo audito metu atrinkti pavyzdžiai (pagal sutartis).

5 lentelė. Audituojamo projekto EK deklaruotų tinkamų išlaidų duomenų visuma ir atrinkti pavyzdžiai išlaidų testavimui (pagal sutartis)

Sutarties Nr.	EK deklaruotų Projekto tinkamų išlaidų visuma		Detaliajam išlaidų testavimui atrinkta	
	Vnt.	EUR	Vnt.	EUR
		Atliktų darbų aktų pozicijos		
Statybos darbų rangos sutartys				
A/2007/Z/32	688	4 097 775,64	29	1 880 686,30
A/2007/K/37	929	9 686 733,56	52	6 971 871,22
A/2007/K/38	1267	3 172 106,72	25	1 014 023,82
A/2007/K/40	1168	5 526 698,16	45	1 588 954,16
Iš viso darbų sutartys:	**4 052**	**22 483 314,08**	**151**	**11 455 535 ,50**
		Sąskaitos		
Paslaugų teikimo sutartys				
2006/96/A/K/LT	6	178 363,27	3	152 296,97
A/2007/K/24	4	343 501,35	3	252 958,90
966-07	3	1 222 325,09	3	1 222 325,09
2008/137/ND/P/LT (IŠK-07-02-0055)	2	25 808,18	2	25 808,18
Iš viso paslaugų teikimo sutartys:	**15**	**1 769 997,89**	**11**	**1 653 389,14**
Įrangos tiekimo sutartys				
2006/8/IPK/PT/LT	1	2 944,84	1	2 944,84
A/2006/K/14	1	32 459,45	1	32 459,45
06-18	1	1 502,26	1	1 502,26
Iš viso įrangos tiekimo sutartys:	**3**	**36 906,55**	**3**	**36 906,55**
Žemės įsigijimo sutartis				
D. Danauskienė	1	101 367,01	1	101367,01
Iš viso žemės įsigijimo sutartis:	**1**	**101 367,01**	**1**	**101 367,01**
Iš viso	**x**	**24 391 585,53**	**x**	**13 247 198,20**

Šaltinis – Valstybės kontrolė

Taigi, atlikome kontrolės (atitikimo) ir detalųjį EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų (sąskaitų) testavimą ir patikrinome 54,31 proc. (13 247 198,20 EUR) visų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. birželio 28 d. raštu Nr. (18.52.8-01)-6K-1106727 vertinti pateiktoje išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje EK deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Siekdami gauti papildomą užtikrinimą, kad rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose nurodyti darbai atlikti, įranga įsigyta vadovaujantis Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [5] ir sprendimuose [7, 8] nustatytais reikalavimais ir tikslais, 2012 m. kovo 15 d. atlikome patikrą pas galutinį paramos gavėją – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre ir projekto įgyvendinimo vietoje.

Atlikdami patikrą 2012 m. kovo 15 d. Audituojamo projekto įgyvendinimo vietoje: aplankėme Lapių ir Zabieliškio regioninius sąvartynus, Kėdainių ir Jonavos atliekų priėmimo aikšteles ir įsitikinome projekto lėšomis įsigytų investicijų buvimu, susipažinome su atliekų surinkimo ir šalinimo procesu sąvartynuose ir APA. Susipažinome su GPG apskaitos tvarkymu. Per patikrą vietoje GPG patalpose patikrinome ir įsitikinome Komisijos sprendimuose [7, 8] įvardytos Audituojamo projekto lėšomis įsigytos įrangos buvimu:

- biuro baldų vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui (sutartis Nr. 2006/8/IPK/PT/LT);
- biuro organizacinės įrangos (sutartis Nr. 06-18).

Be to, patikrinome Kaune APA, esančios Raudondvario pl., ir Lapių sąvartyno statybos žurnalus. Atsitiktinės atrankos būdu patikrinome:

- konteinerių antrinėms žaliavoms (96 vnt.), atliekų presavimo technikos (3 vnt.), atliekų konteinerių transporto priemonėms, atliekų pervežimui iš APA techninius pasus (9 vnt.);
- uždarytų sąvartynų nekilnojamojo turto registrų išrašus;
- taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus;
- monitoringo programos ataskaitas.

Aplankėme projekto lėšomis įsigytą žemę ir sodybą, esančias sanitarinėje apsaugos zonoje.

Taip pat patikrinome, ar Audituojamo projekto viešinimo priemonės (atminimo lentos) atitinka joms keliamus reikalavimus.

Atlikdami pakartotiną patikrą vietoje 2011 m. liepos 2 d. įsitikinome, kad galutinio paramos gavėjo iš projekto lėšų įsigyta žemė, nėra naudojama žemės ūkio veiklai.

Pagal Audituojamo projekto galutinei ataskaitai patikrinti parengtą audito programą vertinta galutinė ataskaita:

- ar ji parengta pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 (EB) [6] II priedo F straipsnio 4 dalyje galutinei ataskaitai nurodytus reikalavimus;
- gal joje yra reikšmingų netikslumų, ypač dėl Audituojamo projekto įvykdymo, laikantis jame nustatytų tikslų;
- ar ji tinkamai pateikia Audituojamo projekto įgyvendinimą – Komisijos sprendimo [8] I priedo 8 dalyje numatytus tikslus[10];
- ji parengta taip, kaip numato Uždarymo gairės COCOF 08/0022/02 [4].

[10] 2010-06-02 pakeistame Komisijos sprendime Nr. K(2010)3625 nurodytas tikslas: pastačius 6 atliekų priėmimo aikšteles pasiekti, kad komunalinių atliekų atskyrimas sudarytų 7 proc. 2006 m. Galutinis paramos gavėjas Kauno RATC 2010-06-18 rašte Nr. 220, nurodė, kad „atskyrimas 7 proc. 2006 m. negalimas, nes priėmimo aikštelės pastatytos 2009 m. Pasiūlyme dėl Sprendimo pakeitimo buvo nurodyti 2010 m.“ Mums pasiteiravus VI dėl šio neatitikimo gavome atsakymą, kad „neaiškumai / painiava dėl pakeistame EK sprendime nurodyto tikslo „Pastačius 6 atliekų priėmimo aikšteles pasiekti, kad komunalinių atliekų atskyrimas sudarytų 7 proc. 2006 m.“ susidarė dėl to, kad pateikus siūlymą keisti sprendimą EK ir jį derinant tarp EK padalinių, įsivėlė techninė klaida: EK atstovų teigimu, angliškoje sprendimo versijoje yra nurodytas teisingas tikslas – toks, koks buvo pateiktame pasiūlyme keisti sprendimą (t. y. 7 proc. 2010 m.), o lietuviškame per klaidą įrašyta 7 proc. 2006 m.“ Buvome informuoti, kad dėl šių netikslumų EK inicijavo sprendimo klaidų atitaisymo procedūrą“. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, vertinome tikslo pasiekimą 2010 m.

Siekdami surinkti su Audituojamo projekto pažeidimais susijusią informaciją, išsiuntėme paklausimus:

- Finansų ministerijai[11], kuri turėjo pateikti informaciją apie visus jai žinomus su minėtu projektu susijusius pažeidimų atvejus;
- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai[12] (FNTT), kuri turėjo informuoti, ar buvo atliekami tyrimai, susiję su Audituojamo projekto vykdymu.

Atlikome Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų vertinimą.

Taip pat vertinome, ar informavimo ir viešinimo priemonės įgyvendintos pagal Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1386/2002 ir 621/2004 [5, 11], Viešinimo taisyklių [19] ir Komisijos sprendimo [7] III.6 priede pateiktus reikalavimus.

Šio audito rezultatai, gauti įvertinus vidaus kontrolę ir atlikus detaliuosius testus, pateikiami ataskaitos 5–13 skyriuose.

[11] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės raštai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai: 2011-09-16 Nr. S-(70-2334)-1851 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ ir 2012-05-03 Nr. S-(70-2334)-969 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“.
[12] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2011-09-16 raštas Nr. S-(70-2334)-1850 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos.

PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS

5. Pažeidimai

Finansų ministerija 2011 m. gruodžio 28 d. raštu[13] informavo, kad iki 2011 m. gruodžio 27 d. Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje duomenų valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS) buvo užregistruota dešimt su projektu susijusių pažeidimų.

2012 m. gegužės 10 d. raštu[14], patikslindama informaciją apie visus ministerijai žinomus su Audituojamu projektu susijusius pažeidimų atvejus, t. y. visus pripažintus pažeidimus (priimtus sprendimus) ir vykstančius tyrimus dėl pažeidimų nustatymo, informavo, kad nuo 2011 m. gruodžio 27 d. iki 2012 m. gegužės 10 d. projekte buvo atlikti keturi įtariamo pažeidimo tyrimai, nustatyti keturi su projektu susiję pažeidimai.

FNTT 2011 m. gruodžio 14 d. raštu[15] patvirtino, kad ikiteisminiai tyrimai, susiję su Audituojamu projektu, nebuvo atliekami.

Informacija apie Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos sektoriaus projektus administruojančių institucijų pažeidimų tyrimus pateikta ataskaitos 3 priede.

1. Vidutinės svarbos pastebėjimas

APVA audito metu atliko pažeidimų tyrimus ir nustatė 101 489,28 EUR netinkamų finansuoti išlaidų sumą, kurią sudaro:

- 41 095,63 EUR dėl atliktų papildomų darbų (pažeidimo registracijos Nr. LT/12/107/SF/0, Nr. LT/12/108/SF/0, Nr. LT/12/109/SF/0);
- 24 632,68 EUR dėl 14-os savivaldybių ir kitų įstaigų atstovų mokomosios kelionės į Daniją. Išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su Audituojamo projekto tikslais (registracijos Nr. LT/12/089/SF/0);
- 2 085,26 EUR dėl konkursinės dokumentacijos Lapių sąvartyno operatoriaus parinkimui parengimą (registracijos Nr. LT/12/101/SF/0);
- 33 675,71 EUR dėl netinkamai finansuotų išlaidų inžinieriaus aprūpinimui (registracijos Nr. LT/12/081/SF/0, LT/12/082/SF/0, LT/12/083/SF/0).

Ši suma Audituojamo projekto išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje bei projekto galutinėje ataskaitoje nėra įvertinta.

[13] Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas Nr. ((4.79-08)-5K-1123209)-39K-6K-1113658 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei.
[14] Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas Nr. ((4.79-2409)-5K-1209998)-6K-6K-1204273 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei.
[15] Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos raštas Nr. 25/3-3-3-13584 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei.

APVA pažeidimų tyrimų metu nustatyta 101 489,28 EUR netinkamų finansuoti išlaidų suma nebuvo įvertinta rengiant Audituojamo projekto išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo paraišką.

6. Patikrinimai

Informacija apie Europos Audito Rūmų ir Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų atliktus Audituojamo projekto patikrinimus / patikras pateikta ataskaitos 4 priede.

2. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, jeigu fiziniai arba administraciniai patikrinimai yra neišsamūs, dokumentuose nurodomi atrinkti darbai arba sandoriai ir apibūdinamas atrankos metodas. Audito metu nustatyta, kad prieš teikiant I tarpinio mokėjimo paraišką Europos Komisijai, mokėjimo institucija 2008-03-15 atliko administracinį patikrinimą Aplinkos projektų valdymo agentūroje ir patikrinimo rezultatus įformino vietoje patikros lape, tačiau nenurodė taikyto atrankos metodo.

Mokėjimo institucija nesilaikė Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [5] 4 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo ir patikrų įforminimo dokumentuose nenurodė atrankos metodo.

3. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Pagal Audituojamo projekto įgyvendinimo metu galiojusį APVA Procedūrų vadovą [12] (aktuali redakcija nuo 2004-10-26 iki 2008-05-10) privaloma atlikti kiekvienos darbų sutarties vykdymo patikrą kiekvienais metais mažiausiai po vieną kartą.

Nustatyta, kad statybos darbų rangos sutartis Nr. A/2007/K/37 pasirašyta 2007-12-27, tačiau 2008 metų APVA metiniame patikrų plane ir jo atnaujinimuose patikrų vietoje nebuvo numatyta.

Taip pat nustatyta, kad dviejų projekto sutarčių (Nr. A/2007/K/37 ir A/2007/K/40):

- patikra vietoje atlikta 2009-10-22, o patikros vietoje ataskaita Nr. SA-53 parengta 2009-11-06 – vėluojant 6 darbo dienas;
- patikra vietoje atlikta 2009-10-23, o patikros vietoje ataskaita Nr. SA-54 parengta 2009-11-06 – vėluojant 5 darbo dienas.

APVA nesilaikė Procedūrų vadove [12] nurodyto periodiškumo planuojant ir atliekant patikras vietoje ir numatyto patikros vietoje ataskaitos parengimo termino (5 darbo dienų).

7. Viešieji pirkimai

4. Didelės svarbos pastebėjimas

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 24 straipsnio 7 dalį pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

Pagal to paties įstatymo 32 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs.

Atviro konkurso sąlygų (sutartis Nr. 2006/96/A/K/LT „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui“) 3.1 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, privalo atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kurie yra privalomi ir pateikti reikalaujamą kvalifikaciją patvirtinančius nustatytus dokumentus. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų grupę.

Be kitų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodančių dokumentų tiekėjas privalo pateikti ir pagrindinių ekspertų (atitinkančių konkurso sąlygų 4 priede keliamus reikalavimus) sąrašą, kiekvieno eksperto pasirašytą sutikimą dalyvauti projekte, ekspertų gyvenimo aprašymus, diplomų kopijas.

Konkurso sąlygų 4 priede nurodytas reikalavimas, kad ekspertas ekonomistas / finansininkas turėtų aukštąjį ekonominį / finansinį išsilavinimą.

Detalesnių paaiškinimų, kokią studijų kryptį, sritį ar specializaciją perkančioji organizacija laikys atitinkančia kvalifikacijos reikalavimus pirkimo dokumentuose, nebuvo pateikta. Mūsų nuomone, pagal perkančiosios organizacijos paruoštas pirkimo dokumentų sąlygas komisija negalėjo tinkamai įvertinti, koks ekspertų išsilavinimas tinkamas. Pažymėtina, kad kitiems ekspertams nebuvo nurodyta, kokios mokslų krypties turi būti išsilavinimas, buvo reikalaujamas tiesiog aukštasis išsilavinimas.

Siekdamas įrodyti minimo eksperto kvalifikaciją, tiekėjas pateikė Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) diplomą Nr. A009786, kuriame nurodoma, kad ekspertas KTU Vadybos fakultete baigė Vadybos studijų programą ir įgijo kvalifikacinį vadybos mokslo magistro laipsnį. Šio diplomo priede nurodyta, kad siūlomas ekspertas Vadybos fakultete baigė vadybos dieninių studijų programą, studijuodamas gilino finansų vadybos srities žinias. 2006-12-11 savo pretenzijoje dalyvis paaiškina, kad aukštojo mokslo baigimo diplome buvo įrašoma mokslų sritis, nenurodant specializacijos. Todėl eksperto diplome nurodytas vadybos mokslų magistro laipsnis, o diplomo priede – finansų specializacija.

Audito metu nustatyta, kad PO atmetė dalyvio – Kauno technologijos universiteto pasiūlymą, nes tiekėjo pasiūlytas ekspertas neturi aukštojo ekonominio / finansinio išsilavinimo.

Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. 5 komisijos nariai balsavo prieš (prieš balsavo du iš trijų komisijos narių), jog pateiktas diplomo akademinis pažymėjimas neįrodo, kad ekspertas turi finansinį / ekonominį išsilavinimą, nes diplome Nr. 009786 nurodyta vadybos mokslų magistro kvalifikacija. Akademinis pažymėjimas, nurodantis studijuotus dalykus, negali pakeisti diplome nurodytos kvalifikacijos.

Bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriuje ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąraše [15][16] (galiojusio konkurso metu) nurodyta, kad finansininko profesinė kvalifikacija įgyjama baigus vadybos ir verslo administravimo studijų sritį. Todėl, mūsų nuomone, pirkimo dokumentuose nurodytas kvalifikacinis reikalavimas dėl aukštojo finansinio išsilavinimo yra neaiškus dalyviams ir viešojo pirkimo komisijai, nes tokios studijų srities nėra, be to, reikalavimo neaiškumą patvirtina ir viešojo pirkimo komisijos narių nevieningas balsavimas.

Kvalifikacinių aukštojo išsilavinimo nuostatų [16][17] 1 dalyje nurodoma, kad magistro diplome nurodoma dar ir studijų specializacijos kryptis. Šių krypčių pavadinimus tvirtina aukštosios mokyklos taryba (senatas).

Išsilavinimo, įgyjamo Lietuvos Respublikoje, pažymėjimų nuostatų [17][18] 8.5 punkte nurodyta, kad kai mokymo programą sudaro daugiau kaip vienas mokomasis dalykas, pažymėjimuose turi būti duomenys apie asmens mokymąsi arba nuoroda į pažymėjimo priedą, kuriame šie duomenys surašyti.

Remiantis KTU studijų programa vadybos magistrai specializuojasi pagal šias sritis: finansų vadyba, personalo vadyba, marketingo vadyba, inovacijų vadyba ir t. t. Pažymėtina, kad eksperto studijuoti moduliai atitinka būtent finansų vadybos specializaciją, t. y. ekspertas specializavosi būtent finansų vadybos srityje, kaip ir nurodyta diplomo priede. Todėl, mūsų nuomone, dalyvio pasiūlymas dėl neatitikties šiam kvalifikaciniam reikalavimui buvo atmestas nepagrįstai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, mūsų nuomone, nesilaikyta Viešojo pirkimo įstatymo 24 straipsnio 7 dalies, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, o eksperto įgytas Vadybos mokslų magistro laipsnis su specializacija finansų vadybos srityje atitinka Konkurso sąlygų 4 priede nurodytą reikalavimą ekspertui ekonomistui / finansininkui turėti aukštąjį ekonominį / finansinį išsilavinimą.

Minėtos aplinkybės atitinka Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių,

[16] Patvirtintas 2001-04-04 Vyriausybės nutarimu Nr. 368 „Dėl Bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo“.
[17] Patvirtinta 1993-10-14 Vyriausybės nutarimu Nr. 768 „Dėl Kvalifikacinių aukštojo išsilavinimo nuostatų bei Aukštųjų mokyklų steigimo ir atestavimo nuostatų patvirtinimo“.
[18] Patvirtinta 1993-10-18 Vyriausybės nutarimu Nr. 773 „Dėl išsilavinimo, įgyjamo Lietuvos Respublikoje, pažymėjimų nuostatų patvirtinimo“.

nustatymo [10] 6 punkto aplinkybes, todėl finansinė pataisa yra 2 proc. sutarties vertės. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šią sutartį EK buvo deklaruota 178 363,27 EUR išlaidų, o šio audito metu nustatyta 26 717,94 EUR (24 632,68 EUR + 2 085,26 EUR) netinkamų finansuoti išlaidų (žr. 1 pastebėjimą), taikyta finansinė pataisa – 3 032,91 EUR (178 363,27 – 26 717,94) x 2 proc.).

> Perkančioji organizacija, APVA, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [14] 24 straipsnio 7 dalies nuostatų, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatų, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti tikslūs ir aiškūs. Atsižvelgiant į tai, finansinė pataisa yra 3 032,91 EUR.

5. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 3 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] 39 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] 32 straipsnio 3 dalimi prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami.

Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] 32 straipsnio 6 dalimi perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

Remiantis sutarties Nr. A/2007/K/37 pirkimo dokumentų I skyriaus I skirsnio 25.3 punktu nagrinėjant konkurso dalyvio pasiūlyme pateiktą techninę ir finansinę informaciją, komisija negali siekti, siūlyti ar leisti konkurso dalyviui pakeisti pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją. Konkurso dalyviai, komisijai paprašius, gali pateikti papildomus duomenis ir dokumentus apie jų kvalifikaciją.

Audito metu nustatyta, kad, vykdant viešojo pirkimo procedūras (sutartis Nr. A/2007/K/37), dalyvis AB „Požeminiai darbai“ 2007-11-14 pateikė pretenziją, nes, jo nuomone, preliminarioje eilėje pirmu numeriu įrašyti dalyviai UAB „Sienojus“ ir UAB „Laugina“, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ir jų pasiūlytas subrangovas neturi kvalifikacijos atestato sąvartyno darbo projektui rengti, ir tai neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų 5.2.2 punkto.

Atsižvelgdama į tai, viešojo pirkimo komisija paprašė dalyvio UAB „Sienojus“ pateikti kvalifikacijos atestatą, kuris konkurso dalyvio subrangovui – UAB „Kauno komprojektas“ suteikia teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti ypatingo statinio (sąvartyno) projektavimo darbus (darbo projekto parengimo), atsižvelgiant į tai, kad pagal STR 1.01.09:2003 sąvartynai pagal naudojimo paskirtį priskiriami IX daliai „Kiti statiniai“.

Atsakydama į komisijos paklausimą UAB „Sienojus“ informavo, kad dalyvio paskirtasis subrangovas UAB „Kauno komprojektas“ negali vykdyti ypatingo statinio (sąvartyno) projektavimo darbų (darbo projekto parengimo), todėl atsisakė jų paslaugų ir pasirinko kitą subrangovą, t. y. UAB „Consena“, ir pateikė kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Viešojo pirkimo komisija, remdamasi pirkimo dokumentų I skyriaus I skirsnio 25.3 punkto nuostatomis bei atsižvelgdama į dalyvių UAB „Sienojus“ ir UAB „Laugina“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateiktos informacijos apie kvalifikaciją patikrinimo rezultatus ir pateiktą atsakymą į komisijos paklausimą, nutarė, kad dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Kadangi dalyvis UAB „Sienojus“ pripažino, kad negalės pasinaudoti kito ūkio subjekto (pasiūlyme nurodyto subrangovo UAB „Kauno komprojektas“) teise vykdyti ypatingo statinio (sąvartyno) projektavimo darbus, nes nurodytas subrangovas tokios teisės neturi, tai VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas įrodyti, kad dalyvis galės pasinaudoti kitų ūkio subjektų pajėgumais buvo neįgyvendintas ir todėl dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi šio dalyvio pasiūlymas turėjo būti atmestas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, mūsų nuomone, APVA, vadovaudamasi pirkimo dokumentų I skyriaus I skirsnio 25.3 punkto nuostatomis t. y. leisdama viešąjį konkursą laimėjusiam dalyviui prieš pasirašant sutartį pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį subrangovą UAB „Kauno komprojektas“ pakeisti reikalavimus atitinkančiu subrangovu (UAB „Consena“), nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatų.

Šio pirkimo metu APVA 2007-11-12 atmetė dalyvio UAB „Skirnuva“ ir UAB „Geosintetika“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateiktą pasiūlymą, kadangi dalyvio pasiūlymo kiekių žiniaraščių keliose pozicijose darbų mato vienetai nurodyti – kvadratiniai milimetrai, o vadovaujantis pirkimo dokumentų IV skyriaus reikalavimais šiose pozicijose darbų mato vienetai turi būti – kvadratiniai

metrai.[19]

Po preliminarios eilės sudarymo dalyvis UAB „Skirnuva“ nurodė, kad jo pasiūlymo darbų kiekių žiniaraščių pozicijose mato vienetai mm^2 atitinka m^2, tačiau perkančioji organizacija į šį paaiškinimą neatsižvelgė, be to, šio klausimo apskritai nenagrinėjo ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 121 straipsnio reikalavimus.

Mūsų nuomone, APVA laikėsi nevienodo požiūrio į pateiktus pasiūlymus, nes po preliminarios eilės sudarymo vienam iš dalyvių leido pakeisti jo pasiūlyme nurodytą informaciją apie kvalifikaciją, o į kito dalyvio paaiškinimą neatsižvelgė.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Sienojus“ ir UAB „Laugina“ pakeistas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir tokia keitimo procedūra buvo numatyta pirkimo dokumentuose[20], o dalyvių UAB „Skirnuva“ ir UAB „Geosintetika“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateiktas pasiūlymas buvo didesnės vertės, nei mažiausią kainą pasiūliusių UAB „Sienojus“ ir UAB „Laugina“ pasiūlymas, mūsų nuomone, šis pažeidimas yra formalaus pobūdžio ir neturi finansinio poveikio.

> Perkančioji organizacija, APVA, po preliminarios eilės sudarymo vienam iš dalyvių leido pakeisti jo pasiūlyme nurodytą informaciją apie kvalifikaciją, o į kito dalyvio paaiškinimą neatsižvelgė. Atsižvelgiant į tai, kad dalyvio kvalifikacijos keitimo/tikslinimo procedūra buvo numatyta pirkimo dokumentuose, o kitas pasiūlymas buvo didesnės vertės, mūsų nuomone, šis pažeidimas yra formalaus pobūdžio ir neturi finansinio poveikio.

6. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08 ir nuo 2007-11-08 iki 2008-09-15) 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų, o 2 dalyje – kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

[19] 2007-11-12 APVA rašte „Dėl atviro konkurso „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba“, pirkimo Nr. 55348 pasiūlymo atmetimo ir preliminarios pasiūlymų eilės“ UAB „Skirnuva“ nurodyta, kad dalyvio UAB „Skirnuva“ ir UAB „Geosintetika“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateiktas pasiūlymas atmestas, nes „dalyvio pasiūlymo kiekių žiniaraščių 12.1.12–12.1.17 ir 12.2.9–12.2.13 eilutės darbų mato vienetai nurodyti – mm2 (kvadratiniai milimetrai), vadovaujantis pirkimo dokumentų IV skyriaus reikalavimais 12.1.12–12.1.17 ir 12.2.9–12.2.13 eilutėse darbų mato vienetų turi būti m^2 (kvadratiniai metrai). Dalyvis taip pat nepateikė atsakymo į vertinimo komisijos 2007-10-29 raštu Nr. APVA-4637 pateiktą paklausimą dėl šių pasiūlymo kiekių žiniaraščiuose nurodytų pozicijų mato vienetų“.

[20] Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] 32 straipsnio 7 dalimi kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis.

To paties įstatymo 56 straipsnyje yra nurodytas išsamus sąrašas aplinkybių, esant kurioms papildomi darbai turi būti perkami neskelbiamų derybų būdu.

Atliekant auditą nustatyta, kad papildomi darbai (žr. 6 lentelę) pagal sutartį Nr. A/2007/K/37 „Lapių regioninio sąvartyno statyba“ , sutartį Nr. A/2007/Z/32 „Zabieliškio regioninio sąvartyno statyba“, sutartį Nr. A/2007/K/38 „Atliekų priėmimo aikštelių statyba“ ir sutartį Nr. A/2007/K/40 „Sąvartynų uždarymas“ įsigyti be viešojo pirkimo procedūros.

6 lentelė. Audituojamo projekto atlikti papildomi darbai nevykdant viešojo pirkimo procedūros

Sutarties Nr.	Sutarties objektas	Papildomų darbų suma, EUR
A/2007/Z/32	Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba	283 889,77
A/2007/K/37	Lapių regioninio sąvartyno statyba	323 650,95
A/2007/K/38	Atliekų priėmimo aikštelių statyba	386 872,47
A/2007/K/40	Sąvartynų uždarymas	185 680,40
Iš viso:		**1 180 093,59**

Šaltinis – Valstybės kontrolė

Atsižvelgiant į tai, kad įsigyjant papildomus darbus nebuvo pakeistos esminės pagrindinės sutarties sąlygos: sutarties vertė, darbų pobūdis, mokėjimo sąlygos, pažeidimas yra formalus ir finansinių pasekmių neturi, todėl finansinės pataisos nesiūlome.

> Papildomi darbai įsigyti nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo [14] 56 straipsnio, tačiau įsigyjant papildomus darbus nebuvo keistos pagrindinės sutarties sąlygos (pažeidimas yra formalaus pobūdžio).

7. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 18 straipsnio 6 dalies 4 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartyje turi būti nustatyta atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka, o 11 punkte, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

2006 m. gruodžio 22 d. sutarties Nr. 2006/96/A/K/LT, pasirašytos tarp Aplinkos projektų valdymo agentūros, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro ir UAB „Cowi Baltic“, 9.7 punkte nurodyta, kad faktinės pinigų sumos turi būti pagrįstos tiekėjo sąskaitomis, kuriose nurodomas faktinis kiekvienos kategorijos eksperto darbo dienų skaičius ir faktinės kompensuojamos išlaidos, patirtos per tą laikotarpį.

2007-04-27 sutarties pakeitimu Nr. 1 ši nuostata buvo pakeista į „Kasdieninės pagalbos teikimui išleistos pinigų sumos turi būti pagrįstos sąskaitomis, kuriose nurodomas faktinis kiekvienos kategorijos eksperto darbo dienų skaičius bei pateikiamos ir faktinės kompensuojamosios išlaidos per tą laikotarpį. Visų kitų sutartyje numatytų užduočių vykdymui išleistos pinigų sumos turi atitikti per

ataskaitinį laikotarpį užbaigtų užduočių sumai, nurodytai atskirai pridedame Tiekėjo, Perkančiosios organizacijos bei Užsakovo patvirtintame lėšų paskirstymo žiniaraštyje.“

Tokiu būdu buvo pakeista atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka: vietoje numatytų valandinių užduočių įkainių atsirado užduočių įkainiai, nepriklausantys nuo dirbtų dienų skaičiaus, neliko tiekėjo numatytų dirbti dienų skaičiaus.

Įvertinus šiuos pasikeitimus[21], mūsų nuomone, pažeidimas yra formalus ir neturi finansinio poveikio.

> Perkančioji organizacija, APVA, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [14] nuostatų, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos (finansinė išraiška nepakito, pažeidimas yra formalaus pobūdžio).

8. Vidutinės svarbos pastebėjimas

1. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08 ir nuo 2007-11-08 iki 2008-09-15) 16 straipsnio 2 dalį, komisijos pirmininku ir nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad nepriekaištingos reputacijos asmenimis nelaikomi asmenys, teisti už sunkų ir labai sunkų nusikaltimą ar nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai arba valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas; asmenys, teisti už tyčinį nusikaltimą, – jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas; asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus; asmenys, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ir pan.

APVA, prieš sudarydama viešųjų pirkimų komisiją (sutartys Nr. A/2007/Z/32, A/2007/K/38, A/2007/K/37, 2006/96/A/K/LT ir A/2007/K/40), nepateikė įrodymų, kaip įsitikino, kad komisijos nariai turi nepriekaištingą reputaciją (ypač tais atvejais, kai nariais buvo skiriami ne perkančiosios organizacijos darbuotojai).

2. Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų[22] [18] 10 punkte nurodyta, kad pretenzijas nagrinėtų perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo, nesantis komisijos nariu, arba sudaroma kita komisija.

Audito metu nustatyta, kad vykdant viešuosius pirkimus (sutartys Nr. A/2007/Z/32, A/2007/K/37, 2006/96/A/K/LT) pretenzijas nagrinėjo APVA viešojo pirkimo komisija / komisijos pirmininkas.

3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08 ir nuo 2007-11-08 iki 2008-09-15) 16 straipsnio 1 dalimi, Komisija dirba pagal ją

[21] Užduotyje numatyto eksperto įkainį padauginę iš numatomo atlikti darbo laiko tai užduočiai ir gautą sumą palyginę su Sutarties pakeitime Nr. 1 nurodyta užduoties kaina skirtumų nenustatėme.
[22] Patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-73.

sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą.

Audito metu nustatyta, kad:

- vykdant pirkimą (sutartis Nr. 2006/96/A/K/LT), sudaryta viešojo pirkimo komisija buvo įpareigota savo darbe vadovautis Prekių, darbų ir paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu[23]. Kiekvienas komisijos narys pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kuriame buvo minimas ankstesnės redakcijos Prekių, darbų ir paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas[24], patvirtintas APVA direktoriaus 2005-02-24 įsakymu Nr. T1-14;
- vykdant pirkimą (sutartis Nr. A/2007/K/40), sudaryta viešojo pirkimo komisija buvo įpareigota savo darbe vadovautis Prekių, darbų ir paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu[25]. Kiekvienas komisijos narys pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kuriame buvo minimas vėlesnės redakcijos Prekių, darbų ir paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas[26], patvirtintas APVA direktoriaus 2006-07-14 įsakymu Nr. T1-101.

> Vykdydama savo funkcijas perkančioji organizacija, APVA, nesilaikė kai kurių Viešųjų pirkimų įstatymo [14] ir VPT rekomendacijų [18] reikalavimų, susijusių su viešojo pirkimo komisijos sudarymu ir veikla.

9. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 24 straipsnio 7 dalimi, pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Remiantis 27 straipsnio 2 dalimi, Perkančioji organizacija papildomus pirkimo dokumentus (patikslinimus, paaiškinimus) turi pateikti ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Nustatyta, kad vykdant viešojo pirkimo procedūrą (sutartis Nr. A/2007/Z/32), nebuvo atsakyta[27] į 2007-05-28 UAB „Kamesta“ pateiktą prašymą Nr.1087 dėl darbų kiekių žiniaraščių 15.4.1 punkto – aukšto spaudimo plovimo aparato techninių parametrų pateikimo, nors terminas teikti paaiškinimus nebuvo pasibaigęs. Mūsų nuomone, pirkimo dokumentai buvo neaiškūs, todėl perkančioji organizacija privalėjo juos patikslinti.

> Perkančioji organizacija, APVA, nepatikslinusi neaiškių pirkimo dokumentų, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [14] 24 straipsnio 7 dalies reikalavimų.

10. Vidutinės svarbos pastebėjimas

1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2007-11-08 iki

[23] Patvirtintas 2006 m. liepos 14 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-101.
[24] Patvirtintas 2005 m. vasario 24 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-14.
[25] Ten pat.
[26] Patvirtintas APVA direktoriaus 2006-07-14 įsakymu Nr. T1-101.
[27] Perkančioji organizacija vadovavosi pirkimo dokumentų sąlygų 10.1 punktu, kad konkurso dalyviai gali raštu prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti pirkimo dokumentus su sąlyga, kad tokie prašymai bus gauti ne vėliau kaip prieš 12 darbo dienų iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir konkurso sąlygų 10.2 punktu, kad perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis pateiktas laiku, atsako ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – dalyvio pateikto prašymo neanalizavo.

2008-09-15) 18 straipsnio 5 dalimi, sudariusi pirkimo sutartį, perkančioji organizacija nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, apie pirkimo sutarties sudarymą išsiunčia pranešimus kitiems dalyviams. Pirkimo sutartis Nr. A/2007/K/40 sudaryta 2008-09-18. Pranešimai apie sutarties sudarymą likusiems kandidatams išsiųsti 2008-09-26 – vėluojant 3 darbo dienas.

Vadovaujantis šio įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, pirkimo procedūrų ataskaita turi būti parengta ir, pirkimui pasibaigus, per 14 dienų pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalį pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis. Sutartis su tiekėju sudaryta 2008-09-18.

Nustatyta, kad APVA, pildydama Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos patikros lapą, netinkamai nurodė kontrolės objektą, o pačią Pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai parengė ir pateikė 2008-10-13 – vėluojant 11 dienų.

2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 27 straipsnio 2 dalimi perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentus pateikti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 6 dienas nuo tiekėjų prašymo pateikti pirkimo dokumentus gavimo dienos, jei prašymas pateiktas likus pakankamai laiko (ne mažiau kaip 6 dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Audito metu APVA nepateikė įrodymų, kad pirkimo dokumentai laiku buvo pateikti visiems dalyviams (nepateikti įrodymai dėl sutarčių Nr. A/2007/Z/32, A/2007/K/38 ir 2006/96/A/K/LT).

3. Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08 ir nuo 2007-11-08 iki 2008-09-15) 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą. Pagal minėto įstatymo 16 straipsnio 1 dalies reikalavimus perkančioji organizacija pirkimui organizuoti ir atlikti privalo sudaryti viešojo pirkimo komisiją. Atsižvelgiant į šias nuostatas, viešojo pirkimo komisija privalo būti sudaryta viešojo pirkimo pradžioje.

Audito metu nustatyta, kad viešųjų pirkimų komisija (sutartys Nr. A/2007/Z/32, A/2007/K/38, A/2007/K/37, 2006/96/A/K/LT ir A/2007/K/40) buvo sudaryta ne iš karto prasidėjus viešajam pirkimui, o praėjus daugiau kaip vienam mėnesiui nuo viešojo pirkimo procedūrų pradžios.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 121 straipsnio 5 dalimi, perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Audito metu nustatyta, kad vykdant viešąjį pirkimą (sutartis Nr. A/2007/K/37) pirkimo dalyvio UAB „Skirnuva“ pretenzija pateikta 2007-12-03, išnagrinėta 2007-12-14 – pavėluota 6 dienas; viešojo pirkimo dalyvio AB „Požeminiai darbai“ pretenzija pateikta 2007-11-14, išnagrinėta 2007-11-22 – pavėluota 3 dienas.

Perkančioji organizacija, APVA, atlikdama pirkimo procedūras, nesilaikė kai kurių Viešųjų pirkimų įstatyme [14] nustatytų terminų.

11. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [14] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-08) 18 straipsnio 4 dalį, jungtinės veiklos sutarties teisinės formos reikalavimai turi būti nustatyti pirkimo dokumentuose. Pirkimo dokumentų (sutartis Nr. A/2007/K/38) I skyriaus 4.7.5 punkte APVA nurodė, kad tuo atveju, kai pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, kurioje privalo būti įrašytas jungtinės veiklos partnerių įsipareigojimas nekeisti jungtinės veiklos sutarties projekto įgyvendinimo metu.

Viešąjį pirkimą laimėjusių jungtinės veiklos dalyvių AB „Raseinių melioracija“ ir UAB „Laugina“ sudaryta jungtinės veiklos sutartis Nr. 135 neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, nes, remiantis jos 10.2 punktu, sutartis gali būti pakeista ar papildyta partneriams pasirašant bendrą dokumentą.

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalį viešojo pirkimo komisija turi pareikalauti, kad jungtinės veiklos sutartis būtų sudaryta pagal nurodytus reikalavimus, siūlydama laimėtojui pasirašyti sutartį. Kadangi sutarties vykdymo metu jungtinės veiklos sutartis nebuvo keista, mūsų nuomone, šis neatitikimas yra formalus ir neturi finansinio poveikio.

Perkančioji organizacija, APVA, nepareikalavo, kad jungtinės veiklos sutartis būtų sudaryta pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo [14] 18 straipsnio 2 ir 4 dalyse.

8. Išlaidų tinkamumas

12. Didelės svarbos pastebėjimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 [13] 4 straipsnyje nurodoma, kad už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos visos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais.

Sutarčių Nr. A/2007/K/37 ir A/2007/K/38 bendrųjų sąlygų 4.10 punkte nurodyta, kad užsakovas turi leisti rangovui iki pradžios datos susipažinti su visa užsakovo turima informacija apie statybvietės geologines bei hidrologines sąlygas, įskaitant aplinkos apsaugą. Užsakovas panašia tvarka turi leisti rangovui susipažinti su visa tokio pobūdžio informacija, kurią jis įgyja po pradžios datos. Rangovas atsako už visos tokios informacijos interpretavimą.

Rangovo prievolė yra gauti, kiek tai praktiškai įmanoma (atsižvelgiant į laiką ir kainą), visą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti

pasiūlymą arba darbus. Kartu rangovo pareiga – patikrinti ir ištirti statybvietę, jos aplinką, anksčiau minėtus duomenis bei visą turimą informaciją ir, prieš pateikiant pasiūlymą, kiek tai susiję su atitinkamais dalykais, būti ištyrus, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant):

- statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas;
- hidrologines bei klimatines sąlygas;
- apimtį bei pobūdį darbo ir prekių, reikalingų vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus;
- šalies įstatymus, procedūras bei darbo organizavimo praktiką;
- rangovo poreikius į statybvietę, įsikūrimą, įrangą, personalą, elektrą, transportą, vandenį bei kitas paslaugas.

Bendrųjų sąlygų 4.11 punkto a papunktyje nurodyta, kad rangovo pareiga išsiaiškinti, kad sutarties priimta suma yra teisinga ir pakankama, o b papunktyje nurodyta, kad rangovo pareiga remtis tuo, kad priimta sutarties suma pagrįsta duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte.

Audito metu nustatyta, kad buvo atlikti papildomi darbai, nes rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą nepakankamai patikrino ir ištyrė statybvietę, jos aplinką, nesurinko būtinos informacijos apie rizikas, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios galėjo turėti įtakos sutarties darbams.

Pagal sutartį Nr. A/2007/K/37 patirtos 1 458,28 EUR, o pagal sutartį Nr. A/2007/K/38 – 7 164,93 EUR išlaidos yra netinkamos finansuoti. Visa suma – 8 623,21 EUR.

> **8 623,21 EUR** išlaidos, patirtos nesilaikant sutarties sąlygų ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 [13] 4 straipsnio reikalavimų, yra netinkamos finansuoti.

9. Audito seka ir apskaitos sistemos

> Audito seka ir apskaitos sistemos atitiko joms keliamus reikalavimus.

10. Viešinimas

13. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1164/1994 [6] 14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipoje numatyta, kad turi būti užtikrintas tinkamas projekto viešinimas, Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004 [11] 1 straipsnyje nustatyta, kad atsakingos institucijos turi naudoti informavimo ir viešumo priemones, kurių tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie projektus, kurių dalį finansuoja Sanglaudos fondas, ir atskleisti, kokį vaidmenį vaidina Bendrija per minėtą fondą. Viešinimo

taisyklių[28] [19] 8 punkte nustatyta, kad informacijos viešinimo priemonės skirstomos į privalomas ir papildomas, o 9 punkte išvardytos privalomos informacijos viešinimo priemonės, kurios yra informaciniai stendai, atminimo lentos ir informacija visuomenės informavimo priemonėse.

Audito metu nustatyta, kad dviejuose informaciniuose filmuose, dviejose radijo laidose ir dviejose TV laidose (GA priedai Nr. 12–17) transliuotose visuomenės informavimo priemonėse nenurodytas įgyvendinamo projekto pavadinimas, projektui finansuoti skirtų Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų suma pagal šaltinius nacionaline valiuta ir jos procentinė išraiška pagal Europos Komisijos sprendimą skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų, projekto įgyvendinimo terminai ir informacija apie jo tikslus, kokių rezultatų bus pasiekta ir kokią ekonominę socialinę naudą įgyvendinus projektą turės administracinio (-ių) vieneto (-ų), kurio (-ių) teritorijoje jis įgyvendinamas, bendruomenė ir projekto įgyvendinimo eiga. Taigi nurodytose viešinimo priemonėse nebuvo pateikta informacija, nurodyta Viešinimo taisyklių [19] 35 punkte.

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004 [11] 4 straipsnį informavimo ir viešumo instrumentai apima ir elementą – Europos vėliavą, laikantis priede nustatytų grafinių taisyklių.

Vertindami Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje pateiktus spaudos straipsnius, nustatėme atvejus, kai nebuvo nurodyta privaloma informacija, t. y. Europos Sąjungos vėliava (Galutinės ataskaitos priedai Nr. 1–11).

> Kai kurios viešinimo priemonės neturėjo privalomųjų elementų, nurodytų Komisijos reglamente (EB) Nr. 621/2004 [11] ir Viešinimo taisyklėse [19].

14. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Pagal Informacijos apie ES Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių[29] 55, 56 ir 60 punktus, kad GPG kasmet, ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d., pateikia įgyvendinančiajai institucijai derinti atnaujintą informacijos apie ES Sanglaudos fondo projektą viešinimo planą, o įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo projektą viešinimo plano suderinimo dienos įregistruoja jį SFMIS (56 punktas).

Audito metu nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija SFMIS Sanglaudos fondo modulyje dalies viešinimo planų (2005, 2006, 2007 ir 2008 m.) nėra įregistravusi, o 2009 m. plane pateikta neužpildyta viešinimo plano forma.

Pagal minėtų taisyklių 60 punktą įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas nuo informacijos apie ES Sanglaudos fondo projektą viešinimo plano įgyvendinimo ataskaitos gavimo dienos įregistruoja ją SFMIS Sanglaudos fondo modulyje. Nustatyta, kad 2005 m. ir 2006 m. I ir II pusmečių bei 2007 m. I pusmečio viešinimo plano įgyvendinimo ataskaitos neįregistruotos.

[28] Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-24 nutarimu Nr. 1043.
[29] Ten pat.

APVA neįregistravo SFMIS privalomos informacijos apie projekto viešinimą (projekto viešinimo planus, jų įgyvendinimo ataskaitas).

11. Projekto galutinė ataskaita

2011 m. birželio 28 d. raštu Nr. (18.52.1-01)-6K-1106727 (žr. 5 priedą) Valstybės kontrolei vertinti pateikta Audituojamo projekto galutinė ataskaita (žr. 7 priedą).

15. Didelės svarbos pastebėjimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [6] II priedo F straipsnyje numatyta, kad Komisijai galutinė ataskaita turi būti pateikta per šešis mėnesius po to, kai baigiamas vykdyti projektas arba projekto etapas. Reglamento II priedo D straipsnyje nustatyta, kad per šešis mėnesius nuo nustatyto darbų pabaigos termino Komisijai pateikiama mokėjimo paraiška ir paraiška dėl išlaidų, nustatytų sprendime suteikti paramą projektui, projekto etapui ar projekto grupei.

Pagal Sanglaudos fondo ir Ex-ISPA 2000–2006 metų projektų uždarymo gaires (angl. *Guidelines on the Closure of Cohesion Fund and Ex-ISPA projects 2000-2006*) [4] 2.2 p. rekomenduojama deklaraciją baigus teikti paramą pateikti per 6 mėnesius nuo paskutinės išlaidų tinkamumo datos kartu su prašymu galutiniam mokėjimui ir galutine išlaidų deklaracija bei projekto galutine ataskaita.

Remiantis EK gairėmis dėl baigiamosios deklaracijos parengimo (angl. *Guidance note on declaration at winding-up of projects under article 12 1. f of Regulation 1164/94, article 13 and annex III of regulation 1386/2002*) [5], rekomenduojama, kad Deklaracija turi būti pateikta baigus kiekvieną projektą, projekto etapą (techniškai ir finansiškai nepriklausomą) arba projektų grupę ir ne vėliau kaip pateikus prašymą galutiniam mokėjimui ir galutinę išlaidų deklaraciją.

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse[30] [9] reglamentuoti projekto galutinės ataskaitos ir išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos pateikimo susijusioms institucijoms terminai. Remiantis šių taisyklių 6.10 p., mokėjimo institucija baigiamajam valstybiniam auditui atlikti pateikia įgyvendinančiosios institucijos patvirtintą galutinę projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitą ir mokėjimo paraišką Europos Komisijai gauti galutinę išmoką, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki nustatyto šių dokumentų pateikimo Europos Komisijai termino.

Audituojamo projekto galutinę ataskaitą ir išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo paraišką deklaraciją baigus teikti paramą rengiančiai institucijai Valstybės kontrolei mokėjimo institucija pateikė nesilaikydama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje

[30] Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (su pakeitimais).

taisyklėse nustatyto šių dokumentų pateikimo Valstybės kontrolei termino. Audituojamo projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita ir projekto galutinė ataskaita turėjo būti pateikta iki 2011 m. balandžio 1 d., tačiau pateikta 2011 m. birželio 29 d., t. y. Tarybos reglamentu nustatyto šių dokumentų pateikimo Europos Komisijai termino priešpaskutinę dieną, vėluojant tris mėnesius.

> Valdymo ir kontrolės sistemos institucijos neužtikrino, kad kokybiškai parengtos Audituojamo projekto galutinė ataskaita, išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška Valstybės kontrolei būtų pateiktos laiku.

16. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Audito metu nustatyta, kad Audituojamo projekto galutinės ataskaitos:

- 2.5 dalyje nurodyta, kad Audituojamas projektas buvo vykdomas pagal tris atskiras darbų sutartis, nors projektas buvo vykdomas pagal keturias atskiras rangos (statybos darbų) sutartis;
- 2.5.1 dalies „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba“ lentelėje Nr. 19 nurodyta, kad įrengta 0,2065 ha ploto statybos ir griovimo atliekų aikštelė, o faktinis statybos ir griovimo atliekų aikštelės plotas pagal 2009-11-20 pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. STN4-148 yra 0,2118 ha. Toje pačioje lentelėje nurodyta darbų pabaigos data 2009-06-26, o statybos darbų pabaigos data pagal perėmimo pažymą yra 2009-06-25;
- 2.5.2 dalies „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba“ lentelėje Nr. 20 nurodyta darbų pabaigos data 2009-12-31, o statybos darbų pabaigos data pagal perėmimo pažymą yra 2009-12-24;
- 2.5.3 dalies „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba“ lentelėje Nr. 21 nurodyta darbų pabaigos data 2010-12-30, o statybos darbų pabaigos data pagal perėmimo pažymą yra 2011-01-07;
- 2.5.4 dalies „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Sąvartynų uždarymas“ lentelėje Nr. 22 nurodyta darbų pabaigos data 2010-06-15, o darbų pabaigos data pagal perėmimo pažymą yra 2010-06-19;
- 2.6 dalyje „Projekto atitikimas EK sprendimui Nr. (2005) 1610 (2005 m. gegužės 24 d.) ir EK sprendimui Nr. K(2010) 3625 (2010 m. birželio 2 d.)“ nurodyta, kad viešųjų pirkimų dokumentuose sutarčių sąlygos darbams buvo parengtos pagal FIDIC tipinių sutarčių sąlygas, o sutarčių sąlygos paslaugoms – pagal Bendrąsias EB finansuojamų paslaugų sutarčių sąlygas. Audito metu nustatėme, kad sutarčių sąlygos paslaugoms pirkti parengtos nenaudojant standartinių Bendrųjų EB finansuojamų paslaugų sutarčių sąlygų;

- 2.6.4 dalyje „Įgyvendinti fiziniai tikslai“ nurodyta, kad pagal iš visų Kauno regiono savivaldybių gautus duomenis, regione per 2010 m. iš bendro komunalinių atliekų srauto atskirta 6,9 proc. atliekų. Audito metu nustatyta, kad šis procentas yra 9,6;
- 3.6.1 dalyje „Galutinės ataskaitos teikimo sąlygos (EK sprendimo 12.3 papunktis)“ nurodyta, kad užbaigus Audituojamo projekto darbus, užsakovas Kauno RATC sąvartyno bei aikštelių eksploatacijai konkurso būdu parinko turinčius tinkamą kvalifikaciją bei patirtį operatorius dirbti šioje srityje, nors Lapių sąvartyno operatorius nebuvo parinktas konkurso būdu[31];
- 2.6.4 dalies „Įgyvendinti fiziniai tikslai“ 24 lentelėje nurodytas ne visų priežiūros rodiklių fizinio ir finansinio įgyvendinimo lygis;
- 5 dalies „Išvados“ 5 išvadoje du kartus nurodyta, kad pastatyta statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir perdirbimo aikštelė, bet nepaminėta, kad įrengta ir kompostavimo aikštelė.

> Projekto galutinėje ataskaitoje pateikta informacija nėra visiškai išsami ir tiksli.

17. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Komisijos sprendime [8] nurodytas vienas iš tikslų – viešąsias atliekų surinkimo paslaugas teikti papildomai 121,877 tūkst. žmonių ir tokiu būdu iki 2010 m. pagerinti vidutinį surinkimo procentą iki 93 proc.

Galutinėje ataskaitoje nurodyta, kad viešosios atliekų surinkimo paslaugos 2011 m. turi būti teikiamos 610,363 tūkst. regione gyvenančių žmonių ir pagerintas vidutinis surinkimo procentas iki 99 proc. Dėl nenumatytų aplinkybių: pablogėjusios ekonominės situacijos šalyje ir dėl to išaugusios emigracijos, 2010 m. gyventojų regione realiai buvo mažiau nei buvo prognozuota projekto galimybių studijoje, todėl po projekto įgyvendinimo viešosios atliekų surinkimo paslaugos papildomai teikiamos 72,405 tūkst. gyventojų, nors buvo planuota 121,877 tūkst.

Audito metu buvo gauta informacija, kad viešosios atliekų surinkimo paslaugos papildomai teikiamos 64 673 gyventojams, o vidutinis atliekų surinkimo procentas yra 97,82 proc.

> EK sprendime [8] nurodytas tikslas pagerinti vidutinį surinkimo procentą yra pasiektas (97,82 vietoj planuotų 93 proc.), nors planuotas gyventojų skaičiaus rodiklis viešąsias atliekų surinkimo paslaugas teikti papildomai 121,877 tūkst. žmonių nepasiektas.

18. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Komisijos reglamento Nr. 1386/2002 [5] II priede nurodyta, kad galutinės mokėjimo paraiškos A priede turi būti pateikiama projekto fizinio ir finansinio įgyvendinimo ataskaita.

Komisijos sprendime [8] nurodyta, kad įgyvendinti priežiūros rodikliai: „Lapių regioninio

[31] 2009 m. gruodžio 29 d. visuotiniame susirinkime (protokolo Nr. 24) dalininkai pritarė Lapių sąvartyno eksploatacijos išlaidoms ir pratęsė sąvartyno eksploatavimo sutartį su UAB „Kauno švara“. Taip papildomu 2009-12-31 susitarimu prie 2005-10-06 nuomos sutarties Nr. (4.4-07)-S1-5 sutarties šalys pratęsė sąvartyno nuomos terminą iki 2014-12-31 ir papildomai išnuomojo audituojamojo projekto lėšomis įrengtą antrąjį kaupimo lauką.

sąvartyno I kaupimo lauko uždarymas“ ir „Zabieliškio regioninio sąvartyno privažiavimo kelias (naujo kelio įrengimas ir esamo remontas)“ turėtų atitinkamai sudaryti: 11,7–12,6 ha ir 3,3–3,6 km. Galutinės mokėjimo paraiškos A priede ir galutinės ataskaitos 24 lentelėje nurodyta, kad įgyvendintas priežiūros rodiklis „Lapių regioninio sąvartyno I kaupimo lauko uždarymas“ sudaro 12,3 ha, o „Zabieliškio regioninio sąvartyno privažiavimo kelias (naujo kelio įrengimas ir esamo remontas)“ sudaro 3,421 km.

Atliekant auditą nustatyta, kad paraiškoje Europos Komisijai dėl projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ finansavimo yra nurodytas priežiūros rodiklio „Lapių regioninio sąvartyno I kaupimo lauko uždarymas“ pagrindo plotas – 12,5 ha. Todėl galutinis paramos gavėjas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras galutinės mokėjimo paraiškos A priede ir galutinės ataskaitos 24 lentelėje, remiantis išpildomosios nuotraukos duomenimis, nurodė priežiūros rodiklio „Lapių regioninio sąvartyno I kaupimo lauko uždarymas“ pagrindo plotą. Atliekant auditą taip pat nustatyta, kad priežiūros rodiklis „Zabieliškio regioninio sąvartyno privažiavimo kelias (naujo kelio įrengimas ir esamo remontas)“, kuris buvo nutiestas įgyvendinant sutartį Nr. A/2007/Z/32 „Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba“ ilgis pagal kelio išpildomąją nuotrauką – 3,43 km.

> Galutinės mokėjimo paraiškos A priede ir galutinės ataskaitos 24 lentelėje nurodyti netikslūs įgyvendintų priežiūros rodiklių dydžiai: „Lapių regioninio sąvartyno I kaupimo lauko uždarymas“ pagrindo plotas 12,3 ha ir „Zabieliškio regioninio sąvartyno privažiavimo kelio (naujo kelio įrengimas ir esamo remontas)“ ilgis 3,421 km, o turėtų būti atitinkamai 12,5 ha ir 3,43 km.

19. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių [9][32] 11.12 punkte nurodyta, kad įgyvendinančioji institucija atlieka Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų kontrolę jų įgyvendinimo laikotarpiu.

Rangos sutarties Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba“ bendrųjų sąlygų 11.9 punkte nurodyta, kad rangovo prievolės neturi būti laikomos atliktos tol, kol inžinierius jam neišduoda atlikimo pažymos, nurodydamas joje datą, kada rangovas baigė vykdyti savo sutartines prievoles. Inžinierius privalo išduoti atlikimo pažymą per 28 dienas, skaičiuojant nuo vėliausios dienos, kurią baigėsi pranešimo apie defektus laikas arba kuo greičiau po to, kai rangovas pateikė visus rangovo dokumentus ir baigė visus darbus bei juos išbandė, įskaitant ir bet kurių defektų ištaisymą.

Audito metu nustatyta, kad Lapių regioninio sąvartyno statybos pranešimo apie defektus

[32] Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026

laikas baigėsi 2011-01-04, o atlikimo pažyma išduota 2010-12-10 – taigi anksčiau, negu baigėsi pranešimo apie defektus laikas. Taip pat nustatėme, kad iki atlikimo pažymos išdavimo rangovas nebuvo atlikęs visų defektų ištaisymo. 2010-12-09 rangovo UAB „Sienojus“ rašte Nr. 778 rašoma, kad kelio tarp II ir III kaupimo laukų Lapių regioniniame sąvartyne sutvarkyti galutinai nepavyko dėl nepalankių oro sąlygų, tačiau rašte pateikta subrangovo UAB „Kelių remonto grupė“ garantija, kurioje subrangovas įsipareigojo užbaigti kelio tarp II ir III kaupimo laukų Lapių regioniniame sąvartyne remonto darbus kuo skubiau, susidarius palankioms oro sąlygoms. Subrangovas UAB „Kelių remonto grupė“ 2011-08-06 raštu Nr. 187-01 informavo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą, kad defektų ištaisymo darbai kelio atkarpoje tarp II ir III kaupimo laukų Lapių regioniniame sąvartyne atlikti.

Mūsų nuomone, Įgyvendinančiosios institucijos ir GPG atlikta sutarties vykdymo priežiūra buvo nepakankama, nes rangos sutarties Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba“ atlikimo pažyma išduota nesilaikant sutarties sąlygų.

> Įgyvendinančioji institucija, APVA, ir GPG neužtikrino, kad rangos sutarties Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba“ atlikimo pažyma būtų išduota laikantis sutarties sąlygų.

12. Projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška

Finansų ministerija 2011 m. birželio 28 d. raštu Nr. (18.52.1-01)-6K-1106727 (žr. 5 priedą) Valstybės kontrolei vertinti pateikė Audituojamo projekto išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo paraišką, kurioje EK tinkamų finansuoti išlaidų suma – 24 391 585,53 EUR. Europos Komisijai deklaruota prašoma Bendrijos pagalbos likučio suma – 2 764 800,00 EUR (žr. 6 priedą).

Informacija apie Europos Komisijai teiktas mokėjimo paraiškas ir Europos Komisijos pervestas Sanglaudos fondo lėšas pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė. Europos Komisijai teiktos mokėjimo paraiškos ir Europos Komisijos pervestos SF lėšos

Mokėjimo paraiška	Paraiškos pateikimo EK data	Mokėjimo paraiškoje prašoma SF dalis, EUR	EK pervesta SF dalis, EUR	Skirtumas
Avansinio	2007-12-13	2 764 800,00	2 764 800,00	-
I tarpinio	2008-05-20	4 210 814,49	4 210 814,49	-
II tarpinio	2008-12-23	3 725 145,12	3 725 145,12	-
III tarpinio	2009-06-30	358 440,39	358 440,39	-
Galutinio[33]	2011-06-28	2 764 800,00		2 764 800,00
	Iš viso	**13 824 000,00**	**11 059 200,00**	2 764 800,00

Šaltinis – mokėjimo institucija

8 lentelėje pateikiamas Sanglaudos fondo paramos likučio apskaičiavimas.

8 lentelė. Sanglaudos fondo paramos likučio apskaičiavimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Suma, EUR
1.	Komisijos sprendimu patvirtinta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma	18 432 000,00
2.	EK deklaruotos tinkamos finansuoti projekto išlaidos	24 391 585,53
3.	EK sprendimo biudžetą viršijanti dalis, finansuojama iš LR biudžeto lėšų (2 eil. – 1 eil.)[34]	5 959 585,53
4.	Audito metu nustatytos netinkamos finansuoti projekto išlaidos:	113 145,40
4.1.	Netinkamos finansuoti išlaidos, nustatytos APVA pažeidimų tyrimų metu (žr.1pastebėjimą)	101 489,28
4.2.	Finansinės pataisos, taikytos pažeidimams dėl viešojo pirkimo (žr. 4 pastebėjimą)	3 032,91
4.3.	Netinkamos finansuoti projekto išlaidos, apskaičiuotos tiesiogiai (žr. 12 pastebėjimą)	8 623,21
5.	Didžiausia galima SF paramos suma pagal Komisijos sprendimą (1 eil. x 75 proc.)	13 824 000,00
6.	Pagal avansinio ir tarpinio mokėjimo paraiškas Europos Komisijos pervestos sumos	11 059 200,00
7.	Perskaičiuotas SF paramos likutis (5 eil. – 6 eil.)	2 764 800,00

Šaltinis – Valstybės kontrolė

[33] VK vertinti pateikta Galutinio mokėjimo paraišką ir išlaidų ataskaita.

[34] Remiantis COCOF 08/007/01 gairių 7.4 punktu, kai šalies narės valdymo ir kontrolės sistema pati nustato netinkamas finansuoti išlaidas ir jas pati ištaiso, šios netinkamos finansuoti išlaidos gali būti pakeistos kitomis to paties projekto ar kito projekto, numatyto tame pačiame sprendime, tinkamomis finansuoti išlaidomis. Atsižvelgiant į tai, kad Audituojamo projekto išlaidos, viršijančios EK sprendimu nustatytą sumą, buvo 5 959 585,53 EUR, ši suma bus sumažinta 113 145,40 EUR (101 489,28 EUR + 3 032,91 EUR + 8 623,21 EUR) netinkamų finansuoti išlaidų suma.

Audito metu nustatėme netinkamų finansuoti išlaidų, tačiau jos yra pakeistos to paties projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis, todėl Audituojamo projekto išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje perskaičiuotas Sanglaudos fondo paramos likutis turi būti **2 764 800,00 EUR**.

13. Klaidų vertinimas

Atlikę detalųjį testavimą, nustatėme žinomą klaidą – **113 145,40 EUR** (SF dalis – 84 859,05 EUR), kurią sudaro:

- **101 489,28 EUR** APVA pažeidimų tyrimų metu nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma nebuvo įvertinta rengiant Audituojamo projekto išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo paraišką (žr. 1 pastebėjimą);
- **3 032,91 EUR** siūloma finansinė pataisa dėl vykdyto viešojo pirkimo konkurso pažeidimo (žr. 4 pastebėjimą);
- **8 623,21 EUR** išlaidos, susijusios su papildomais darbais (žr. 12 pastebėjimą);

Projekto baigiamajam auditui taikytas reikšmingumo lygis yra 2 proc. (487 831,71 EUR) visų EK deklaruotų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Audito metu nustatyta žinoma klaida **113 145,40 EUR** neviršija nustatyto reikšmingumo lygio **(**487 831,71 EUR**)**.

7-ojo audito departamento direktorė Vilija Stirbienė

7-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius Vytenis Laukys

PRIEDAI

Valstybinio audito ataskaitos „Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
1 priedas

Valstybinio audito ataskaitoje vartojamos santrumpos

Santrumpa	Pavadinimas
APA	Atliekų priėmimo aikštelės
APVA	Aplinkos projektų valdymo agentūra
Deklaracija	Deklaracija baigus teikti paramą
EK	Europos Komisija
EK rekomendacijos	EK rekomendacijos dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr.1164/94 12 straipsnio 1 dalies punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą
ES	Europos Sąjunga
EAR	Europos Audito Rūmai
FIDIC	Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
FNTT	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
GPG	Galutinis paramos gavėjas
ĮI	Įgyvendinančioji institucija
ISPA	Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas
LR	Lietuvos Respublika
MI	Mokėjimo institucija
SF	Sanglaudos fondas
SFMIS	Europos Sąjungos struktūrinių fondų kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema
TI	Tarpinė institucija
UAB	Uždaroji akcinė bendrovė
VAS	Aplinkos ministerijos vidaus audito skyrius
VI	Vadovaujančioji institucija
VK	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
VPT	Viešųjų pirkimų tarnyba
VPT rekomendacijos	Rekomendacijos „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-73
VšĮ	Viešoji įstaiga

Šaltinis – Valstybės kontrolė

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
2 priedas

Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, kuriais remtasi valstybinio audito ataskaitoje

1. Lietuvos Respublikos Seimo 2003-07-01 nutarimas Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Europos Sąjungos finansinės paramos auditus“ pakeitimo“.

2. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas, 1995-05-30 Nr. I-907 (su pakeitimais).

3. 2005 m. balandžio 15 d. EK rekomendacijos dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą.

4. Sanglaudos fondo ir ex-ISPA priemonės projektų 2000–2006 uždarymo gairės, 2008-04-23 Nr. COCOF 08/0022/02-EN.

5. 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1386/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų tvarkos atlikimo.

6. 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą.

7. 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimas Nr. K(2005)1610 dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.

8. 2010 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas Nr. K(2010)3625, iš dalies keičiantis 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimą Nr. K(2005)1610.

9. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (su pakeitimais).

10. Rekomendacijos dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo COCOF 07/0037/03-LT.

11. 2004 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 621/2004, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su Sanglaudos fondo veikla.

12. Aplinkos projektų valdymo agentūros procedūrų vadovas, patvirtintas APVA direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. T1-92 „Dėl Aplinkos projektų valdymo agentūros procedūrų vadovo patvirtinimo“ (su pakeitimais).

13. 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2003, nustatantis specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo.

14. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su pakeitimais).

15. Bendrasis studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatorius ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-04 nutarimu Nr. 368 „Dėl Bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo“.

16. Kvalifikaciniai aukštojo išsilavinimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-10-14 nutarimu Nr. 768 „Dėl Kvalifikacinių aukštojo išsilavinimo nuostatų bei Aukštųjų mokyklų steigimo ir atestavimo nuostatų patvirtinimo“.

17. Išsilavinimo, įgyjamo Lietuvos Respublikoje, pažymėjimų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-10-18 nutarimu Nr. 773 „Dėl Išsilavinimo, įgyjamo Lietuvos Respublikoje, pažymėjimų nuostatų patvirtinimo“.

18. Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijos, patvirtintos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006-11-29 įsakymu Nr. 1S-73.

19. Viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-24 nutarimu Nr. 1043 „Dėl Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių patvirtinimo“.

20. Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Valstybės kontrolės 2002-02-21 įsakymu Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“.

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
3 priedas

Informacija apie Audituojamo projekto pažeidimus

Eil. Nr.	Pranešimo apie pažeidimą		Pažeidimo			Priimti sprendimai	Pažeidimo dydis (EUR)				Komentaras
	Nr.	data	registracijos numeris	nustatymo data	Tipas		iš viso (9+10+11)	SF lėšos	BF lėšos		
									Valstybės biudžeto	Nuosavų lėšų	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	2010-01-15	LT/09/029/SF/0	2009.11.18	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 dalis lėšų buvo panaudota netinkamai (sutarties Nr. 06-18 rangovas – UAB „Sekolda“) dėl dalies lėšų skirtų įsigyti kompiuterinei įrangai.	Tyrimas užbaigtas.	4 206,73	3 155,05	1 051,68	-	
2	1	2011-06-10	LT/11/071/SF/0	2011-06-09	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 dalis lėšų buvo panaudota netinkamai (pagal sutartį Nr. A/2007/K/24, rangovas UAB „SWECO BKG LSPI“) dėl lėšų, išmokėtų pagal banko garantiją, tinkamumo.	Tyrimas užbaigtas.	5 744,76	-	-	5 744,76	
3	1	2012-04-10	LT/12/081/SF/0	2012-04-10	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 dalis pagal rangos sutartį Nr. A/2007/K38 inžinieriaus aprūpinimui numatytų išlaidų nėra realiai patirtos.	Tyrimas užbaigtas.	4 509,45	1 060,00	3 449,45	-	

4	1	2012-04-10	LT/12/082/SF/0	2012-04-10	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 dalis pagal rangos sutartį Nr. A/2007/K37 inžinieriaus aprūpinimui numatytų išlaidų nėra realiai patirtos.	Tyrimas užbaigtas.	6 948,35	2 916,32	4 032,03	-	
5	1	2012-04-10	LT/12/083/SF/0	2012-04-10	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 dalis pagal rangos sutartį Nr. A/2007/Z/32 inžinieriaus aprūpinimui numatytų išlaidų nėra realiai patirtos.	Tyrimas užbaigtas.	22 217,91	16 663,43	5 554,48	-	
6	1	2012-05-07	LT/12/089/SF/0	2012-05-07	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 įgyvendinant techninės pagalbos sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui Nr. 2006/96/A/K/LT dalis išlaidų buvo panaudota netinkamai (galutinio paramos gavėjo ir 14-os savivaldybių bei kitų įstaigų atstovų mokomosios kelionės į Daniją išlaidos).	Tyrimas užbaigtas.	24 632,68	18 474,51	6 158,17	-	
7	1	2012-06-19	LT/12/101/SF/0	2012-06-19	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 įgyvendinant techninės pagalbos sutartį Nr. 2006/96/A/K/LT dalis numatytų išlaidų Lapių	Tyrimas užbaigtas.	2 085,26	1 563,95	521,32	-	

					regioninio sąvartyno konkursinės dokumentacijos sąvartyno operatoriaus parinkimui parengti nėra realiai patirtos.						
8	1	2012-06-27	LT/12/107/SF/0	2012-06-25	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 dalis pagal rangos sutartį Nr. A/2007/K38 atliktų papildomų darbų išlaidų nėra tinkamos finansuoti.	Tyrimas užbaigtas.	27 275,44	6 411,43	20 864,01	-	
9	1	2012-06-26	LT/12/108/SF/0	2012-06-26	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 dalis pagal rangos sutartį Nr. A/2007/Z/32 atliktų papildomų darbų išlaidų nėra tinkamos finansuoti.	Tyrimas užbaigtas.	12 911,31	9 683,48	3 227,83	-	
10	1	2012-06-27	LT/12/109/SF/0	2012-06-26	Vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 dalis pagal rangos sutartį Nr. A/2007/K37 atliktų papildomų darbų išlaidų nėra tinkamos finansuoti.	Tyrimas užbaigtas.	908,88	381,47	527,41	-	
Šaltinis – VI											

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
4 priedas

Informacija apie Audituojamo projekto patikrinimus

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Europos AuditoRūmai	Misijos 2008-11-17..21, 2008-12-01..12, 2009-01-05..15	DAS 2008	Sanglaudos fondo išmokų teisėtumo ir tvarkingumo auditas ir Sanglaudos fondo išmokų finansinių klaidų taisymo valdymo vertinimas	DAS 2008 misijos metu EAR vertino 10 Sanglaudos fondo Lietuvoje finansuojamų projektų, tarp jų ir audituojamą. Pirmasis audito tikslas – užtikrinti, kad 10 atsitiktine tvarka atrinktų projektų deklaruojamos ir Sanglaudos fondo kompensuojamos išlaidos būtų teisėtos ir tvarkingos. Antrasis audito tikslas buvo įvertinti nustatytų projekto išlaidų finansinių klaidų, dėl kurių iš Europos Komisijos išmokėtos neteisingos sumos, taisymo valdymą. Klaidos gali būti nustatytos atliekant įvairių rūšių kontrolę, t. y. atliekant kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 1382/2002 4, 8 ar 9 straipsnius, EK, Europos Audito Rūmų ar nacionalinių ir regioninių kontrolės institucijų auditą.	Su audituojamu projektu susiję pastebėjimai: EAR nurodė, kad yra įtariami 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 2 straipsnio „Sutarčių sudarymo principai“ pažeidimai, sudarant rangos darbų sutartis: Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba“ ir Nr. A/2007/Z/32 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba“. EAR nurodė, kad tiekėjams mokamos neįprastai didelės išankstinės išmokos. 30–40 proc. avansai neatitinka įprastos rinkos praktikos.
Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimai (15 proc.)					

LR aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius	2009-10-27	Nr. 4-4-(2)-09-04	Atrankinis patikrinimas	Atrankinio patikrinimo tikslas: (1) nustatyti, ar projekto išlaidos patirtos nepažeidžiant ES ir LR teisės aktų, reglamentuojančių ES Sanglaudos fondo paramos teikimą ir administravimą nuostatų ir yra tinkamos finansuoti bei pagrįstos, (2) įvertinti projekto vidaus kontrolės sistemą. Atrankinio patikrinimo metu tikrinta rangos sutartis Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba“. Atrankinio patikrinimo apimtis: nuo 2005-05-24 iki 2009-08-31.	Atrankinio patikrinimo metu nustatyti neatitikimai: LR finansų ministerija 2009-02-27 raštu Nr. ((18.52.1-01)-5K-0902933)-6K-0902165 „Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 netinkamų finansuoti išlaidų“ kreipėsi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą, prašydama teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti apmokėtų, netinkamomis pripažintų (4 206,73 EUR) išlaidų grąžinimą. Atrankinio patikrinimo metu nustatyta, kad netinkamomis finansuoti pripažintos 4 206,73 EUR lėšos nebuvo grąžintos. Aplinkos projektų valdymo agentūra neužtikrino tinkamų finansuoti išlaidų kontrolės. Taip pat nustatyta, kad Viešųjų pirkimų komisija sudaryta vadovaujantis paruoštų pirkimo dokumentų nuostatomis, kurios prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 punktui: „Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą“ bei Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 1 punktui, kad perkančioji organizacija pirkimui organizuoti ir atlikti privalo sudaryti Viešųjų pirkimų komisiją.
Viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikros					
LR aplinkos ministerija	2007-06-22	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikros lapas Nr. 4	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikrinimas	Naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams, Nr. A/2006/K14	AM, patikrinusi pirkimą konstatavo, kad viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikrinimo metu Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nenustatyta.
LR aplinkos ministerija	2007-07-28	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikros lapas Nr. 7	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikrinimas	Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, Nr. 2006/8/IPK/PT/LT	AM, patikrinusi pirkimą konstatavo, kad viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikrinimo metu Viešųjų pirkimų įstatymo esminių pažeidimų nenustatyta.

LR aplinkos ministerija	2007-08-09	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikros lapas Nr. 5	Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų patikrinimas	Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	AM, patikrinusi pirkimą konstatavo, kad konkursas nutrauktas, nes pasirinktas netinkamas pirkimo būdas. Pirkimą perduota vykdyti Kauno regioniniam atliekų tvarkymo centrui. Esminių procedūrų pažeidimų nenustatyta, išskyrus smulkius pastebėjimus, kurie neturėjo įtakos sutarties sudarymui.
Patikrinimai / patikros, susijusios su Audituojamu projektu					
Mokėjimo institucija	2008-03-15	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančiojoje institucijoje (APVA) atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto I tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1) Sutarties Nr. 2006/96/A/K/LT sąskaita Nr. 20736; 9 295,56 EUR; 2) Sutarties Nr. A/2007/K/37 sąskaita Nr. 1; 3 062 427,23 EUR. 3) Sutarties Nr. 06-18 sąskaita Nr. 2; 6 736, 61 EUR.	NFD nuomone, yra rizika, kad pagal sutarties Nr. 06-18 sąskaitą Nr. 2 išlaidos, susijusios su biuro organizacinės įrangos pirkimu, gali būti finansuotos iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų.
Mokėjimo institucija	2008-12-11	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančiojoje institucijoje (APVA) atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto II tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1) Sutarties Nr. 2006/96/A/K/LT sąskaita Nr.208253; 44 644, 35 EUR; 2) Sutarties Nr. A/2007/K/37 sąskaita Nr. 2; 516 907,70 EUR. 3) Sutarties Nr. 966-07 sąskaita Nr. 966-07/2; 489362,01 EUR. 4) Sutarties Nr. A/2007/K/40 sąskaita Nr. 1; 1 686 103,31 EUR.	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 4 966 860,16 EUR sumos mokėjimo paraišką Europos Komisijai.

Mokėjimo institucija	2009-06-11	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančiojoje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto III tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1) Sutarties Nr. 2006/96/A/K/LT sąskaita Nr.209042; 14 263,79 EUR; 2) Sutarties Nr. A/2007/K/38 sąskaita Nr. 5; 300 779,73 EUR 3) Sutarties Nr. A/2007/Z/32 sąskaita Nr. 5; 506 972,35 EUR. 4) Sutarties Nr. 2008/137/ND/P/LT (IŠK-07-02-0055) sąskaita Nr. 1; 10 742,87 EUR.	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 3 696 699,94 EUR sumos mokėjimo paraišką Europos Komisijai.
Patikros Audituojamo projekto vykdymo vietoje					
Įgyvendinančioji institucija	2008-10-15	SA-59	Patikra projekto vykdymo vietoje (apima administracinį, finansinį, techninį aspektus)	Planinė patikra. Patikrinimo vietoje buvo atliktas sutarties „Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statybos“ (Nr. A/2007/Z/32) duomenų apie projekto vykdytoją, sutarties finansavimą ir finansavimo šaltinių panaudojimą, sutarties administravimo ir lėšų apskaitos įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ vertinimas.	Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, VAS ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą verslo įmonėse. Esminių trūkumų nenustatyta. Pateiktos rekomendacijos paramos gavėjui: užsakovas turi paskirti atsakingą asmenį, kuris kontroliuotų atliktų darbų aktuose nurodytus kiekius ir sumas nuo statybos darbų pradžios, derinant su projekto patvirtinta sąmata ir pakeitimų nurodymais.

Įgyvendinančioji institucija	2009-01-27	SA-2	Patikra projekto vykdymo vietoje (apima administracinį, finansinį, techninį aspektus)	Patikra projekto vykdymo vietoje. Patikrinimo vietoje buvo atliktas sutarties „Atliekų priėmimo aikštelių statyba“ (Nr. A/2007/K/38) duomenų apie projekto vykdytoją, sutarties finansavimą ir finansavimo šaltinių panaudojimą, sutarties administravimo ir lėšų apskaitos, duomenų apie sutarties veiklą ir įgyvendinimą vertinimas.	Atlikus patikrą nenustatyta esminių pažeidimų, kurie turėtų neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.
Įgyvendinančioji institucija	2009-10-22	SA-53	Patikra projekto vykdymo vietoje (apima administracinį, finansinį, techninį aspektus)	Patikra projekto vykdymo vietoje. Patikrinimo vietoje buvo atliktas sutarties „Lapių regioninio sąvartyno statyba“ (Nr. A/2007/K/37) duomenų apie projekto vykdytoją, sutarties finansavimą ir finansavimo šaltinių panaudojimą, anksčiau vykdytų patikrų, sutarties administravimo ir lėšų apskaitos vertinimas.	Tikrinant sutarties lėšų apskaitą klaidų nenustatyta. Apskaitytos sumos atitinka APVA turimus duomenis. Aktų suvestinėje klaidų taip pat nerasta.
Įgyvendinančioji institucija	2009-10-23	SA-54	Patikra projekto vykdymo vietoje (apima administracinį, finansinį, techninį aspektus)	Planinė patikra. Patikrinimo vietoje buvo atliktas sutarties „Sąvartynų uždarymas“ (Nr. A/2007/K/40) duomenų apie projekto vykdytoją, sutarties finansavimą ir finansavimo šaltinių panaudojimą, anksčiau vykdytų patikrų, sutarties administravimo ir lėšų apskaitos, sutarties veiklą ir įgyvendinimą, darbo grafiko duomenų vertinimas.	Tikrinant sutarties lėšų apskaitą klaidų nenustatyta. Apskaitytos sumos atitinka APVA turimus duomenis. Aktų suvestinėje klaidų taip pat nerasta.
Valstybės kontrolė	2012-03-15	-	Patikra projekto vykdymo vietoje	Žr. šios ataskaitos 4 skyriuje.	Atlikus patikrą vietoje nustatyti šie neatitikimai: Galutinio paramos gavėjo iš projekto lėšų įsigyta žemė, mūsų nuomone, yra naudojama žemės ūkio veiklai. Patikros vietoje metu įsigyta žemė buvo suarta, joje stovėjo plėvele uždengti šiltnamiai. Sodybos kieme stovėjo mašina, tinkanti žemės ūkio veiklai.
Valstybės kontrolė	2012-07-02	-	Patikra projekto vykdymo vietoje	Žr. šios ataskaitos 4 skyriuje.	Neatitikimai nenustatyti. Galutinio paramos gavėjo iš projekto lėšų įsigyta žemė, nėra naudojama žemės ūkio veiklai.
Šaltinis – AM VAS, MI, APVA, Valstybės kontrolė					

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
5 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ
Gauta
2011-06-29 Nr. 6-2030

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
Finansinio audito 7-ajam departamentui

2011-06-28 Nr. (18.52.1-01)-6K-1106626

DĖL SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO NR. 2004/LT/16/C/PE/001 GALUTINĖS ATASKAITOS IR GALUTINIO MOKĖJIMO PARAIŠKOS PATEIKIMO

Siunčiame Jums Finansų ministerijos (Sanglaudos fondo mokėjimo institucijos) patvirtintos galutinio mokėjimo paraiškos Europos Komisijai gauti iš Sanglaudos fondo galutinę išmoką projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – projektas) išlaidoms kompensuoti kopiją kartu su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) (Sanglaudos fondo įgyvendinančiosios institucijos) patvirtinta projekto galutinės ataskaitos kopija.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Finansų ministerija (Sanglaudos fondo vadovaujančioji ir mokėjimo institucijos), siekdama užtikrinti, kad projektų, kuriems skirta Sanglaudos fondo lėšų, pažeidimai būtų tiriami, nustatomi ir šalinami Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 (Žin., 2005, Nr. 127-4588) (toliau – Pažeidimų taisyklės), nustatyta tvarka ir atsižvelgdama į tai, kad APVA neatliko pažeidimo dėl Informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1043 (Žin., 2006, Nr. 114-4351) (toliau – Viešinimo taisyklės), nustatytų reikalavimų nesilaikymo įgyvendinant projekto viešinimo priemones tyrimo tvarka, kaip nustatyta Pažeidimų taisyklėse, pakartotinai kreipėsi į APVA (Finansų ministerijos 2011 m. birželio 23 d. raštas Nr. ((4.79-08)-5K-1116993-5K-1115623)-6K-1106626), prašydama, vadovaujantis Pažeidimų taisyklėmis, atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą dėl projekto viešinimo priemonių atitikties Viešinimo taisyklėse nustatytiems reikalavimams. Informaciją apie įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatus ir atliktus veiksmus APVA turėtų pateikti Finansų ministerijai ne vėliau kaip iki š. m. birželio 30 d. raštu ir el. paštu. Atsižvelgiant į įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatus, projekto galutinio mokėjimo paraiška ir galutinė ataskaita gali būti tikslinamos.

PRIDEDAMA:

1. Galutinio mokėjimo paraiškos Europos Komisijai kopija, 23 lapai.

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481
El. paštas finmin@finmin.lt
http://www.finmin.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288604610

2. Projekto galutinės ataskaitos kopija, 1 egzemplioriu.

3. Finansų ministerijos 2011 m. kovo 15 d. rašto Nr. (4.79-08)-6K-1102877 „Dėl įtariamo pažeidimo vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" kopija, 2 lapai.

4. Finansų ministerijos 2011 m. gegužės 18 d. rašto Nr. ((18.52.1-01)-5K-1109055)-6K-110526! „Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 galutinės ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos patikslinimo" kopija, 6 lapai.

5. Finansų ministerijos 2011 m. birželio 23 d. rašto Nr. ((4.79-08)-5K-1116993-5K-1115623)-6K-1106626 „Dėl įtariamų Sanglaudos fondo projektų pažeidimų, susijusių su viešinimo reikalavimų nesilaikymu, tyrimo" kopija, 3 lapai.

Finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas

Jurgita Vilkeliene, tel. 2390 178

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
6 priedas

Projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita

CERTIFICATE AND STATEMENT OF EXPENDITURE AND APPLICATION FOR PAYMENT

EUROPEAN COMMISSION

Cohesion Fund

(Final certificate and statement of expenditure and application for payment)

Name of project: ***Kaunas Regional Waste Management System Development***

Commission Decision No ***K(2005)1610*** of ***24/05/2005***

Commission Reference (CCI No) ***2004/LT/16/C/PE/001***

National reference ..... (if any)

CERTIFICATE

I, the undersigned Mr. Aloyzas Vitkauskas, Vice-Minister of the Ministry of Finance, representing the paying authority designated by[1] the Government of the Republic of Lithuania Resolution No. 1026 on the Administration of Assistance from the European Union's Cohesion Fund in Lithuania of 24 August 2001 (Official Gazette No. 74-2596, 2001, No. 87-3483, 2008), hereby certify that all eligible expenditure included in the attached statement, representing the contributions of the Cohesion Fund and national funding, was paid in line with the progress of the project

after[2]: 30 07 2004 (dd mm yyyy) and amounts to: 24,391,585.83 EUR (exact amount to two decimal places)

The attached statement of expenditure broken down by category of expenditure, and by project in the case of a group of projects, covers expenditure up to

31 12 2010 (dd/mm/yyyy)

and is an integral part of this certificate, as is the accompanying report on progress of the project compared with plans.

I also certify that the project is making satisfactory progress towards completion in accordance with the objectives and that the information given in the progress report is correct.

---

1 Indicate the administrative instrument of designation in accordance with Article D(1) and (4) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, with appropriate references and the date.

2 Starting date for eligibility of expenditure under the decision.

T I K R A
Skyriaus vedėja
2011 -06- 28
Aldona Čepaitienė

I further certify that the project is being implemented in accordance with the terms of the decision and in compliance with the provisions of Regulation (EC) No 1164/94, in particular as regards:

1. compliance with the provisions of the Treaty and instruments adopted under it and with Community policies, in particular the rules on protection of the environment, transport (including trans-European networks), competition, and the award of public contracts (Article 8 of Regulation (EC) No 1164/94);

2. application of management and control procedures to the project, in particular to verify the reality of expenditure claimed and the proper execution of the project in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1386/2002 and to prevent, detect and correct irregularities, pursue fraud, and recover unduly paid amounts (Article 12 of Regulation (EC) No 1164/94 and Articles G and H of Annex II thereto).

In accordance with Article G(3) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, the supporting documents are and will continue to be available for a minimum period of three years following payment of the balance by the Commission.

I certify that:

1. the statement of expenditure is accurate and results from accounting systems based on verifiable supporting documents;

2. the statement of expenditure and the application for payment take account of any recoveries made and interest received thereon;

3. details of the underlying transactions are recorded, where possible, on computer files and are available on request to the Commission departments responsible.

Date 2 9 0 6 2 0 1 1 (dd/mm/yyyy)

ALOYZAS VITKAUSK
Vice-Minister of the Min of Finance

Name in capitals, stamp, position and signature of competent authority

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapiėjienė

2011 -06- 2 9

Statement of expenditure incurred in the project [1]
Reference No (CCI code – Code commun d'identification): *2004/LT/16/C/PE/001*
Name of project: *Kaunas Regional Waste Management System Development*
Date: *31/12/2010*

Category of expenditure	Total expenditure incurred to date (between 30/07/2004 [2] and 31/12/2010)	Expenditure certified in present declaration	Total expenditure planned (initial budget) [4]	Expenditure incurred to date, as proportion of (initial budget (%)	Estimated expenditure still required to complete measure
1. Planning					
2. Land acquisition	101,367.01	101,367.01	101,367.01	100.00	0.00
3. Site preparation [3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Building and construction [5]	23,763,906.80	9,787,380.59	17,752,484.85	133.86	0.00
5. Equipment	4,447.10	1,502.26	8,653.80	51.39	0.00
6. Technical assistance	521,864.62	223,356.25	569,494.32	91.64	0.00
7. Publicity [6]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. VAT or equivalent					
9. Other (contingencies, reserves)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24,391,585.53	10,113,606.11	18,432,000.00	132.33	0.00

[1] For decisions on groups of projects, expenditure must be broken down by project, except where the expenditure is common to the group, as in the case of technical assistance or publicity.
[2] Starting date for eligibility of expenditure.
[3] Under Directive 93/42/EEC (OJ L 184, 17.7.1993, p. 42)
[4] EUR 3,684,093.35 according Financing memorandum was paid from the State budget, EUR 2,470,026.09 was paid by the Final Beneficiary during the period of 30/07/2004 - 31/12/2010
[5] Site preparation expenditure is included in building and construction contracts' expenditure.
[6] The initial budget and the total expenditure is estimated according categories specified in the EC decision No K(2010)9625 of 02/06/2010.

3

TIKRA
Atlieka Departamentas
2011 -05- 26

Annex to statement of expenditure: recoveries effected since the last certified statement of expenditure and included in the present statement of expenditure

Amount ordered to be recovered	N.A.
Debtor	N.A.
Date of issue of recovery order	N.A.
Authority which issued recovery order	N.A.
Date of recovery	N.A.
Amount recovered	N.A.

APPLICATION FOR FINAL PAYMENT

Name of project: ***Kaunas Regional Waste Management System Development***

Commission reference (CCI No) ***2004/LT/16/C/TE/001***

Pursuant to Article D(2)(d) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, I, the undersigned Mr. Aloyzas Vitkauskas, Vice-Minister of the Ministry of Finance, request payment of the amount of **EUR 2,764,800.00** as a final payment. This application meets the admissibility requirements because:

Delete as appropriate

(a)	the report on the progress of the project in relation to physical and financial indicators and demonstrating its conformity with the decision granting the assistance, including the specific conditions laid down	*- is enclosed as Annex A*
(b)	the final report on implementation required under the Annex to Annex II to the Regulation, including in the latter case details of compliance with the public procurement rules	*- is enclosed*
(c)	observations and recommendations made by national and/or Community audit authorities, in particular the correction of suspected or proven irregularities	*- are enclosed as Annex C*
(d)	the main technical, financial and legal problems that have arisen and the measures taken to correct them	*- are indicated in Annex D*
(e)	the analysis of any departures from the original financial plan	*- is enclosed as Annex E*
(f)	the publicity measures taken with regard to the measure	*- are indicated in Annex F*
(g)	none of the certified expenditure has been suspended pursuant to Article G(2) or H(2) of Annex II to the Regulation	

Payment should be made to:

Beneficiary:	**Name:** Ministry of Finance of the Republic of Lithuania **Address:** Lukiškių 2, LT 01512, Vilnius, Lithuania **Contact:** Mrs. Jurgita Vileitienė **Telephone:** +370 5 239 01 78 **E-mail:** j.vileitiene@finmin.lt **Fax:** +370 5 239 90 39
Bank:	**Bank name:** Bank of Lithuania **Bank address:** Gedimino av. 6, Vilnius, Lithuania **Post Code:** LT 01103 **Town:** Vilnius **Sort code:** 10100 **BIC code:** LIABLT2X
Account No	632425 IBAN LT62 1010 0000 0063 2425
Account holder (if different from beneficiary)	

Date 28 06 2011 (dd/mm/yyyy)

ALOYZAS VITKAUSKAS

Vice-minister of the Ministry of Finance

Name in capitals, stamp, position and signature of competent authority

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-28
Aldona Cepkėjienė

A PRIEDAS

Projekto pavadinimas. Kauno regiono vietinių kelių rekonstrukcija ir taisymas, saugumo užtikrinimas

Finansinis susitarimo/sutarties Nr. 2014/LT/16/C/PE/001 , *pasirašymo* 2015/03/24

Projekto fizinės ir finansinės įgyvendinimo ataskaita

Projekto fizinės ir finansinės įgyvendinimo ataskaita *	Fizinė įgyvendinimo					Finansinė įgyvendinimo					
	Tikslo indikatorius					Atsiskaitymo rodikliai					
	vnt./kita	Kodas	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2000+2450)	Einamo ataskaitinio laikotarpio pabaiga (2000+2450)	Fizinės įgyvendinimo eigos (%)	Sąmatos kodas (Sąmatos lygmuo)	sąmatos vidinės išlaidų kategorijos (Kategorijos kodas)	Einamo ataskaitinio laikotarpio pabaiga (2000-01-01)	Einamo ataskaitinio laikotarpio pabaiga (2000-12-31)	Finansinės eigos (%)	Fizinės ir finansinės eigos skirtumas (%)
01	02	03	04	05	06=(05/04)*100	07	08=(07/07*100)	09	010	011=(010/09)*100	12=(05-011)
Rodiklio vykdymas	%	100	91,6	100,0	109,0	3 338 901,16	22,5%	3 848 996,82	5 425 898,16	100,0	22,5
Užimtoji gyventojai	vnt.	45	52	59	104,0						
Atskirų gyvenimo kokybės aspektų	%	100	89,0	100,0	109,0	2 372 106,72	13,5%	2 299 921,60	3 722 995,72	100,0	13,5
atskirų gyvenimo aplinkos aspektų. Eismo intensyvumo padidėjimas, gyventojų veiklą ir aplinkos gerinantis kokybės aspektų, kuriuos siekiama pagerinti projektu, pokyčiai ir kt. atitinkami rodikliai	vnt.	4	3	4	100,0						
Pritraukiamos investicijos dalininkams	vnt.	90	90	90	100,0						
Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	3	3	3	100,0						
Atsižvelgiant į bendrą projekto poveikį aplinkai, gyventojų sveikatai ir saugumui, projektu siekiama sumažinti ar išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir kt. atitinkami rodikliai	vnt.	3	3	3	100,0						
Bendras naujų ir rekonstruotų kelių ilgis	%	100	15,6	100,0	109,0	6 666 111,38	25,4%	3 369 206,41	9 646 193,88	100,0	25,4
Projektu siekiama pagerinti kelių eismo saugumą ir sumažinti eismo įvykių, pranešimuose nurodytų, kelių ilgį, kilometrais	km	3,19	1,43	3,19	109,0						
Atsižvelgiant į projekto poveikį aplinkai, gyventojų sveikatai ir saugumui, projektu siekiama sumažinti ar išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir kt. atitinkami rodikliai	vnt.	1	1	1	100,0						
Atsižvelgiant į projekto poveikį aplinkai, gyventojų sveikatai ir saugumui, projektu siekiama sumažinti ar išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir kt. atitinkami rodikliai	vnt.	1	1	1	100,0						
Atsižvelgiant į projekto poveikį aplinkai, gyventojų sveikatai ir saugumui, projektu siekiama sumažinti ar išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir kt. atitinkami rodikliai	vnt.	3	3	3	100,0						

TIKRA

6

2019 -06- 26

A PRIEDAS

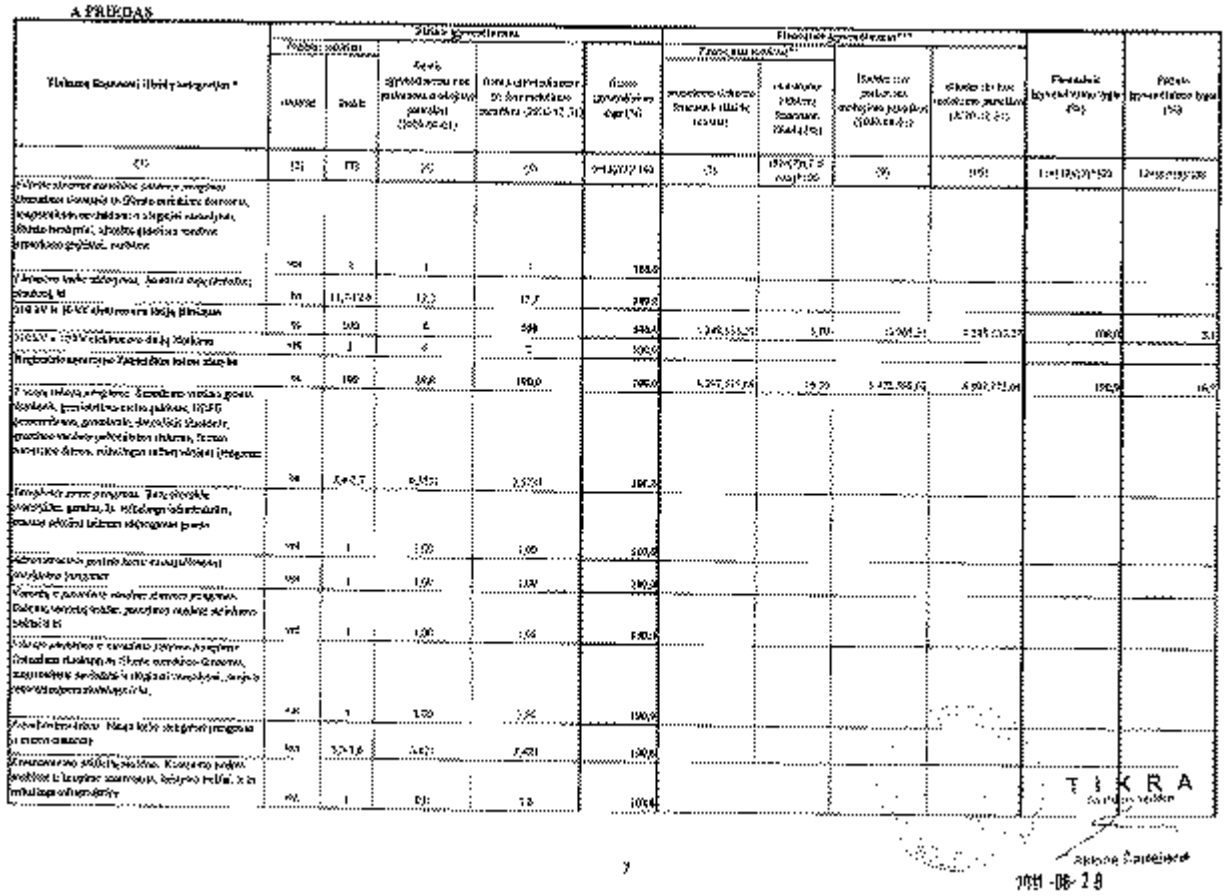

A PRIEDAS

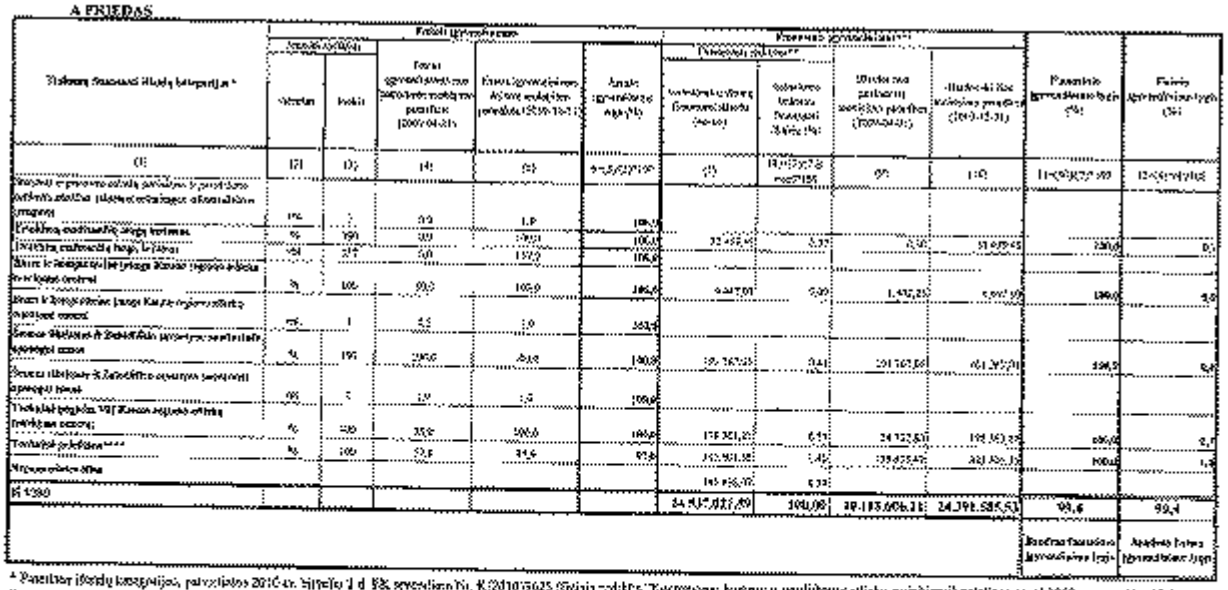

Valstybės finansuoti ilgalaikiai projektai *	Projektų finansavimo šaltiniai					Projektų įgyvendinimas**					
	Nacionalinis biudžetas		Paskutinė projektų finansavimo pagal Sutartį mokėjimo paraiška (2009-04-01)	Planuojama projekto veiklų pabaiga (2010-10-31)	Projekto vertė (Sutartyje nustatyta suma) (Lt)	Projektų vertės pokytis (Sutartyje nustatyta suma) (Lt)	Pokyčio dalis bendroje projektų vertėje (2009-04-01) (%)	Išmokėta lėšų projektų vykdytojams (2009-12-31) (Lt)	Panaudota lėšų (%)	Faktinis įgyvendinimo lygis (%)
	Viešasis	Privatus								
01	02	03	04	05	06=3+4+5	07	08=07/06*100	09	10	11=09/06*100	12=10/06*100
Projektų, pagrindinės veiklos pabaiga ir projektinės veiklos atlikimo ataskaitos pateikimo Centrinei projektų valdymo agentūrai terminas suėjęs	1%	1	0,0	1,0	100,0						
Projektų, mokėjimų prašymų teikimas	%	100	100	100,0	100,0	22 452,45	0,37	0,00	31 679,45	200,0	0,5
Projektų, mokėjimų prašymų teikimas	106	106	0,0	132,0	106,0						
Projektų, pagrindinės veiklos pabaiga, Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktos galutinės ataskaitos	%	100	99,0	100,0	100,0	6 847,00	0,00	1 435,00	6 847,00	100,0	0,0
Projektų, pagrindinės veiklos pabaiga, Kaip projektų vykdytojų mokymai	1%	1	0,0	1,0	100,0						
Projektų, Valstybės ir Žemaitijos nacionalinio parko projektų vykdytojų mokymai	%	100	100,0	100,0	100,0	19 767,00	0,11	191 767,00	451 347,00	100,0	0,0
Projektų, Valstybės ir Žemaitijos nacionalinio parko projektų vykdytojų mokymai	100	1	1,0	1,0	100,0						
Projektų įgyvendinimo VPT Kaimo rėmimo skyriaus mokymai	%	100	35,0	100,0	100,0	158 301,00	0,91	24 122,00	158 301,00	100,0	0,1
Projektų priežiūra***	%	100	52,0	84,0	97,0	342 301,00	1,97	338 625,00	342 301,00	100,0	1,9
Mokymai viešiesiems						165 436,00	0,95				
Iš viso						17 347 027,00	100,00	39 183 606,21	24 391 585,53	99,6	99,4
										Bendras finansinis įgyvendinimo lygis	Apskaitos įrašų įgyvendinimo lygis

* Panašiai išlaidų kategorijai, patvirtintos 2010 m. birželio 1 d. ES specialiosios Nr. K(2010)3625 (finansinės paramos "Europos bendrijos teisės ir politikos aiškinimui" patikslus pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Finansų ministerijos raštą Nr. (6.3-08)-6K-10-1458) ES. pasiūlą patikslinome).

** Apėmė 100% visų tinkamų finansuoti išlaidų

*** Finansinis įgyvendinimas pagal kiekvieną sutartį komponentų neišardytas, kadangi kiti sutartyje išlaidų atskaitymai yra labai nedidelės dalis nemokamos. Pagal daugumą sutarčių sąlygų, ši kiekvieno tarpinio finansinio padėtis nemokamos pateikiamos ataskaitos ir sąskaitos pateiktos. Galutinio ir atskiro dydis yra nemokamos kiekvienoje darbų eigos sutartyje. Neišmokėta darbų suma pagal kiekvieną sutarties komponentą, nepaisant mokamo ir sąskaitų pinigų sumos kaip parodyta šioje išskaidytoje kiekvienam komponentui. Del šios procedūros atnaujinti, tobulinti sąskaitos ir kitokio mokėjimo galynos pasidarytų labai sudėtingas. Be to, sutartyje numatyti bendrieji pobūdžio darbai apima visus komponentus, todėl jų paskirstymas atskiriems komponentams yra neįmanomas.

**** Projekto išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga 2010 m. gruodžio 31 d., o reikalingi projektinės veiklos baigimui 2011 m. liepos 15 d. Išlaidos, susijusios tiesiai projekto išlaidų tinkamumo laikotarpiu galiojusių, nemokamų galutinio patikrinimo metu ir sąskaitos pateiktos (2010 m. gruodžio 31 d.) iki 2011 m. liepos 15 d. ir reikalavimo tenkinti "Kaimo regionų atlikių kartojimo sistemos sukūrimas: atliekų patvirtinimo nustatytą darbą" Nr. AS/2007/KG/36 ir "Kaimo regionų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" AS/2007/KG/40 techninius priežiūros patikrinus (darbų laikotarpiu). Atsižvelgiant į tai, techninės priežiūros išlaidų įgyvendinimas iki 2010-12-31 yra 97 %.

TIKRA

2011 -06- 28

A1 PRIEDAS

GAUTŲ SĄSKAITŲ IR MOKĖJIMŲ PAGAL RANGOVUS SUVESTINĖ

Projekto pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Komisijos sprendimo kodas: *2004/L7/16/C/PE4001* **Data:** *2005-05-24*

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
UAB "Sekuida" Nr. 06-18 (įrangos įsigijimas)	2	2006.07.11			Už prekes pagal 2006-07-11 priėmimo-perdavimo aktą
			2006.08.24	4.281,74	Sanglaudos fondo dalis
			2006.08.24	1.427,25	Valstybės biudžeto dalis
			2009.11.23	-3.155,85	Netinkamos finansuoti išlaidos Sanglaudos fondo dalis
			2009.11.23	-1.051,68	Valstybės biudžeto dalis
UAB "COWI Baltic" Nr. 2006/96/A/K/LT (paslaugos)	209400(5)	2009.12.07			Už 2009 m. rugsėjo - birželio mėn suteiktas paslaugas Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.28	18.542,42	
			2009.12.28	6.180,71	Valstybės biudžeto dalis
UAB "SWECO BKG LSFI" Nr. A/2007/K/24 (paslaugos)	SWE 684	2009.03.29		67.906,84	Už 2007 m. lapkričio mėn. - 2009 m. gegužės mėn. suteiktas paslaugas
			2009.07.08		Sanglaudos fondo dalis
			2009.07.08	22.635,61	Valstybės biudžeto dalis
	SWE 982	2010.05.31		67.906,83	Už 2009 m. birželio mėn. - 2010 m. gegužės mėn. suteiktas paslaugas
			2010.07.12		Sanglaudos fondo dalis
			2010.07.12	22.635,61	Valstybės biudžeto dalis
	SWE 1125	2010.11.25		17.469,95	Galutinis mokėjimas
			2010.12.28		Sanglaudos fondo dalis
			2010.12.28	5.823,32	Valstybės biudžeto dalis
			2011.06.09	-5.744,76	Netinkamos finansuoti išlaidos Užsakovo dalis*, **
UAB "Kamesta" Nr. A/2007/Z/32 (darbai)	7	2009.03.31	2009.05.08	129.776,95	Už 2009 m. kovo mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.05.11	43.258,98	Valstybės biudžeto dalis
	8	2009.04.30	2009.06.09	182.314,81	Už 2009 m. balandžio mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.06.09	60.771,60	Valstybės biudžeto dalis
	9	2009.05.29	2009.07.28	195.491,46	Už 2009 m. gegužės mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.07.28	65.163,82	Valstybės biudžeto dalis
	10	2009.07.31	2009.10.12	194.692,38	Už 2009 m. birželio mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.10.12	64.897,45	Valstybės biudžeto dalis
	11	2009.09.30	2009.11.12	80.606,91	Už 2009 m. birželio mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.11.12	26.868,97	Valstybės biudžeto dalis
	12	2009.11.16	2009.12.17	14.227,29	Už 2009 m. lapkričio mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.17	4.742,43	Valstybės biudžeto dalis
	13	2009.11.26	2009.12.21	153.666,59	Sulaikomų pinigų grąžinimas Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.21	51.222,20	Valstybės biudžeto dalis
	14	2009.12.15	2009.12.31	153.666,59	Sulaikomų pinigų grąžinimas Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.31	51.222,20	Valstybės biudžeto dalis
UAB "Sienojus" Nr. A/2007/K/37 (darbai)	11	2009.03.31	2009.06.09	245.732,46	Už 2009 m. kovo mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
	12	2009.04.30	2009.06.25	10.077,87	Už 2009 m. balandžio mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.07.30	241.450,86	Užsakovo apmokėta dalis*
	13	2009.05.29	2009.07.20	323.234,74	Už 2009 m. gegužės mėn atliktus darbus Užsakovo apmokėta dalis*
	14	2009.07.31	2009.10.09	302.950,56	Už 2009 m. liepos mėn atliktus darbus Užsakovo apmokėta dalis*

PATVIRTINTA
2011 -06- 28
Aldona Čepliejienė

A1 PRIEDAS

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
	15	2009.09.30		338.093,74	Už 2009 m. balandžio mėn atliktus darbus
			2009.12.03		Valstybės biudžeto dalis*
			2009.12.03	236.325,39	Užsakovo apmokėta dalis*
	16	2009.12.03			Už 2009 m. liepos - gruodžio mėn atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.31	239.596,16	
			2009.12.31	79.865,42	Valstybės biudžeto dalis
			2009.12.31	29.591,60	Valstybės biudžeto dalis*
			2010.01.25	53.062,41	Užsakovo apmokėta dalis*
	17	2010.03.23			Sulaikomų pinigų grąžinimas
			2010.04.09	297.552,77	Sanglaudos fondo dalis
			2010.04.09	27.935,85	Valstybės biudžeto dalis
			2010.04.09	23.204,85	Valstybės biudžeto dalis*
			2010.04.14	43.472,18	Užsakovo apmokėta dalis
			2010.04.14	92.455,94	Užsakovo apmokėta dalis*
	18	2010.12.10			Sulaikomų pinigų grąžinimas
			2010.12.20	297.552,78	Sanglaudos fondo dalis
			2010.12.20	27.935,84	Valstybės biudžeto dalis
			2010.12.20	23.204,86	Valstybės biudžeto dalis*
			2010.12.28	43.472,18	Užsakovo apmokėta dalis
			2010.12.28	92.455,93	Užsakovo apmokėta dalis*
AB "Rasninių melioracija" Nr. A/2007/K/38 (darbai)	4***	2008.08.29	2008.10.31	-13.082,42	Užsakovo apmokėta dalis*
	4***	2008.08.29	2008.10.31	13.082,42	Užsakovo apmokėta dalis
	8	2009.02.27			Už 2009 m. vasario mėn atliktus darbus
			2009.04.28	31.846,76	Valstybės biudžeto dalis*
			2009.04.30	47.770,12	Užsakovo apmokėta dalis*
	9	2009.03.31			Už 2009 m. kovo mėn atliktus darbus
			2009.06.05	55.330,83	Valstybės biudžeto dalis*
			2009.06.05	79.802,01	Užsakovo apmokėta dalis*
	10	2009.04.30			Už 2009 m. balandžio mėn atliktus darbus
			2009.06.29	63.329,75	Valstybės biudžeto dalis*
			2009.07.30	41.553,17	Užsakovo apmokėta dalis*
	11	2009.05.29			Už 2009 m. gegužės mėn atliktus darbus
			2009.07.29	90.328,34	Valstybės biudžeto dalis*
			2009.07.17	60.218,91	Užsakovo apmokėta dalis*
	12	2009.06.30			Už 2009 m. birželio mėn atliktus darbus
			2009.09.16	39.286,75	Valstybės biudžeto dalis*
			2009.09.16	26.191,16	Užsakovo apmokėta dalis*
	13	2010.10.13			Sulaikomų pinigų grąžinimas
			2010.11.08	12.974,40	Valstybės biudžeto dalis
			2010.11.08	82.673,62	Valstybės biudžeto dalis*
			2010.11.11	7.625,61	Užsakovo apmokėta dalis
			2010.11.11	42.106,44	Užsakovo apmokėta dalis*
	14	2010.12.08			Sulaikomų pinigų grąžinimas
			2010.12.29	12.974,39	Valstybės biudžeto dalis
			2010.12.29	82.673,63	Valstybės biudžeto dalis*
			2010.12.29	7.625,61	Užsakovo apmokėta dalis
			2010.12.29	42.106,44	Užsakovo apmokėta dalis*
	15	2010.12.13			Už 2010 m. gruodžio mėn. atliktus darbus
			2010.12.22	176.336,96	Valstybės biudžeto dalis*
			2010.12.21	88.168,48	Užsakovo apmokėta dalis*
UAB "Luidas" pr. A/2007/K/40 (darbai)	2	2009.02.27			Už 2009 m. vasario mėn. atliktus darbus
			2009.04.20	287.806,27	Sanglaudos fondo dalis
			2009.04.20	26.785,07	Valstybės biudžeto dalis
			2009.04.20	69.450,35	Valstybės biudžeto dalis
	3	2009.04.30			Už 2009 m. balandžio mėn. atliktus darbus
			2009.06.12	433.430,70	Sanglaudos fondo dalis
			2009.06.12	137.810,23	Valstybės biudžeto dalis
	4	2009.05.29			Už 2009 m. gegužės mėn. atliktus darbus
			2009.07.24	185.870,11	Sanglaudos fondo dalis
			2009.07.24	61.956,70	Valstybės biudžeto dalis

K R A
2011 -06- 28
Aušra Česlėjienė

A1 PRIEDAS

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
	5	2009.06.26	2009.08.28	158.421,83	Už 2009 m. birželio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.08.28	52.807,29	Valstybės biudžeto dalis
	6	2009.07.28	2009.09.23	209.998,08	Už 2009 m. liepos mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.09.23	69.999,36	Valstybės biudžeto dalis
	7	2009.08.31	2009.10.28	456.538,55	Už 2009 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.10.28	152.179,48	Valstybės biudžeto dalis
	8	2009.10.30	2009.12.17	420.197,25	Už 2009 m. spalio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.17	140.065,75	Valstybės biudžeto dalis
	9	2009.11.30	2009.12.24	106.238,72	Už 2009 m. lapkričio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.24	35.412,90	Valstybės biudžeto dalis
	10	2010.01.29	2010.03.22	62.497,05	Už 2010 m. sausio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2010.03.22	20.832,34	Valstybės biudžeto dalis
	11	2010.06.14	2010.08.19	164.945,29	Už 2010 m. birželio mėn. atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2010.08.19	54.981,76	Valstybės biudžeto dalis
	12	2010.07.01	2010.08.19	207.251,18	Sulaikomų pinigų grąžinimas Sanglaudos fondo dalis
			2010.08.19	69.083,73	Valstybės biudžeto dalis
	13	2010.11.22	2010.12.15	207.251,18	Sulaikomų pinigų grąžinimas Sanglaudos fondo dalis
			2010.12.15	69.083,73	Valstybės biudžeto dalis
D. Danauskienė (žemės įsigijimas)	S/1		2010.12.06	76.025,26	Už atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2010.12.06	25.341,75	Valstybės biudžeto dalis
AB "VST" Nr. 2008/37/ND/P/LT (LŠK-07-02-0855) (darbai)	2	2009.02.24	2009.05.08	11.298,98	Už atliktus darbus Sanglaudos fondo dalis
			2009.05.11	3.766,33	Valstybės biudžeto dalis
Iš viso A1 priede				**10.313.606,11**	

* Komisijos sprendimą viršijančios lėšos.

** Atliekama sustatytų netinkamų projekto išlaidų užskaita iš projekto vertę viršijančių išlaidų

*** Išlaidos deklaruotos III tarpinio mokėjimo prašiklyje kaip Užsakovo viršijančios lėšos, tačiau turėjo būti deklaruotos, kaip Užsakovo Komisijos sprendimo neviršijanti dalis. Atliekama Užsakovo sumokėtų lėšų korekcija.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 28
Aldona Čepliejienė

11

C PRIEDAS

Projekto pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Komisijos sprendimas Nr. K(2005)1618, patvirtintas 2005-05-24

NACIONALINIŲ IR/ARBA EUROPOS BENDRIJŲ INSTITUCIJŲ ATLIKTŲ PATIKRINIMŲ IR ATRANKINIŲ PATIKRINIMŲ IŠVADOS BEI REKOMENDACIJOS

Pateiktos 2007 m. rugsėjo 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) išvados jau įvykusiems viešiesiems pirkimams „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" (pirkimo Nr.44360) ir „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos bei griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" (pirkimo Nr.51096), tačiau neįpareigojo nutraukti sutarties. Aplinkos projektų valdymo agentūra atsižvelgė į VPT pastabas, vykdydama tolimesnius viešuosius pirkimus. Konkurso sąlygų pavyzdinės formos pakeistos 2007 m. spalio 9 d.

2008 m. gruodžio 1 d. – 12 d. Europos rūmų auditas atliko projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" 2004/LT/16/C/PE/001 patikrą. Ataskaita gauta 2009 m. birželio 2 d.

- Atliktas sutarties Nr. A/2007/Z/32 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" patikrinimas.
  Pastabos:

  1. Pasibaigus pasiūlymo teikimo terminui tik viena įmonė atitiko mažiausius kvalifikacinius reikalavimus, t.y. buvo akredituota statyti sąvartynus.
  2. Vertinimo komitetas savo iniciatyva paprašė pasiūlymų teikėjų pateikti daugiau informacijos apie tai, kad kiti pasiūlymų tiekėjai kreipėsi dėl jų sertifikatų išplėtimo įtraukiant sąvartynų statybą.
  3. Perkančioji organizacija (Aplinkos projektų valdymo agentūra) atšaukė pradinį vertinimo komiteto sprendimą sudaryti sutartį su konsorciumu UAB "Statovita" ir UAB "Laugina" be jokio raštiško pagrindimo.
  4. Sprendimas atmesti mažiausios kainos pasiūlymą ir vėlesnis sprendimas dėl sutarties sudarymo labai pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB.

- Atliktas sutarties Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" patikrinimus.

Pastabos:

1. Perkančioji organizacija priėmė skirtingus sprendimus dėl vienodos rūšies skundo dėl neatitikties mažiausiems kvalifikaciniams reikalavimams: vienu atveju skundas persiųstas vertinimo komitetui, o kitais atvejais pati perkančioji organizacija išnagrinėjo skundą ir net paprašė, kad konkurso dalyvis, su kuriuo vertinimo komitetas jau sudarė sutartį, pateiktų paaiškinimus.
2. Išorės ekspertas vertintojas informavo perkančiąją organizaciją, jai pačiai paprašius, kad laimėjusio pasiūlymo kaina yra mažesnė nei rinkos sąlygomis. Nepaisant to, perkančioji organizacija nusprendė nestiimti jokių veiksmų.
3. Perkančioji organizacija neveikė skaidriai.

Europos Komisija 2010 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. REGIO J3 MB/ba D(2010) 990431 pateikė LR Finansų ministerijai peržiūrėtą Europos audito rūmų atstovų pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų apžvalgą, kurioje paprašė pateikti aukščiau nurodytų sutarčių Nr. A/2007/Z/32 ir Nr. A/2007/K/37 papildomus dokumentus, kad būtų galima priimti galutinę poziciją, papildomi dokumentai EK pateikti 2010 m. gruodžio 13 d. Europos Komisija 2011 m. gegužės 19 d. raštu Nr. REGIO J3 MB/ag

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -05- 27
Aldona Čepliejienė

D(2011)526824 (Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES šis raštas užregistruotas 2011-06-09) informavo, kad pateiktuose dokumentuose „nenurodomos priežastys, kurios paaiškintų, kodėl perkančioji organizacija nusprendė neatsižvelgti į teisinę nuomonę ir neatmetė pasiūlymo. Kadangi laimėtojas neatitiko minimalių reikalavimų, atrankos procedūrą reikėtų laikyti neatitinkančia reikalavimų ir pritaikyti 25 proc. finansinę korekciją. Atsižvelgiant į tai, nacionalinės valdžios institucijos rengia atsakymą Europos Komisijai, kuris turi būti pateiktas per du mėnesius nuo tos datos, kai Lietuvos nuolatinė atstovybė ES gaus šį raštą arba šio rašto vertimą į lietuvių kalbą.

Išankstinės išmokos rangovams, paslaugų tiekėjams buvo nuo 30 iki 40 % visos sutarties vertės, tokie dydžiai neatitinka įprastų rinkos sąlygų.

Europos Komisija 2010 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. REGIO J3 MB/ba D(2010) 990431 pateikė LR Finansų ministerijai parengtą Europos audito rūmų atstovų pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų apžvalgą, kurioje nurodė, kad šių pastabų valstybės narė pagrindė ir šis pastebėjimas yra baigtas nagrinėti.

LR Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba 2009 m. rugpjūčio 31 d. – 2009 m. spalio 2 d. atliko projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" 2004/LT/16/C/PE/001 patikrą.

Išvados:
1.Aplinkos ministerija tinkamai vykdo tarpinės institucijos funkcijas;
2.Aplinkos projektų valdymo agentūra neužtikrino tinkamų finansuoti išlaidų kontrolės, kadangi pagal pasirašytą sutartį „Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui" Nr.06-18 iki atrankinio patikrinimo pradžios nebuvo grąžintos lėšos (4.206,73 EUR) už įrangą, kuri pripažinta netinkama finansuoti.
3.Tikrintu atveju į SFMIS sistemą suvesta visa informacija, neatitikimų nenustatyta
4.Audito apimtyje tikrinti darbai atlikti, neatitikimų nenustatyta.
5. Galutinis paramos gavėjas- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras tinkamai vykdo jam paskirtas Projekto įgyvendinimo funkcijas.
6.Viešųjų pirkimų komisija sudaryta vadovaujantis parengtų Pirkimo dokumentų nuostatomis, kurios prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1p. nuostatomis „Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą ..." bei Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 1p. nuostatomis, kur Perkančioji organizacija pirkimui organizuoti ir atlikti privalo sudaryti Viešųjų pirkimų Komisiją.

Rekomendacijos:
1.APVA užtikrinti, kad netinkamomis pripažintos lėšos būtų grąžintos ir apie įvykdymą informuoti atitinkamas institucijas;

Sprendimas susigrąžinti lėšas priimtas ir patvirtintas 2009 m. lapkričio 18 d. Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-182, o 2009 m. lapkričio 30 d. šios lėšos buvo grąžintos į Valstybės iždo sąskaitą.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 28

13

D PRIEDAS

Projekto pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Komisijos sprendimas Nr. K(2005)1610, patvirtintas 2005-05-24

TECHNINĖS, FINANSINĖS AR TEISINĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS

Projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimo Kauno regionų atliekų tvarkymo sistemų sukūrimui paslaugų konkursas dėl ribotos konsultacinių paslaugų rinkos buvo paskelbtas du kartus. Be to, ši sutartis yra finansuojama Finansinio memorandumo Nr. 2001/LT/16/PA/002 „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui" lėšomis, kuriame, po AM inicijuoto memorandumo 2001/LT/16/P/PA/002 pakeitimo, numatytas nepakankamas (mažesnis negu numatyta galimybių studijoje) biudžetas šioms paslaugoms. Dėl šių priežasčių sutarties pasirašymas vėlavo daugiau nei metus (sutartis pasirašyta 2005 m. spalio mėn.). Atitinkamai vėlavo ir kitų projekto komponentų (darbų ir tiekimo sutarčių) įgyvendinimas.

Techninės pagalbos teikimo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui paslaugų konkursas buvo paskelbtas 2005 m. liepos 4 d., gauti 2 dalyvių pasiūlymai neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų ir buvo atmesti. 2005 m. rugsėjo 15 d. šių paslaugų pirkimui paskelbtas naujas konkursas buvo sustabdytas teismo sprendimu, nes vienas ankstesnio konkurso dalyvių apskundė perkančiosios organizacijos veiksmus teisme. 2005 m. gruodžio 6 d. Vilniaus apygardos teismas atmetė ieškovo ieškinį ir leido tęsti pirkimo procedūras. Dėl šių priežasčių vėluoja konkurso procedūrų vykdymas ir sutarties pasirašymas. Dalyvis teismo sprendimą apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui, 2006 m. balandžio 19 d. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė ieškovo skundą ir leido tęsti pirkimo procedūras. Dėl užsitęsusių teisminių procedūrų dalis pirkime numatytų užduočių pasikeitė, nes dalį užduočių atliko VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Konkursas iš naujo paskelbtas 2006 m. rugpjūčio 23 d., o sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" (Nr. A/2007/K/24) pasirašyta 2006 m. gruodžio 22 d.

Vykdant atvirą konkursą „Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" vienas konkurso dalyvis 2007-08-20 apskundė perkančiosios organizacijos veiksmus Vilniaus apygardos teismui. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė pirkimo procedūrų vykdymą. Vilniaus apygardos teismui 2007-10-23 panaikinus laikinąsias apsaugos priemones buvo pratęstos pirkimo procedūros ir 2007-11-13 pasirašyta rangos sutartis. 2008-01-08 perkančioji organizacija su konkurso dalyvių pasirašė taikos sutartį ir byla Vilniaus apygardos teisme nutraukta.

Vykdant neskelbiamas supaprastintas derybas dėl „10 KV įtampos elektros oro linijos perkėlimo paslaugos" pirkimo AB „Vakarų skirstomieji tinklai" neteikė derybų pasiūlymo iki perkančiosios organizacijos nustatyto pasiūlymų pateikimo termino. Lapių regioninio sąvartyno rangovui pateikus patikslintą darbų programą buvo tęsiamos derybos su AB „Vakarų skirstomieji tinklai" dėl elektros linijos iškėlimo, kuri trukdo Lapių regioninio sąvartyno sekcijų įrengimo darbams. Pratęsus derybų pasiūlymo pateikimo terminą 2008 m. rugsėjo 25 d. AB „VST" pateikė neskelbiamų pasiūlymą. 2008 m. spalio 20 d. buvo pasirašyta sukėlimo sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: 10 KV ETT orinės linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimas" (Nr.2008/37/ND/P/LT (IŠK-07-02-0055)).

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" vedamos derybos su gyventoju dėl iškėlimo iš Zabieliškio regioninio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos užsitęsė, kadangi kylant nekilnojamojo turto kainoms nepavyko susitarti su gyventoju dėl kompensacijos dydžio, nes neužteko lėšų numatytų projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" EK sprendime. Sutarimo nepasiekus, 2009 m. klausimas buvo nagrinėjamas teismo keliu, tačiau teismas atsisakė nagrinėti pateikta ieškinį (2009 m. birželio 29 d. gauta Apeliacinio teismo nutartis). Pakartotinai atlikus turto vertinimą ir pravedus derybas su gyventoju, sutartis dėl jo iškėlimo iš sąvartyno sanitarinės zonos buvo pasirašyta 2010 m. gegužės 6

Ekvivalentas vienam

2011 -06- 28

Aldona Čepaitienė

d., bei 2010 m. spalio 6 d. pasirašytas papildomas susitarimas, užtikrinantis projekto finansavimo reikalavimams. Pateikta Kėdainių raj. savivaldybės administracijos Pelėdnagių seniūnijos 2010 m. lapkričio 18 d. pažyma Nr.17-1311, patvirtinanti, kad gyvenamojo namo savininkė D. Danauskienės šeima pakeitė deklaruotą gyvenamąją vietą.

2007 m. gruodžio 27 d. pasirašyta rangos sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba" Nr. A/2007/K/38 su AB „Rasainių melioracija" ir UAB "Laugina" (jungtinės veiklos pagrindu), kuri turėjo įrengti šešias atliekų priėmimo aikšteles. Penkios aikštelės baigtos statyti 2009 m. Kauno miesto savivaldybė vietoj numatytos likusios šeštos atliekų priėmimo aikštelės Raudondvario pl. 107 B. parinko aikštelę naujoje vietoje bei savo lėšomis parengė detalųjį planą ir techninį projektą. Aikštelės statybos darbai baigti 2010 m. gruodžio mėn. Sulaikyta 10% šios aikštelės statybos darbų apmokėjimų dalis Rangovui bus sutartyje numatyta tvarka išmokėta 2011 m., o mokėjimus bus vykdomas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras lėšomis.

2008 m. rugsėjo 15 d. pasirašyta rangos sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" Nr. A/2007/K/40. Pagal šią sutartį rangos darbai turėjo būti užbaigti iki 2009 m. gruodžio mėnesio. Tačiau Užsakovas negulėjo laiku perduoti darbų vykdymui Kaišiadorių raj. Budninkų sąvartyno, nes šis sąvartynas, kol nebuvo įrengta Kaišiadorių atliekų priėmimo aikštelė su perkrovimo stotimi, buvo eksploatuojamas iki 2009 m. vasaros, todėl darbų baigimo laikas pratęstas iki 2010 m. balandžio 15 d. Visi darbai užbaigti, 2010 m. birželio 22 d. inžinierius išdavė darbų perėmimo pažymą.

Vadovaujantis 2010 m. birželio 15 d. patvirtintu Europos Komisijos sprendimo pakeitimu (Nr. K(2010)3625), projekto pabaigos laikas pratęstas iki 2010 m. gruodžio 31 d. dėl užsitęsusių projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimo darbų bei vienos atliekų priėmimo aikštelės laiku nepradedamų statybos darbų. Taip pat kadangi Europos Komisijos sprendimo pasirašymo metu fiziniai indikatoriai buvo nustatyti remiantis galimybių studija, kurioje techniniai sprendimai buvo preliminarūs, atskirų fizinių indikatorių dydžiai patikslinti ir suderinti rengiant preliminarų projektą ir techninius projektus. Atsižvelgiant į tai, 2010 m. birželio 15 d. patvirtintame Europos Komisijos sprendimo pakeitime (Nr. K(2010)3625) buvo patikslinti fiziniai indikatoriai ir jų kiekiai.

2007 m. kovo 29 d. pasirašyta rangos sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" Nr. A/2007/K/24. Atsižvelgiant į tai, kad projekto išlaidų tinkamumo laikotarpis baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., o ši paslaugų sutartis baigiasi 2011 m. lapkričio 13 d., išlaidos, susijusios su iki projekto išlaidų tinkamumo datos neįvykdyta paslaugų dalimi, apmokėtos galutinio paramos gavėjo lėšomis. Po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos (2010 m. gruodžio 31 d.) iki 2011 m. lapkričio 13 d. teikiamos sutarčių "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba" Nr. A/2007/K/38 ir "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" A/2007/K/40 techninės priežiūros paslaugos (defektų laikotarpiu).

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 28

15

E PRIEDAS

Projekto pavadinimas: *Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas*

Komisijos sprendimas Nr. K(2005)1610, patvirtintas 2005-05-24

PRIEŽASTYS, LĖMUSIOS SKIRTUMĄ TARP FIZINIO IR FINANSINIO ĮGYVENDINIMO, NUKRYPIMUS NUO NUMATYTO GRAFIKO

Skirtumas tarp fizinio ir finansinio įgyvendinimo rodiklių sutartyje „ Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra"(Nr. A/2007/K/24) atsirado kadangi 2010 m. gruodžio 31 d. baigėsi išlaidų tinkamumo laikotarpis ir Paslaugų tiekėjui buvo sumokėti visi pinigai pagal papildomai pateiktą banko garantiją galiojančią iki 2011 m. gruodžio 31 d., kurios vertė lygi nesuteiktų paslaugų apimčiai. Aplinkos projektų valdymo agentūra su LR aplinkos ministerija suderino metodines rekomendacijas dėl projektų baigtumo vertinimo, kuriose viena iš sąlygų ir yra: „Jeigu yra akivaizdu, kad iki šiuo metu nustatyto Projektų išlaidų tinkamumo termino pabaigos nebūtų visiškai užbaigtos visos techninės priežiūros sutartys, galima pasiūlyti paslaugos tiekėjui: pateikti banko garantiją/draudimo laidavimą galiojantį iki 2011 m. gruodžio 31 d., kurio vertė lygi nesuteiktų paslaugų apimčiai, kad būtų galima išmokėti visas pagal paslaugų sutartį numatytas lėšas į paslaugų tiekėjo sąskaitą". Visi projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" objektai yra pilnai pastatyti. Šiuo metu vyksta objektų defektinis laikotarpis. Techninės priežiūros paslaugų tiekėjo sutartis baigiasi 2011 m. lapkričio 13 d.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija atkreipė dėmesį, kad 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 189), 5 straipsnyje numatyta, kad „išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, <...>". Taip pat 2008 m. gegužės 23 d. Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000–2006 m. uždarymo gairių Nr. COCOF 08/0022/02-EN 3.2.4 punkte nurodyta, kad jeigu dėl įgyvendinimo vėlavimo ar dėl nacionalinių teisės aktų reikalavimų „atsakomybės už defektus" laikotarpis baigiasi vėliau nei galutinė išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga, išlaidas, padarytas po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos, finansuoja nacionalinės valdžios institucijos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, informavo, kad minėtos pagal papildomai pateiktą banko garantiją išmokėtos lėšos yra netinkamos finansuoti iš projektui skirtų Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, ir prašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skubos tvarka atlikti pažeidimo tyrimą. Atlikus pažeidimų tyrimą, nustatyta, kad dalis lėšų, paslaugų tiekėjui išmokėtų pagal pateiktą garantiją ir kurių vertė lygi nesuteiktų paslaugų apimčiai, negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Nustatyta netinkamų finansuoti bei grąžintinų lėšų suma – 19.835,52 Lt. Lėšų susigrąžinimo procedūra nebuvo inicijuojama, nes jos buvo užskaitytos EK Sprendimą viršijančių lėšų dalimi.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 28

F PRIEDAS

Projekto pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Komisijos sprendimas Nr. K(2005)1610, patvirtintas 2005-05-24

PROJEKTO VIEŠINIMAS

1. Stendai darbų vykdymo vietose: Taip ☒ Ne ☐ Netaikoma ☐

2. Informacijos priemonės, kuriose visuomenė buvo informuojama apie projektą:

2.1. Spauda ☒

2.2. Televizija ☒

2.3. Radijas ☒

2.4. Internetas ☒

3. Kitos vaizdo ir garso informacijos priemonės ☐

4. Kita: ☒

Priemonės	Priemonės įgyvendinimo data	Nuorodos/informacijos šaltiniai
	(1)	(2)
2.1. ☒ Spauda	2004/11/25	**Atliekas moderniai tvarkys viena įstaiga** (Straipsnis apie steigiamą Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą, kuris įgyvendins ES projektą atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui Kauno regione). **Laikinoji sostinė**
	2004/11/27	**Atliekų verslas lauks milijoninių investicijų** (Publikacija apie VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro pateiktą paraišką ES paramai gauti). **Kauno diena**
	2004/12/01	**Atliekas tvarkys bendrai** (Publikacija apie VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą ir rengiamą galimybių studiją Kauno regiono savivaldybių bendrai atliekų tvarkymo sistemai). **Kauno diena, psl. 15**
	2006/05/13	**Kodėl kuriamos regioninės atliekų tvarkymo sistemos** (Pranešimas spaudai apie Kauno regione kuriamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, ES paramą ir aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi) **Naujas rytas, psl. 3**
	2007/03/01	**Ketina pertvarkyti sąvartynus** (Publikacija apie numatomus darbus įgyvendinant projektą) **Laikraštis 15 min.**

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -08- 28

17

	2007/06/07	**Siukšlių kalnai** (Publikacija iš renginio žurnalistams „Savartynas – atvirų durų diena" apie Kauno regione įgyvendinamą atliekų tvarkymo sistemą.) **Naujos Tėviškės žinios** **Nr. 104, psl. 1**
	2007/06/12	**Mūsų laukia katastrofa?** (Publikacija iš renginio žurnalistams „Savartynas – atvirų durų diena" apie Kauno regione įgyvendinamą atliekų tvarkymo sistemą.) **Naujos Tėviškės žinios** **Nr. 105, psl. 4**
	2008/01/07	**Lapės pasmerktos naujam savartynui** (Informacija apie konkurso regioninio Lapių savartyno statybai laimėtoją ir planuojamus darbus). **Kauno diena psl. 10**
	2008/02/21	**Neretkalingos aistros dėl aikštelės** (Straipsnyje pateikiama informacija apie įgyvendinamą investicinį projektą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir ES reikalavimus projekto įgyvendinimui bei atliekamų darbų eiliškumui). **Kauno diena**
	2008/06/04	**Kauno regione – naujos aikštelės atliekoms kompostuoti** (Straipsnis apie ES Sanglaudos fondo finansuojamą projektą ir jo lėšomis įrengiamas naujas didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles Kauno regione) **Kauno diena psl. 8**
	2009/02-03	**Užsakomasis straipsnis žurnale „Europos ritmu" – „Kauno regione – naujo atliekų tvarkymo era".**
2.2 Televizija ☒	2007/07/25 - 2008/04/18	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimas** (Reklaminis filmas apie atliekų tvarkymo problemas Kauno regione ir kuriamą naują atliekų tvarkymo sistemą. 5 filmo transliacijos) **Pūkas TV**
	2007/10/09	Specialí laida apie Kauno regione diegiamą atliekų tvarkymo sistemą (laidoje pristatoma Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema, aptariamos Raseinių, Jonavos atliekų tvarkymo problemos) **Pūkas TV**
	2008/04/24	Specialí laida apie Kauno regione diegiamą atliekų tvarkymo sistemą (laidoje pristatoma Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema, aptariamos Kaišiadorių, Kauno rajonų atliekų tvarkymo problemos) **Pūkas TV**
	2008/04/04	Radijo laida apie atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą, netvarkingai eksploatuojamų savartynų daromą žalą aplinkai, galimas prevencijos priemones **Kauno fonas**
	2009/01-12	**Informacinis filmas apie atliekų priėmimo aikšteles** (Reklaminis filmas apie 5 stambiagabaričių atliekų priėmimo aikšteles, kurios Kauno regione buvo pastatytos įgyvendinant projektą) **Pūkas TV**
2.3. Radijas ☒	2007/12/21	Radijo laida apie atliekų tvarkymo sistemą bei „teršėjas moka" principo įgyvendinimą. **Kauno fonas**
2.4. Internetas ☒	2007/02/11	**Rengiamas Kauno regiono atliekų tvarkymo planas** (Skelbimas apie Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto vykdymą, regiono atliekų tvarkymo plano parengimą). **Kauno RATC internetinė svetainė**

TIKRA
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 28

	2007/06/07	**Nuo šiukšlių ginamasi tik šviečiant** (Publikacija iš renginio žurnalistams „Savartynas – atvirų durų diena" apie Kauno regione įgyvendinamą atliekų tvarkymo sistemą.) **Kauno diena**
	2007/09	**Kauno RATC internetinės svetainės atnaujinimas**
	2007/12/06	**Informacinis pranešimas** (Skelbimas apie pasirašytą sutartį su UAB „Kamesta" „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabiliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir grievimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba"). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2007/12/14	**Zabiliškio regioninio sąvartyno statybos darbų pradžia** (Pranešimas apie pasirašytą sutartį su Zabiliškio sąvartyno statybos rangovu) **BNS spaudos centras**
	2007/12/18	**Pasirašyta 110 KV elektros linijos iškėlimo sutartis** (Skelbimas apie pasirašytą sutartį „Elektros įrenginių perkėlimo paslaugų sutartis") **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2007/12/28	**Pasirašyta atliekų priėmimo aikštelių statybos sutartis** (Skelbimas apie pasirašytą rangos sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba"). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2007/12/28	**Pasirašyta Lapių regioninio sąvartyno statybos sutartis** (Skelbimas apie pasirašytą rangos sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba") **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2008/02/28	**Atliekų priėmimo aikštelių statyba** (Pateikiama informacija apie Sanglaudos fondo projekto lėšomis įgyvendinamą projektą bei reikalavimus atliekų priėmimo aikštelių įrenginiui.) **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2008/07/16	**Trukdoma įsisavinti ES lėšas** (Pateikiama informacija apie projekto finansavimą ir galimybę jo netekti, jei numatyti projekto darbai nebus atlikti, t.y. nebus pastatyta atliekų priėmimo aikštelė Kauno mieste). **Kauno savivaldybės internetinė svetainė**
	2008/09/11	**Naujo lauko eksploatavimas** (pateikiama informacija apie Lapių sąvartyno statybos darbų sutarties vykdymą ir pradėtą eksploatuoti naujai įrengtą atliekų kaupimo sekciją). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2008/09/19	**Sąvartynų uždarymas** (Pranešimas apie pasirašytą sutartį Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas) **Kauno RATC internetinė svetainė**

TIKRA
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 28

19

	2008/11/26	**Siūlnėjimo trasų sąvartyne teks palaukti** (Straipsnis apie įgyvendinamą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą ir numatomus pokyčius regioniniame Lapių sąvartyne). **Kauno diena internetinė svetainė**
	2009/01/06	**Siūklės palaidos net sąvartynus** (Publikacija apie Kauno RATC įgyvendinamą projektą, sąvartynų mažinimą Lietuvoje ir poreikį skatinti atliekų rūšiavimą). **Lzinios.lt internetinė svetainė**
	2009/08/17	**APA Kėdainiuose** (parengta ir paviešinta informacija apie Sanglaudos fondo lėšomis įrengtos atliekų priėmimo aikštelės Kėdainiuose darbą per pirmąjį veiklos mėnesį). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2009/08/18	**Zabieliškio sąvartyno pridavimas** (Parengta ir paviešinta informacija apie įvykusį Zabieliškio regioninio sąvartyno pridavimo komisiją ir įvykdytus darbus). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2009/08/25	**APA Kaune** (Parengta ir paviešinta informacija apie Sanglaudos fondo lėšomis įrengtos atliekų priėmimo aikštelės Kaune darbą per pirmąjį veiklos mėnesį). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2009/12/24	**Lapių regioninio sąvartyno pridavimas** (Parengta ir paviešinta informacija apie įvykusią Lapių regioninio sąvartyno pridavimo komisiją ir įvykdytus darbus). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2010/05/28	**Moksleivių ekskursija į Lapių sąvartyną** (Moksleiviai ir mokytojai supažindinti su regioninio Lapių sąvartyno rekonstrukcijos projektu). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2010/06/14	**Išvyka į Zabieliškio sąvartyną bei Atliekų priėmimo aikštelę Kėdainių mieste** (Kėdainių gyventojams buvo suderyta galimybė susipažinti su sąvartyno veikla, įvykdytais pokyčiais statybų metu, pristatyta Atliekų priėmimo aikštelė). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2010/06/23	**Sąvartynų uždarymo darbai** (Pranešimas apie baigtus vykdyti investicinio Projekto sutarties sąvartynų uždarymo darbus). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2010/10/18	**Jonavos moksleiviai lanko atliekų tvarkymo įrenginius** (Informacija apie moksleivių išvyką į regioninius atliekų tvarkymo įrenginius). **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2010-11-26	**Dviratininkų klubo ekskursija į Lapių sąvartyną** (Informacija apie dviratininkų klubo ekskursiją į regioninį Lapių sąvartyną). **Kauno RATC internetinė svetainė**

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-28
Aldona Čepėlienė

20

	2010-12-31	**Naujo atliekų priėmimo aikštelė** (Pranešimas apie baigtų statyti aikštelę Raudondvario pl. 155 D, Kaune). Aikštelės statyba buvo projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" sutarties Nr. A/2007/K/38 dalis. **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2010-12-31	Pranešimas apie baigtą vykdyti projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2004/LT/16/C/PE/001. **Kauno RATC internetinė svetainė**
	2007-2010 m.	Periodiškas informacijos atnaujinimas, Projekto įgyvendinimo metu atliktų darbų pateikimas, nuotraukų talpinimas.
	2006-2010 m.	Informacija apie Všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro vykdomą projektą internetinėje svetainėje www.osparasne.lt.
	2004-2010 m.	Apie vykdomą projektą nuolat informuojama Finansų ministerijos tinklalapyje www.finmin.lt/samalaudos_fondas
4. Kitos priemonės: ☒	**2006/04/05**	**2006 m. sausio-kovo mėn. susitikimai su Lapių, Žabiškių seniūnijų gyventojais, televizijos korespondentais.** Susitikimų metu pateikta informacija apie Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą Kauno regione, planuojamus vykdyti darbus ir būsimus pokyčius.
	2007/10/26	**Seminaras „Jonavos rajono atliekų srautai, rūšiavimo reikalavimai ir teisingo rūšiavimo principai".** Pranešimas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinimas".
	2007/12/18	**Informacinis leidinys apie Všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą „Atliekų tvarkymas Kauno regione"**
	2008/04-05	**Dalyvavimas projekte „Aš noriu švarios Lietuvėlės"** (Parengtas pristatymas Kauno miesto darželių auklėtiniams. Vaikai supažindinti su kuriama regionine atliekų tvarkymo sistema, aiškinama jos svarba ir kiekvieno mūsų dalyvavimas šiame procese).
	2008/10/21	**Dalyvavimas seminare „Šiandieninės atliekų tvarkymo aktualijos"** (Parengtas pranešimas Kauno rajono savivaldybės, seniūnijų, mokymo įstaigų atstovams. Pristatyta Kauno RATC veikla, jau atlikti ir vykdomi darbai).
	2008/11/28	**Paskaita LŽŪU studentams „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos pagrindiniai objektai"** (Parengtas pranešimas LŽŪU IV kurso studentams apie projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", pristatyta Kauno RATC veikla, vykdomi statybos darbai).
	2009/01/23	**Paskaita Kauno raj. pagrindinės mokyklos aplinkotyros ir kraštotyros klubui.** (Susitikime mokiniams papasakota apie jų rajone buvusius sąvartynus, jų uždarymo metu vykdomus darbus. Pristatytas Kauno RATC vykdomas projektas, siekiami tikslai, parengtas pristatymas, apie atliekų rūšiavimą).
	2009/01-03 mėn.	**Lankstinukų apie atliekų priėmimo aikštelės gamyba ir platinimas į gyvenvietę pašto dėžutes**
	2009/12/16	**Mokymai Kauno regiono savivaldybių aplinkosaugos specialistams „Naujų iššūkiai atliekų tvarkyme"** (Renginys savivaldybių atliekų tvarkymo specialistams, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas įvykdytomis veiklomis, pasiektais rezultatais)

T I K R A
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
21
2011 -06- 28

	2010/05/27	**Parengtas pranešimas Kauno raj. moksleiviams apie Lapių sąvartyną.** (dalyvauta Kauno raj. mokyklų aplinkosauginiame renginyje, kurio dalis buvo išvyka į Lapių sąvartyną. Sąvartyne moksleiviai supažindinti su įgyvendintu projektu).
Stendai	**Nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn.**	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" Nr. (A/2007/K/37), stendas prie Lapių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Lapių k. Kauno r.
	Nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2009 m. birželio mėn.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/Z/32), stendas prie Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Zabieliškio k. Kėdainių r.
	Nuo 2008 m. gegužės mėn. iki 2009 m. liepos mėn.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), stendas prie Kauno m. stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Nemajūnų g. 15D, Kaunas.
	Nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2009 m. birželio mėn.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), stendas prie Kaišiadorių stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Vytauto Didžiojo g. 156, Kaišiadorys.
	Nuo 2008 m. balandžio mėn. iki 2009 m. birželio mėn.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), stendas prie Jonavos stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Jonalaukio k. Jonavos raj.
	Nuo 2008 m. kovo mėn. iki 2009 m. gegužės mėn.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), stendas prie Kėdainių stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo J. Basanavičiaus g. 97A, Kėdainiai.
	Nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2009 m. birželio mėn.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), stendas prie Raseinių stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Andrušaičių k. Raseinių raj.
	Nuo 2010 m. lapkričio mėn. iki 2010 m. gruodžio mėn.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), stendas prie Raseinių stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Raudondvario pl. 155 D, Kaune.
	Nuo 2009 sausio mėn. iki 2010 m. birželio mėn.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" (Nr. A/2007/K/40), stendai: **Kauno raj.** prie įvažiavimo į Miškinių sąvartyną. **Raseinių raj.** prie įvažiavimo į Andrušaičių sąvartyną. **Kaišiadorių raj.** prie įvažiavimo į Budnikų sąvartyną. **Jonavos raj.** prie įvažiavimo į Jonalaukio sąvartyną. **Kėdainių raj.** prie įvažiavimo į Babėnų sąvartyną.
Atminimo lentos	**Nuo 2009 m. gruodžio mėn. iki 2014 m.**	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" Nr. (A/2007/K/37), atminimo lenta prie Lapių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Lapių k. Kauno r.
	Nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2014 m.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/Z/32), atminimo lenta prie Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Zabieliškio k. Kėdainių r.

KOPIJA
Sąvartynas uždaryta
2011-06-27
Aldona Čepulėjienė

	Nuo 2009 m. liepos mėn. iki 2014 m.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), atminimo lenta prie Kauno m. stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Nemajūnų g. 15B, Kaunas.
	Nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2014 m.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), atminimo lenta prie Kaišiadorių stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Vytauto Didžiojo g. 156, Kaišiadorys.
	Nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2014 m.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), atminimo lenta prie Jonavos stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Jonalaukio k. Jonavos raj.
	Nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2014 m.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), atminimo lenta prie Kėdainių stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo J. Basanavičiaus g. 97A, Kėdainiai.
	Nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2014 m.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), atminimo lenta prie Raseinių stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Anstriašaičių k. Raseinių raj.
	Nuo 2010 m. gruodžio mėn. iki 2015 m.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Nr. A/2007/K/38), atminimo lenta prie Raseinių stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įvažiavimo Raudondvario pl. 155 D, Kaune.
	Nuo 2010 m. birželio mėn. iki 2015 m.	Sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" (Nr. A/2007/K/40). Atminimo lentos prie uždarytų sąvartynų: **Kauno raj.:** Miškinių, Digrių, Dzvinių, Gaiženiškių. **Kaišiadorių raj.:** Budnikų, Tarpumiškio, Romiškių, Moskėnų, Antakalnio, Kruonio, Grunžų, Živinins, Kleriškių, Pakalniškių. **Kėdainių raj.:** Babėnų, Šalčininių, Jovaišų, Grunžių, Miškėnų, Šatenių, Aristavėlės, Žiogaičių, Pavermenio, Pajiesliio, Rekšių, Donavos, Labūnavos, Čiukiškių, Čystupolio, Gudžiūnų, Vikaičių, Špitolpievlo. **Jonavos raj.:** Jonalaukio; Paskutiškių, Kuliškių, Palokės, Narsuninkiškių, Varpių, Kaigalių, Čičinų, Biržuliškių, Aklių. **Raseinių raj.:** Andrušaičių, Tarosų, Paskystinio, Poliepių, Papelkių, Gėlavos, Numgalių, Dirkonių, Girkalnio, Žvirgždės, Dautartų, Zbaro, Jukainių, Ugionių, Steponkaimio, Meitiškių.



Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
7 priedas

Projekto galutinė ataskaita

sanglaudos fondas

Projekto pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas**
Projekto Nr.	**2004/LT/16/C/PE/001**
Dokumentas	**Galutinė ataskaita**

Parengė:	**VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras**	**Direktorius Kęstutis Balčiūnas**	
	Viešoji įstaiga	**Vardas, pavardė, pareigos**	**Parašas**
Patvirtino:	**Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra**	*Direktorius Kastytis Tumėnas*	
	Institucija	**Vardas, pavardė, pareigos**	**Parašas**

VALSTYBĖS KONTROLĖS KAUNO APSKRITIES VALDYBOS ANTSPAUDAS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 5758,
faks. (8 5) 272 2563, el. p. apva@apva.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288779660

PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Aš, Kastytis Tuminas, Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius, tvirtinu, kad darbai, aprašyti Galutinėje ataskaitoje yra įvykdyti remiantis sprendimu suteikti paramą projektui Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas".

Kastytis Tuminas

Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius

Data: 2011-06-16

Vilnius

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliejienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Aš, Kęstutis Balčiūnas, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC) direktorius, tvirtinu, kad informacija, pateikta Galutinėje ataskaitoje yra teisinga, o atlikti darbai įvykdyti, remiantis sprendimu suteikti paramą Sanglaudos fondo aplinkos investicijų projektui „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, projekto registracijos Nr. **2004/ LT/16/C/PE/001.**

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
direktorius Kęstutis Balčiūnas

KONTROLĖS, KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

Sanglaudos fondas

TURINYS

		Psl.
	LENTELIŲ TURINYS	6
	TRUMPINIAI	8
	BENDROJI INFORMACIJA	9
1	**ĮVADAS**	10
1.1.	Esama padėtis atliekų tvarkymo srityje	10
1.2.	Sanglaudos fondo parama	10
1.3.	Sanglaudos fondo valdymas	11
1.4.	Įgyvendinančios institucijos ir galutinio paramos gavėjo atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymas įgyvendinant Projektą	13
2.	**PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS**	17
2.1	Projekto aprašymas	17
2.2	Projekto valdymo ypatumai	19
2.3.	Viešieji pirkimai	19
2.3.1.	Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai Kauno RATC, sutarties Nr.2006/8/IPK/PT/LT	20
2.3.2.	Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai Kauno RATC, sutarties Nr.06-18	20
2.3.3.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams, sutarties Nr. A/2006/K/14	21
2.3.4.	Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos, sutarties Nr.966-07	22
2.3.5.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: 10 KV ETT orinės linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimas, sutarties Nr.2008/37/ND/P/LT	23
2.3.6.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas Kauno RATC, sutarties Nr. 2006/96/A/K/LT	23
2.3.7	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba, sutarties Nr. A/2007/Z/32	25
2.3.8.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra, sutarties Nr. A/2007/K/24	27
2.3.9.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas, sutarties Nr. A/2007/K/40	29
2.3.10.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba, sutarties Nr. A/2007/K/37	30
2.3.11.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba, sutarties Nr. A/2007/K/38	32
2.3.12	Šeimos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos	33
2.4	Situacija iki projekto įgyvendinimo	34
2.4.1	Komunalinių atliekų kiekiai	34
2.4.2	Komunalinių atliekų sudėtis	36
2.4.3	Regiono komunalinių sąvartynų apžvalga	37

VALSTYBĖS KONTROLĖS FINANSŲ AUDITO DEPARTAMENTAS KONTROLĖS KORESPONDENTAS IR ĮGALIOTAS ASMUO

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

2.5.	Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įvykdyti statybos darbai	40
2.5.1	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba	41
2.5.2.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba	42
2.5.3.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas : APA statyba	43
2.5.4.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas	43
2.6	Projekto atitikimas EK sprendimui Nr. (2005)1610 (2005 m. gegužės 24 d.) ir EK sprendimui Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.)	45
2.6.1.	2010 m. birželio 2 d.EK sprendimo Nr. (2010)3625, kuris iš dalies pakeitė 2005 m. gegužės 24 d. EK sprendimą Nr. (2005)1610, sąlygosEK.	45
2.6.2.	Projekto tikslai ir pagrindiniai priežiūros rodikliai	47
2.6.3	EK sprendime Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.) iškelti fiziniai tikslai	48
2.6.4.	Įgyvendinti fiziniai tikslai	48
2.7.	Projekto patikros	52
2.8.	Projekto pažeidimai	57

3.	**FINANSINĖ IR EKONOMINĖ ANALIZĖ**	59
3.1.	Projekto išlaidos	72
3.2.	Ekonominės naudos analizė	72
3.2.1.	Bendrosios skaičiavimų prielaidos	72
3.2.1.1.	Projekto ataskaitinis laikotarpis	72
3.2.1.2	Diskonto norma	72
3.2.1.3.	Bendros investicijų išlaidos	72
3.2.1.4	Projekto veiklos išlaidos	72
3.2.1.5.	Projekto pajamos	72
3.2.1.6	Likutinė vertė	72
3.2.2.	Projekto investicijos	72
3.2.3.	Projekto reinvesticijos	75
3.2.4.	Projekto pajamos	76
3.2.5.	Likutinė projekto turto vertė	77
3.2.6.	Projekto finansavimas	78
3.2.7.	Projekto finansiniai rodikliai	79
3.2.8.	Projekto finansinis gyvybingumas	80
3.2.9.	Projekto finansinės analizės išvados	80
3.2.10.	Projekto sąnaudų–naudos analizė	80
3.2.11.	Fiskalinė korekcija	81
3.2.12.	Išorinio poveikio įvertinimas	81
3.2.13.	Projekto ekonominiai rodikliai	83
3.2.14.	Projekto sąnaudų–naudos analizės išvados	83

KONTROLĖS, KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR TYRIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23



3.2.15.	Projekto jautrumo analizė	83
4.	**PROJEKTO VIEŠINIMAS**	85
4.1.	Projekto viešinimo tikslai	85
4.2	Įgyvendintos projekto viešinimo priemonės	86
4.3	Informaciniai stendai ir atminimo lentos	91
5.	**IŠVADOS**	94
6	**PRIEDŲ SĄRAŠAS**	96

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-08-23
Aldona Čeplėjienė

sanglaudos fondas

LENTELIŲ TURINYS

Nr.	Pavadinimas	Psl.
1	Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui.	20
2	Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui.	20
3	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams.	21
4	Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos.	22
5	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: 10 KV ETT orinės linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimas.	23
6	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas Kauno RATC.	23
7	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba	25
8	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra	27
9	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas.	29
10	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba.	30
11	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba.	32
12	Šeimos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos.	33
13	Mišrių buitinių ir panašių atliekų susidarymas, surinkimas ir šalinimas savivaldybėse 2002 m.	34
14	Metiniai susidarančių atliekų kiekiai remiantis skaičiavimais ir atliekų tvarkytojų duomenimis 2003 m.	35
15	Statybos ir griovimo atliekos, priimtos sąvartynuose ir aikštelėse.	35
16	Apskaičiuotas komunalinių atliekų susidarymas Kauno apskrities atliekų tvarkymo regione 2003 m.	36
17	Atliekų susidarymas vienam gyventojui bei vidutinė atliekų sudėtis Kauno atliekų tvarkymo regione 2003 m.	37
18	Kauno apskrities atliekų tvarkymo regiono sąvartynų skaičius	38
19	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba.	41
20	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba	42
21	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba	43
22	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas	43

KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

23	Kauno RATC objektų TIPK leidimai	47
24	Pasiekti projekto fiziniai rodikliai	49
25	Projekto patikros	52
26	Projekto vertė ir finansavimo šaltiniai (pagal atliktus mokėjimus)	59
27	Projekto komponentų vertės.	60
28	Bendra vykdytų darbų / suteiktų paslaugų pagal sutartis mokėjimų suvestinė	62
29	Projekto vykdytojų (rangovų, paslaugų teikėjų) mokėjimų suvestinė	63
30	Projekto investicijos (įvykdyta darbų iki 2010-12-31)	73
31	Projekto investicijų grafikas	73
32	Duomenys apie projekto išlaidas 1–20 projekto metais	74
33	Duomenys apie visas projekto reinvesticijas	76
34	Duomenys apie projekto pajamas 1–20 projekto metais	77
35	Duomenys apie likutinę vertę	78
36	Duomenys apie projekto investicijų finansavimo šaltinius	78
37	Projekto finansiniai rodikliai	79
38	Duomenys apie projekto fiskalines korekcijas 1–20 projekto metais	81
39	Duomenys apie projekto aplinkosauginę naudą	82
40	Pagrindiniai projekto ekonominiai rodikliai	83
41	Duomenys apie rizikos veiksnių pokyčius	84
42	Projekto jautrumo analizės rezultatai pajamoms	84
43	Projekto jautrumo analizės rezultatai veiklos išlaidoms	84
44	Projekto jautrumo analizės rezultatai išoriniam poveikiui	85
45	Projekto veiklų viešinimas	86
46	Įrengti informaciniai stendai ir atminimo lentos	91

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

TRUMPINIAI

Kauno RATC – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
AM – Aplinkos ministerija
APA – atliekų priėmimo aikštelė
APVA – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
EK – Europos Komisija
ES – Europos Sąjunga
EB – Europos Bendrija
EEB - Europos Ekonominė Bendrija
EUR – euras
FIDIC – Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
ISPA – Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas
LR – Lietuvos Respublika
LT – Lietuva
Nr. – numeris
PHARE – Europos Sąjungos ekonominės pagalbos programa
SAPARD - Specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros programa
SF – Sanglaudos fondas
STR – Statybos techninis reglamentas
VšĮ – viešoji įstaiga
vnt. – vienetas
UAB – uždaroji akcinė bendrovė

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

sanglaudos fondas

BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas**		
Projekto registracijos Nr.	**2004/LT/16/C/PE/001**		
Įgyvendinančioji institucija	**LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra** Labdarių g. 3, LT-01013, Vilnius, Lietuva		
Galutinis paramos gavėjas	**VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras** Statybininkų g. 3-19, LT-50124 , Kaunas, Lietuva		
SF paramos dydis pagal EK sprendimą Nr.K(2005)1610 dėl paramos iš SF skyrimo projektui dėl Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo, vykdomam Lietuvos Respublikoje (toliau – EK sprendimas)	**75 proc.**		
EK sprendimo pasirašymo data	**2005-05-24**	EK sprendime nurodyta projekto pabaigos data	**2009-12-31**
EK sprendimo Nr.K(2010)3625, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas K(2005)1610 dėl SF paramos skyrimo projektui dėl Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo, vykdomam LR (toliau - EK sprendimo pakeitimas) data*	**2010-06-02**		
EK sprendimo pakeitime nurodyta projekto vertė (bendrosios išlaidos EUR)	**25.388.987**		
EK sprendimo pakeitime nurodyta projekto vertė (bendrosios tinkamos išlaidos EUR)	**18.432.000**		
EK sprendimo pakeitime nurodytas paramos dydis (%, EUR)	**75% , 13.824.000**		
EK sprendimo pakeitime nurodyta Statybos darbų pradžia	**2007-11-13**		
EK sprendimo pakeitime nurodyta Statybos darbų pabaiga ir projekto išlaidų tinkamumo paramai gauti pabaigos data	**2010-12-31**		
Išlaidų tinkamumo paramai gauti pradžios data	**2004-07-30**		

*Kauno RATC 2010 m. birželio 18 d. raštu Nr.220 yra pateikęs pastabas dėl EK sprendimo pakeitime nustatytų neatitikimų, o APVA 2010 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. 4386 pateikė oficialias šias pastabas LR Finansų ministerijai ir LR AM. 2010 m. gruodžio 23 d. LR Finansų ministerijos raštu Nr. [illegible]6K-10[illegible]8 ši informacija pateikta EK.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR PERĖTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Cepelėjienė
2011-06-23

sanglaudos fondas

1. ĮVADAS

1.1. Esama padėtis atliekų tvarkymo srityje

1996 m. paskelbtame Pranešime apie Bendrijos strategiją atliekų tvarkymo srityje pateikiama ES atliekų tvarkymo politika. Dokumentas patvirtina 1989 m. Bendrijos atliekų tvarkymo strategijoje nustatytą „principų hierarchiją", t.y. pirmiausiai atliekų susidarymo prevencija ir toliau lieka pirmuoju prioritetu, o po jo seka pakartotinis naudojimas, atliekų perdirbimas, kitoks atliekų naudojimas (energijai gauti) ir galiausiai saugus atliekų šalinimas

Atliekų tvarkymas Lietuvoje yra prioritetinė aplinkos apsaugos sritis, kurios svarba nurodyta LR Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu „Dėl valstybės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo" Nr. I-1550 (Žin., 1996, Nr. 103-2347).

Siekiant įvykdyti atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES direktyvų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, LR Vyriausybė 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nustatyti atliekų tvarkymo prioritetai ir principai, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, kuriais vadovaujantis pradėtos diegti regioninės atliekų tvarkymo sistemos, apimančios kelių savivaldybių teritorijas ir padedančios apsaugoti aplinką nuo užteršimo atliekomis. Regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimas – naujas ir perspektyvus reiškinys, sąlygotas Lietuvos įsipareigojimų ES

Atliekų tvarkymo sistemos tikslas – iki 2010 metų sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, organizuoti jos funkcionavimą ir įgyvendinti šios sistemos plėtrą.

1.2. Sanglaudos fondo parama

Vadovaudamasi ES sutarties nuostatomis, EB Taryba 1994 m. gegužės 16 d. reglamentu Nr. 1164/94, įsteigiančiu SF, kurio pakeitimai buvo atlikti Tarybos 1999 m. birželio 21d. reglamentu Nr. 1264/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą Nr. 1164/94, įsteigiantį SF, ir 1999m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1265/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio SF, II priedą, įsteigė SF. Reglamentas taip pat nustato SF remtinas priemones, galimas paramos formas, dydžius ir sąlygas bei pagrindinius projektų tvirtinimo, įgyvendinimo, priežiūros ir vertinimo principus.

SF – tai struktūrinė priemonė, sukurta 1993 m. ir nuo 1994 m. padedanti valstybėms narėms sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei stabilizuoti savo ekonomiką, mažinant skirtumus tarp regionų. SF finansuoja iki 85 proc. tinkamų išlaidų, susijusių su svarbiausiais aplinkosaugos ir transporto infrastruktūros projektais. Tokiu būdu stiprinama ES sanglauda ir solidarumas. Parama skiriama atskiriems projektams juos individualiai suderinus su EK. Visi projektai finansuojami pagal šiuos kriterijus:

- Projektas atitinka ES direktyvų reikalavimus ir skirtas brangiausių direktyvų įgyvendinimui;
- finansuojami ne mažesni kaip 10 mln. EUR vertės projektai;
- finansuojama iki 80 – 85 proc. projekto vertės;
- turi būti išlaikytas balansas tarp transporto ir aplinkos apsaugos projektų;
- Projektas turi atitikti "teršėjas moka" bei "darnaus vystymosi" principus, atliktas poveikio aplinkai vertinimas bei nepatekti į Natura 2000 saugomas teritorijas;
- Projektai gali būti grupuojami ir skirstomi į stadijas;

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

- Suteikiama techninė pagalba projektų rengimui, monitoringui, projektų vertinimui, visuomenės informavimui.

SF parama LT buvo teikiama vadovaujantis bendru LR finansų, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtinta ir su EK suderinta Sanglaudos fondo strategija 2004–2006 metams. Strategijoje apibrėžiamos pagrindinės šio fondo paramos panaudojimo kryptys. Jos atitinka ilgalaikius LT tikslus bei ES politikos gaires transporto plėtros ir aplinkos apsaugos srityse.

Atliekų tvarkymo regioninės sistemos (naujų sąvartynų įrengimas ir senų uždarymas, APA, kompostavimo aikštelių įrengimas) – viena iš pagrindinių aplinkosaugos investicijų krypčių 2004-2006 m.

Atliekų tvarkymo sistemos kūrimo teisinė ir administracinė bazė:

- Atliekų direktyva (2006/12/EB);
- Sąvartynų direktyva (1999/31/EB);
- Pavojingų atliekų direktyva Nr. 94/31/EB, iš dalies keičianti direktyvą Nr. 91/689/EEB;
- Atliekų deginimo direktyva (2000/76/EB, 94/67/EB, 89/369/EEB, ir 89/429/EEB);
- Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva Nr. 2004/12/EB, iš dalies keičianti direktyvą Nr. 94/62/EB;LR atliekų tvarkymo įstatymas;
- Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas;
- Atliekų tvarkymo taisyklės

1.3. Sanglaudos fondo valdymas

ISPA yra pasirengimo narystei ES struktūrinės politikos priemonė, kuri kaip ir PHARE, SAPARD, yra skirta kitų finansinių išteklių panaudojimui ypač svarbių projektų įgyvendinimui skatinti Vidurio ir Rytų Europos šalyse kandidatėse. Konkrečiai ISPA finansinės paramos programa yra skirta padėti minėtoms šalims priartinti aplinkosaugos ir transporto būklę prie ES šalių būklės.

ISPA finansinės paramos programos tikslus buvo prisidėti prie stojimo partnerystės tikslų įgyvendinimo kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje ir prisidėti siekiant atitikti nacionalinius aplinkosaugos ir transporto sektorių plėtros ir kokybės gerinimo tikslus.

ISPA yra SF prototipas, įsteigtas 2000–2006 metų laikotarpiui **Europos Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1267/1999**, parengiančiu struktūrinės pasirengimo narystei politikos instrumentą.

Kadangi SF yra ES finansinė priemonė, jį valdant dalyvauja šios ES institucijos:

- **Europos Parlamentas**, kuris tvirtina ES biudžetą, kartu ir SF lėšas kiekvienam finansiniam laikotarpiui;
- **Europos Taryba,** kurios sprendimu priimtas reglamentas, įsteigiantis SF ir nustatantis jo išteklių paskirstymą šalims narėms bei įtvirtinantis pagrindines valdymo taisykles;
- **Europos Komisija**, kuriai tenka pagrindinis SF valdymo ES lygiu vaidmuo, yra atsakinga už projektų patvirtinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą, potencialaus ir realaus kiekvieno projekto poveikio įvertinimą. Įgyvendinus projektą, EK patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl ES Sanglaudos fondo paramos administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2004, Nr. 103-3777; 2008, Nr. 87-3483) sudaryta keturių lygmenų SF valdymo ir administravimo struktūra. SF lėšas administruojanti institucija – vadovaujančioji, mokėjimo, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos, taip pat galutiniai paramos gavėjai. Tiesioginė atsakomybė už projektų valdymą ir

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

finansinę kontrolę tenka šalinis narėms. SF valdymą reglamentuojantys teisės aktai nurodo keletą institucijų, kurios dalyvauja valdant šį fondą šalyje narėje.

SF administravimo sistema yra paremta ISPA paramos programos valdymo sistema, panaudojant patirtį, įgytą valdant ISPA lėšas.

SF valdymo struktūra nuo LR įstojimo į ES dienos yra tokia:

1 pav. SF valdymas Lietuvoje

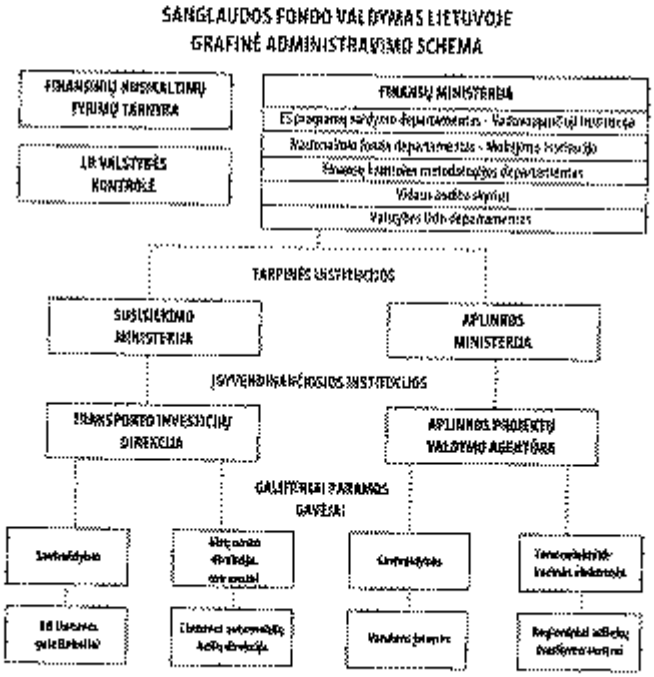

Europos Komisija (EK) – ES institucija.

Valstybės kontrolė - LR aukščiausioji valstybinio audito institucija. Jos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.

Finansų ministerija – administruodama SF lėšas, atlieka vadovaujančiosios, mokėjimo ir auditą koordinuojančiosios institucijų funkcijas.

Aplinkos ministerija – tarpinė institucija ir institucija, atsakinga už veiklos atrankinius patikrinimus aplinkos apsaugos srityje;

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) – įgyvendinančioji institucija aplinkos apsaugos srityje.

Įgyvendinant ISPA/SF finansuojamą projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", galutinis paramos gavėjas – Kauno RATC, todėl žemiau aprašomos tik susijusios

KONTROLĖS, ATESTAVIMO IR PERSPEKTYVINIO PLANAVIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

institucijos.

Finansų ministerija - Vadovaujančioji, auditą koordinuojanti ir mokėjimo institucija, kuri atsakinga už atrankinius patikrinimus ir funkcijas, susijusias su Finansų ministerijos įgyvendinamais ES sanglaudos fondo techninės paramos priemonių projektais.

Vadovaujančioji institucija - įgyvendina ES SF strategiją, koordinuoja ES SF lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūrą, atlieka kitas SF vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

Mokėjimo institucija - administruoja iš EK gautas SF lėšas, tikrina ir teikia EK mokėjimo paraiškas išmokoms gauti, užtikrina tinkamų projektų įgyvendinimo finansinę priežiūrą bei atlieka kitas SF mokėjimo institucijos funkcijas.

Aplinkos ministerija (AM) - tarpinė institucija. Pagal kompetenciją rengia SF strategijos aplinkosauginę dalį, siūlo projektų, tinkamų finansuoti iš SF sąrašą; užtikrina SF paraiškų parengimą, prireikus teikia siūlymus dėl EK sprendimo pakeitimų bei atlieka kitas SF tarpinės institucijos funkcijas. AM taip pat atlieka atrankinius patikrinimus aplinkos apsaugos srityje.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) – įgyvendinančioji institucija, kuri organizuoja viešuosius pirkimus, pasirašo sutartis, užtikrina, kad įgyvendinant SF projektus, būtų laikomasi LR ir EB teisės aktų bei užtikrina informavimo ir viešumo veiksmų įgyvendininą bei atlieka kitas SF įgyvendinančios institucijos funkcijas.

Galutiniai naudos (paramos) gavėjai – institucijos, gaunančios paramą ir tiesioginę naudą iš įgyvendinamų projektų.

Išsami informacijos pateikta: http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/

1.4 Įgyvendinančios institucijos ir galutinio paramos gavėjo atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymas įgyvendinant Projektą

Įgyvendinančios institucijos ir galutinio paramos gavėjo atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymas įgyvendinant projektą nustatytas APVA ir Kauno RATC 2006 m. balandžio 28 d. pasirašytoje sutartyje.

APVA priskirtos užduotys ir atsakomybė:

- Pirkimo konkursų organizavimas ir sutarčių sudarymas:
  - vykdo viešuosius pirkimus pagal LR viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimus;
  - tikrina Kauno RATC pateiktų pirkimo dokumentų atitikimą LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;
  - atsako į konkurso dalyvių paklausimus dėl konkurso sąlygų paaiškinimo. Klausimus dėl techninės specifikacijos persiunčia atsakyti galutiniam paramos gavėjui;
  - kviečia APVA, Kauno RATC bei, pagal poreikį, kitus atstovus į viešojo pirkimo komisiją ir ją tvirtina;
  - skiria savo atstovus į viešojo pirkimo komisiją;
  - tvirtina viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą;
  - atsako į konkurso dalyvių skundus;
  - pasirašo su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį, perkančiosios organizacijos vardu.
- Projekto komponentų įgyvendinimo sutarčių vykdymas:
  - prasidėjus sutarties įgyvendinimui, per savaitę paskiria projekto komponento įgyvendinimo vadovą iš APVA pusės ir raštu informuoja apie tai partnerius;

KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliejienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

- gavus galutinio paramos gavėjo komentarus, per savaitę, raštiškai pakomentuoja ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimo sutarčių vykdymu;
- per savaitę gavus dokumentus raštiškai patvirtina ar pakomentuoja Projekto įgyvendinimo sutarčių pakeitimus, kuriems pritarė galutinis paramos gavėjas;
- gavus techninį projektą iš konsultantų ir turint galutinio paramos gavėjo pritarimą, per savaitę pateikia jį techninei ekspertizei įvertinti;
- nuolat prižiūri, kad kitos Projekto įgyvendinimo sutarčių šalys nurodytas funkcijas atliktų pagal sutarčių sąlygas.

- Finansinė kontrolė, priežiūra, ataskaitos ir sąskaitų apmokėjimas:
  - peržiūri gautus mokėjimo prašymus, sąskaitas ir kitus dėl apmokėjimo pateiktus dokumentus pagal EK sprendimo dėl paramos skyrimo šiems Projektams nuostatas, LR teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų reikalavimus ir, jei gauti dokumentai yra priimti, juos patvirtina bei perduoda vieną sąskaitą galutiniam paramos gavėjui;
  - apmoka Tiekėjo, Rangovo pateiktą sąskaitą SF bei specialiųjų valstybės biudžeto SF programų projektui skiriamomis bendrojo finansavimo lėšomis, kaip nustatyta LR teisės aktuose ir šio projekto komponentų sutartyje;
  - atlikus mokėjimą, per 5 darbo dienas išsiunčia pranešimą (kartu su patvirtinta sąskaita ir kitais dokumentais) Galutiniam paramos gavėjui apie atliktus mokėjimus iš SF bei specialiųjų valstybės biudžeto SF programų projektui skiriamų bendrojo finansavimo lėšų;
  - jei mokėjimo prašymas ir mokėjimo prašymą pateisinantys dokumentai nepriimami, per 5 darbo dienas gražina juos Galutiniam paramos gavėjui pataisyti, nurodant neatitikimo priežastis.
- Vadovavimas, priežiūra, apskaita ir ataskaitos:
  - vykdo projekto komponentų patikrinimų jų įgyvendinimo vietose, šių patikrinimų registraciją bei galutiniam paramos gavėjui ar kitoms (paslaugų, darbų, tiekimo) sutarčių šalims nurodo imtis būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti;
  - kaupia gautą bei pačių pateiktą raštišką informaciją apie Projekto įgyvendinimo sutarčių eigą ir saugo ją 5 metus po paskutinio mokėjimo;
  - rengia ataskaitas Finansų ministerijai ir AM apie visą bendrą šio Projekto komponentų įgyvendinimo eigą;
  - teikia informaciją EK apie Kauno RATC įsipareigojimo 5 metus neperleisti viešosios nuosavybės turto privatiems asmenims vykdymą.
- Visuomenės informavimas ir švietimas:
  - vykdo bendrosios viešos informacijos paskelbimą;
  - vykdo EK informavimą apie šio projekto visuomenės informavimo priemones;
  - vykdo Galutinio paramos gavėjo parengto visuomenės informavimo veiksmų plano vykdymo kontrolę.
- Auditas:
  - bendradarbiauja su vidaus ir kvietiniais auditoriais;
  - teikia auditoriams visą su projektais susijusią dokumentaciją ir informaciją;
  - įgyvendina audito išvadas ir rekomendacijas susijusias su APVA veikla.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

Kauno RATC priskirtos užduotys ir atsakomybė:

- Pirkimo konkursų organizavimas ir sutarčių sudarymas:
  - vykdo visas užsakovo pareigas, numatytas LR Statybos įstatyme ir Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos statybos sutarties sąlygose (FIDIC), 1999 m. leidimas;
  - rengia pirkimų dokumentus ir teikia jas derinti APVA;
  - APVA, atskirais atvejais, direktoriaus įsakymu gali pavesti Galutiniam paramos gavėjui atlikti perkančiosios organizacijos funkcijas;
  - Tais atvejais, kai galutinis paramos gavėjas vykdant pirkimus atlieka perkančiosios organizacijos funkcijas prieš pasirašant sutartį su konkurso nugalėtoju pateikia APA patikrinimui pirkimo konkurso dokumentus;
  - vykdo techninių specifikacijų bei brėžinių kokybės rengimo koordinavimą ir derinimą tarp savivaldybės ir kitų institucijų, bei patvirtina pagal STR reikalavimus;
  - pateikia pastabas Tiekėjų parengtoms pirkimo dokumentų techninėms specifikacijoms bei brėžiniams (per 1 savaitę nuo jų gavimo dienos);
  - parengia atsakymus į konkurso dalyvių paklausimus dėl techninės specifikacijos ir išsiunčia į APVA (per 3 kalendorines dienas nuo jų gavimo dienos);
  - skiria savo atstovus į viešojo pirkimo komisiją, kuri dirba pagal APVA patvirtintą reglamentą bei dalyvauja visuose viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose;
  - APVA pakvietus, pasirašo su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį Užsakovo vardu.
- Projekto komponentų įgyvendinimo sutarčių vykdymas:
  - pateikia savalaikį kreipimąsi į savivaldybes dėl detaliojo plano rengimo sąlygų sąvado bei sąlygų sąvado projektavimui išdavimo ten, kur Galutinis paramos gavėjas yra planavimo organizatorius;
  - ten, kur Galutinis paramos gavėjas nėra planavimo organizatorius užtikrina, kad detaliojo plano rengimo sąlygų sąvado projektavimui išdavimas būtų savalaikis ir dėl šios priežasties nebūtų projektavimo sutarties užduočių įvykdymo vėlavimo;
  - prasidėjus Projekto komponento sutarties įgyvendinimui, pateikia Tiekėjui, Rangovui visus su šiuo projekto komponentu susijusius dokumentus, kaip nustatyta sutarties sąlygose;
  - per savaitę raštiškai pateikia pastabas gautoms ataskaitoms ir kitiems dokumentams, susijusiems su Projekto įgyvendinimo sutarčių vykdymu;
  - per savaitę patvirtina ar pakomentuoja Tiekėjui, Rangovui jo prašomą sutarties pakeitimą;
  - patvirtintą sutarties pakeitimą pateikia į APVA derinti;
  - nuolat tikrina savalaikį Projekto komponentų įgyvendinimo sutartyse aprašytų užduočių atlikimą, užduočių kokybę ir jų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, taip pat savalaikį susijusių ataskaitų pateikimą;

- konsultantams pateikus techninį projektą, pateikia galutinio paramos gavėjo pritarimą APVA, kad jį per savaitę pateiktų jį techninei ekspertizei įvertinti;
- nepritarus techniniam projektui per savaitę pateikia motyvuotą paaiškinimą
- ekspertizei pripažinus, kad projektinė dokumentacija atitinka jai keliamus reikalavimus ir rekomendavus techninį projektą tvirtinti, patvirtina techninį projektą ir pateikia visus reikalingus dokumentus į atitinkamą savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo;
- pateikia statybos leidimą rangovui (per savaitę pateikia kopiją APVA);
- kreipiasi dėl išankstinio APVA ir AM pritarimo, bei kokių nukrypimų nuo EK sprendime ar darbų sutartyse numatytų apimčių, atveju;
- turi teisę inicijuoti EK sprendimo pakeitimą ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki projekto pabaigos ir tik vieną kartą. Tokiu atveju, parengia visą EK sprendimo pakeitimui reikalingą dokumentaciją ir suderina su AM, Finansų ministerija ir APVA;
- inicijuoja projekto komponentų žemės sklypų nuosavybės ir kitų žemės valdymo teisių patvirtinančių dokumentų sutvarkymą;
- atsako už projekto techninių sprendinių ir rezultatų, nustatytų sutarčių sąlygose įgyvendinimo kontrolę bei projekto įgyvendinimą pagal EK sprendime numatytas sąlygas;
- atsako už fizinių ir kitų projekto EK sprendime indikatorių pasiekimą.

- Finansinė kontrolė, priežiūra, ataskaitos ir sąskaitų apmokėjimas:
  - paskiria finansininką projekto apskaitai tvarkyti;
  - per 3 savaites nuo rangos sutarčių pasirašymo dienos pateikia APVA suderinto su rangovu apmokėjimo grafiką;
  - kontroliuoja, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (FIDIC inžinierius) patvirtintų Rangovo sąskaitas laiku, kaip nustatyta šio projekto komponento sutartyje;
  - kartu su APVA atsako už savalaikį ES bei biudžeto lėšų įsisavinimą (pagal patvirtintą valstybės investicijų programą).
- Vadovavimas, priežiūra, apskaita ir ataskaitos:
  - Per 6 mėn. nuo techninės pagalbos konsultantų parinkimo parengia Procedūrų vadovą (instrukcijas). Procedūrų vadovas turi būti praktiniam naudojimui skirtas dokumentas, kuris be konkrečių rekomendacijų turi spinti ir pavyzdines formas;
  - teikia APVA šią informaciją:
    - ateinančių metų projekto komponentų įgyvendinimo grafiką (pirkimų ir mokėjimų planus) iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. bei, esant reikalui, projekto įgyvendinimo grafiko tikslinimą;
    - galutinę Projekto komponentų sutarčių įgyvendinimo ataskaitą (per 1 mėn. visoms sutarties šalims pasirašius darbų priėmimo- perdavimo aktą);
    - ataskaitą apie Projekto komponentų sutarčių įgyvendinimo neatitikimus (per savaitę po nustatyto neatitikimo);
- kaupia gautą bei pačių pateiktą raštišką informaciją apie Projekto įgyvendinimo sutarčių eigą ir saugo ją 5 metus po paskutinio mokėjimo;
- kaupia ir saugo apskaitos dokumentų originalus 10 metų po Projekto komponentų įgyvendinimo sutarčių galiojimo pabaigos.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

- visuomenės informavimas ir švietimas:
  - Galutinis paramos gavėjas atsakingas už 2004 m. balandžio 1 d. EK reglamente Nr. 621/2004 nustatytų privalomųjų informavimo ir viešumo veiksmų įgyvendinimą, tame tarpe:
    - visuomenės informavimo veiksmų plano parengimą;
    - užtikrina, kad projektų vykdytojai įgyvendintų kontraktuose numatytas informavimo bei viešumo priemones.
- Auditas:
  - užtikrina, kad visa projekto dokumentacija būtų prieinama EK ir Audito rūmams;
  - užtikrina, kad visa turima projekto dokumentacija būtų prieinama APVA, AM ir įgaliojimus turintiems pareigūnams patikrinimo vietoje metu;
  - įgyvendina audito išvadas ir rekomendacijas, susijusias su Galutinio naudos gavėjo veikla.

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

2.1. Projekto aprašymas

Kauno regionas yra centrinėje Lietuvos dalyje, apima dalį buvusios Kauno apskrities savivaldybės teritorijos. Regione yra 6 savivaldybės:

- Jonavos rajono;
- Kaišiadorių rajono;
- Kėdainių rajono;
- Kauno rajono;
- Raseinių rajono;
- Kauno miesto.

2005 m. gegužės 24 d. EK pritarus projektui dėl „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pasirašytas EK sprendimas, o 2010 m. birželio 2 d. jo pakeitimas, kuriame numatytos projekto išlaidos (be PVM):

- Bendra projekto vertė – 25.388.987,00 EUR, iš jų:
- Bendrosios tinkamos išlaidos 18.432.000,00 EUR;
- Parama iš SF 75 % - 13.824.000,00 EUR.

Kiti finansavimo šaltiniai:

- LR Vyriausybė finansuoja 20 % bendrų tinkamų išlaidų – 3.686.400,00 EUR;
- VšĮ Kauno RATC finansuoja 5 % bendrų tinkamų išlaidų – 921.600,00 EUR;
- LR Vyriausybė finansuoja 60 % projekto vertės dalį, viršijančią tinkamas išlaidas – 4.174.192,20 EUR;
- VšĮ Kauno RATC finansuoja 40 % projekto vertės dalį, viršijančią tinkamas išlaidas – 2.782.794,80 EUR.

Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" tikslas – sukurti aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu darnią Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus. Ypač padėti įgyvendinti šių direktyvų reikalavimus:

- Atliekų direktyva Nr. 2006/12/EB;

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

sanglaudos fondas

- Sąvartynų direktyva Nr. 1999/31/EB;
- Pavojingų atliekų direktyva Nr. 91/689/EEB, kurią pakeitė direktyva Nr. 94/31/EB;
- Reglamentas Nr. EEB/259/93 dėl atliekų vežimo EB, į ir iš jos;
- Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva Nr. 2004/12/EB iš dalies keičianti direktyvą Nr. 94/62/EB;
- Direktyva Nr. 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;
- Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra tam tikrų pavojingų medžiagų, direktyva Nr. 91/157/EEB;
- Nuotekų dumblo direktyva Nr. 86/278/EEB, skirta apsaugoti aplinką, o ypač dirvožemį, kai nuotekų dumblas naudojamas žemės ūkyje;
- Direktyva Nr. 2000/53/EB dėl netinkamų naudoti automobilių.

Projekto "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" **rezultatai**:

- Įrengtos reikalavimus atitinkančios sąvartynų Lapėse ir Zabieliškyje sekcijos su filtrato surinkimo ir valymo įrenginiais ir, uždarius bei sutvarkius 58 veikiančius sąvartynus ir šiukšlynus, sumažinta požeminio ir paviršinio vandens tarša;
- Uždaryta Lapių sąvartyno I sekcija;
- Viešosios atliekų surinkimo paslaugos 2011 m. teikiamos 610,363 tūkst. regione gyvenančių žmonių ir pagerintas vidutinis surinkimo procentas iki 99 %. Remiantis Statistikos departamento duomenimis (pagal Statistikos departamento ataskaitą „Gyventojų skaičius, natūrali kaita apskrityse ir savivaldybėse", žr. Priedas Nr. 2.5.1), 2011 m. pradžioje Kauno regione (Jonavos, Kaišiadorių , Kėdainių, Kauno, Raseinių rajonuose ir Kauno mieste) gyveno 610,363 tūkst. gyventojų, t.y. 47,137 tūkst. gyventojų mažiau, nei planuota rengiant EK sprendimą (657,5 tūkst. gyventojų). Dėl nenumatytų aplinkybių: pablogėjusios ekonominės situacijos šalyje ir dėl to išaugusios emigracijos, po projekto įgyvendinimo viešosios atliekų surinkimo paslaugos papildomai teikiamos 72,405 tūkst. gyventojų, o planuota buvo 121,877 tūkst. žmonių. Kauno RATC imasi visų priemonių, kad atliekų surinkimo paslaugos būtų teikiamos kuo didesniam skaičiui regiono gyventojų. Šiuo metu surinkimas procentas siekia net 99 %.
- Taikomi tarifai, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir regione įtvirtintas „teršėjas moka" principas;
- Pastačius 6 APA (6-ta aikštelė baigta statyti 2010 m. gruodžio mėn.), padidintas komunalinių atliekų atskyrimas. Pastatytose šešiose APA per 2009-2010 m. surinkta 2.069 t atliekų. :
- Įrengus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, sumažintas į sąvartynų patenkančių biodegraduojančių atliekų kiekis;
- Užtikrinta, kad biologiškai skaidžios, statybos ir griovimo atliekos bei pavojingos atliekos nepatektų į sąvartyną. Šios atliekos, pagal išduotus TIPK leidimus (žr. lentelė 23), Lapių ir Zabieliškio regioniniuose sąvartynuose nešalinamos;
- Sumažintas reikalavimų neatitinkančių sąvartynų skaičius regione nuo 59 iki 2 ES reikalavimus atitinkančių regioninių sąvartynų iki 2010 m.;
- Užtikrinta, kad Kauno RATC generuos pakankamas pajamas padengti eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudas;
- Atliekos tvarkomos remiantis geriausiomis techninėmis žiniomis ir atitinka Sąvartynų direktyvos Nr. 1999/31/EB reikalavimus.

KONTROLĖS, SUDERINAMUMO IR VIDAUS AUDITO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Helena Čepėlienė

2011 -06- 23



2.2. Projekto valdymo ypatumai

2004 m. gruodžio 2 d. šešios Kauno regiono savivaldybės (Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Raseinių rajonų) ir UAB „Kauno švara" pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo kurti ir plėtoti bendrą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemą.

2005 m. sausio 6 d. pasirašyta Kauno RATC steigimo sutartis. Bendrovės steigėjos šešios Kauno apskrities savivaldybės (Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Raseinių rajonų) ir UAB „Kauno švara". Kauno RATC valdybą sudaro šešių Kauno regiono savivaldybių ir UAB „Kauno švara" atstovai.

2005 m. kovo 2 d. bendrovė įregistruota juridinių asmenų registre, patvirtinti bendrovės įstatai. Įstaigos tikslai:

- Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus eksploatavimo užtikrinimas;
- Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, LR biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis naudos gavimas;
- Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorius parinkimas;
- Paramos savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

Projektui pasibaigus, gavėjo šalis užtikrina, kad visi viešieji (centrinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, įskaitant audituojančias įmones) ir privatūs subjektai, dalyvaujantys valdant projektą, turėtų priėjimą prie projekto apskaitos ir kitų su projekto išlaidomis susijusių dokumentų, kuriuos atsakingosios institucijos privalo saugoti penkerius metus nuo paskutinio su projektu susijusio mokėjimo.

Po projekto užbaigimo, naujai pastatyti ir įrengti objektai nuosavybės teise ir toliau priklausys Kauno RATC, o jų veikla bus valdoma sekančiai:

– Lapių ir Žabieliškio regioninių sąvartynų bei Raseinių, Jonavos ir Kaišiadorių APA su perkrovimo stotimis eksploataciją vykdys parinkti operatoriai, veiklą koordinuos Kauno RATC;

– Kauno (Nemajūnų ir Raudondvario APA) ir Kėdainių APA eksploatacija vykdys Kauno RATC;

– uždarytų sąvartynų žemės sklypai panaudos pagrindais perduoti Kauno RATC ir po projekto pabaigos šių sąvartynų priežiūrą bei monitoringą vykdys Kauno RATC.

2.3. Viešieji pirkimai

Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimo metu vykdant viešuosius pirkimus buvo laikomasi Tarybos direktyvos Nr. 92/50/EB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo, Tarybos direktyvos Nr. 93/96/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo, Tarybos direktyvos Nr. 93/37/EB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo ir Tarybos direktyvos Nr. 93/38/EEB dėl įmonių, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, viešojo

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

pirkimo tvarkos koordinavimo reikalavimų ir, nuo jų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus įsigaliojimo dienos, direktyvos Nr. 2004/18/EB dėl viešojo darbų, tiekimo ir paslaugų pirkimo sutarčių tvarkos koordinavimo ir direktyvos Nr. 2004/17/EK dėl įmonių, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, viešojo pirkimo tvarkos koordinavimo reikalavimų.

Viešųjų pirkimų dokumentuose sutarčių sąlygos darbams buvo parengtos pagal FIDIC tipinių sutarčių sąlygas. Detalesnė informacija apie viešuosius pirkimus pateikiama žemiau.

2.3.1. Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, sutarties Nr.2006/8/IPK/PT/LT

Lentelė 1. Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui .

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-02-06
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Kvietimas dalyvauti konkurse dėl biuro baldų pirkimo taikant įprastą komercinę praktiką buvo išsiųstas faksu 2006-02-08 trims dalyviams. Pasiūlymo pateikimo terminas iki 2006-02-21. Pasiūlymus pateikė trys konkurso dalyviai. Skundų ir pretenzijų nebuvo gauta. Biuro baldų tiekimo sutartis pasirašyta 2006 m. balandžio 3 d.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Narbutas ir Ko"
Sutarties sudarymo data:	2006-04-03
Paslaugų kaina arba kainoraščio taisyklės:	2.944,83 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai:	
Pradžia:	2006-04-03
Pabaiga:	2006-05-03
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Biuro baldų tiekimas

Pagal sutartį „Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui" pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 2.944,84 EUR (be PVM) iš kurių:

- SF dalis: 2.208,63 EUR,
- LR biudžeto dalis: 736,21 EUR,

Permokėta dalis: 0,01 EUR (be PVM), iš kurių:

- SF dalis: 0,01 EUR,
- LR biudžeto dalis: 0,00 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

2.3.2. Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, sutarties Nr.06-18

Lentelė 2. Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui.

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje	2006-02-06

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

institucijoje data:	
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Kvietimas dalyvauti konkurse dėl biuro organizacinės technikos pirkimo, taikant įprastą komercinę praktiką, buvo išsiųstas faksu 2006-02-08 keturiems dalyviams. Pasiūlymų pateikimo terminas 2006-02-21. Pasiūlymus pateikė trys dalyviai. Tačiau pirkimo procedūros buvo nutrauktos 2006 m. kovo 31 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-50. Mažos vertės pirkimas vykdytas apklausos būdu, apklausa paskelbta 2006-04-28, pasiūlymų pateikimo terminas 2006-05-08. Gauti keturi pasiūlymai Pasiūlymus pateikė įmonės „BMS“, „Ofitecha“, „Sekolda“, „SONEX“. Pretenzijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo pateikta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sekolda“
Sutarties sudarymo data:	2006-06-15
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	5.708,99 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai:	
Pradžia:	2006-06-15
Pabaiga:	2006-07-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Organizacinės technikos tiekimas

Pagal sutartį „Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui“ pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 5.708,99 EUR (be PVM)iš kurių:

- SF dalis: 4.281,74 EUR,
- LR biudžeto dalis: 1.427,25 EUR,

Likusi **nepanaudota** dalis (EUR be PVM):

- SF dalis: 0,00 EUR,
- LR biudžeto dalis: 0,00 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir tiekėjui apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

LR finansų ministerija 2009 m. vasario 27 d. raštu Nr.((18.52.1-01)-SK-0902933)-6K-0902165 ir APVA 2009 m. balandžio 3 d. raštu NR.-1592 informavo, apie pagal pasirašytą sutartį „Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui“, pripažino netinkamomis išlaidomis už 4.206,73 EUR (14.525,00 Lt), iš kurių 3.155,05 EUR iš SF ir 1.051,68 EUR iš LR biudžeto. 2009 m. lapkričio 30 d. šios lėšos buvo grąžintos į Valstybės iždo sąskaitą.

2.3.3. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: naujų triukšmą izoliuojančių langų įstigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams. Sutarties Nr. A/2006/K/14

Lentelė 3. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams.

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-07-04
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2006-07-12.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čepiėnė

sanglaudos fondas

	Viešojo pirkimo būdas – supaprastintas konkursas. Vokų atplėšimo posėdis vyko įvyko 2006-07-27.Gauti trys pasiūlymai. Skundų ir pretenzijų nebuvo gauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Via Regia“
Sutarties sudarymo data:	2006-08-24
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	32.459,45 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai:	
Pradžia:	2006-08-24
Pabaiga:	2006-11-03
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Langų tiekimas ir įstatymas Lapių gyvenvietės Barsūniškio gatvės gyventojams

Pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams“ pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 32.459,45 EUR (be PVM)iš kurių:

- SF dalis: 24.344,59 EUR,
- LR biudžeto dalis: 8.114,86 EUR,

Likusi **nepanaudota** dalis 0,00 (EUR be PVM):

- SF dalis: 0,00 EUR,
- LR biudžeto dalis: 0,00 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 100 proc. numatytų lėšų.

2.3.4. Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos, sutarties Nr.966-07

Lentelė 4. Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos.

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-10-23
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą neskelbtas. Viešojo pirkimo būdas – neskelbiamos supaprastintos derybos su perkeliamos 110 KV ETL savininku AB „Lietuvos energija. Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-05 gautas vienas pasiūlymas.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AB "Lietuvos energija"
Sutarties sudarymo data:	2007-12-27
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	1.223.405,03 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai*:	
Pradžia:	2007-12-17
Pabaiga:	2008-09-30*
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Lapių regioninio sąvartyno teritorijoje esančios 110 KV įtampos oro linijos Kaunas-Jonava atkarpos nuo atramos Nr. 28 iki atramos Nr. 31 pakeitimas į kabelių liniją

* Pagal sutartį Nr. 966-07, darbų teikimo terminas iki 2008m. rugpjūčio mėn.31d. 2008 m. rugpjūčio 29 d. buvo pasirašytas sutarties pakeitimas Nr.1, kuriuo darbų atlikimo terminas nukeltas iki 2008 m. rugsėjo 30 d. , Faktiškai statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas pasirašytas 2008-10-2

TIKRA
Skenuota versija
Aldona Čepėlienė

Pagal sutartį „Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos sutartis" pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 1.222.325,09 EUR (be PVM) iš kurių:

- SF dalis: 916.743,82 EUR,
- LR biudžeto dalis: 305.581,27 EUR,

Likusi **nepanaudota** dalis 1.079,94 EUR (be PVM), iš kurių:

- SF dalis: 809,95 EUR,
- LR biudžeto dalis: 269,99 EUR.

Viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 99,9 proc. numatytų lėšų. Paslaugos teikėjo konkurso būdu pasirinktas rangovas atliko darbus už mažesnę kainą nei buvo numatyta paslaugos teikimo sutartyje.

2.3.5. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: 10 KV ETT orinės linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrenginas, sutarties Nr.2008/37/ND/P/LT (IŠK-07-02-0055)

Lentelė 5. 10 KV ETT orinės linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrenginas.

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2008-08-05
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą neskelbtas. Viešojo pirkimo būdas – neskelbiamos supaprastintos derybos su perkeliamos 10 KV ETL savininku AB „VST". Vokų atplėšimas įvyko 2008-09-25. Buvo pateiktas vienas pasiūlymas.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AB "VST"
Sutarties sudarymo data:	2008-10-20
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	26.857,18 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai*:	
Pradžia:	2008-10-30
Pabaiga:	2009-02-03
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	10 KV įtampos oro linijos Lapių regioniniame savartyne pakeitimas požemine kabelių linija.

*Sutartyje numatytas paslaugos suteikimas 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo rangovo, Paslaugos darbams atlikti, perėmimo ir su juo sutarties sudarymo dienos. Faktiškai statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas pasirašytas 2009-02-03

Pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: 10 KV ETT orinės linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrenginas" pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 25.808,18 EUR (be PVM) iš kurių:

- SF dalis: 19.356,13 EUR,
- LR biudžeto dalis: 6.452,05 EUR,

Likusi **nepanaudota** dalis 1.049,00 EUR (be PVM), iš kurių:

- SF dalis: 786,75 EUR,
- LR biudžeto dalis: 262,25 EUR.

Iš viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 96,1 proc. numatytų lėšų. Paslaugos teikėjo konkurso būdu pasirinktas rangovas atliko darbus už mažesnę kainą nei buvo numatyta paslaugos teikimo sutartyje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

2.3.6. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui , sutarties Nr. 2006/96/A/K/LT

Lentelė 6. Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui .

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2005-07-01
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2005-07-04. Viešojo pirkimo būdas – atviras konkursas Gauti dviejų tiekėjų pasiūlymai. Kadangi pateikti pasiūlymai neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, pirkimas buvo nutrauktas ir 2005-09-15 paskelbtas pakartotinai, bet dėl teisminių procesų nutrauktas.2006-08-23d. Viešojo pirkimo būdas – atviras konkursas. 2006-10-16 įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis, gauti penki pasiūlymai. Gautos pretenzijos po 2005-07-04 skelbimo paskelbimo: 1.UAB „Ernst & Young Baltic" 2005-09-13 raštu dėl pasiūlymo atmetimo. Pretenzija, kaip nepagrįsta, atmesta 2005-09-15d. raštu Nr. APVA-1961. 2. Pagal UAB „Ernst & Young Baltic" pateiktų ieškinį dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų, Vilniaus apygardos teismas 2005-09-23 nutarimu priėmė sprendimą taikyti laikiną apsaugos priemonę sustabdyti paskelbtą konkursą. 3.Vilniaus apygardos teismas 2005-12-06 sprendimu atmetė ieškovo UAB „Ernst & Young Baltic" ieškinį ir panaikino taikyti laikiną apsaugos priemonę - sustabdyti paskelbtą konkursą 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2006-04-19 nutartimi atmetė UAB „Ernst & Young Baltic" apeliacinį skundą. Gauta pretenzija po 2006-08-23 skelbimo paskelbimo: Kauno technologijos universitetas 2006-12-11 raštu dėl pasiūlymo atmetimo. Pretenzija, kaip nepagrįsta, atmesta 2006-12-12 raštu Nr. APVA-4399.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Cowi Baltic"
Sutarties sudarymo data:	2006-12-22
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	207.324,49 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai*:	
Pradžia:	2006-12-22
Pabaiga:	2009-06-22
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Dokumentų reikalingų Kauno RATC veiklai, parengimas; kasdieninės pagalbos teikimas; pirkimo dokumentų rengimas ir pagalba viešųjų pirkimų procedūrų vykdyme; mokymų vykdymas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Česnikienė
2011 -06- 23



*Pagal sutartį Nr. 2006/96/A/K/LT, paslaugų teikimo terminas iki 2008m. gruodžio 22 d., tačiau 2008 m. gruodžio 19 d. buvo pasirašytas sutarties pakeitimas Nr. 2, kuriuo paslaugų atlikimo terminas atidėtas iki 2009 m. birželio 22 d.

Pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui " pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 178.363,27 EUR (be PVM) iš kurių:

- SF dalis: 133.772,44 EUR,
- LR biudžeto dalis: 44.590,83 EUR,

Likusi **nepanaudota** dalis 28.961,22 EUR (be PVM), iš kurių:

- SF dalis: 21.720,93 EUR,
- LR biudžeto dalis: 7.240,29 EUR.

Iš viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 86 proc. numatytų lėšų. Neapmokėtų lėšų dalį sudaro nepanaudotos lėšos, skirtos pagalbai kasdieninėje Kauno RATC veikloje, nes nebuvo šios pagalbos poreikio.

2.3.7. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabiliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba, sutarties Nr. A/2007/Z/32

Lentelė 7. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabiliškio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-04-04
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Viešojo pirkimo būdas – atviras konkursas. Perkami statybos darbai pagal statytojo parengtą techninį projektą. Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-04 gauti keturi pasiūlymai. Pateiktos pretenzijos: 1.UAB „Merko statyba" 2007-08-14 raštu Nr.CO07-0086 dėl preliminarios pasiūlymų eilės. Pretenzija, kaip nepagrįsta, atmesta 2007-08-17 raštu Nr. APVA-3396. 2.UAB „Laugina" 2007-08-14 rašta S-27 dėl nustatytos preliminarios pasiūlymų eilės bei leidimo pateikti papildomus dokumentus. Pretenzija, kaip nepagrįsta, atmesta 2007-08-17 raštu Nr.APVA-3397. 3.UAB „Statovita" 2007-08-20 raštu dėl nustatytos preliminarios pasiūlymų eilės ir UAB „Statovita" pasiūlymo vertinimo. Pretenzija, kaip nepagrįsta, atmesta 2007-08-22 raštu Nr. APVA-3474. 4.UAB „Laugina" ir UAB „Statovita" kaip jungtinės veiklos partneriai 2007-08-20 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo neteisėtu bei jo panaikinimo. Vilniaus apygardos teismas 2007-08-27 nutartimi įpareigojo taikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdyti pirkimo procedūras, kurias panaikino 2007-10-23 nutartimi. Tuo pagrindu pirkimo

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čepliejienė

sanglaudos fondas

	procedūra atnaujinta, apie ką tiekėjai informuoti 2007-11-07 raštu Nr.APVA-4773 5.UAB „Laugina"2007-11-09 raštu Nr.S-402 dėl patvirtintos naujos preliminarios pasiūlymų eilės. Pretenzija, kaip pakartotina tuo pačiu klausimu, atmesta 2007-11-13 raštu Nr. APVA-4986.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Kamesta"
Sutarties sudarymo data:	2007-11-13
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	4.276.440,33 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai*:	
Pradžia:	2007-11-13
Pabaiga:	2009-06-26
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Pagrindiniai šio viešojo pirkimo darbai yra šie: -įrengti buitinių atliekų sąvartyno 1-ąją sekciją, -esamos 2-os sekcijos sutvarkymas ir dalinis uždengimas; - esamo administracinio pastato remontas, - įrengti aptarnaujančio transporto stoginę; - įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo 0,387 ha ploto aikštelę; - įrengti statybos ir griovimo atliekų 0,2065 ha ploto aikštelę; - įrengti filtrato kaupimo rezervuarą, -automobilių svarstyklių remontas, - įrengti automobilių ratų dezinfekavimo duobę, - įrengti priešgaisrinius rezervuarus, - įrengti elektros transformatorinę paslotę, - filtrato surinkimo siurblines-esamos rekonstrukcija ir naujos įrengimas, - įrengti drenažinio vandens siurblinę, - įrengti gruntinio vandens pažeminimo sistemą; - įrengti purvo ir naftos skirtuvą, - įrengti inžinerinius tinklus, - įrengti sąvartyno vidinius kelius, - įrengti sąvartyno apšvietimą, aptvėrimą ir apželdinimą, - įrengti privažiavimo kelią, - įrengti monitoringo sistemą. Kiti, į šios Sutarties darbų apimtis įtraukti, darbai: - Darbo projekto paruošimas, - Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atsitiesiamieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui, - Priemonių bei procedūrų, reikalingų saugiai eksploatacijai, saugiam darbui ir saugiam žmonių įleidimui į pastatus, įgyvendinimas.

Priedas. „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra" Nr. 2006/... Projektų rinkinys
GALUTINĖ ATASKAITA

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čeplėjienė

sanglaudos fondas

*Pagal sutartį Nr. A/2007/Z/32, darbų teikimo terminas iki 2009 m. gegužės13d. šalių sutikimu darbų baigimo laiką pratęsus iki 2009 m. birželio 26 d., gautas rangovo patvirtinimas, kad visi darbai baigti laiku, tačiau vykstant teisminiam procesui statinys negalėjo būti pripažintas tinkamu naudoti. Gauta 2009 m. liepos 9 d. darbų priėmimo pažyma, kurioje pažymima, kad statybos darbai baigti 2009 m. birželio 25 d.. Išsisprendus gyventojo išėjimo klausimui, 2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo sukviesta statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija, tačiau aktas nebuvo pasirašytas, nes nebuvo baigti papildomi ir sutartyje nenumatyti darbai, kurių neatlikus statinys negalėjo būti pripažintas tinkamu naudoti. Šie aktai išduoti 2009 m. lapkričio 20 d. ir 2009 m. gruodžio 14 d.

Pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 4.097.775,64 EUR (be PVM) iš kurių:

- SF dalis: 3.073.331,74 EUR,
- LR biudžeto dalis: 1.024.443,90 EUR,

Likusi **nepanaudota** dalis 178.664,69 EUR (be PVM), iš kurių:

- SF dalis: 133.998,51 EUR,
- LR biudžeto dalis: 44.666,18 EUR.

Atlikta 100% darbų, apmokėta 95,8% sutarties vertės. Neapmokėta dalį sudaro dalis užsakovo rezervui (nenumatytiems darbams) skirtų lėšų dalis.

2.3.8. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra, sutarties Nr. A/2007/K/24

Lentelė 8. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-09-06
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2009-06-15. Viešojo pirkimo būdas – atviras konkursas, perkamos paslaugos. Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2006-11-07 gauti šeši pasiūlymai. Pretenzijų nebuvo pateikta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „SWECO BKG"
Sutarties sudarymo data:	2007-03-29
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	362.169,83 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai:	
Pradžia:	2007-11-13
Pabaiga:	2011-11-13
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūrą ir ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą, vykdant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto statybos darbus. Vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" statybos darbus pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos (1999 m., pirmas leidimas, „Raudonoji Knyga"). Sutarties valdymas, projektų peržiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas;

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

	Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta LR Statybos įstatyme Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir LR statybos techniniuose reglamentuose: STR. 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra", STR. 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra", STR. 1.02.06:2005 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje, taisyklės")
	Teikti finansines ataskaitas Užsakovo bei Perkančiosios organizacijos finansininkams.
	Teikti techninės ataskaitas Užsakovui, AM ir Perkančiajai organizacijai.

Pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 349.246,11 EUR (be PVM) iš kurių:

- SF dalis: 261.934,59 EUR,
- LR biudžeto dalis 87.311,52 EUR.

Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 5.744,76 EUR, jos yra užskaitomos iš EK sprendimą viršijančios (Užsakovo) dalies.

Likusi **nepanaudota** dalis 12,923,72 EUR (be PVM), iš kurių:

- SF dalis: 9.692,78 EUR,
- LR biudžeto dalis: 3.230,94 EUR.

Iš viso apmokėjimui pateikta ir apmokėta 96,43 proc. numatytų lėšų.

Pastabos:

1) Septynis sąvartynus uždarė pačios savivaldybės, todėl nereikėjo uždarinėti sekančių sąvartynų: Butkūnų, Ilgakiemio, Besmerčių, Ežerėlio, Poškaičių, Rinkšelių ir Mikalaučiškių. Šių darbų techninės priežiūros vertė 44.623 Lt (12.923,71 EUR), kuria buvo sumažinta bendra aktuojama suma.

2) Atsižvelgiant į tai, kad techninės priežiūros paslaugų sutartis baigiasi 2011 m. lapkričio 13 d., o projekto išlaidų tinkamumo laikotarpis baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., paslaugų tiekėjui buvo sumokėti visi pinigai pagal papildomai pateiktą banko garantiją galiojančią iki 2011 m. gruodžio 31 d., kurios vertė lygi nesuteiktų paslaugų apimčiai. Aplinkos projektų valdymo agentūra su LR aplinkos ministerija suderino metodines rekomendacijas dėl projektų baigtumo vertinimo, kuriose viena iš sąlygų ir yra: „Jeigu yra akivaizdu, kad iki šino metu nustatyto Projektų išlaidų tinkamumo termino pabaigos nebūtų visiškai užbaigtos visos techninės priežiūros sutartys, galima pasiūlyti paslaugos tiekėjui: pateikti banko garantiją/draudimo laidavimą galiojantį iki 2011 m. gruodžio 31 d., kurio vertė lygi nesuteiktų paslaugų apimčiai, kad būtų galima išmokėti visas pagal paslaugų sutartį numatytas lėšas į paslaugų tiekėjo sąskaitą". Visi projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" objektai yra pilnai pastatyti, šiuo metu vyksta objektų defektinis laikotarpis.

TIKRA
Skyriaus vedėja 2011-06-23
Aldona Čeplėjienė



Tačiau LR finansų ministerija 2010 m. gegužės 18 d. raštu Nr.((18.52.1-01)-5K-1105561 atkreipė dėmesį, kad 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 189), 5 straipsnyje numatyta, kad „išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, <...>". Taip pat 2008 m. gegužės 23 d. Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000–2006 m. uždarymo gairių Nr. COCOF 08/0022/02-EN 3.2.4 punkte nurodyta, kad jeigu dėl įgyvendinimo vėlavimo ar dėl nacionalinių teisės aktų reikalavimų „atsakomybės už defektus" laikotarpis baigiasi vėliau nei galutinė išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga, išlaidas, padarytas po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos, finansuoja nacionalinės valdžios institucijos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, informavo, kad minėtos pagal papildomai pateiktą banko garantiją išmokėtos lėšos yra netinkamos finansuoti iš projektui skirtų Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, ir prašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skubos tvarka atlikti pažeidimo tyrimą. Atlikus pažeidimų tyrimą, nustatyta, kad dalis lėšų, paslaugų tiekėjui išmokėtų pagal pateiktą garantiją ir kurių vertė lygi nesuteiktų paslaugų apimčiai, negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Nustatyta netinkamų finansuoti bei grąžintinų lėšų suma – 5.744,76 EUR. Lėšų susigrąžinimo procedūra nebuvo inicijuojama, nes jos buvo užskaitytos EK Sprendimą viršijančių lėšų dalimi.

2.3.9. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas, sutarties Nr. A/2007/K/40

Lentelė 9. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas.

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2008-05-28
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2008-06-27. Viešojo pirkimo būdas – atviras konkursas, perkami statybos darbiai, pagal statytojo parengtą techninį projektą. Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2008-08-12 gauti šeši pasiūlymai. Pateikta pretenzija: UAB „Požeminiai darbai" 2008-09-05 raštu Nr.03-06-131 dėl konkurso dalyvio UAB „Luidas" ir UAB „Kauno keliai" atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams (neįprastai maža kaina). Pretenzija, kaip pateikta vėliau negu numato įstatymas, atmesta 2008-09-10d. raštu Nr. APVA-3573.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Luidas" su UAB „Kauno keliai" (jungtinės veiklos pagrindu)
Sutarties sudarymo data:	2008-09-18
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	5.620.344,42 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai*:	
Pradžia:	2008-10-15
Pabaiga:	2010-06-15
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	38 savartynų uždarymas Kauno regione.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

	Kiti į šios sutarties apimtį įtraukti darbai -Darbo projekto paruošimas, - Visų pastatytų ir statinių aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atstatomieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas -Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui gyvendinimas.

* Pagal sutartį Nr. A/2007/K/40, darbų teikimo terminas iki 2010 m. sausio mėn. 15 d., darbų teikimo terminas buvo pratęstas iki 2010 m. birželio 15 d.

Pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 5.526.698,16 EUR (be PVM) iš kurių:

- SF dalis: 4.145.023,64 EUR,
- LR biudžeto dalis: 1.381.674,52 EUR,

Likosi **nepanaudota** dalis 93.646,26 EUR (be PVM), iš kurių:

- SF dalis: 70.234,68 EUR,
- LR biudžeto dalis: 23.411,58 EUR.

Atlikta 100 % darbų, apmokėta 98,33 % sutarties vertės. Nesmokėtą dalį sudaro dalis užsakovo rezervui (nenumatytiems darbams) skirtų lėšų.

2.3.10. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba, sutarties Nr. A/2007/K/37

Lentelė 10. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba.

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-08-16
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2007-08-29. Viešojo pirkimo būdas – atvirs konkursas, perkami statybos darbai, pagal statytojo parengtą techninį projektą. Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-10-15 gauti trys pasiūlymai. Pateiktos pretenzijos: 1.UAB „Požeminiai darbai" 2007-11-14 raštu Nr.01-15-300 dėl dalyvio UAB „Sienojus„ ir UAB „Laugina" pasiūlymo vertinimo. Pretenzija, kaip nepagrįsta, atmesta 2007-11-22 raštu Nr. APVA-5103. 2.UAB „Skirmuva" 2007-11-23 raštu Nr.1211 dėl konkurso dalyvio UAB „Sienojus" ir UAB „Laugina" atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Pretenzija, kaip nepagrįsta, atmesta 2007-11-23 raštu Nr. APVA-5160. 3.UAB „Skirmuva" 2007-12-03 raštu Nr.1228 dėl konkurso dalyvio UAB „Sienojus" ir UAB „Laugina" atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Pretenzija, kaip nepagrįsta, atmesta 2007-12-14 raštu Nr. APVA-

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čapiūjienė

sanglaudos fondas

	5623.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sienojus" ir UAB Łauginu" (jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
Sutarties sudarymo data:	2007-12-27
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	10.208.090,75 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai*:	
Pradžia:	2007-12-27
Pabaiga:	2009-12-31
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Pagrindiniai šio viešojo pirkimo darbai yra šie: -įrengti buitinių atliekų sąvartyno 2-ąjį kaupimo lauką apie 8,8 ha, -esamo 1-o kaupimo lauko uždarymas (rekultivavimas); -esamo 3-io kaupimo lauko dalies sekcijos statybos užbaigimas; -administracinio pastato statyba; -buitinio pastato statyba; -esamos aptarnaujančio transporto stoginės perkėlimas; -automobilių svarstyklių rekonstrukciją, -automobilių ratų plovyklos statyba, -priešgaisrinių rezervuarų statyba, -gruntinio vandens pažeminimo sistemos įrengimas; -naftos gaudyklių statyba, -inžinerinių tinklų statyba (elektros tinklai, video stebėjimas, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai) , -sąvartyno vidinių kelių ir aikštelių statyba, -sąvartyno apšvietimas, aptvėrimas ir apželdinimas, -monitoringo projekto parengimas, derinimas ir sistemos įrengimas; - artezinio gręžinio įrengimas, Kiti, į šios Sutarties darbų apimtis įtraukti, darbai: -Darbo projekto paruošimas ir konstrukcinės dalies ekspertizė, - Esamų statinių demontavimas, Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atstatomieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui, - Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas.

* Pagal sutartį Nr. A/2007/K/37, darbų teikimo terminas iki 2009 m. lapkričio 10 d., tačiau darbų terminas buvo pratęstas iki 2009 m. gruodžio 31 d.

2008 m. birželio 26 d. pasirašytas sutarties pakeitimas Nr.1, kuriuo pakoreguotas Sutarties kainos sudėtinių dalių išskirstymas EK sprendimo biudžetą neviršijančioje ir viršijančioje dalyse.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapiėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

2009 m. gruodžio 7 d. pasirašytas sutarties pakeitimas Nr.2, kuriuo papildomai pakoreguotas Sutarties kainos sudėtinių dalių išskirstymas EK sprendimo biudžetą neviršijančioje ir viršijančioje dalyse:

- Sutarties kaina 10.208.090,75 EUR (be PVM);
- EK sprendimą neviršijanti dalis 5.357.684,78 (be PVM), kurioje:
  - SF dalis: 4.018.263,58 EUR,
  - LR biudžeto dalis: 469.977,69 EUR,
  - Paskola/Nuosavos lėšos: 869.443,50.
- EK sprendimą viršijanti dalis 4850405,97 EUR (be PVM), kurioje:
  - LR biudžeto dalis: 2910243,58 EUR,
  - Paskola/Nuosavos lėšos: 434273,61 EUR.

Pagal sutarties „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" 2009 m. gruodžio 7 d. pakeitimą Nr.2 pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 9.686.733,56 EUR (be PVM) iš kurių:

- **EK sprendimą neviršijanti dalis**:
- SF dalis: 4.280.207,93 EUR,
- LR biudžeto dalis: 558.717,04 EUR,
- Paskola/Nuosavos lėšos: 868.018,97 EUR.
- **EK sprendimą viršijanti dalis**:
- LR biudžeto dalis: 2.387.873,77 EUR,
- Paskola/Nuosavos lėšos: 1.591.915,85 EUR,

Likusi **nepanaudota** dalis 521.357,19 EUR (be PVM), iš kurių:

- **EK sprendimą neviršijanti dalis**:
- SF dalis: 4.273,60 EUR,
- LR biudžeto dalis: 0,00 EUR,
- Paskola/Nuosavos lėšos: 1.424,53 EUR.
- **EK sprendimą viršijanti dalis:**
- LR biudžeto dalis: 309.395,44 EUR,
- Paskola/Nuosavos lėšos: 206.263,62 EUR.
-

Atlikta 100 % darbų, apmokėta 94,89 % sutarties vertės. Neapmokėtą dalį sudaro dalis užsakovo rezervui (nenumatytiems darbams) skirtų lėšų ir Rangovo sumokėta kompensacija dėl darbų vėlavimo.

2.3.11. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba, sutarties Nr. A/2007/K/38

Lentelė 11. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba.

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje datą:	2007-10-04
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2007-10-12. Viešojo pirkimo būdas – atviras konkursas, perkami statybos darbiai, pagal statytojo parengtą techninį projektą. Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-26 gauti trys pasiūlymai. Rangos sutartis pasirašyta 2007-12-27 Pretenzijų nebuvo pateikta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Raseinių melioracija" ir UAB „Laugina"

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čeplėjienė

	veikiantys jungtinės veiklos pagrindu
Sutarties sudarymo data:	2007-12-27
Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	3.321.874,69 EUR (be PVM)
Darbų teikimo terminai*:	
Pradžia:	2007-12-27
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Pagrindiniai šio viešojo pirkimo darbai yra šie: Šešių Atliekų priėmimo aikštelių (trys iš jų su atliekų perkrovimo stotimis) Kaune, Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Jonavoje, Raseiniuose statyba.

* Pagal sutartį Nr. A/2007/K/38, darbų teikimo terminas iki 2008 m. lapkričio 7 d., tačiau darbų terminas buvo pratęstas iki 2010 m. gruodžio 30 d.

Pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba" pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 3.172.106,72 EUR (be PVM) iš kurių:

- **EK sprendimą neviršijanti dalis**:
- SF dalis: 780.847,50 EUR,
- LR biudžeto dalis: 208.226,- EUR,
- Paskola/Nuosavos lėšos: 52.056,49 EUR.
- **EK sprendimą viršijanti dalis:**
- LR biudžeto dalis: 1.296.219,73 EUR,
- Paskola/Nuosavos lėšos: 834.757,- EUR.

Likusi **nepanaudota** dalis 149.767,97 EUR (be PVM), iš kurių:

- **EK sprendimą neviršijanti dalis**:
- SF dalis: 0,00 EUR,
- LR biudžeto dalis: 0,00 EUR,
- Paskola/Nuosavos lėšos: 0,01 EUR.
- **EK sprendimą viršijanti dalis:**
- LR biudžeto dalis: 72.227,09 EUR,
- Paskola/Nuosavos lėšos: 77.540,87 EUR,

Atlikta 100% darbų, apmokėta 95,49 % sutarties vertės. Neapmokėtą dalį sudaro dalis užsakovo rezervui (nenumatytiems darbams) skirtų lėšų ir sulaikyti pinigai nuo paskutinės APA statybos darbų (10 % ~ 29.389,49 EUR).

2.3.12. Šeimos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos

Lentelė 12. Šeimos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos.

Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	netaikoma
Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Vykdytos tiesioginės derybos su pil. Daiva Danauskiene ir pil. Virginijumi Danauskiu dėl iškėlimo iš sanitarinės apsaugos zonos
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	netaikoma
Sutarties sudarymo data:	2009-08-06 pasirašyta sutartis, o 2010-10-06 pasirašytas notariškai patvirtintas susitarimas, pagal kurį D. Danauskienė sutinka išsikelti iki 2010-11-07 iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės zonos.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čepėjienė

Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	101.367,01 EUR
Darbų teikimo terminai:	
Pradžia:	netikslina
Pabaiga:	Netaikoma
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Pirkimo (sutarties sudarymo tikslas) iškelti gyventoją iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės zonos. 2008 m. šalys atliko nepriklausomus turto vertinimus ir vedė derybas dėl kompensacijų už gyventojo iškėlimą. Sutarimo nepasiekus, 2009 m. klausimas buvo nagrinėjamas teismo keliu, tačiau teismas atsisakė nagrinėti pateikų ieškinį (2009-06-29 gauta Apeliacinio teismo nutartis). Pakartotinai atlikus turto vertinimą ir pravedus derybas su gyventoju, sutartis dėl jo iškėlimo iš sąvartyno sanitarinės zonos buvo pasirašyta 2009-08-06 bei 2010-10-06 pasirašytas papildomas susitarimas, užtikrinantis projekto finansavimo reikalavimams. Pateikta Kėdainių raj. savivaldybės administracijos Pelėdnagių seniūnijos 2010-11-18 d. pažyma Nr.17-1311, patvirtinanti, kad gyvenamojo namo savininkės D. Danauskienės šeima pakeitė deklaruotą gyvenamąją vietą (priedas Nr.2.4.2)

Pagal sutartį pateikti mokėjimo prašymai apmokėti 101.367,01 EUR (be PVM) iš kurių:

- SF dalis: 76.025,26 EUR,
- LR biudžeto dalis: 25.341,75EUR.

Apmokėta visa suma.

EK 2005 m. gegužės 24 d. sprendime pagrindinių priežiūros rodiklių sąraše buvo numatytas technikos 12 vnt. įsigijimas. Tai 3 sutankintojai plieno ratais, 1 ekskavatorius regiono sąvartynams, 1 mobilus smulkintuvas su priedais sukompostuotoms atliekoms smulkinti, 1 mobilus smulkintuvas su priedais statybos ir griovimo atliekoms perdirbti, 6 teritorijos valytuvai. Kaip numatyta 2010 m. birželio 2 d. EK sprendimo pakeitime, įranga iš projekto nebus įsigyjama, o regioninių sąvartynų kompostavimo aikštelės, statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir perdirbimo aikštelės bei APA eksploatavimui reikalingą techniką privalo įsigyti arba nuomotis konkurso būdu parinkti operatoriai.

2.4. Situacija iki projekto įgyvendinimo (2003 m.)

2.4.1 Komunalinių atliekų kiekiai

Apžvalgoje pateikti galimybių studijos „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", parengtos 2004 m. duomenys apie komunalinių atliekų susidarymą įvairiuose šaltiniuose ir geografinę kilmę bei duomenys apie sąvartynuose pašalintų atliekų kiekius 2002 m. Lentelėje 13 pateikiami apibendrinti duomenys apie susidariusių ir surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekius, lyginant su visų sąvartynuose ir šiukšlynuose šalinamų atliekų kiekiais Kauno apskrities atliekų tvarkymo regione.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23



Lentelė 13. Mišrių buitinių ir panašių atliekų susidarymas, surinkimas ir šalinimas savivaldybėse 2002 m.

Savivaldybė	Visas susidarančių komunalinių atliekų kiekis [t]	Atliekų susidarymas 1 gyventojui. [kg]	Įmonių surenkamos komunalinės atliekos [t]	Šiukšlynuose bei sąvartynuose priimtos atliekos [t]
Kauno m.	134450	300	134450	122132
Kauno raj.	39620	478	12350	39620
Jonavos raj.	12460	224	12660	16179
Kaišiadorių raj.	5390	135	5650	6966
Kėdainių raj.	13383	197	13380	20940
Raseinių raj.	12670	273	3760	14140
Iš viso	**197970**	**294**	**182190**	**219968**

Šaltinis: LR AM Aplinkos apsaugos agentūros statistiniai duomenys

2002 m. Kauno regione susidarė 197970 t komunalinių atliekų, tai yra 294 kg vienam gyventojui per metus. Į šį kiekį yra įtrauktas tas komunalinių atliekų kiekis, kuris yra surenkamas iš regiono pramonės įmonių ir organizacijų. Tačiau čia neįtrauktos pramoninės atliekos, statybos bei griovimo atliekos ir nuotėkų dumblas iš komunalinių bei pramonės įmonių vandens valymo įrenginių.

Kauno miesto Lapių sąvartyne ir Kėdainių rajono Zabieliškio sąvartyne atliekos sveriamos. Kadangi kituose sąvartynuose atliekos nesveriamos, statistinei apskaitai pateikti duomenys, apskaičiuoti kubinius metrus pavertus tonomis, negali būti laikomi patikimais. Rezultatą palyginti ir skirtumą tarp atliekų susidarymo miesto ir kaimo vietovėse apytikriai įvertinti, remiantis atliekų tvarkytojų pateiktais duomenimis apie atliekų susidarymo normas, buvo apskaičiuoti kiekvienos savivaldybės miestų ir kaimų vietovėse susidarančių atliekų kiekiai (žr. lentelę 14).

Statybos ir griovimo atliekos sudaro dalį lentelėje 13 nurodytų sąvartynuose priimtų atliekų kiekių. Statistiniais duomenimis 2002 m. šios statybos ir griovimo atliekos buvo priimtos sąvartynuose ir antrinių žaliavų bei didžiųjų APA (žr. Lentelę 15).

Atliekų susidarymo normos Kauno mieste ir Kėdainių rajone yra panašios į rezultatus, gautus 1998 m. praktinių tyrimų Alytaus apskrityje ir Kauno m. metu, kitų konsultantams žinomų šaltinių apie atliekų susidarymą duomenis. Nustatant susidarančių atliekų kiekius vadovautasi Kauno miesto duomenis, kai nustatomas miestuose susidarančių atliekų kiekis, ir į Kėdainių rajono duomenis, kai nustatomas rajonuose susidarančių atliekų kiekis. Tuo remiantis ir buvo nustatyti lentelėje 16 pateikiami Kauno apskrities atliekų tvarkymo regione susidarančių atliekų kiekiai 2003 m.

TIKRA
Sąvartuvės vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

Lentelė 14. Metiniai susidarančių atliekų kiekiai remiantis skaičiavimais ir atliekų tvarkytojų duomenimis 2003 m.

Savivaldybė	Miesto vietovės			Kaimo vietovės			Iš viso [t/m.]	kg/gyv./m.
	Gyventojai	kg/gyv./m	Iš viso [t/m.]	Gyventojai	kg/gyv./m.*	Iš viso [t/m.]		
Kauno m.	373669	340	127047	0		0	127047	340
Kauno raj.	23516	225-300	5290-7050	60120	150-200	9020-12030	14310-19080	171-228
Kaišiadorių raj.	14580	195-260	2840-3790	24274	150-200	3640-4860	6480-8650	176-222
Jonavos raj.	37209	225-300	8370-11160	15467	150-200	2320-3090	10690-14250	203-270
Kėdainių raj.	31800	200	6360	34500	100	3450	9810	147
Raseinių raj.	16275	255-340	4150-5530	22321	150-200	3350-4460	7500-9990	194-259

* Kur atliekos nesveriamos, komunalinių atliekų norma nustatyta apibendrinus atliekų tvarkytojų pateiktus duomenis ir skaičiuojant kad 1 m3 ~ 150-200 kg.

Lentelė 15. Statybos ir griovimo atliekos, priimtos savartynuose ir aikštelėse.

Savivaldybė	Priimta savartynuose t/m.	Priimta aikštelėse t/m.
Kauno m.	11676	5160
Kauno raj.	N.d.	N.d.
Kaišiadorių raj.	569	N.d.
Jonavos raj.	14025	N.d.
Kėdainių raj.	676	N.d.
Raseinių raj.	N.d.	N.d.

* N.d. – nėra duomenų

Lentelė 16. Apskaičiuotas komunalinių atliekų susidarymas Kauno apskrities atliekų tvarkymo regione 2003 m.

Savivaldybė	Miestų vietovės			Kaimų vietovės			Iš viso [t/m.]	kg/gyv./m.
	Gyventojai	kg/gyv./m.	Iš viso [t/m.]	Gyventojai	kg/gyv./m.	Iš viso [t/m.]		
Kauno m.	373669	340	127047	0		0	127047	340
Kauno raj.	23516	200	4703	60120	100	6012	10715	128
Kaišiadorių raj.	14580	200	2916	24274	100	2427	5343	137
Jonavos raj.	37209	200	7442	15467	100	1547	8989	171
Kėdainių raj.	31800	200	6360	34500	100	3450	9810	147
Raseinių raj.	16275	200	3255	22321	100	2232	5487	142
Iš viso	497049	305	151723	156682	100	15668	167391	256

Remiantis duomenimis apie savartynuose ir didžiųjų atliekų aikštelėse priimtų statybos ir griovimo atliekų kiekius, atsižvelgiant į tai, kad dalis statybos ir griovimo atliekų neatskirtos nuo mišrių atliekų, bei kitų šalių patirtį, 2003 m. taikytinos šios statybos ir griovimo atliekų susidarymo

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23 36
Aldona Čepėlienė

normos:

- Kauno m.: 80 kg/gyv./m.;
- rajonams: 30 kg/gyv./m.

2.4.2 Komunalinių atliekų sudėtis

Lietuvoje (Alytuje, Kaune) buvo atlikti keli atliekų sudėties tyrimai rūšiavimo būdu. Kauno m. Lapių sąvartyne ir Kėdainių rajono Zabieliškio sąvartyne vykdomas šalinamų atliekų monitoringas. Nustatant komunalinių atliekų sudėtį, atsižvelgta ir į kitus duomenis, pvz., rajonų atliekų tvarkymo planus, Lietuvos atliekų tvarkytojų asociacijos pateiktus duomenis bei duomenis, gautus atliekų praktinių tyrimų metu Lietuvoje ir kitose Rytų Europos šalyse. 2003 m. atliekų susidarymas vienam gyventojui bei vidutinė atliekų sudėtis Kauno atliekų tvarkymo regione nurodyta lentelėje Nr.17., kurioje įtrauktos sodo bei didžiosios atliekos, tačiau neįtrauktos statybos ir griovimo atliekos.

Lentelė 17. Atliekų susidarymas vienam gyventojui bei vidutinė atliekų sudėtis Kauno atliekų tvarkymo regione 2003 m.

Atliekos	Kauno m.		Miestų vietovės rajonuose		Kaimų vietovės rajonuose	
	kg/gyv./m.	%	kg/gyv./m.	%	kg/gyv./m.	%
Maisto	132	39	102	51	30	30
Sodo	7	2	4	2	4	4
Popieriaus ir kartono	54	16	20	10	10	10
Plastmasės	24	7	10	5	5	5
Stiklo	31	9	14	7	12	12
Metalo	10	3	6	3	3	3
Nedegios liekanos	17	5	16	8	16	16
Degios liekanos	48	14	18	9	9	9
Pavojingos	3	1	2	1	1	1
Didžiosios	14	4	8	4	8	8
Iš viso	**340**	**100**	**200**	**100**	**100**	**100**

Lietuvoje nebuvo duomenų apie komunalinėse atliekose esančių pakuočių atliekų kiekius. Jie buvo nustatyti remiantis kitų šalių patirtimi ir studijoje bus taikomi visam planavimo laikotarpiui:

- popieriaus: 20% pakuočių;
- kartono: 95% pakuočių
- plastmasės: 50% pakuočių;
- metalo: 50% pakuočių;
- stiklo: 95% pakuočių.

LR AM duomenimis, pakuočių atliekų kiekiai procentais kiek skyrėsi, pvz., metalo atliekose yra

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čapiejienė
37

77%, stiklo atliekose – 78%, popieriaus ir kartono atliekose – 60% pakuočių.

2.4.3. Regione komunalinių sąvartynų apžvalga

Savivaldybės ir LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė informaciją apie 67 sąvartynus, iš kurių Kauno rajone yra 6 sąvartynai (įskaitant Kauno m. Lapių sąvartyną) Kaišiadorių – 11, Kėdainių – 21, Jonavos – 10, Raseinių – 19 sąvartynų.

Nagrinėjant Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) duomenis apie Kauno apskrities atliekų tvarkymo regiono sąvartynus paaiškėjo, kad čia registruoti 98 šie objektai. Sąvartynų inventorizacijos metu paaiškėjo, kad nemaža dalis LGT duomenų bazėje esančių sąvartynų yra rekultivuoti, o iki projekto įgyvendinimo savivaldybės savo lėšomis vykdė sąvartynų rekultivavimą.

Įvairių informacijos šaltinių duomenys apie sąvartynų skaičių ir inventorizacijos metu nustatytas sąvartynų skaičius skyrėsi.

Lentelė 18. Kauno apskrities atliekų tvarkymo regiono sąvartynų skaičius.

Rajonas	Savivaldybių duomenys	LGT duomenys	Inventorizacijos duomenys
Kaunas	6	23	9
Jonava	10	12	10
Kaišiadorys	12	13	12
Kėdainiai	21	31	19
Raseiniai	19	19	19
Iš viso	**68**	**98**	**69***

Šaltinis: savivaldybės, LGT duomenų bazė, inventorizacija.
*Eksploatuojamų sąvartynų skaičius, įskaitant Lapių (Kauno raj.) ir Zabieliškio (Kėdainių raj.).

Sąvartynai suskirstyti į rajonų ir senūnijų. Senūnijų sąvartynų plotai svyruoja nuo mažiau nei 0,3 ha iki ne daugiau 3 ha. Bendras sukauptų atliekų kiekis paprastai neviršija 5000 m^3. Metinis šalinamų atliekų kiekis neviršija 500 t, o daugelio atvejų apsiriboja 50–100 t. Atliekų sluoksnio storis šiose atliekų šalinimo vietose yra 0,5-2 m, todėl esant aerobinėms sąlygoms atliekos pūna.

Kauno rajono teritorijoje inventorizuoti bei įvertinti penki sąvartynai (Piliuonos, Gaiženėlių, Butkūnų, Miškinių ir Dirvinių). Visi jie įteisinti, priskiriami buitinių atliekų sąvartynams. Trys iš jų (Miškinių, Piliuonos, Gaiženėlių) turėjo statybos projektus. Oficialiai buvo eksploatuojami tik du (Gaiženėlių ir Miškinių) sąvartynai, tačiau lankantis objektuose pastebėta, kad aplinkinių kaimų gyventojai šalina komunalines atliekas ir į kai kuriuos kitus sąvartynus. Bendras šalinamų atliekų kiekis sudaro apie 39 620 t/m., bendras plotas – 18,3 ha. Pagal sukauptą atliekų kiekį išsiskiria Gaiženėlių ir Miškinių sąvartynai. Mažesni atliekų kiekiai sukaupti Dirvinių ir Butkūnų sąvartynuose, o Piliuonos sąvartyne sukauptas mažiausias atliekų kiekis. Vyraujančios atliekos šiuose sąvartynuose - popierinė, plastmasinė tara ir pakuotė, polietilenas, medžių genėjimo, didžiosios atliekos.

Kaišiadorių rajono savivaldybės pateiktais duomenimis rajone buvo 12 sąvartynų, kurie užima bendrą 17,2 ha plotą, šalinamų atliekų kiekis – 6000 t/m. eksploatuojamas tik vienas - Budnikų

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepkijienė
2007 -06- 23

sąvartynas. Papildomai buvo pateikta informacija apie Strošiūnų kraštovaizdžio draustinyje esantį prieš dešimt metų uždarytą sąvartyną, esantį šalia Tarpumiškio kaimo ir priklausantį Žiežmarių seniūnijai. Tai buitinių atliekų sąvartynas, kuris nėra rekultivuotas, tačiau uždarytas ir užpiltas gruntu. Sąvartynas pradėtas eksploatuoti apie 1970 m. Manoma, kad čia sukaupta apie 250 000 m3 atliekų. Atstumas nuo sąvartyno iki artimiausios vandenvietės ir gyvenvietės - 1000 m, iki artimiausio paviršinio vandens telkinio - 2000 m. Dalinai rekultivuotieji uždaryti sąvartynai sutvarkyti pakankamai gerai. Šiukšlės užpiltos storu grunto sluoksniu. Išimtis buvo tik Živintos sąvartynas, buvęs už 20-30 m nuo to paties pavadinimo upelio, kuriame atliekos užsatumdytos gana plonu smėlio sluoksniu, šiukšlės visame buvusio sąvartyno plote matėsi išlindusios į žemės paviršių. Žemesnėse vietose stovėjo vanduo.

Kėdainių rajono savivaldybė nurodė 19 sąvartynų, kurie užėmė bendrą 41,22 ha plotą. Juose per metus buvo šalinama 20940 t atliekų. Visų rajono sąvartynų plotai (išskyrus Zabieliškio ir Babėnų) neviršijo 1 ha. Rajono sąvartynai priskirti seniūnijoms, kurių teritorijoje jie įrengti, Kėdainių rajonas išsiskiria sąvartynų gausa. Be Zabieliškio sąvartyno rajone buvo dar du labai dideli sąvartynai - Babėnų ir Čiukiškių, kurie lyg ir rekultivuoti, tačiau nepakankamai tvarkingai. Buvo būtinas papildomas šių sąvartynų sutvarkymas, užtikrinantis gamtinės aplinkos apsaugą nuo taršos. Abiem sąvartynams reikalingas požeminio vandens monitoringo tinklas ir požemio vandens būklės kitimo stebėjimai. Daugelis kitų sąvartynų, įvedus vietinę rinkliavą už atliekų šalinimą, jau neeksploatuojami, tačiau vietiniai gyventojai ir toliau šalino juose atliekas ir ypač didžiąsias, sodų, namų remonto. Didžiausia tokių rajoninių sąvartynų problema ta, kad jie labai plėtėsi į plotį, užimdami vis didesnes teritorijas.

Jonavos rajono savivaldybė pateikė duomenis apie 10 sąvartynų, užimančių 20,4 ha bendrą plotą. Daugumoje jų, neskaitant rajono centrinio Jonalaukio sąvartyno, gyventojai šalino atliekas kaip papuolė, nevykdoma atliekų apskaita, priežiūra apsiribojo sezoniniais sutvarkymais. Kai kuriuose jų, pvz. Užusalių, atliekos šalintos ne tik pačiuose sąvartynuose, bet ir šalia jų. Jonalaukio (Jonavos buitinių atliekų sąvartyną) ir AB Achemos inertinių medžiagų sąvartyną skyrė tinklo tvora. Dėl paviršiaus nuolydžių inertinių atliekų sąvartyno paviršiaus nuoplovos tekėjo į komunalinių atliekų sąvartyną, o vėliau su pasiekia ir Nėries upės slėnį. Abu sąvartynai yra už 500 m nuo Taurostos upelio, įtekančio į Neries upę. Jonavos rajono savivaldybė iki projekto įgyvendinimo pradžios išsprendė filtrato valymo klausimą įrengdama filtrato surinkimo ir nuvedimo liniją į komunalinių nuotekų tinklus.

Raseinių rajone, remiantis LR AM ir rajono savivaldybės duomenimis, buvo registruota 19 sąvartynų, bendru 26,28 ha plotu. Kaip ir kituose Kauno regiono rajonuose — tai didelės komunalinių atliekų sankaupos, kurios priskirtos seniūnijoms ar komunalinių paslaugų teikėjoms (įmonėms). Daugumos sąvartynų plotai neviršijo vieno hektaro, sukauptų atliekų kiekiai 100-300 t. Duomenys apie šalinamų atliekų kiekius netikslūs, nes atliekų apskaita vesta tik centriniuose sąvartynuose, kuriuos prižiūri komunalinės įmonės (Andrušaičių, Gėluvos, Vidukiės sąvartynai), nors ir čia duomenys apie šalinamų atliekų kiekius buvo netikslūs. Statistiniais duomenimis Raseinių rajone bendras šalinamų atliekų kiekis– apie 14040 t/m. Beveik visi Raseinių rajono sąvartynai įrengti smėlio ir žvyro karjeruose, be jokių aplinkosaugos priemonių. Dalis sąvartynų rekultivuota, tačiau dalį jų reikėjo papildomai sutvarkyti, taip pat į juos žmonės vežė šiukšles (Steponkaimio, Tarosų, Poškaičių, Rikšlelių, Pašventupio), o kiti užpilti tik nestoru grunto sluoksniu, pro kurį išlenda šiukšlės (Tarosų, Paskystenio, Vaitiškių).

Kauno miesto buitinių atliekų Lapių sąvartynas yra 19 km nuo miesto, Kauno rajono Lapių seniūnijos Lepšiškių kaime. Sąvartyną eksploatuoja UAB "Kauno švara". Sąvartyno teritorija užima 37,4 ha plotą. Sąvartyno sanitarinė apsauginė zona 500 m. Nuo 1973 m. atliekos šalintos šio sąvartyno pirmajame kaupimo lauke, užimančiame 12,5 ha plotą. Eksploatuojančios įmonės

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

duomenimis 2003 m. sausio 1 d. čia sukaupta apie 2,5 mln. t atliekų, tačiau Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento duomenų bazėje įtrauktas tik apie 1,5 mln. t pašalintų atliekų kiekis. Atliekų kaupo storis – apie 24-30 m, vidutinis storis - apie 16 m. Priimamos atliekos registruojamos nuo 1992 m. Nuo 1998 m. jos sveriamos tiltinėmis svarstyklėmis ir registruojamos elektroninėje apskaitos sistemoje. Apskaičiuota, kad nuo 1992 m. sąvartyne pašalinta apie 80000 t atliekų. Po 1992 m. metiniai šalinamų atliekų kiekiai svyravo nuo 83000 t 1993 m. iki 107000 t 1995 m., tačiau pastaraisiais metais pasiekė apytikriai 120000 t/m. Lapių sąvartyne šalintos pirmiausiai Kauno miesto gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų atliekos, tačiau čia buvo atvežama ir apie 5-10% atliekų, susidariusių Kauno rajono, Kaišiadorių, Jonavos rajonų savivaldybių teritorijose. Pašalintų kietųjų atliekų masėje vyrauja organika (virtuvinės atliekos), popierius, kartonas, plastmasė ir kitos degios medžiagos. Nuo 2003 m. pradžios sąvartyne draudžiama šalinti sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biodegraduojamas atliekas. Įrengiant pirmąjį kaupimo lauką dabartiniai reikalavimai dėl sąvartynų įrengimo negaliojo, todėl jokių specialių paruošimo darbų nebuvo – nėra specialaus ekranuojančio sluoksnio ir filtrato surinkimo sistemos. Aplink sąvartyną įrengtu drenažiniu grioviu susikaupęs filtratas tiekiamas į valymo įrenginius. Dujų surinkimo sistema taip pat neįrengta.

Visiems sąvartynams būdingos problemos:

- sąvartynai neaptverti, nenužymėtos jų ribos;
- apsauginiai pylimai yra tik nedaugelyje sąvartynų;
- nėra filtrato surinkimo bei valymo sistemų, išskyrus kai kuriuos didžiuosius rajoninius sąvartynus;
- į sąvartynus patenkančių atliekų kontrolė bei registracija vykdoma labai apytiksliai;
- sąvartynuose trūksta eksploatacinės technikos ir įrenginių;
- atvežtų atliekų sustumdymas ir sutankinimas vykdomas epizodiškai;
- netvarkingas atvežamų atliekų išpylimas;
- atliekos dažniausiai retai tankinamos ir visai neperdengiamos gruntu;
- patenkančios į sąvartynus atliekos nėra rūšiuojamos;
- sąvartynuose neįrengtos aplinkos monitoringo sistemos;
- nevykdomi aplinkos būklės stebėjimai.

Regiono atliekų tvarkymo būklės apžvalga rodė:

- Regione buvo 68 eksploatuoti netinkami sąvartynai, kurie neatitinka ES ir atliekų šalinio valstybinių reikalavimų. Techninių projektų rengimo metu atlikus detalius tyrinėjimus tvarkomų sąvartynų skaičius patikslintas – 58 sąvartynai.
- Regione nebuvo aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančių įrenginių atliekoms šalinti, kuriuose būtų įrengta šiuolaikiška, dugną izoliuojanti danga. Dalinai reikalavimus atitiko Lapių sąvartyno III laukas ir Žaliešiškio sąvartyno eksploatuojama sekcija.
- Nepakankamai statybos ir griovimo atliekų buvo nukreipiama nuo sąvartyno, trūko tam tinkamų aikštelių ir įrangos.
- Gana daug biodegraduojamų atliekų patekdavo į sąvartynus, nors sąvartynų eksploatacijos instrukcijose draudžiama priimti šalinti jas į sąvartyną, trūko kompostavimui tinkamų aikštelių bei technikos.
- Komunalinių atliekų sraute daug antrinių žaliavų, kurias reikia atskirai surinkti. Regione nebuvo organizacijos, kuri atstovautų savivaldybes regiono lygyje ir taptų projekto savininke bei prisiimtų atsakomybę už investicinio plano įgyvendinimą.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

2.5. Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įvykdyti statybos darbai

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" buvo vykdomas pagal tris atskiras darbų sutartis. Rangos sutartys pasirašytos ir darbai vykdyti pagal statytojo parengtus projektus (FIDIC Raudonoji knyga: Užsakovo suprojektuotų ir statybos inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos). Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai, perėmimo pažymos, objektų atlikimo pažymos pateiktos pridedamuose prieduose.

2.5.1 Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabiliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir grioviuo atliekų perdirbimo aikštelių statyba

Lentelė 19. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabiliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir grioviuo atliekų perdirbimo aikštelių statyba.

Sutarties Nr.	**A/2007/Z/32**
Sutarties pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabiliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir grioviuo atliekų perdirbimo aikštelių statyba**
Sutarties pobūdis	**Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos (FIDIC raudona knyga)**
Sutarties aprašymas	Pagrindiniai šio viešojo pirkimo darbai yra šie: - įrengti buitinių atliekų sąvartyno 1-ąją sekciją, - esamos 2-os sekcijos sutvarkymas ir dalinis uždengimas; - esamo administracinio pastato remontas, - įrengti aptarnaujančio transporto stoginę; - įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo 0,387 ha ploto aikštelę; - įrengti statybos ir grioviuo atliekų 0,2065 ha ploto aikštelę; - įrengti filtrato kaupimo rezervuarą, -automobilių svarstyklių remontas, - įrengti automobilių ratų dezinfekavimo duobę, - įrengti priešgaisrinius rezervuarus, - įrengti elektros transformatorinę pastatą, - filtrato surinkimo siurblines-esamos rekonstrukcija ir naujos įrengimas, - įrengti drenažinio vandens siurblinę, - įrengti gruntinio vandens pažeminimo sistemą; - įrengti purvo ir naftos skirtuvą, - įrengti inžinerinius tinklus, - įrengti sąvartyno vidinius kelius, - įrengti sąvartyno apšvietimą, aptvėrimą ir apželdinimą, - įrengti privažiavimo kelią, - įrengti monitoringo sistemą. Kiti, į šios Sutarties darbų apimtis įtraukti, darbai: - Darbo projekto paruošimas, - Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atstatomieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui;

KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Černiejienė

	- Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN4-148; Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN4-168; (žr. priedas Nr.2.2.1, 2.2.2); Darbų perėmimo pažyma (žr. Priedas Nr.2.3.1) Objektų atlikimo pažyma žr. Priedas Nr.2.4.1)
Darbų rangovas	UAB „Kamesta“
Darbų pradžios data	2007-11-13
Darbų pabaigos data	2009-06-26
Atliktų darbų aprašymas. Darbai atlikti. Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis pateiktas priede 2.1.1	

2.5.2. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba

Lentelė 20. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba

Sutarties Nr.	**A/2007/K/37**
Sutarties pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba**
Sutarties pobūdis	**Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos (FIDIC raudona knyga)**
Sutarties aprašymas	Pagrindiniai šio viešojo pirkimo darbai yra šie: - įrengti buitinių atliekų sąvartyno 2-ąjį kaupimo lauką apie 8,8 ha, - esamo 1-o kaupimo lauko uždarymas (rekultivavimas); - esamo 3-io kaupimo lauko dalies sekcijos statybos užbaigimas; - administracinio pastato statyba; - buitinio pastato statyba; - esamos aptarnaujančio transporto stoginės perkėlimas; - automobilių svarstyklių rekonstrukcija, - automobilių ratų plovyklos statyba, - priešgaisrinių rezervuarų statyba, - gruntinio vandens pažeminimo sistemos įrengimas; - naftos gaudyklių statyba, - inžinerinių tinklų statyba (elektros tinklai, video stebėjimas, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai) , - sąvartyno vidinių kelių ir aikštelių statyba, - sąvartyno apšvietimas, aptvėrimas ir apželdinimas, - monitoringo projekto parengimas, derinimas ir sistemos įrengimas; - artezinio gręžinio įrengimas, Kiti, į šios Sutarties darbų apimtis įtraukti, darbai: - Darbo projekto paruošimas ir konstrukcinės dalies ekspertizė, - Esamų statinių demontavimas, Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai; - Statybos atstatomieji darbai;

TIKRA
Sėkmingos veiklos
2011 -06- 23
Aldona Čepėjienė

	- Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui, - Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2008-10-09d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2008-09-11d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2009-07-01d Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2009-12-24d. (žr. priedas Nr. 2.2.3-2.2.6) Darbų perėmimo pažymos (žr. Priedas Nr.2.3.2) Darbų atlikimo pažyma (žr. Priedas Nr. 2.4.3)
Darbų rangovas	UAB „Sienojus" ir UAB Laugina" jungtinės veiklos sutarties pagrindu
Darbų pradžios data	2007-12-27
Darbų pabaigos data	2009-12-31
Atliktų darbų aprašymas : Darbai atlikti. Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis pateiktas priede 2.1.2	

2.5.3. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba

Lentelė 23. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba

Sutarties Nr.	**A/2007/K/38**
Sutarties pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba**
Sutarties pobūdis	**Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos (FIDIC raudona knyga)**
Sutarties aprašymas	Pagal šią sutartį įrengtos šešios APA (trys iš jų su atliekų perkrovimo stotimis) Kauno, Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Jonavoje ir Raseiniuose. Pripažinimo tinkamų naudoti aktas Nr.STN-82 2009-06-17d. Pripažinimo tinkamų naudoti aktas Nr.STN4-34 2009-05-29d Pripažinimo tinkamų naudoti aktas Nr.STN26-09-079/IN-001 2009-07-10 Pripažinimo tinkamų naudoti aktas Nr.STN-334 2009-11-13d. Pripažinimo tinkamų naudoti aktas Nr.STN-25-76/09 2009-09-29d. Statybos užbaigimo aktas Nr.(15.34)SUA-29 (žr. priedas Nr.2.2.7-2.2.12) Darbų dalies perėmimo pažyma (žr. Priedas Nr.2.3.3) Darbų dalies perėmimo pažyma (žr. Priedas Nr. 2.3.5) Darbų atlikimo pažyma *
Darbų rangovas	AB „Raseinių melioracija" ir UAB „Laugina" veikiantys jungtinės veiklos pagrindu
Darbų pradžios data	2007-12-27
Darbų pabaigos data	2010-12-30
Atliktų darbų aprašymas. Darbai atlikti.	

* Visos aikštelės yra perduotos Užsakovui VšĮ KaunoRATC, šiuo metu objektuose vyksta defektų laikotarpis, o darbų atlikimo pažyma išduodama po defektų laikotarpio.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

2.5.4. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas

Lentelė 22. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas.

Sutarties Nr.	**A/2007/K/40**
Sutarties pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas**
Sutarties pobūdis	**Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos (FIDIC raudona knyga)**
Sutarties aprašymas	Pagal šią sutartį Kauno regiono Jonavos Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių ir Raseinių rajonuose uždaryti 58 sąvartynai. **Dalyje jų įrengtos aplinkos monitoringo sistemos.** Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100519-00273 2010-05-19d. Pripažinimo uždarytu aktas Nr. PTN-20-100619-00424 2010-06-19d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100406000054 2010-04-06d Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100406-00052 2010-04-06d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100406-00051 2010-04-06d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100421-00132 2010-04-21d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100421-00128 2010-04-21d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100421-00131 2010-04-21d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100619-00423 2010-06-19d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100619-00422 2010-06-19d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100507-00214 2010-05-07d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100615-00400 2010-06-15d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100412-00018 2010-04-12d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100414-00102 2010-04-14d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100413-00063 2010-04-13d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100412-00079 2010-04-12d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktai žr. priedas Nr. 2.2.13-2.2.28 Darbų perėmimo pažyma (žr. Priedas Nr.2.3.4) Darbų atlikimo pažyma *
Darbų rangovas	UAB „Luidas" su UAB „Kauno keliai" (jungtinės veiklos pagrindu)
Darbų pradžios data	2008-10-15
Darbų pabaigos data	2010-06-15
Atliktų darbų aprašymas. Darbai atlikti. Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis pateiktas priede 2.1.4.	

* Visi sąvartynai yra uždaryti, šiuo metu objektuose vyksta defektų laikotarpis, o darbų atlikimo pažyma išduodama po defektų laikotarpio.

TIKRA
išvestinis vienetas
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

2.6 Projekto atitikimas EK sprendimui Nr. (2005)1610 (2005 m. gegužės 24 d.) ir EK sprendimui Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.)

EK sprendime Nr. (2005)1610 (2005 m. gegužės 24 d.) ir EK sprendime Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.) numatyti projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" tikslai yra pasiekti, o specialiosios sąlygos ir pagrindiniai priežiūros rodikliai yra įgyvendinti laiku ir tinkamai.

2.6.1. 2010 m. birželio 2 d. EK sprendimo Nr. (2010)3625, kuris iš dalies pakeitė 2005 m. gegužės 24 d. EK sprendimą Nr. (2005)1610, specialiosios sąlygos

2010 m. birželio 2 d. EK sprendimo Nr. (2010)3625, iš dalies keičiančio 2005 m. gegužės 24 d. EK sprendimą Nr. (2005)1610, EK pagal kurį buvo įgyvendinamas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" projektas, 12 punktas nusako sąlygas, pagal kurias yra teiktina ES parama šiam projektui.

Sąlyga pridaidoms ir turto panaudojimui (EK sprendimo 12.1 papunktis):

Ši sąlyga taikoma 5 metų periodui po darbų užbaigimo, t.y. EK turi teisę peržiūrėti SF nustatytą paramos dydį, jei per šį laikotarpį projekto veiklos sąlygos (tarifai, pajamos, turto nuosavybė ir pan.) žymiai skirsis nuo pradinių sąlygų, naudotų nustatyti paramos dydį ir/ar bus atlikus reikšmingus pakeitimus:

a) kurie turės įtakos darbo sąlygų pobūdžiui ar projekto įgyvendinimo sąlygoms, ar suteiks privačiai ar viešai bendrovei pernelyg didelį privalumą; ir
b) kurie bus įtakoti pasikeitimų, susijusių su bet kurios finansuotos infrastruktūros dalies nuosavybe, arba nutraukus ar iš esmės pakeitus veiklos sąlygas.

Po projekto užbaigimo visame Kauno regione yra taikoma vieninga tarifų nustatymo metodika, kuri realiai atitinka įmonės sąnaudas dviejų naujų sąvartynų, kompostavimo aikštelės, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelės, šešių APA (trys iš jų su atliekų perkrovimo stotimis) eksploatacijai ir priežiūrai bei atliekų pervežimo iš perkrovimo stočių iki regioninių sąvartynų. Priede 3.5 pateikiamas nustatytas komunalinių atliekų priėmimo į sąvartynus ir aikštelės mokesčio dydis ir atliekų kodai, lentelėje 23 - eksploatuojamiems objektams išduotų TIPK leidimų numeriai ir leidimų išdavimo datos.

Sąlygos, susiję su išankstiniu mokėjimu (EK sprendimo 12.2 papunktis)

Lietuvos Respublika, teikdama išankstinio mokėjimo paraišką, įsipareigojo įrodyti, kad Kauno regioninis atliekų tvarkymo centras yra tinkamai įsteigtas ir veikiantis.

LR atsakingos institucijos kartu su išankstinio mokėjimo paraiška įsipareigojo pateikti šią informaciją:

- Gruntinio vandens Zabieliškio sąvartyno teritorijoje ir šalia, nurodant taip pat ir taršos patekimo šaltinius (Zabieliškio buitinių atliekų sąvartynas, fosfogipso ir/ar lignino sąvartynai), analizės duomenis;
- Detalų priemonių, kurių buvo imtasi arba planuojama imtis siekiant eliminuoti gruntinio vandens taršą iš abiejų pramoninių sąvartynų ir senųjų Zabieliškio buitinių atliekų sąvartyno sekcijų, aprašymą bei priemonių įgyvendinimo laiko grafikus. Ši sąlyga negalioja jei pateikti analizės duomenys nerodo gruntinio vandens taršos Zabieliškio sąvartyno teritorijoje ir šalia jos;

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čeplėjienė



- Detalias uždaryto lignino sąvartyno bei senų Zabieliškio sąvartyno sekcijų sutvarkymo/uždarymo ataskaitas, apimančias darbų aprašymus ir laiko grafiką;
- Patvirtinimą, kad UAB „Lifosa" fosfogipso sąvartyno sutvarkymo planas yra parengtas pagal Atliekų direktyvos 14 skyriaus a) dalies reikalavimus. Įrodymą, kad įmonei išduotas gamtos išteklių naudojimo leidimas, leidžiantis tęsti sąvartyno eksploataciją arba įpareigojantis uždaryti sąvartyną, tuo atveju jei jis negali būti sutvarkytas, yra išduotas pagal Atliekų direktyvos 14 skyriaus b) dalies reikalavimus;
- Patvirtinimą, kad projekto „Kauno regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Galimybių studija turi būti laikoma Kauno regiono Atliekų tvarkymo planu, atitinkančiu Rėminės atliekų direktyvos, Pavojingų atliekų direktyvos, Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos reikalavimus, taip pat įsipareigojimą, kad atitinkamos Kauno apskrities institucijos šią studiją patvirtins kaip Kauno regiono atliekų tvarkymo planą ir apie tai informuos Europos Komisiją per vienerius metus nuo šio sprendimo.

2005 m. kovo 2 d. įsteigtas Kauno RATC, kuris atsakingas už regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, jos funkcionavimo organizavimą, plėtojimą ir administravimą Kauno regione.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas yra Kauno RATC nuosavybė, kuris yra atsakingas už eksploataciją ir priežiūrą, kaip ir buvo numatyta projekto įgyvendinimo pradžioje.

2005 m. rugsėjo 27 d. Kauno regiono plėtros taryba sprendimu Nr. 2 patvirtino, kad Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimo galimybių studija, 2004 m. parengta „COWI" A/S su UAB „COWI Baltic", Aplinkos apsaugos politikos centru ir B.Paukščio individualia įmone laikoma Kauno regiono atliekų tvarkymo planu.

Visos sąlygos, susijusios su išankstiniu mokėjimu yra įvykdytos, ir informaciją apie jų įvykdymą Finansų ministerija 2005 m. rugpjūčio 18 d. pateikė EK raštu Nr. (4.75.10-06)-6K-0508058.

Galutinės ataskaitos teikimo sąlygos (EK sprendimo 12.3 papunktis):

Užbaigus projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" darbus, Užsakovas Kauno RATC sąvartyno bei aikštelių eksploatacijai konkurso būdu parinko turinčius tinkamą kvalifikaciją bei patirtį operatorius dirbti šioje srityje.

Sąlyga, susijusi su direktyvų taikymu (EK sprendimo 12.3. a) papunktis):

Įgyvendinus projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", atliekos tvarkomos remiantis geriausiomis techninėmis žiniomis.

Atliekos tvarkomos vadovaujantis:

- Sąvartynų direktyvos Nr. 1999/31/EB reikalavimais, kadangi uždraudus atliekas šalinti 68 Kauno regione esančiuose sąvartynuose/užterštose teritorijose, įrengti du Lapių ir Zabieliškio regioniniai nepavojingų atliekų sąvartynai, atitinkantys visus aplinkosauginius reikalavimus, keliamus ES bei Lietuvos Respublikoje. Taip pat užkirstas kelias netinkamam atliekų šalinimui sąvartynuose, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, ypač paviršinių ir požeminių vandenų, dirvožemio, oro ir žmonių sveikatai.

sanglaudos fondas

– Atliekų direktyvos Nr. 2006/12/EB, kadangi eksploatuojami Lapių ir Zabieliškio regioniniai sąvartynai bei APA turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (lentelė 23), kurie griežtai apibrėžia atliekų priėmimo į sąvartyną kriterijus, aplinkos apsauga, požeminę taršą, avarijų prevenciją ir t.t.:

Lentelė 23. Kauno RATC objektų TIPK leidimai

Eil. Nr.	Objektas	TIPK leidimo Nr.	TIPK leidimo išdavimo data
1.	Lapių regioninis sąvartynas	5/72	2009-02-02
2.	Zabieliškio regioninis sąvartynas	6/47	2009-10-13
3.	APA Andrušaičių km. Raseinių raj.	7/35	2009-07-13
4.	APA Jonalaukio km. Jonavos raj.	2/56	2009-07-15
5.	APA Vytauto Didžiojo g. 136, Kaišiadorys	4/44	2009-10-15
6.	APA Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai	6/36	2009-07-02
7.	APA Nemajūnų 15b, Kaunas	1/23	2009-07-15
8.	APA Raudondvario pl.155D, Kaunas	1/52	2011-02-21

– Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos Nr.2004/12/EB, iš dalies keičiančios direktyvą Nr. 94/62/EB ir Pavojingų atliekų direktyvos Nr. 91/689/EEB, kurią papildė direktyva Nr. 94/31/EB reikalavimus, kadangi įrengtose 6 APA iš gyventojų nemokamai priimamos saugojimui įvairios pakuotės bei buityje susidarančios pavojingos atliekos, vykdoma griežta kontrolė, siekiant užkirsti pakuočių ir pavojingų atliekų patekimui į Lapių ir Zabieliškio regioninius nepavojingų atliekų sąvartynus.

Sąlyga, susijusi su viešųjų pirkimų vykdymu (EK sprendimo 12.3. b) papunktis):

Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimo metu vykdyti viešieji pirkimai buvo atliekami laikantis Tarybos direktyvos Nr. 92/50/EB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo, Tarybos direktyvos Nr. 93/96/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo, Tarybos direktyvos Nr. 93/37/EB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo, Tarybos direktyvos Nr. 93/38/EEB dėl įmonių, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, pirkimo tvarkos koordinavimo reikalavimų ir, nuo jų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus įsigaliojimo dienos, direktyvos Nr. 2004/18/EB dėl viešojo darbų, tiekimo ir paslaugų pirkimo sutarčių tvarkos koordinavimo ir direktyvos Nr. 2004/17/EK dėl įmonių, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, pirkimo tvarkos koordinavimo reikalavimų. Viešųjų pirkimų dokumentuose sutarčių sąlygos darbams buvo parengtos pagal FIDIC tipinių sutarčių sąlygas, o sutarčių sąlygos paslaugoms — pagal Bendrąsias EB finansuojamų paslaugų sutarčių sąlygas.

2.6.2. Projekto tikslai ir pagrindiniai priežiūros rodikliai

Projekto tikslas – sukurti aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu darnią Kauno regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus. Ypač padėti įgyvendinti šių direktyvų reikalavimus:

- Atliekų direktyva Nr. 2006/12/EB;
- Sąvartynų direktyva Nr. 1999/31/EB;
- Pavojingų atliekų direktyva Nr. 91/689/EEB, kurią pakeitė direktyva Nr. 94/31/EB;

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapliejienė
2011-06-23

- 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo EB viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (OL L 30 , 6.2.1993, p. 1);
- Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva Nr. 2004/12/EB iš dalies keičianti direktyvą Nr. 94/62/EB;
- Direktyva Nr. 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;
- Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra tam tikrų pavojingų medžiagų, direktyva Nr. 91/157/EEB;
- Nuotekų dumblo direktyva Nr. 86/278/EEB, skirta apsaugoti aplinką, o ypač dirvožemį, kai nuotekų dumblas naudojamas žemės ūkyje;
- Direktyva Nr. 2000/53/EB dėl netinkamų naudoti automobilių.

2.6.3. EK sprendime Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.) iškelti fiziniai tikslai

- Įrengti reikalavimus atitinkančių sąvartynų Lapėse ir Zabieliškyje sekcijas ir, uždarius bei sutvarkius 59 veikiančius sąvartynus ir šiukšlynus, įskaitant ir Lapių sąvartyno I-ą lauką, sumažinti požeminio ir paviršinio vandens taršą;
- Viešąjas atliekų surinkimo paslaugas teikti papildomai 121,877 žmonių ir tokiu būdu iki 2010 m. pagerinti vidutinį surinkimo procentą iki 93 %;
- Taikyti tarifus, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir regione įtvirtina „teršėjas moka" principą;
- Pastačius 6 APA pasiekti, kad 2006 m. komunalinių atliekų atskyrimas sudarytų 7 %;
- Įrengus žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, sumažinti į sąvartyną patenkančių biodegraduojančių atliekų kiekį;
- Užtikrinti biologiškai skaidžių, statybos ir griovimo atliekų bei pavojingų atliekų nepatekimą į sąvartyną;
- Sumažinti reikalavimų neatitinkančių sąvartynų skaičių regione nuo 59 iki 2, ES reikalavimus atitinkančių, regioninių sąvartynų iki 2010 m.;
- Užtikrinti, kad Kauno RATC generuos pakankamas pajamas padengti eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudas.

2.6.4. Įgyvendinti fiziniai tikslai

- Įrengtos reikalavimus atitinkančios sąvartynų Lapėse ir Zabieliškyje sekcijos su filtrato surinkimo ir valymo įrenginiais, uždaryti ir sutvarkyti 58 veikiantys sąvartynai ir šiukšlynai, tuo sumažinta požeminio ir paviršinio vandens tarša;
- Uždaryta Lapių sąvartyno I sekcija;
- Viešosios atliekų surinkimo paslaugos 2011 m. teikiamos 610,363 tūkst. regione gyvenančių žmonių ir pagerintas vidutinis surinkimo procentas iki 99 %. Remiantis Statistikos departamento duomenimis (pagal Statistikos departamento ataskaitą „Gyventojų skaičius, natūrali kaita apskrityse ir savivaldybėse", žr. Priedas Nr. 2.5.1), 2011 m. pradžioje Kauno regione (Jonavos, Kaišiadorių , Kėdainių, Kauno, Raseinių rajonuose ir Kauno mieste) gyveno 610363 gyventojų, t.y. 47,137 tūkst. gyventojų mažiau, nei planuota rengiant EK sprendimą (657,5 tūkst. gyventojų). Dėl nenumatytų aplinkybių: pablogėjusios ekonominės situacijos šalyje ir dėl to išaugusios emigracijos, po projekto įgyvendinimo viešosios atliekų surinkimo paslaugos papildomai teikiamos 72,405 tūkst. gyventojų, o planuota buvo 121,877 tūkst. žmonių. Kauno RATC imasi

KAUNO R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮMONIŲ IR TURTO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėlienė



visų prietaisų, kad atliekų surinkimo paslaugos būtų teikiamos kuo didesniam skaičiui regiono gyventojų. Šiuo metu surinkimas procentas siekia net 99 %.

- Taikomas tarifas (sąvartyno „vartų" mokestis), kuris atitinka finansinius reikalavimus ir „teršėjas moka" principą;
- Pagal iš visų Kauno regiono savivaldybių gautus duomenis, regione per 2010 m. iš bendro komunalinių atliekų srauto (224.131,66 t) atskirta 15.473,85 t atliekų ir tai sudaro 6,90 % bendro komunalinių atliekų kiekio. 6-ta aikštelė baigta statyti 2010 m. gruodžio 30 d. Pastačius 6 APA, komunalinių atliekų atskyrimas 2010 m. padidėjo 1% (pagal metines atliekų apskaitos ataskaitas).
- Įrengus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Zabieliškio regioninio sąvartyno teritorijoje, sumažintas į sąvartyną patenkančių biodegraduojančių atliekų kiekis. Per 2009 m. šioje aikštelėje surinkta 625,7 t, o per 2010 m. – 736,9 t žaliųjų atliekų.
  Vadovaujantis išduotais Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimais (lentelė 23), vykdant tinkamą sąvartynų eksploatavimą, užtikrinamas biologiškai skaidžių, statybos ir griovimo atliekų bei pavojingų atliekų nepatekimas į sąvartynus;
- Iki 2010 m. sumažintas reikalavimų neatitinkančių sąvartynų skaičius regione nuo 59 (įskaitant Lapių sąvartyno 1-ą sekciją) iki 2, ES reikalavimus atitinkančių, regioninių sąvartynų;
- Kauno RATC generuoja pakankamas pajamas padengti eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudas.

EK sprendime Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.) numatytos darbų apimtys užbaigtos iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagal EK sprendimą Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.) pasiekti fiziniai rodikliai pateikti lentelėje 24.

Lentelė 24. Pasiekti projekto fiziniai rodikliai.

Finansuojamų finansavimo šaltinių kategorijos*	Fizinis įgyvendinimas				Finansinis įgyvendinimas**,***				
	Fiziniai rodikliai				Finansiniai rodikliai**				
	vnt.	kiekis	Bendras fizinis įgyvendinimas iki 2010-12-31	Fizinio įgyvendinimo eiga (%)	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (EUR)	numatomų tinkamų finansuoti išlaidų (%)	Bendras finansinis įgyvendinimas iki 2010-12-31	Finansinio įgyvendinimo eiga (%)	Fizinis įgyvendinimo eiga (%)
(1)	2	3	4	(5)=(4)/(3)*100	6	7	8	9	(10)=(5)*(7)/100
Sąvartynų uždarymas	%	100	100,0	100,0	5.526.698,16	22,52	5.526.698,16	100,0	22,5
Uždaryti sąvartynai	vnt.	58	58	100,0					
Atliekų priėmimo aikštelių statyba	%	100	100,0	100,0	3.172.106,72	12,92	3.172.106,72	100,0	12,9
Atliekų priėmimo aikštelių skaičius. Konteinerių tipo administracinis, pavojingų atliekų ir stambiagabaričių atliekų saugojimo pastatai, biologinių buitiekų valyklė ir kt. reikalinga infrastruktūra	vnt.	6	6	100,0					
Konteineriai antrinėms žaliavoms	vnt.	96	96	100,0					

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Ceplėjienė

sanglaudos fondas

Atliekų presavimo technika	vnt.	3	3	100,0					
Atliekų kosdejamojo transporto priemonėms atliekų pervežimui iš APA	vnt.	9	9	100,0					
Regioninio sąvartyno Lapių kaime statyba	%	100	100,0	100,0	9.686.733,56	39,47	9.686.733,56	100,0	39,5
Transporto keliams įrenginiai. Surenkamo vieninio grunto sluoksnis, geosintetinio molio paklotas, HDPE geomembrana, geotekstilė, drenažinis sluoksnis; gruntinio vandens pašalinimo sistema; filtrato surinkimo drenas; reikalingos infrastruktūros įrengimas	ha	9-10	9,53	100,0					
Tarnybinės zonos įrenginiai. Buitinis pastatas su pagalbinėmis patalpomis, generatorinė elektrinė, kt. reikalinga infrastruktūra	vnt.	1	1	100,0					
Administracinio pastato zonos įrenginiai. Administracinis pastatas su pagalbinėmis patalpomis, svarstyklės, rato plovimo ir dezinfekavimo dušas, kt. reikalinga infrastruktūra	vnt.	1	1	100,0					
Nuotekų ir paviršinio vandens surinkimo sistemų įrenginiai. Buitinių nuotekų talpos, surinkimo rezervuarai, biologiniai valymo įrenginiai, paviršinių nuotekų / paviršinio vandens surinkimo šuliniai, separatorė ir kt.	vnt.	3	3	100,0					
Filtrato sistemos surinkimo sistemos įrenginiai. Drenažinis sluoksnis su filtrato surinkimo dreneriais, magistraliniai savitakiniai ir slėginiai vamzdynai, filtrato tvenkiniai, užterštos gruntinio vandens nuorinimo gręžiniai, separatorė	vnt.	1	1	100,0					
Kasamo grunto užkasimas, įskaitant duobę deponuoti sluoksnį, kt.	ha	11,7-12,6	12,3	100,0					
110 kV ir 10 kV elektros oro linijų iškėlimas	%	100	100	100,0	1.248.133,27	5,09	1.248.133,27	100,0	5,1
110 kV ir 10 kV elektros oro linijų iškėlimas	vnt.	2	2	100,0					
Regioninio sąvartyno Zuikeičių kaime statyba	%	100	100,0	100,0	4.097.775,64	16,70	4.097.775,64	100,0	16,7
Transporto keliams įrenginiai. Surenkamo vieninio grunto sluoksnis, geosintetinio molio paklotas, HDPE geomembrana, geotekstilė, drenažinis sluoksnis, gruntinio vandens pašalinimo sistema, filtrato surinkimo drenas, reikalingos infrastruktūros įrengimas	ha	2,4-2,7	2,573	100,0					
Tarnybinės zonos įrenginiai. Ratų plovykla, svarstyklės, garažas, kt. reikalinga infrastruktūra, esamos sekcijos linkimo užbaigimas grioviu	vnt.	1	1,00	100,0					
Administracinio pastato kartu su pagalbinėmis patalpomis įrenginiai	vnt.	1	1,00	100,0					
Nuotekų ir paviršinio vandens sistemos įrenginiai. Buitinių nuotekų talpos, paviršinio vandens surinkimo šuliniai ir kt.	vnt.	1	1,00	100,0					

KAUNO RAJ. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ TIKRA

Aldona Čepkauskienė

2011 -06- 23

sanglaudos fondas

Filtrato surinkimo ir nuvedimo sistemos įrenginiai Šiaurinis šluoksnis su filtrato surinkimo drenomis, magistralinės surinkėjai ir slėginiai vamzdynai, nauja ir rekonstruojama siurblinės ir kt.	vnt.	1	1,00	100,0					
Perpylimo kelias. Naujo kėlio įrenginys įrengimas ir esamo remontas	km	3,3-3,6	3,625	100,0					
Kompensacinio aikštelių skaičius. Kompozo surinkos siurblinė ir kaupimo rezervuarai, išleistuvo tunelis, ir kt. reikalinga infrastruktūra	vnt.	1	1,0	100,0					
Statybos ir gręžinio atliekų surinktuvo ir perdirbimo aikštelių skaičius įskaitant reikalingos infrastruktūros įrengimą	vnt.	1	1,0	100,0					
Triukšmą mažinančių langų keitimas	%	100	100,0	100,0	32.650,45	0,13	32.499,05		
Triukšmą mažinančių langų keitimas	vnt.	157	157,0	100,0					
Ryšio ir kompiuterinė įranga Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	%	100	100,0	100,0	4.447,09	0,02	4.447,10		
Ryšio ir kompiuterinė įranga Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	vnt.	1	1,0	100,0					
Šalanos išleistuvo iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos	%	100	100,0	100,0	101.367,01	0,01	101.367,01		
Šalnos išleistuvo iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos	vnt.	1	1,0	100,0					
Techninė priežiūra VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	%	100	100,0	100,0	178.363,27	0,73	178.363,27		
Techninė priežiūra****	%	100	97,0	97,0	343.501,35	1,40	343.501,35		
Nepaaiškintos lėšos					155.436,02	0,59			
IŠ VISO					24.537.021,59	100,00	24.393.585,53	99,4	99,4
								Bendras finansinės įgyvendinimo lygis	Bendras fizinės įgyvendinimo lygis

* Pateiktos išlaidų kategorijos, patvirtintos 2010 m. birželio 2 d. EK sprendimu Nr. K(2010)3625 (fizinis rodiklis "Konteineriai buitinių ir pavojingų atliekų surinkimui" pateiktas pagal 2010 m. gruodžio 23 d. Finansų ministerijos raštą Nr. ((4.51-08)-6K-10F1458) EK patvirtintą pranešimą);

** Apima 100% visų tinkamų finansuoti išlaidų

*** Finansinis įgyvendinimas pagal kiekvieną sutarčių komponentą nenurodytas, kadangi toks sumokėtų lėšų išskirstymas yra labai sudėtingas nes avansai neįskaičiuoti. Pagal darbų sutarčių sąlygas, iš kiekvieno tarpinio mokėjimo pažymos sumos yra grąžinamas sumokėtas avansas ir sulaikomi pinigai. Grąžinimo ir sulaikymo dydis yra nustatomas kiekviename darbų rangos sutartyje. Norint išskirti sumokėtą sumą pagal kiekvieną sutarties komponentą, sugrąžinto avanso ir sulaikytų pinigų sumos taip pat turėtų būti išskaidytos kiekvienam komponentui. Dėl šios priežasties rangovų teikiamos sąskaitos ir tarpinio mokėjimo pažymos pasidarytų labai sudėtingos. Be to, sutartyje numatyti bendrojo pobūdžio darbai apima visus komponentus, todėl jų paskirstymas atskiriems komponentams yra neįmanomas.

**** Projekto išlaidų tinkamumo laikotarpis baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., o techninės priežiūros sutartis baigiasi 2011 m. lapkričio 13 d. Išlaidos, susijusios su šiuo projekto išlaidų tinkamumo laiko neįvykdytu paslaugų dalimi, apmokėtos pakeitimo paramos gavėjo lėšomis. Po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos (2010 m. gruodžio 31 d.) iki 2011 m. lapkričio 13 d. teikiamos sutarčių "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba" Nr. A/2007/K/38 ir "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" A/2007/K/40 techninės priežiūros paslaugos (defektų laikotarpis).
Atsižvelgiant į tai, techninės priežiūros fizinis įgyvendinimas iki 2010-12-31 yra 97,0%.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Cepelėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

2.7. Projekto patikros

Lentelė 25. Projekto patikros

Eil. Nr.	Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos išvados
1.	2007-09-28	Viešųjų pirkimų tarnyba	Pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) išvados jau įvykusiems viešiesiems pirkimams „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra" (pirkimo Nr.44360) ir „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos bei griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" (pirkimo Nr.51096), tačiau neįpareigojo nutraukti sutarties. APVA atsižvelgė į VPT pastabas, vykdydama tolimesnius viešuosius pirkimus. Konkurso sąlygų pavyzdinės formos pakeistos 2007-10-09
2.	2008-12-01 iki 2008-12-12	Europos audito rūmai	Tikrintas projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" 2004/LT/16/C/PE/001 Ataskaita gauta 2009-06-02. ▪ Atliktas sutarties Nr. A/2007/Z/32 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" patikrinimas. Pastabos: 1. Pasibaigus pasiūlymo teikimo terminui tik viena įmonė atitiko mažiausius kvalifikacinius reikalavimus, t.y. buvo akredituota statyti sąvartynus. 2. Vertinimo komitetas savo iniciatyva paprašė pasiūlymų teikėjų pateikti daugiau informacijos apie tai, kad kiti pasiūlymų teikėjai kreipėsi dėl jų sertifikatų išplėtimo įtraukiant sąvartynų statybą. 3. Perkančioji organizacija (APVA) atšaukė pradinį vertinimo komiteto sprendimą sudaryti sutartį su konsorciumu UAB "Statovita" ir UAB "Laugisa" be jokio raštiško pagrindimo. 4. Sprendimas atmesti mažiausios kainos pasiūlymą ir vėlesnis sprendimas dėl sutarties sudarymo tokai pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB. ▪ Atliktas sutarties Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" patikrinimas. Pastabos: 1. Perkančioji organizacija priėmė skirtingus sprendimus dėl vienodos rūšies skundo dėl neatitikties mažiausiems kvalifikaciniams reikalavimams: vienu atveju skundas perduotas vertinimo komitetui, o kitais atvejais pati perkančioji organizacija

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

			išnagrinėjo skundą ir aiet paprašė, kad konkurso dalyvis, su kuriuo vertinimo komisetas jau sudarė sutartį, pateiktų paaiškinimus. 2. Išorės ekspertas vertintojas informavo perkančiąją organizaciją, jai pačiai paprašius, kad laimėjusio pasiūlymo kaina yra mažesnė nei rinkos sąlygomis. Nepaisant to, perkančioji organizacija nusprendė nesiimti jokių veiksmų. 3. Perkančioji organizacija neveikė skaidriai. EK 2010 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. REGIO B3 MB/ba D(2010) 990431 pateikė LR Finansų ministerijai parengtą Europos audito rūmų atstovų pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų apžvalgą, kurioje paprašė pateikti aukščiau nurodytų sutarčių Nr. A/2007/Z/32 ir Nr. A/2007/K/37 papildomus dokumentus, kad būtų galima priimti galutinę poziciją. Papildomi dokumentai pateikti, galutinė išvada dar nepateikta. • Išankstinės išmokos rangovams, paslaugų teikėjams buvo nuo 30 iki 40 % visos sutarties vertės, tokie dydžiai neatitinka įprastų rinkos sąlygų. EK 2010 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. REGIO B3 MB/ba D(2010) 990431 pateikė LR Finansų ministerijai parengtą Europos audito rūmų atstovų pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų apžvalgą, kurioje nurodė, kad šią pastabą valstybės narė pagrindė ir šis pastebėjimas yra laikytas nagrinėti.
3.	2009-01-27	APVA	Tikrinta sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba" Nr. A/2007/K/38 Išvados: Patikros metu trūkumų nenustatyta. Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais bei kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą versle įmonėse. Pastabos ir rekomendacijos galutiniam pirkimo gavėjui: Ištaisyti apskaitoje nurodytus statybos žurnalo pildymo trūkumus. Rangovas ir statybos techninės priežiūros atstovai informuoti apie nustatytus trūkumus pildant statybos žurnalus, atlikta žurnalų patikra, ištaisyti trūkumai.
4.	2009-08-31 2009-10-02	LR Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba	Tikrintas projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" 2004/LT/16/C/PE/001 Išvados: 1.AM tinkamai vykdo tarpinės institucijos funkcijas; 2.APVA neužtikrino tinkamų finansavimo išlaidų kontrolės; 3.Tikrinto atveju į Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą suvesta visa informacija,

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėlienė

sanglaudos fondas

			neatitikimų nenustatyta. 4.Audito apimtyje tikrinti darbai atlikti, neatitikimų nenustatyta. 5. Galutinis paramos gavėjas – Kauno RATC, tinkamai vykdo jam paskirtas Projekto įgyvendinimo funkcijas. Rekomendacijos: 1.APVA užtikrinti, kad netinkamomis pripažintos lėšos būtų grąžintos ir apie įvykdytus informuoti atitinkamas institucijas; 2. Viešųjų pirkimų komisija sudaryta vadovaujantis parengtų Pirkimo dokumentų nuostatomis, kurios prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1p. nuostatomis „Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą..." bei Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 1p. nuostatomis, kur Perkančioji organizacija pirkimui organizuoti ir atlikti privalo sudaryti Viešųjų pirkimų Komisiją.
5.	2009-10-22	APVA	Tikrinta sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" Nr. A/2007/K/37 Išvada: Daugumą sutartyje numatytų darbų yra įvykdyti, Inžinieriaus bei Užsakovo atstovas teigia, kad atlikta daugiau, kaip 95 proc. visų numatytų darbų. Patikros metu buvo pateikti trijų statomo sąvartyno kaupimo laukų valstybinės komisijos pripažinimo tinkamais naudoti aktai: 3B (2008-09-11), 2D (2008-10-09), 2E (2009-07-01). Dalis sąvartyno yra eksploatuojama. Patikros dieną darbai dar vyko. Oficiali darbų baigimo data yra 2009-11-10, tačiau Inžinieriaus ir Rangovo teigimu darbai iki šios datos nebus baigti, nes atlikinėjami darbai, pagal Užsakovo pakeistas techninio projekto dalis. Tačiau kyla abejonių dėl šių pakeitimų, kurie nėra patvirtinti APVA pagal esamą tvarką. Atsitiktinės atrankos būdu pasirinkta ir patikrinta sąvartyno vandentiekio V2 ketinių 200 mm vamzdžių montavimas (20 m), atliktų darbų akto Nr.13, 6.2.5 pozicija. Šie darbai užfiksuoti statybos darbų žurnale ir pasirašyti techninės priežiūros inžinieriaus, nors įrodymų, kad jie atlikti patikros vietoje metu nebuvo. Apžiūrėjus vietą, nerasta šių darbų atlikimo požymių, nepateikta išpildomoji dokumentacija, nip pat nerasta užaktuotų prie tikrintos vamzdynų sistemos tarpinčių būti geležbetoninių šulinių. Patikros metu nebuvo pateikti įrodymai, kad subrangovų atliekamų darbų kaina neviršija numatytos 40 proc. sutarties kainos ribos. Nebuvo pateiktas Inžinieriaus ir užsakovo suderinimas dėl subrangovo UAB „Consena". Taip pat patikros metu nustatyta, jmulkūs statybos darbų žurnalo pildymo trūkumai. Buvo siūlyta inicijuoti pažeidimo tyrimą dėl atliktų

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

			darbų akte deklaruotų, o faktiškai neatliktų darbų. Taip pat rekomenduota ištirti Rangovo atliekamų darbų, pagal užsakovo iniciatyva pakeisto techninio projekto dalis, pagrįstumą. Pastabos ir rekomendacijos galutiniam paramos gavėjui: 1) Per 5 darbo dienas nuo šios ataskaitos gavimo dienos pateikti Užsakovo ir Inžinieriaus rašiškus paaiškinimus dėl atliktų darbų akto ir faktinės situacijos neatitikimo; 2) Per 5 darbo dienas pateikti Užsakovo rašiškų paaiškinimą, kodėl buvo inicijuoti techninio projekto pakeitimai, ar jie yra būtini ir pagrįsti; 3) Per 5 darbo dienas pateikti Inžinieriaus patvirtintą informaciją apie visų subrangovų atliekamų darbų kainos dalį procentine išraiška; 4) Per 5 darbo dienas pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo suderinimą dėl subrangovo UAB „Consena" sudarinimo; 5)Įpareigoti Rangovą ištaisyti statybos darbų žurnalo pildymo trūkumus. Įgyvendinant audito rekomendacijas ir nurodymus: 1. Pateikta medžiaga ir paaiškinimai, įrodantys atliktų darbų akto ir faktinės situacijos neatitikimo nebuvimą; 2. Pateikti paaiškinimai dėl inicijuotų techninio projekto pakeitimų; 3.Pateikta Inžinieriaus patvirtinta informacija apie visų subrangovų atliekamų darbų kainos dalį procentine išraiška; 4. Pateiktas suderinimas dėl subrangovo UAB „Consena"; 5. Rangovas įpareigotas ištaisyti statybos darbų žurnalo pildymo trūkumus, vykdyta žurnalų pildymo patikra.
6.	2008-10-15	APVA	Atliktas sutarties Nr. A/2007/Z/32 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Žaliosios regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir grioviuo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" patikrinimas. Išvados: Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, versio apskaitos standartais bei kitais norminiais aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą versio įmonėse. Sutarties veikla įgyvendinama, laikantis sutartinių įsipareigojimų. Pastabos: Užsakovas turi paskirti atsakingą asmenį, kuris kontroliuotų atliktų darbų aktuose nurodytus kiekius bei sumas nuo statybos darbų pradžios, derinant su projekto patvirtinta sąmata bei pakeitimo nurodymais. Paramos gavėjas kartu su jo atstovu (Inžinieriumi) turi patikrinti, kaip vykdomos aikštelių

KONTROLĖS IR VIEŠTURO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Cuvejienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

			nurodytos pastabos dėl smulkių netikslumų statybos žurnaluose pašalinimo. Įgyvendinant audito rekomendacijas ir nurodymus: 1.Užsakovas yra paskyręs atsakingą asmenį, kuris kontroliuotų atliktų darbų aktuose nurodytus kiekius bei sumas nuo statybos darbų pradžios. 2.Rangovas ir inžinierius papildomai informuoti susirinkimų statybos aikštelėse metu dėl smulkių neatitikimų statybos žurnaluose, vykdyta pastovi statybos žurnalų patikra.
7.	2009-10-23	APVA	Tikrinta sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" Nr. A/2007/K/40. Išvados: Patikros metu nebuvo nustatyta esminių pažeidimų, dėl kurių sutartis būtų neįgyvendinta. Tačiau iškilo abejonių, ar visi darbai bus baigti iki sutartyje numatytos datos 2009.12.28. Atsilieka Budnikų sąvartyno darbai Kaišiadorių raj., sustabdyti darbai Žingaičių, Pajieslio, Dotnuvos sąvartynuose Kėdainių rajone. Nėra aišku ar darbai vykdyti Morkūnų, Krusnio sąvartynuose Kaišiadorių rajone bei Pavermenio sąvartyne Kėdainių rajone. Apžiūrėjus Digrių sąvartyną Kauno rajone ir Tarpuniškio sąvartyną Kaišiadorių rajone įsitikinta, kad šiuose objektuose darbai yra baigti, pastatytos atminimo lentos. Pastabos ir rekomendacijos galutiniam pranešimo gavėjui: 1) Per 10 darbo dienų atsiųsti APVA'i išsamesnį paaiškinimą kodėl vėluoja sąvartyno Budnikų k. Kaišiadorių raj. ir kada numatoma baigti šio sąvartyno uždarymą; 2) Per 10 darbo dienų atsiųsti APVA'i paaiškinimus dėl situacijos Morkūnų, Krusnio sąvartynuose Kaišiadorių rajone ir Pavermenio sąvartyne Kėdainių rajone. Įgyvendinant audito rekomendacijas ir nurodymus: 1.Pateiktas paaiškinimas Budnikų sąvartyno uždarymo darbų vėlavimo bei numatomų atlikimo terminų; 2.Pateikti paaiškinimai dėl situacijos Morkūnų, Krusnio sąvartynuose Kaišiadorių rajone ir Pavermenio sąvartyne Kėdainių rajone.

2.8. Projekto pažeidimai

Įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 (toliau – Projektas), Aplinkos projektų valdymo agentūra užregistravo penkis įtarimus dėl pažeidimų, dėl kurių buvo atlikti tyrimai:

1. 2009 m. lapkričio 18 d. atliktas pažeidimo tyrimas dėl Projekto sutarties „Kompiuterinės įrangos įsigijimas vienai darbo vietai Kauno regiono atliekų tvarkymo centre" Nr. 06-18 lėšų

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

sanglaudos fondas

tinkamumo. Atlikus pažeidimo tyrimą nustatyta, jog išlaidos, patirtos įsigyjant skaitmeninį daugiafunkcinį kopijavimo aparatą, kompiuterinę buhalterinę apskaitos programą, skaitmeninį fotoaparatą, skaitmeninį diktofoną, nešiojamąjį kompiuterį, USB atmintinę, dokumentų įrišimo aparatą, dokumentų naikiklį, pastatomą konferencinę magnetinę lentą ir pastatomą seifą, t.y. 4.206,73 EUR negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, nes pažeidžia Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 26 str. nuostatas. 2009 m. lapkričio 30 d. šios lėšos buvo grąžintos į Valstybės iždo sąskaitą.

2. 2011 m. vasario 23 d. buvo atliktas tyrimas Projekto sutartyje Nr. Nr. A/2007/K/37 „ Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" nustatytų galimi neatitikimų tarp atliktų darbų akte deklaruotų ir faktiškai atliktų darbų (sąvartyno vandentiekio V2 ketinių vamzdžių montavimo darbai užfiksuoti 2009 m. liepos 15 d. statybos darbų žurnale, tačiau patikros metu nerasta šių darbų atlikimo požymių, nepateikta išpildomoji dokumentacija, taip pat nerasta užaktuotų prie tiekiamos vamzdynų sistemos turinčių būti gelžbetoninių šulinių). Siekiant įsitikinti, ar pažeidimas tikrai buvo padarytas, projekto vykdytojui buvo nurodyta pateikti paaiškinimus dėl atliktų darbų akte nurodytos informacijos ir faktinės situacijos neatitikimo. Projekto vykdytojas informavo, jog patikros metu nebuvo sudaryta galimybė apžiūrėti įrengtų ketinių vamzdžių ir jų tęsinyje esančių šulinių, kadangi ant šulinių buvo uždėti gelžbetoniniai dangčiai, siekiant apsaugoti metalinius. Toliau vykdant aikštelės užpylimo planiravimo darbus, šulinių dangčiai dėl neatsargumo buvo užpilti žemėmis. Kaip įrodymus, kad darbai buvo atlikti, projekto vykdytojas pateikė darbų išpildomąsias nuotraukas bei šulinių korteles. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nutarta, jog įtarimas dėl pažeidimo nepasitvirtino.

3. 2011 m. gegužės 31 d. buvo atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Projekto rangos sutartyse Nr. A/2007/Z/32, Nr. A/2007/K/37, Nr. A/2007/K/38, Nr. A/2007/K/40 numatytų išlaidų, skirtų informaciniams stendams įrengti ir prižiūrėti, tinkamumo. Pagal rangos sutartį Nr. A/2007/Z/32 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Žaliešiškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba" 2008 m. sausio mėn. pastatytame informaciniame stende nurodyta projekto vertė neatitinka projekto vertės nacionaline verte, nustatytos Europos Komisijos sprendime skirti šiam projektui Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų, stende paskelbti objekto statybos darbų įgyvendinimo terminai, o ne viso projekto įgyvendinimo terminai. Pagal rangos sutartį Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" 2008 m. sausio mėn. pastatytame informaciniame stende nurodyta projekto vertė neatitinka projekto vertės nacionaline verte, nustatytos Europos Komisijos sprendime skirti šiam projektui Sanglaudos fondo lėšų, stende paskelbti objekto statybos darbų įgyvendinimo terminai, o ne viso projekto įgyvendinimo terminai. Pagal rangos sutartį Nr. A/2007/K/38 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba" 2008 m. vasario – birželio mėnesiais, o Raudondvario pl. 155D, Kaune – 2010 m. lapkričio mėn., prie atliekų priėmimo aikštelių pastatytuose informaciniuose stenduose (iš viso jų įrengta – 6) nenurodyta teisinga projekto vertė pagal Europos Komisijos sprendimą skirti šiam projektui Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų, stenduose paskelbti objekto statybos darbų įgyvendinimo terminai, o ne viso projekto įgyvendinimo terminai. Pagal rangos sutartį Nr. A/2007/K/40 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" 2009 m. sausio mėn. pastatytuose informaciniuose stenduose (iš viso jų įrengta – 5) nenurodyta projekto vertė pagal Europos Komisijos sprendimą skirti šiam projektui Sanglaudos fondo lėšų, tik sutarties vertė, paskelbti objekto statybos darbų įgyvendinimo terminai, o ne viso projekto įgyvendinimo terminai.

Atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą, nutarta, kad užfiksuoti Projekto neatitikimai negali būti traktuojami kaip pažeidimai, todėl visos informaciniams stendams įrengti ir prižiūrėti rangos

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė 2011-06-23



sutartyse Nr. A/2007/Z/32 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba“, Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba“, Nr. A/2007/K/38 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba“, Nr. A/2007/K/40 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas“ numatytos išlaidos, laikytinos tinkamomis finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis.

4. 2011 m. birželio 9 d. atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Projekto sutarties Nr. A/2007/K/24 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra“ lėšų, išmokėtų pagal banko garantiją, tinkamumo. Atlikus pažeidimų tyrimą, nustatyta, kad dalis lėšų, paslaugų tiekėjui išmokėtų pagal pateiktą garantiją ir kurių vertė lygi nesuteiktų paslaugų apimčiai, negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Nustatyta netinkamų finansuoti bei grąžintinų lėšų suma – 5.744,76 EUR. Lėšų susigrąžinimo procedūra nebuvo inicijuojama, nes jos buvo užskaitytos EK Sprendimą viršijančių lėšų dalimi.

5. 2011 m. birželio 15 d. atliktas įtariamo pažeidimo tyrimą dėl Projekto nacionalinėse ir regioninėse visuomenės informavimo priemonėse įgyvendintų (spaudoje paskelbtų) privalomų viešinimo priemonių tyrimą. Patikrinus projekto galutinę ataskaitą, buvo nustatyta, kad nacionalinėse ir regioninėse visuomenės informavimo priemonėse publikuoti informaciniai straipsniai neatitinka 2004 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 621/2004, nustatančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su Sanglaudos fondo veikla, (toliau – Reglamentas 621), ir Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklėse, patvirtintose 2006 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1043 (*Žin.*, 2006, Nr. 114-4351, toliau – Viešinimo taisyklės), privalomoms viešinimo priemonėms (visuomenės informavimo priemonėse skelbiamai informacijai) keliamų reikalavimų.

Atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą nutarta, kad nacionalinėse ir regioninėse visuomenės informavimo priemonėse publikuoti informaciniai straipsniai nevisiškai atitinka Reglamente 621 ir Viešinimo taisyklėse privalomoms viešinimo priemonėms (visuomenės informavimo priemonėse skelbiamai informacijai) keliamus reikalavimus, bet atsižvelgiant į tai, kad visos šios projekto spaudoje paskelbtos viešinimo priemonės buvo įgyvendintos tik galutinio paramos gavėjo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis, neskyrus Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų, dėl minėtų nustatytų viešinimo pažeidimų finansinės korekcijos projekto galutiniam paramos gavėjui nebus taikomos.

Projekto Galutinėje ataskaitoje nurodyti finansinės analizės duomenys pateikti jau įvertinus šiuose įgyvendinant Projektą nustatytuose pažeidimuose grąžintas ir grąžintinomis pripažintas lėšų sumas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

3. FINANSINĖ IR EKONOMINĖ ANALIZĖ

3.1. Projekto išlaidos

Analizuojamos projekto išlaidos apima Kauno RATC dėl projekto įgyvendinimo patirtas išlaidas ir atliktus apmokėjimus.

Lentelė 26. Projekto vertė ir finansavimo šaltiniai (pagal atliktus mokėjimus).

Tik EK sprendimo Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.) neviršijanti dalis

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Planuota		Įvykdyta	
		EUR (be PVM)	%	EUR (be PVM)	%
1.	SF programa (ES lėšos)	13.824.000,00	75,00	13.714.922,96	99,21
2.	Bendrojo finansavimo (Valstybės biudžeto lėšos)	3.686.400,00	20,00	3.651.565,52	99,06
3.	Galutinio paramos gavėjo lėšos	921.600,00	5,00	920.075,46	99,83
	Iš viso projektui	**18.432.000,00**		**18.286.563,94**	**99,21**

Pradiniame sprendime finansuoti projektą, visos jo investicijos arba tinkamos išlaidos buvo įvertintos 18.432,0 tūkst. EUR (63.642,0 tūkst. Lt). Įvertinus pradinio sprendimo investicijų biudžetą viršijančią sumą, projekto faktinės investicijų bendrosios išlaidos siekia 24.397,3 tūkst. EUR (84.239,1 tūkst. Lt), tinkamos finansuoti projekto išlaidos – 24.391,6 tūkst. EUR (84.219,3 tūkst. Lt).

Lentelė 26/1. Projekto išlaidų suskirstymas pagal išlaidų kategorijas

Išlaidų kategorija	**Iš viso išlaidų, padarytų (nuo 2004/07/30 iki 2010/12/31), EUR**	**Iš viso suplanuotų išlaidų (pradinis biudžetas), EUR**	**Išlaidos, padarytos iki dabar, kaip pradinio biudžeto dalis (%)**
1. Planavimas			
2. Žemės įsigijimas	101.367,01	101.367,01	100,00

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

3. Statybvietės paruošimas	0,00	0,00	0,00
4. Statyba	23.763.906,80	17.752.484,85	133,86
5. Įranga	4.447,10	8.653,82	51,39
6. Techninė pagalba	521.864,62	569.494,32	91,64
7. Viešumas	0,00	0,00	0,00
8. PVM arba lygiavertis mokestis			
9. Nenumatytos išlaidos	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**24.391.585,53**	**18.432.000,00**	**132,33**

Projekto komponentų vertės, bendra atliktų mokėjimų suvestinė bei Projekto vykdytojų (rangovų, paslaugų teikėjų) mokėjimų suvestinės pateiktos lentelėse 27, 28 ir 29.

Lentelė 27. Projekto komponentų vertės.

Eil. Nr.	Projekto vykdytojas (rangovas, paslaugų teikėjas)	Sutarties pavadinimas, Nr.	EK sprendimo Nr. K(2010)3625 (2010-06-02) neviršijanti dalis			EK sprendimą Nr. K(2010)3625 (2010-06-02) viršijanti dalis		Iš viso
			SF dalis	Nacionalinis kofinansavimas	Paskola/Nuosavos lėšos	Nacionalinis kofinansavimas	Paskola/Nuosavos lėšos	
1	UAB "Narbotas ir Ko"	Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, sutarties Nr.2006/8/IPK/PT/LT	2.208,62	736,21				2.944,83
2	UAB "Sekolda"	Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, sutarties Nr.06-18	4.281,74	1.427,25				5.708,99

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

3	UAB "Via Regia"	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: naujų trūkstamų izoliuojančių luitų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams, sutarties Nr. A/2006/K/14	2.434,59	8.114,86				32.459,45
4	AB "Lietuvos energija"	Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos sutartis, sutarties Nr. 966-07	917.553,77	305.851,26				1.223.405,03
5	AB "VST"	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: 10 KV ETT orinės linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimas, sutarties Nr.Nr.2008/37/ND/P/LT (IŠK-07-02-9055)	20.142,88	6.714,30				26.857,18
6	UAB "COWI Lietuva"	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, sutarties Nr.2006/96/A/K/LT	155.493,37	51.831,12				207.324,49
7	UAB "Kamesta"	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba, sutarties Nr. A/2007/Z/32	3.207.330,25	1.069.110,08				4.276.440,33
8	UAB "Sweco Lietuva"	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra, sutarties Nr. A/2007/K/24	271.627,37	90.542,46				362.169,83
9	UAB "Luidas" ir UAB „Kauno keliai", jungtinės veiklos sutarties pagrindu	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas, sutarties Nr. A/2007/K/40	4.215.258,32	1.405.086,10				5.620.344,42

FINANSŲ MINISTERIJA
SANGLAUDOS, EKONOMINĖS PLĖTROS IR TURTO SKYRIUS
VILNIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

10	UAB "Sienojus" ir UAB „Laugina", jungtinės veiklos sutarties pagrindu	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba, sutarties Nr. A/2007/K/37	4.284.481,53	558.717,94	869.443,59	2.697.269,21	1.798.179,47	10.208.090,75
11	AB "Rasėnių mašinacija" ir UAB „Laugina", jungtinės veiklos sutarties pagrindu	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba, sutarties Nr. A/2007/K/38	780.847,50	208.226,00	52.656,59	1.368.446,82	912.297,87	3.321.874,69
12		Šeimos iškėlimas iš Žabiečiškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos	76.025,26	25.341,75				101.367,01
	Iš viso:		**13.959.595,20**	**3.731.698,43**	**921.500,00**	**4.065.716,03**	**2.710.477,34**	**25.388.987,00**

Lentelė 28. Bendra vykdytų darbų / suteiktų paslaugų pagal sutartis mokėjimų suvestinė

Eil. Nr.	Projekto komponento pavadinimas	Bendra projekto vertė pagal sutartį EUR (be PVM)	Išmokėta pagal sutartį bendra lėšų suma, EUR (be PVM)	Likusi neišmokėta pagal sutartį bendra lėšų suma, EUR (be PVM)	Netinkamos finansuoti išlaidos
1	Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, sutarties Nr.2006/8/TPK/PT/LT	2.944,83	2.944,84	-0,01	
2	Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, sutarties Nr.06-18	5.708,99	1.502,26	0,00	4.206,73
3	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: naujų triukšmą izoliuojančių langų įstigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams, sutarties Nr. A/2006/K/14	32.459,45	32.459,45	0,00	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

62

sanglaudos fondas

4	Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos sutartis, sutartis Nr. 966-07	1.223.403,03	1.222.323,09	1.079,94	
5	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: 10 KV ETT oriniu linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimas, sutarties Nr.Nr.2008/37/ND/P/LT (IŠK-07-02-0055)	26.857,18	25.808,18	1.049,00	
6	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, sutarties Nr.2006/96/A/K/LT	207.324,49	178.363,27	28.961,22	
7	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba, sutarties Nr. A/2007/Z/32	4.276.440,33	4.097.775,64	178.664,69	
8	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra, sutarties Nr. A/2007/K/24	362.169,83	343.501,35	12.923,72	5.744,76
9	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas, sutarties Nr. A/2007/K/40	5.620.344,42	5.526.698,16	93.646,26	
10	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba, sutarties Nr. A/2007/K/37	10.208.090,75	9.686.733,56	521.357,19	
11	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba, sutarties Nr. A/2007/K/38	3.321.874,69	3.172.106,72	149.767,97	
12	Šeimos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos	101.367,01	101.367,01	0,00	
Iš viso:		25.388.987,00	24.391.385,53	987.449,98	9.951,49

TIKRA
Alytaus Apskrities

63

2011 -06- 23



Lentelė 29. Projekto vykdytojų (rangovų, paslaugų teikėjų) mokėjimų suvestinė

Sutarties pavadinimas: Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui

Sutarties Nr. 2006/S/IPK/PT/LT

	Mokėjimų šaltinis				
Sąskaitos Nr.	SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Nr.1, 2006 05 09	2.208,63	736,21		2.944,84	2006 05 25
Išmokėta suma (EUR be PVM)	2.208,63	736,21		2.944,84	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)*	-0,01	0,00		0,00	

*- iš SF permokėta 0,01 EUR.

Sutarties pavadinimas: Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui

Sutarties Nr. 06-18

	Mokėjimų šaltinis					
Sąskaitos Nr.	Sanglaudos fondo dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Netinkamos finansuoti išlaidos *	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)		
Nr.2, 2006 07 11	1.126,69	375,57		1.502,26	4.206,73	2006 08 24
Išmokėta suma (EUR be PVM)	1.126,69	375,57		1.502,26	4.206,73	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00		

* Netinkamos finansuoti išlaidos iš Sanglaudos fondo – 3.155,05 EUR, Bendrojo finansavimo lėšos – 1.051,68 EUR.

TIKRA
Aldona Ceplėjienė
2011 -06- 23



Sutarties pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: naujų triukšmą izoliuojančių langų įstiklinimas ir pakeitimas Lopšių gyvenvietės gyventojams

Sutarties Nr. A/2006/K/14

Sąskaitos Nr.	Mokėjimų šaltinis: SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Nr.3, 2006 11 14	24.344,59	8.114,86		32.459,45	2006 12 06
Išmokėta suma (EUR be PVM)	24.344,59	8.114,86		32.459,45	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0	

Sutarties pavadinimas: Elektros įrenginių perkėlimo paslaugos sutartis

Sutarties Nr. 966-07

Sąskaitos Nr.	Mokėjimų šaltinis: SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Nr.966-07/1, 2007 12 28	458.776,88	152.925,63		611.702,51	2007 12 29
Nr.966-07/2, 2008 09 08	367.021,51	122.340,50		489.362,01	2008 09 26
Nr.966-07/3, 2008 09 30	90.945,43	30.315,14		121.260,57	2008 11 24
Išmokėta suma (EUR be PVM)	916.743,82	305.581,27		1.222.325,09	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	809,95	269,99		1.079,94	

TIKRA
Aldona Čepėjienė
65
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

Sutarties pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: 10 KV ETT artinės linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimas

Sutarties Nr. 2008/37/ND/P/LT (ISK-07-02-0055)

	Mokėjimų šaltinis				
Sąskaitos Nr.	SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Nr.1, 2008 10 30	8.057,15	2.685,72		10.742,87	2008 11 10
Nr.2, 2009 02 26	11.298,98			11.298,98	2009 05 08
		3.766,33		3.766,33	2009 05 11
Išmokėta suma (EUR be PVM)	19.356,13	6.452,05		25.808,18	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	786,75	262,25		1.049,00	

Sutarties pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui

Sutarties Nr. 2006/96/A/K/LT

	Mokėjimų šaltinis				
Sąskaitos Nr.	SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
ADV Nr.206289, 2006 12 22	62.197,35	20.732,45		82.929,80	2006 12 29
Nr.207306, 2007 12 10	6.971,67	2.323,89		9.295,56	2007 12 19
Nr.208043, 2008 02 13	1.889,21	626,74		2.586,95	2008 03 03
Nr.208253, 2008 08 18	33.483,25	11.161,09		44.644,34	2008 09 08
Nr.209042, 2009 02 25	10.697,84	3.565,95		14.263,79	2009 03 27
Nr.209460(5), 2009 12 07	18.542,12	6.180,71		24.722,83	2009 12 28
Išmokėta suma (EUR be	133.772,44	44.590,83		178.363,27	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepkėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

PVM)					
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	21.720,93	7.240,29		28.961,22	

Sutarties pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir grievimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba

Sutarties Nr. A/2007/Z/32

	Mokėjimų šaltinis				
Sąskaitos Nr.	SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Nr. 1, 2007 11 22	962.199,07	320.733,00		1.282.932,10	2007 11 28
Nr.2, 2008 06 30	144.388,21	48.129,41		192.517,62	2008 08 21
Nr.3, 2008 08 29	117.619,77	39.206,58		156.826,35	2008 10 27
Nr.4, 2008 09 30	155.379,46			155.379,46	2008 11 24
		45.338,49		45.338,49	2008 12 15
		6.454,67		6.454,67	2008 11 28
Nr.5, 2008 10 31	380.229,27			380.229,27	2008 12 10
		126.743,08		126.743,08	2009 01 21
Nr.6, 2008 11 28	209.072,99			209.072,99	2009 01 21
		69.690,99		69.690,99	2009 01 22
Nr.7, 2009 03 31	129.776,95			129.776,95	2009 05 08
		43.258,98		43.258,98	2009 05 11
Nr.8, 2009 04 30	182.314,81	60.771,60		243.086,41	2009 06 09
Nr.9, 2009 05 29	195.491,46	65.163,82		260.655,28	2009 07 28
Nr.10, 2009 07 31	194.692,38	64.897,45		259.589,83	2009 10 12
Nr.11, 2009 09 30	80.606,91	26.868,97		107.475,88	2009 11 12
Nr.12, 2009 11 16	14.227,29	4.742,43		18.969,72	2009 12 17
Nr.13, 2009 11 26	153.666,59	51.222,20		204.888,79	2009 12 21

TIKRA

Aldona Čepėjienė

2011 -06- 23

sanglaudos fondas

Nr.14, 2009 12 15	153.666,58	51.222,20		204.888,78	2009 12 31
Išmokėta suma (EUR be PVM)	3.073.351,74	1.024.443,90		4.097.795,64	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	133.998,51	44.666,18		178.664,69	

Sutarties pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas

Sutarties Nr. A/2007/K/40

	Mokėjimų šaltinis				
Sąskaitos Nr.	SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Nr. 1, 2008 10 09	1.264.577,48	421.525,83		1.686.103,31	2008 10 27
Nr.2, 2009 02 27	287.806,27			287.806,27	2009 04 28
		69.150,39*		69.150,39	2009 04 28
		26.785,07		26.785,07	2009 04 16
Nr.3, 2009 04 30	413.430,70	137.810,23		551.240,93	2009 06 12
Nr.4, 2009 05 29	185.870,11	61.956,70		247.826,81	2009 07 24
Nr.5, 2009 06 26	158.421,88	52.807,29		211.229,17	2009 08 28
Nr.6, 2009 07 28	209.998,68	69.999,36		279.997,44	2009 09 23
Nr.7, 2009 08 31	456.538,45	152.179,48		608.717,93	2009 10 28
Nr.8, 2009 10 30	420.197,25	140.065,75		560.263,00	2009 12 17
Nr.9, 2009 11 30	106.238,72	35.412,90		141.651,62	2009 12 24
Nr.10, 2010 01 29	62.497,05	20.832,34		83.329,39	2010 03 22
Nr.11, 2010 06 14	164.945,29	54.981,76		219.927,05	2010 08 19
Nr.12, 2010 07 01	207.251,18	69.083,73		276.334,91	2010 08 19
Nr.13, 2010 11 22	207.251,18	69.083,73		276.334,91	2010 12 15
Išmokėta suma (EUR be PVM)	4.145.023,64	1.381.674,52		5.526.698,16	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	70.234,68	23.411,58		93.646,26	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

2011 -06- 23



* 8.360,71 EUR buvo sumokėta iš paskolos, sukauptų nuo ES SF (ISPA programos) lėšų

Sutarties pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba

Sutarties Nr. A/2007/K/37

	Mokėjimų šaltinis						
	EK sprendimo Nr. K(2010)3625 (2010-06-02) neviršijanti dalis			EK sprendimo Nr. K(2010)3625 (2010-06-02) viršijanti dalis			
Sąskaitos Nr.	SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Nr. 1, 2007 12 27	1.136.650,51			1.923.776,72		3.060.427,23	2007 12 29
Nr.2, 2008 04 30	284.299,23	232.608,47				516.907,70	2008 07 02
Nr.3, 2008 05 30	139.326,12	113.994,09				253.320,21	2008 07 22
Nr.4, 2008 06 30	192.143,34	76.377,37				268.520,71	2008 08 22
			80.830,82			80.830,82	2008 08 28
Nr.5, 2008 07 31	122.638,04					122.638,04	2008 09 24
			100.340,22			100.340,22	2008 09 25
Nr.6, 2008 08 29	160.900,07					160.900,07	2008 10 31
			131.645,52			131.645,52	2008 11 06
Nr.7, 2008 09 30	234.061,93					234.061,93	2009 01 20
			193.577,27			193.577,27	2008 12 18
Nr.8, 2008 10 31	257.460,25					257.460,25	2009 01 20
			80.267,06			80.267,06	2008 12 22
Nr.9, 2008 11 29	353.175,06					353.175,06	2009 02 27
			194.413,72			194.413,72	2008 12 23
Nr.10, 2009 01 30	307.041,34					307.041,34	2009 03 27

KAUNO R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DE FACTO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

69

2011 -06- 23

Nr.11, 2009 03 31	245.732,46					245.732,46	2009 06 09
Nr.12, 2009 04 30	10.077,87					10.077,87	2009 06 25
					241.450,86	241.450,86	2009 07 10
Nr.13, 2009 05 29					373.214,74	373.214,74	2009 07 20
Nr.14, 2009 07 31					502.930,58	502.930,58	2009 10 09
Nr.15, 2009 09 30				338.093,74	236.325,39	574.419,13	2009 12 03
Nr.16, 2009 12 03	239.596,16	79.865,42		79.593,68		399.055,18	2009 12 31
					53.062,43	53.062,43	2010 01 25
Nr.17, 2010 03 23	297.552,77	27.935,85		23.204,85		348.693,47	2010 04 09
			43.472,18		92.455,94	135.928,12	2010 04 14
Nr.18, 2010 12 10	297.552,78	27.935,84		23.204,86		348.693,48	2010 12 20
			43.472,18		92.455,93	135.928,11	2010 12 28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	4.280.207,93	336.717,04	868.038,97	2.387.873,77	1591.915,85	9.686.753,56	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	4.273,60	0,00	1.424,53	309.395,44	206.263,62	521.357,19	

Sutarties pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba
Sutarties Nr. A/2007/K/38

	Mokėjimų šaltinis						
	EK sprendimo Nr. K(2010)3625 (2010-06-02) neviršijanti dalis			EK sprendimo Nr. K(2010)3625 (2010-06-02) viršijanti dalis			
Sąskaitos Nr.	SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
Nr. 1, 2007 12 28	780.847,50			215.714,91		996.562,41	2007 12 29
Nr.2, 2008 06 30		129.743,97				129.743,97	2008 09 01
Nr.3, 2008 07 31		52.533,24				52.533,24	2008 09 25

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2006/LT/16/C/PE/001
GALUTINĖ ATASKAITA

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -08- 23



			23.722,85			23.722,85	2008 09 25
Nr.4, 2008 08 29			13.082,42			13.082,42	2008 10 31
				73.739,24		73.739,24	2008 10 30
Nr.5, 2008 09 30				152.110,32		152.110,32	2008 11 19
					148.669,41	148.669,41	2008 11 26
Nr.6, 2008 10 31				141.979,09		141.979,09	2009 01 21
					132.745,94	132.745,94	2008 12 16
Nr.7, 2008 11 28				91.869,51		91.869,51	2009 02 19
					125.424,92	125.424,92	2008 12 31
Nr.8, 2009 02 27				31.846,76		31.846,76	2009 04 28
					47.770,12	47.770,12	2009 04 30
Nr.9, 2009 03 31				55.330,83		55.330,83	2009 06 05
					79.802,01	79.802,01	2009 06 03
Nr.10, 2009 04 30				62.329,75		62.329,75	2009 06 25
					41.553,17	41.553,17	2009 07 10
Nr.11, 2009 05 29				90.328,36		90.328,36	2009 07 20
					60.218,91	60.218,91	2009 07 17
Nr.12, 2009 06 30				39.286,75		39.286,75	2009 09 16
					26.191,16	26.191,16	2009 09 16
Nr.13, 2010 10 13		12.974,40		82.673,62		95.648,02	2010 11 08
			7.625,61		42.106,44	49.732,05	2010 11 11
Nr.14, 2010 12 08		12.974,39		82.673,63		95.648,02	2010 12 29
			7.625,61		42.106,44	49.732,05	2010 12 29
Nr. 15, 2010 12 13					88.168,48	88.168,48	2010 12 21
				176.336,96		176.336,96	2010 12 22
Išmokėta suma (EUR be PVM)	780.847,50	208.226,00	52.056,49	1.296.219,73	834.757,80	3.172.106,72	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	0,01	72.227,09	77.540,87	149.767,97	

Sutarties pavadinimas: Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninė priežiūra

Sutarties Nr. A/2007/K/24

Mokėjimų šaltinis

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

71



Sąskaitos Nr.	SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	EK sprendimą viršijanti dalis. Galutinio paramos gavėjo lėšos*	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)		
Nr.1, 2007 12 04	108.650,95	36.216,98		144.867,93		2007 12 27
Nr.SWE 684, 2009 05 29	67.906,84	22.635,61		90.542,45		2009 07 08
Nr.SWE 982, 2010 05 31	67.906,85	22.635,61		90.542,46		2010 07 12
Nr.SWE 1123, 2010 11 25	17.469,95	5.823,32		23.293,27		2010 12 28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	261.934,59	87.311,52		343.501,35	-5.744,76	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	9.692,78	3.230,94		18.668,48	5.744,76	

* Pagal sutartį Nr. A/2007/K/24 pripažinta netinkamomis finansuoti lėšomis 5.744,76 EUR. Šios lėšos užskaitytos iš pagal projektą Užsakovo apmokėtų EK sprendimo biudžetą viršijančių lėšų.

Sutarties pavadinimas: Šeimos išėjimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos

Sutarties Nr.

Sąskaitos Nr.	Mokėjimų šaltinis: SF dalis	Bendrojo finansavimo lėšos	Galutinio paramos gavėjo lėšos	Suma apmokėjimui	Mokėjimo data
/Sąskaitos data	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	(EUR be PVM)	
	76.023,26	25.341,75		101.367,01	2010 12 06
Išmokėta suma (EUR be PVM)	76.023,26	25.341,75		101.367,01	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	



Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2004/LT/16/C/PE/002
GALUTINĖ ATASKAITA

sanglaudos fondas

3.2. Ekonominės naudos analizė

3.2.1. Bendrosios skaičiavimų prielaidos

Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės bendrosios finansinių skaičiavimų prielaidos, kuriomis remiantis atliekama projekto finansinė ir sąnaudų–naudos analizė.

3.2.1.1.Projekto ataskaitinis laikotarpis

Projekto ataskaitinis laikotarpis, kuriam pateikiamos prognozės yra 20 metų. Šis laikotarpis nustatytas atsižvelgiant į pirminėje projekto analizėje naudotą laikotarpį, projekto įgyvendinimo prielaidas ir atitinka analogiškų projektų, įgyvendinamų Lietuvoje, analizių ataskaitinius laikotarpius. Pirmieji analizės projekto metai atitinka 2007 kalendorinius metus.

3.2.1.2.Diskonto norma

Projekto analizėje taikoma 6 proc. finansinė diskonto norma ir 5 proc. socialinė diskonto norma. Pasirinktos diskonto normos atitinka EK rekomenduojamas taikyti diskonto normas 2000–2006 m. SF projektams.

3.2.1.3.Bendros investicijų išlaidos

Bendros projekto investicijų išlaidos yra faktinės projekto investicijų išlaidos atliktos projekto įgyvendinimo metu ir nurodomos pamečiui, pagal jų atlikimo laiką. Skaičiavimai atliekami pagal realiai atliktų darbų vertę 2010-12-31 d.

3.2.1.4.Projekto veiklos išlaidos

Projekto veiklos išlaidos yra susijusios su projekto metu sukuriamo turto eksploatavimu ir patitiamos dėl to, kad yra įgyvendinamas projektas. Prie projekto veiklos išlaidų priskirtos ir pakartotinos investicijos, reikalingos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos susidėvėjusiems projekto metu sukurto turto dalims pakeisti (reinvesticijos). Į projekto veiklos išlaidas įtraukiamos tik tos išlaidos, kurios sąlygoja piniginių srautų atsiradimą. Projekto veiklos išlaidos nurodytos nekoreguojant jų dėl infliacijos.

3.2.1.5.Projekto pajamos

Projekto pajamos nustatytos kaip įplaukos, tiesiogiai sumokamos vartotojų už paslaugas, kurias sukuria projekto investicijos. Projekto pajamos nurodytos nekoreguojant jų dėl infliacijos.

3. 2.1.6.Likutinė vertė

Projekto analizėje (išskyrus projekto finansinio gyvybingumo vertinimą) likutinė vertė yra laikoma projekto pajamomis. Likutinė vertė nustatoma kaip projekto investicijų ir reinvesticijų vertė paskutiniaisiais ataskaitinio laikotarpio metais. Nustatant likutinę vertę, atsižvelgiama į projekto ataskaitinį laikotarpį ir įsigyto turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

3.2.2. Projekto investicijos

Apibendrinti duomenys apie projekto investicijas, finansavimo šaltinius remiantis projekto įgyvendinimo metu pasirašytomis sutartimis su rangovais bei galutinėmis atliktų darbų sumomis, pateikiami lentelėje 30.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėlienė

sanglaudos fondas

Lentelė 30. Projekto investicijos (įvykdyta darbų iki 2010-12-31)

Projekto investicijos		
	Vertė, tūkst. Lt	Vertė, tūkst. EUR
Lapių regioninio sąvartyno statyba	33.466,0	9.692,4
Atliekų priėmimo aikštelių statyba	11.054,1	3.201,5
Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir gręžinio atliekų perdirbimo aikštelių statyba	14.158,8	4.097,8
Sąvartynų išdėstymas	19.082,6	5.526,7
Elektros įrenginių perkėlimas (110 KV elektros linijos iškėlimas)	4.220,4	1.222,3
10 KV ETT oriniė linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimas	89,1	25,8
Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	615,9	178,4
Techninė priežiūra	1.205,9	349,2
Biuro baldų pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	10,2	2,9
Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	5,2	1,5
Naujų strūkšnį šviečiančių lempų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams	112,1	32,5
Šalmos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos	350,0	101,4
Projekto investicijos iš viso	84.369,3	24.432,4

Duomenys apie projekto investicijų grafiką 1–4 projekto metais pateikiami lentelėje 31. Projekto investicijos pamečiui išdėstytos pagal faktiškai atliktus darbus.

Lentelė 31. Projekto investicijų grafikas

Projekto investicijų grafikas					
	1	2	3	4	Iš viso
Investicijos iš viso, tūkst. Lt	132,3	37.549,4	39.131,8	7.546,8	84.369,3
Investicijos iš viso, tūkst. EUR	38,3	10.875,0	11.333,3	2.185,7	24.432,4
Investicijų dalis laike, proc.	0,2%	44,5%	46,4%	8,9%	100,0%

Numatoma, projekto veiklos išlaidas sudarys šios išlaidos:

- regioninių sąvartynų eksploatacija;
- atliekų perkrovimo stočių eksploatacija;
- APA eksploatacija;
- sąvartynų priežiūra ir monitoringas;
- RATC veiklos ir kitos išlaidos.

Projekto išlaidų skaičiavimų prielaidos yra numatytos atsižvelgiant į esamos situacijos analizę (pateikiamos faktinės išlaidos už 2009 metus, kurie atitinka 3 projekto metus), remiantis 2008 metais parengto verslo plano skaičiavimais ir panašių objektų veiklos rezultatais, taip pat atsižvelgiant į numatomo įgyvendinti projekto parametrus ir kitas prielaidas.

Skaičiuojant projekto išlaidas, daromos šios bendros prielaidos:

- projekto išlaidų skaičiavimuose į kainų pokyčius dėl infliacijos nėra atsižvelgiama, numatoma, kad kintamos projekto išlaidos atitiks keisis priklausomai nuo įgalaikio atliekų kiekio kitimo;

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėlienė



- bendri regione šalinamų atliekų kiekiai numatyti atsižvelgiant į faktinius šalinamų atliekų kiekius, numatoma, kad ilgalaikis šalinamų atliekų kiekių didėjimas nuo 5 projekto metų sudarys 0,7 proc.;
- galutinis atliekų šalinimas sąvartynuose, į kurį yra atsižvelgiama planuojant regioninių sąvartynų eksploatavimo išlaidas, jų tarnavimo laiką, investicijas į papildomą plėtrą ir uždarymą, yra numatytas atsižvelgiant į šiuo metu planuojamus įgyvendinti projektus ir numatomus atliekų tvarkymo sistemos pokyčius ateityje.

Detalūs duomenys apie projekto išlaidų skaičiavimus pateikiami 3.5 priede.

Duomenys apie projekto išlaidas 1–20 projekto metais pateikiami lentelėje 32.

Lentelė 32. Duomenys apie projekto išlaidas 1–20 projekto metais

	Projekto išlaidos, tūkst. Lt									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regioninių sąvartynų eksploatacija	0,0	0,0	3.053,3	5.288,7	5.307,2	5.325,7	5.344,4	3.996,8	4.010,7	4.024,8
Atliekų perkrovimo stočių eksploatacija	0,0	0,0	317,9	1.035,6	1.042,9	1.050,2	1.057,5	1.064,9	1.072,4	1.079,9
APA eksploatacija	0,0	0,0	344,9	797,9	803,5	809,1	814,8	820,5	826,2	832,0
Sąvartynų priežiūra ir monitoringas	0,0	0,0	66,1	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6
RATC veiklos ir kitos išlaidos	0,0	0,0	328,6	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1
Išlaidos iš viso	**0,0**	**0,0**	**4.210,6**	**8.110,9**	**8.142,3**	**8.173,8**	**8.205,4**	**6.870,9**	**6.898,1**	**6.925,4**
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Regioninių sąvartynų eksploatacija	4.038,9	4.053,0	4.067,2	4.076,2	6.090,5	4.104,8	4.119,2	4.133,6	4.148,1	4.162,6
Atliekų perkrovimo stočių eksploatacija	1.087,5	1.095,1	1.102,7	1.110,5	1.118,2	1.126,1	1.134,0	1.141,9	1.149,9	1.157,9
APA eksploatacija	837,8	843,7	849,6	855,5	861,5	867,6	873,6	879,7	885,9	892,1
Sąvartynų priežiūra ir monitoringas	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6
RATC veiklos ir kitos išlaidos	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1	678,1
Išlaidos iš viso	**6.952,9**	**6.980,5**	**7.008,3**	**7.031,0**	**7.059,0**	**7.087,2**	**7.115,5**	**7.144,0**	**7.172,6**	**7.201,4**

Duomenys apie visas projekto išlaidas 1–20 projekto metais pateikiami grafike žemiau.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

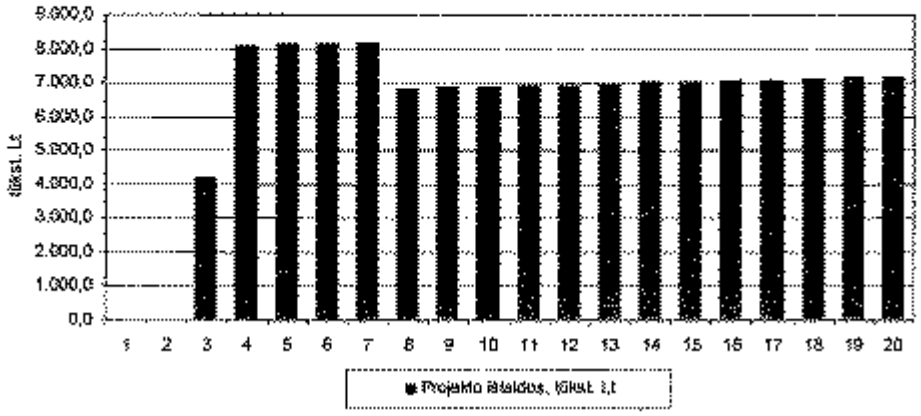

Duomenys apie numatomą vidutinę projekto išlaidų struktūrą 1–20 projekto metais pateikiami grafike žemiau.

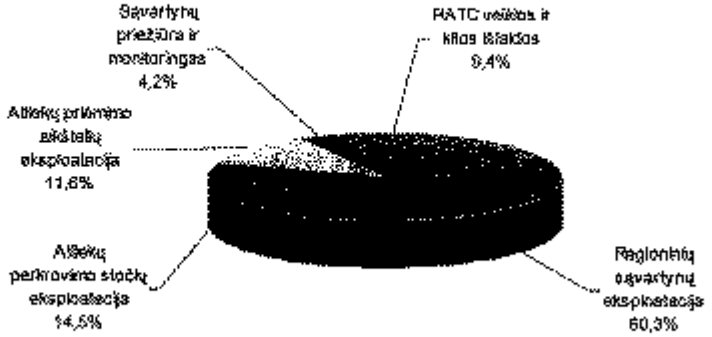

3.2.3. Projekto reinvesticijos

Apskaičiuojant papildomas investicijas (reinvesticijas) į projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą, daromos šios prielaidos:

- numatoma, kad papildoma talpa Zabieliškio regioniniame sąvartyne bus reikalinga 6 ir 14 projekto metais, o atsižvelgiant į talpos poreikį, atitinkamai numatomos papildomos 4,0 ir 5,0 mln. Lt investicijos;
- numatoma, kad Lapių regioninis sąvartynas bus uždarytas 14 projekto metais, atsižvelgiant į tai, numatoma papildomos 8,0 mln. Lt investicijos;
- dalis projekto investicijų nusidėvės anksčiau nei iki projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į tai 9 ir 15 projekto metais numatoma kitos papildomos 233,4 tūkst. Lt investicijos.

Duomenys apie visas projekto reinvesticijas pateikiami lentelėje 33 žemiau.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapaitienė
2011 -06- 23



Lentelė 33. Duomenys apie visas projekto reinvesticijas

Reinvesticijos, tūkst. Lt	
	Iš viso
Papildoma talpa Zabieliškio sąvartyne	9.000,0
Lapių sąvartyno uždarymas	8.000,0
Kitos investicijos	466,7
Reinvesticijos iš viso, tūkst. Lt	**17.466,7**

3.2.4. Projekto pajamos

Analizuojamos projekto pajamos apima Kauno RATC dėl projekto įgyvendinimo numatomas gauti pajamas. Numatoma, projekto pajamas sudarys pajamos už atliekų priėmimą.

Projekto pajamų skaičiavimų prielaidos yra numatytos atsižvelgiant į esamos situaciją analizę (pateikiamos faktinės pajamos už 2009 metus, kurie atitinka 3 projekto metus), šiuo metu nustatytu sąvartynų vartų mokesčio dydžiu ir atsižvelgiant į numatomus šalinti atliekų kiekius.

Skaičiuojant projekto pajamas, daromos šios bendros prielaidos:

- projekto pajamų skaičiavimuose į kainų pokyčius dėl infliacijos nėra atsižvelgiama, numatoma, kad projekto pajamos ateityje keisis priklausomai nuo šalinamų atliekų kiekio ir planuojamo taikyti sąvartynų vartų mokesčio;
- bendri regione šalinamų atliekų kiekiai numatomi atsižvelgiant į faktinius šalinamų atliekų kiekius, numatoma, kad ilgalaikis šalinamų atliekų kiekių didėjimas nuo 5 projekto metų sudarys 0,7 proc.;
- numatant sąvartynų vartų mokesčio dydį ateityje, atsižvelgiama į tai, kad projekto išlaidos ir reinvesticijos turi būti dengiamos iš projekto pajamų ir jo generuojamų pinigų srautų turi pakakti nuosavo indėlio finansavimui gautos ilgalaikės paskolos grąžinimui ir palūkanų mokėjimui, taip užtikrinant, kad projektas atskirai paėmus yra gyvybingas visu ataskaitiniu laikotarpiu ir yra laikomasi „teršėjas moka" principo.

Kadangi iki 8 projekto metų grąžinamos ilgalaikės banko paskolos dydis ir veiklos sąnaudos iš esmės nesikeis, numatoma, kad 3-7 projekto metais sąvartyno vartų mokestis išliks dabar Kauno RATC nustatyto sąvartyno vartų mokesčio lygyje. Atžvelgiant į veiklos sąnaudų pasikeitimus, susijusius su savartynų eksploatacijos sąnaudomis ir į numatomą ilgalaikės paskolos grąžinimo pabaigą 10 projekto metais, skaičiavimuose daroma prielaida, kad sąvartyno vartų mokestis nuo 49,1 Lt/t 7 projekto metais, mažės iki 33 Lt/t. 11 projekto metais ir toliau išliks šiame lygyje. Tai lems, kad 8-11 projekto metais atliekų priėmimo pajamos mažės, tačiau jos išliks pakankamos projekto išlaidų ir reinvesticijos padengimui, paskolos grąžinimui ir palūkanų mokėjimui, taip užtikrinant, kad projektas atskirai paėmus yra gyvybingas visu ataskaitiniu laikotarpiu ir yra laikomasi „teršėjas moka" principo.

Detalūs duomenys apie projekto pajamų skaičiavimus pateikiami 3.5 priede.

Duomenys apie projekto pajamas ir jų apskaičiavimo prielaidas 1–20 projekto metais pateikiami lentelėje 34.



Poveikio aplinkai vertinimo procedūros

Poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu. Kėdainių, Andrušaičių, Kaišiadorių, Jonalaukio,

sanglaudos fondas

Kauno miesto Nemajūnų ir Kauno miesto Raudondvario pl. atliekų priėmimo aikštelių, Lapių ir Zabieliškio regioninių sąvartynų poveikio aplinkai vertinimai neprivalomi. Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, atranka dėl sąvartynų uždarymo poveikio aplinkai vertinimo – neprivaloma.

Lentelė 34. Duomenys apie projekto pajamas 1–20 projekto metais

Projekto pajamos, tūkst. Lt

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Atliekų šalinimas iš viso, t	0	0	114.382	228.062	229.659	231.266	232.885	234.515	236.157	237.810
Atliekų priėmimo įkainis, Lt/t	0	0	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	41,6	41,0	34,0
Atliekų priėmimo pajamos, tūkst. Lt	**0,0**	**0,0**	**5.616,1**	**11.197,9**	**11.276,2**	**11.355,2**	**11.434,7**	**9.763,8**	**9.693,9**	**8.078,0**
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Atliekų šalinimas iš viso, t	239.479	241.151	242.839	244.539	246.251	247.975	249.710	251.458	253.219	254.991
Atliekų priėmimo įkainis, Lt/t	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Atliekų priėmimo pajamos, tūkst. Lt	**7.891,5**	**7.946,8**	**8.002,4**	**8.058,4**	**8.114,8**	**8.171,6**	**8.228,8**	**8.286,4**	**8.344,4**	**8.402,8**

Duomenys apie visas projekto pajamas 1–20 projekto metais pateikiami grafike žemiau.

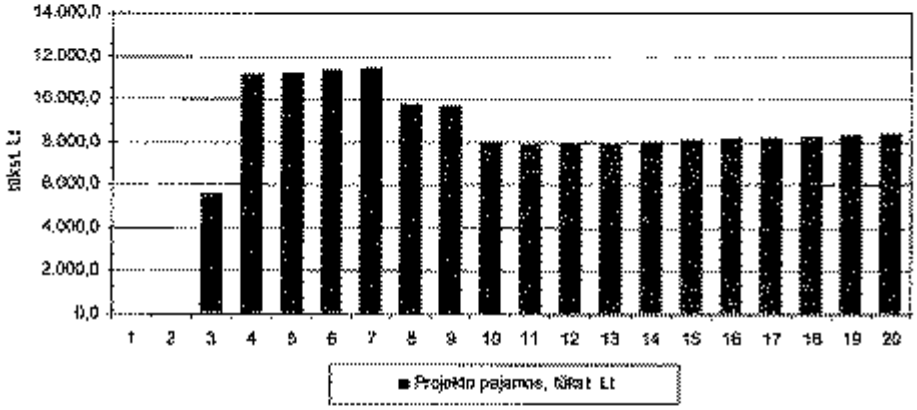

3.2.5.Likutinė projekto turto vertė

Likutinė projekto turto vertė nustatoma atsižvelgiant į projekto metu sukurto turto ir reinvesticijų nusidėvėjimą projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Likutinė vertė yra pateikiama projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Likutinė vertė nėra įtraukiama į projekto finansinio gyvybingumo vertinimą.

Apskaičiuojant projekto turto likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje daromos šios prielaidos:

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėlienė



- pradinių nenusidėvėjusių investicijų likutinė vertė bus lygi 1,49 proc. nuo visų pradinių investicijų vertės;
- nenusidėvėjusių reinvesticijų, atliktų per ataskaitinį projekto laikotarpį likutinė vertė sudarys 2,22 proc. nuo visų reinvesticijų pradinės vertės.

Duomenys apie likutinę vertę pateikiami 35 lentelėje žemiau.

Lentelė 35. Duomenys apie likutinę vertę

Projekto turto likutinė vertė				
	Pradinė vertė		Likutinė vertė	
	tūkst. Lt	tūkst. EUR	tūkst. Lt	tūkst. EUR
Pradinės projekto investicijos	84.360,3	24.432,4	1.260,1	365,0
Projekto reinvesticijos	17.466,7	5.058,7	387,9	112,4
Iš viso	**101.827,0**	**29.491,1**	**1.648,1**	**477,3**

Nustatant likutines turto vertes atsižvelgiama į iki projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos likusį naudingą turto eksploatavimo laiką.

3.2.6.Projekto finansavimas

Duomenys apie projekto investicijų finansavimo šaltinius pateikiami lentelėje 36. Tai duomenys pagal faktiškai atliktus darbus.

Lentelė 36. Duomenys apie projekto investicijų finansavimo šaltinius.

Projekto finansavimas, tūkst. Lt			
	Suma, tūkst. Lt	Suma, tūkst. EUR	Dalis, proc.
Sprendime numatytas finansavimas	**63.159,5**	**18.292,3**	**100,00%**
ES lėšos *	47.369,6	13.719,2	75,00%
Biudžeto lėšos	12.608,1	3.651,6	19,96%
Pareiškėjo indėlis*	3.181,8	921,5	5,04%
Sprendimo biudžetą viršijanti dalis	**21.200,7**	**6.140,2**	**100,00%**
ES lėšos	0,0	0,0	0,00%
Biudžeto lėšos	12.720,4	3.684,1	60,00%
Pareiškėjo indėlis**	8.480,3	2.456,1	40,00%
Projekto finansavimas iš viso	**84.360,3**	**24.432,4**	**100,00%**
ES lėšos	47.369,6	13.719,2	56,15%
Biudžeto lėšos	25.328,6	7.335,7	30,02%
Pareiškėjo indėlis	11.662,0	3.377,6	13,82%
Nuosavos lėšos	1.100,2	318,6	1,30%
Paskolos lėšos	10.561,9	3.058,9	12,52%

*- dėl darbų vėlavimo pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" buvo paskirta bauda, todėl iš SF faktiškai apmokėta 4.273,60 EUR mažiau, o iš pareiškėjo indėlio - 1.424,53 EUR mažiau, nei faktiškai atlikta darbų.

**- pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba" visi darbai atlikti, o likusi neišmokėta sulaikytų pinigų suma sudaro 29.389,49 EUR.

Projektui EK sprendimu Nr. K(2010)3625 (2010 m. birželio 2 d.) skirtos ES paramos lėšos negali viršyti 75 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Atsižvelgiant į finansinės analizės įvertinus

Skyrius vardija
2011 -06- 23
Aldona Čepulėjienė

planuojamas projekto grynąsias pajamas, apskaičiuotas finansavimo nepakankamumas (angl. *funding–gap*) sudaro 85,47 proc. Toks projekto finansavimo nepakankamumo dydis rodo, kad jo tinkamoms išlaidoms suteikiant 75 proc. ES paramos lėšų projektas nebus per daug finansuojamas.

Projekto pareiškėjo nuosavas indėlis didžiąja dalimi yra finansuojamas gaunant ilgalaikę banko paskolą. Atsižvelgiant į gautos paskolos sąlygas ir grąžinimo grafiką, skaičiavimuose numatoma, kad ilgalaikė banko paskola bus gražinama 4–10 projekto metais.

3.2.7.Projekto finansiniai rodikliai

Projekto finansinėje analizėje skaičiuojami šie projekto finansiniai rodikliai:

- **Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI)**. Rodiklis parodo projekto grynojo pinigų srauto dabartinę vertę ir leidžia įvertinti projekto atsiperkamumą. Neigiama šio rodiklio reikšmė reiškia, kad projektas yra finansiškai neatsiperkantis, t.y. negeneruojantis pelno. Skaičiuojant FGDVI neatsižvelgiama į projekto finansavimo šaltinius.
- **Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms (FVGNI)**. Rodiklis parodo esant kokiam diskonto normos dydžiui projekto FGDVI bus lygi 0. Mažesnė už taikomą diskonto normą reikšmė reiškia, kad projektas yra finansiškai neatsiperkantis, t.y. negeneruojantis pelno.
- **Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui (FGDVK)**. Rodiklis kaip ir FGDVI parodo projekto grynojo pinigų srauto dabartinę vertę, tačiau skaičiuojant FGDVK atsižvelgiama ir į projekto finansavimo šaltinius. Jei šis rodiklis yra artimas nuliui, projektas su parama nei generuoja pelną, nei yra nuostolingas. Neigiamas rodiklis reiškia, kad ir suteikus paramą projektui, jis yra finansiškai nuostolingas.
- **Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui (FVGNK)**. Rodiklis parodo esant kokiam diskonto normos dydžiui projekto FGDVK bus lygi 0. Artima diskonto normai reikšmė reiškia, kad projektas su parama nei generuoja pelną, nei yra nuostolingas. Mažesnė už diskonto normą reikšmė reiškia, kad ir suteikus paramą projektui, jis yra finansiškai nuostolingas pareiškėjui.

Duomenys apie šiuos rodiklius pateikiami lentelėje 37.

Lentelė 37. Projekto finansiniai rodikliai

Projekto finansiniai rodikliai, tūkst. Lt	
Taikoma finansinė diskonto norma, proc.	6,0%
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI)	-65.572,3
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms (FVGNI)	-
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui (FGDVK)	-22.515,3
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui (FVGNK)	-

Detalūs projekto finansinių rodiklių skaičiavimai pateikiami finansinės ir sąnaudų–naudos analizės 3.1 ir 3.2 prieduose.

Neigiama projekto FGDVI reikšmė rodo, kad projekto įgyvendinimas be ES paramos būtų neįmanomas. Projekto investicijos pačios savaime neužtikrina pakankamų pinigų srautų, kurie leistų finansuoti reikalingas investicijas t.y. projekto įgyvendinimo metu uždirbamos grynosios pajamos yra per mažos, kad visas projekto investicijas būtų įmanoma finansuoti iš paskolos lėšų užtikrinant, kad bus uždirbama pakankamai lėšų tokiai paskolai grąžinti.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėlienė



Projekto rodikliai kapitalui skaičiuojami įvertinus projektui suteikus paramą t.y. į projekto pinigų srautų analizę įtraukiamos ir paramos lėšos kaip teigiamas pinigų srautas. ES paramos projektuose taikomas finansavimo nepakankamumo metodas reiškia, kad pareiškėjui turi būti teikiamas toks paramos dydis, kuris leistų įgyvendinti projektą, tačiau nesudarytų sąlygų gauti finansinį pelną iš projekto. Ši sąlyga yra patenkinama, kai projekto FGDVK reikšmė yra artima nuliui arba neigiama. Nagrinėjamo projekto FGDVK reikšmė yra neigiama dar ir dėl to, kad pradinio sprendimo investicijų biudžetą viršijanti suma, nėra finansuojama ES paramos lėšomis.

3.2.8.Projekto finansinis gyvybingumas

Projekto finansinio gyvybingumo vertinimo tikslas yra nustatyti, ar projektas atskirai paėmus yra gyvybingas visu ataskaitiniu laikotarpiu t.y. ar akumuliuotas projekto pinigų srautas visais projekto metais yra teigiamas. Jei akumuliuotas pinigų srautas kažkuriuo laikotarpiu būtų neigiamas, tai reikštų, jog projektas turi gyvybingumo problemų ir tokiu atveju reiktų numatyti iš kokių lėšų bus finansuojamas neigiami pinigų srautai.

Atsižvelgiant į numatomas pajamų ir išlaidų prielaidas, projekto pajamos per ataskaitinį ataskaitiniu laikotarpį viršys projekto išlaidas ir reinvesticijas, taip pat projekto generuojamų pinigų srautų pakaks ir ilgalaikės paskolos, kuria yra finansuojamas pareiškėjo nuosavas indėlis, grąžinimui ir palūkanų mokėjimams. Numatoma, kad tam tikrais vėlesniais laikotarpiais, atliekant reinvesticijas, susidariusiam trumpalaikiam pinigų trūkumui kompensuoti bus pasitelktas papildomas laikinas finansavimas paskolomis, kurios vėlesniais laikotarpiais grąžinamos iš projekto generuojamų pinigų srautų.

Tokiu būdu projekto veiklos išlaidos ir reinvesticijos būtų dengiamos iš inkrementinių projekto pajamų, taip užtikrinant, kad projektas atskirai paėmus yra gyvybingas visu ataskaitiniu laikotarpiu ir yra laikomasi „teršėjas moka" principo.

Detalūs projekto finansinio gyvybingumo skaičiavimai pateikiami 3.3 priede.

3.2.9.Projekto finansinės analizės išvados

Pagrindinis atliktos analizės tikslas yra įvertinti projekto finansinius rodiklius, siekiant nustatyti ar projekto finansiniai rezultatai išlieka pagrindžiantys ES paramos poreikį projektui.

SF parama buvo teikiama projektams remiantis finansavimo nepakankamumo principu, kuriuo remiantis ES finansavimo dalis negalėjo būti didesnė nei projekto finansavimo nepakankamumas arba 75 proc., priklausomai nuo to, kuri vertė buvo mažesnė.

Nagrinėjamam projektui skirta parama sudarė 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Atnaujintos finansinės analizės skaičiavimuose nustatytas projekto finansavimo nepakankamumas sudaro 85,47 proc. Toks projekto finansavimo nepakankamumo dydis rodo, kad projektui skirta ES parama neviršija maksimaliai galimos projektui skirti paramos. Finansiniai projekto rodikliai rodo, kad net ir suteikus ES paramą projektui jis netampa finansiškai atsiperkantis ir per daug finansuojamas.

3.2.10.Projekto sąnaudų–naudos analizė

Projekto socialinis-ekonominis įvertinimas yra atliktas ir projekto ekonominiai rodikliai apskaičiuoti atsižvelgiant į „Investicinių projektų išlaidų–naudos analizės gairių" (angl. *Guide to cost-benefit analysis of investment projects*) reikalavimus. Atliekant projekto ekonominį įvertinimą taip pat buvo atsižvelgiama į šalių kandidačių atitikimo aplinkosauginiam Acquis naudos ataskaitą

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėjienė



(angl. *The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for the candidate countries report*).

Socialinė–ekonominė nauda ir žala (SENŽ)–tai nauda ir (ar) žala, kuri, įgyvendinus projektą, patiriama regiono ar valstybės ekonomikoje. Tokiu būdu, SENŽ, skirtingai nei organizacijos gaunama vidinė finansinė nauda ar žala, apima ir išorinį projekto poveikį. Siekiant apskaičiuoti projekto SENŽ, išreiškiamą piniginę išraišką ir atlikti projekto socialinį–ekonominį įvertinimą buvo:

- atlikta finansinių srautų fiskalinė korekcija;
- įvertintas projekto išorinis poveikis;
- apskaičiuoti projekto ekonominės vidinės grąžos normos (EVGN), ekonominės grynosios dabartinės vertės (EGDV) ir ekonominės naudos ir sąnaudų santykio rodikliai.

Projekto ekonominio įvertinimo skaičiavimai pateikiami priede 3.4.

3.2.11.Fiskalinė korekcija

Atliekant fiskalinę korekciją eliminuojama tiesioginių mokesčių, kuriuos organizacija sumoka valstybei, įtaka projekto rezultatams.

Duomenys apie projekto fiskalines korekcijas 1–20 projekto metais pateikiami lentelėje 38.

Lentelė 38. Duomenys apie projekto fiskalines korekcijas 1–20 projekto metais

	Fiskalinės korekcijos, tūkst. Lt									
	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.	5 m.	6 m.	7 m.	8 m.	9 m.	10 m.
Gyventojų pajamų mokestis	0,0	0,0	265,3	511,0	513,0	514,9	516,9	432,9	434,6	436,3
Fiskalinės korekcijos iš viso	**0,0**	**0,0**	**265,3**	**511,0**	**513,0**	**514,9**	**516,9**	**432,9**	**434,6**	**436,3**
	11 m.	12 m.	13 m.	14 m.	15 m.	16 m.	17 m.	18 m.	19 m.	20 m.
Gyventojų pajamų mokestis	438,0	439,8	441,5	443,0	444,7	446,5	448,3	450,1	451,9	453,7
Fiskalinės korekcijos iš viso	**438,0**	**439,8**	**441,5**	**443,0**	**444,7**	**446,5**	**448,3**	**450,1**	**451,9**	**453,7**

Skaičiavimuose fiskalinė korekcija atlikta iš finansinių projekto išlaidų eliminuojant gyventojų pajamų mokesčio išlaidas. Pridėtinės vertės mokesčio korekcija nėra atliekama, kadangi projekto finansinės pajamos ir išlaidos yra be PVM.

3.2.12.Išorinio poveikio įvertinimas

Išorinio projekto įvertinimo tikslas yra nustatyti ir išmatuoti dėl projekto įgyvendinimo už projekto organizacijos ribų sukuriamą naudą ir sąnaudas, kurios nebuvo įvertintos finansinės analizės metu.

Projekto socialinė–ekonominė nauda plačiąja prasme neapsiriboja vien tik veiksmčia atliekų tvarkymo sistema, bet pasireikš įvairiomis jos sukūrimo pasekmėmis:

- Įgyvendinus projektą ir uždarius netinkamus eksploatuoti sąvartynus bei sukūrus naują efektyvią atliekų tvarkymo sistemą sumažės aplinkos tarša.
- Tinkamai tvarkant atliekas, gerėja higieninė gyventojų gyvenamoji aplinka, mažėja užkrečiamų ligų plitimo galimybės ir tuo pačiu sergamumo šiomis ligomis tikimybė.
- Dėl projekto įgyvendinimo sukuriamos darbo vietos didina gyventojų užimtumą ir sudaro sąlygas tenkinti darbuotojų ir jų šeimų materialinius poreikius.

T I K R A
Skyriaus vedėja 2011 -06- 23
Aldona Česiūnienė

- Pajamos iš sukurtų darbo vietų generuoja mokesčius į valstybės biudžetą ir sudaro sąlygas teikti daugiau arba geresnės kokybės viešojo sektoriaus paslaugų.
- Projektas sudaro prielaidas mažinti skurdą, kadangi įgyvendinus projektą be ES struktūrinės paramos lėšų atliekų tvarkymo tarifas gyventojams turėtų būti ženkliai didesnis ir taip didintų mokesčių naštą.
- Sukurta atliekų tvarkymo sistema, leis valstybei ir savivaldybėms išvengti galimų neigiamų ekonominių ir finansinių pasekmių dėl laiku neįdiegtos atliekų tvarkymo sistemos ir nevykdomų atliekų tvarkymo užduočių.

Projekto išorinė nauda gyventojams, kurią įmanoma įvertinti kiekine išraiška, labiausiai pasireikš tuo, kad įgyvendinus projektą sumažės aplinkos tarša, kadangi pagerės atliekų surinkimas ir tvarkymas. Kadangi dėl duomenų stokos neįmanoma tiksliai įvertinti aplinkos taršos sumažinimo naudos gyventojams ar valstybei atskirų dedamųjų, šios naudos piniginei vertei nustatyti bus naudojami santykiniai rodikliai.

Šalių kandidačių atitikimo naudos ataskaitoje (angl. *The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for the candidate countries report*), kurią 2001 metais parengė ECOTEC, buvo apskaičiuota, kad metinė pilno atitikimo ES aplinkosaugos standartams nauda Lietuvoje sudarys nuo 79 EUR iki 353 EUR vienam gyventojui per metus. Ši nauda taikoma oro, vandens ir atliekų sektoriams. Įvertinant projekto aplinkosauginę naudą daromos šios prielaidos:

- skaičiavimuose naudojamas sukuriamos bendros aplinkosauginės naudos vidurkis–216 EUR arba 745,8 Lt vienam gyventojui per metus;
- ataskaitoje nurodoma, kad atliekų sektorius sudaro nuo 2 iki 16 proc. bendros gamtosauginės ES direktyvų (ES aplinkosaugos standartų) įgyvendinimo Lietuvoje naudos, skaičiavimuose naudojamas šių ribų vidurkis arba 9 proc., atsižvelgiant į tai, numatoma, kad vidutinė atliekų tvarkymo sektoriaus aplinkosauginė nauda sudarys 19,4 EUR arba 67,1 Lt vienam gyventojui per metus;
- kadangi numatytas įgyvendinti projektas užtikrins dalį pagrindinių direktyvų, kurių įgyvendinimo Lietuvoje nauda Ataskaitoje buvo vertinama kiekine išraiška, įgyvendinimą, daroma prielaida, kad projektui galima priskirti 35 proc. bendros aplinkosauginės atliekų tvarkymo sektoriaus naudos, atsižvelgiant į tai, numatoma, kad vidutinė projekto aplinkosauginė nauda sudarys 6,8 EUR arba 23,5 Lt vienam gyventojui per metus;
- tinkamas atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimas turės teigiamos įtakos visiems regiono, kuriame įgyvendinamas projektas gyventojams, todėl bendra projekto aplinkosauginė nauda yra įvertinama atsižvelgiant į aplinkosauginės naudos dydį vienam gyventojui per metus ir numatomą regiono gyventojų skaičių.

Apibendrinti duomenys apie projekto aplinkosauginę naudą arba išorinį poveikį ir pagrindines jo apskaičiavimo prielaidas 1–20 projekto metais pateikiami lentelėje 39.

Lentelė 39. Duomenys apie projekto aplinkosauginę naudą

	Projekto išorinis poveikis									
	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.	5 m.	6 m.	7 m.	8 m.	9 m.	10 m.
Regiono gyventojai iš viso, tūkst.	638,0	634,9	632,0	628,1	624,9	621,8	618,7	615,6	612,5	609,5
Projekto aplinkosauginė nauda gyventojui, Lt/metus	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Projekto bendra išorinė nauda, mln. Lt	15,0	14,9	14,8	14,8	14,7	14,6	14,5	14,5	14,4	14,3
Išorinės naudos dalis, proc.	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Projekto išorinis poveikis iš viso, mln. Lt	**0,0**	**0,0**	**7,4**	**14,8**	**14,7**	**14,6**	**14,5**	**14,5**	**14,4**	**14,3**

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23

sanglaudos fondas

	11 m.	12 m.	13 m.	14 m.	15 m.	16 m.	17 m.	18 m.	19 m.	20 m.
Regiono gyventojai iš viso, tūkst.	606,8	603,4	600,1	597,4	594,4	591,4	588,5	585,5	582,6	579,7
Projekto aplinkosauginė nauda gyventojui, Lt/metus	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Projekto bendra išorinė nauda, mln. Lt	14,2	14,2	14,1	14,0	14,0	13,9	13,8	13,8	13,7	13,6
Išorinės naudos dalis, proc.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Projekto išorinis poveikis iš viso, mln. Lt	14,2	14,2	14,1	14,0	14,0	13,9	13,8	13,8	13,7	13,6

Atliekant projekto išorinį vertinimą piniginė išraiška išorinė žala nėra identifikuojama ir vertinama.

3.2.13.Projekto ekonominiai rodikliai

Įvertinus finansinius projekto rezultatus, fiskalines korekcijas bei išorinį projekto ekonominį poveikį apskaičiuoti pagrindiniai projekto ekonominiai rodikliai pateikiami lentelėje žemiau.

Lentelė 40. Pagrindiniai projekto ekonominiai rodikliai

Projekto ekonominiai rodikliai	
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV), tūkst. Lt	91.407,9
Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN), proc.	19,3%
Ekonominis naudos ir sąnaudų santykis	1,56

Skaičiavimuose naudojama 5 proc. dydžio socialinė diskonto norma.

Atsižvelgiant į apskaičiuotus ekonominius rodiklius, projektas yra ekonomiškai atsiperkantis ir socialiniu–ekonominiu požiūriu yra naudingas regiono ir šalies mastu.

Detalūs projekto ekonominio įvertinimo skaičiavimai pateikiami 3.4 priede.

3.2.14.Projekto sąnaudų–naudos analizės išvados

Projekto sąnaudų–naudos analizė rodo, kad projekto vidinė ekonominė grąžos norma yra teigiama t.y. projektas socialiniu–ekonominiu požiūriu yra reikalingas ir pelningas, o sąnaudų naudos analizės rezultatai ir rodikliai leidžia teigti, kad projektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus.

Atliktos projekto jautrumo analizės rezultatai rodo, kad analizuojamų rizikos veiksnių numatyti galimi pasikeitimai nedaro lemiamos reikšmės projekto ekonominiam naudingumui, kadangi esant skirtingiems neigiamiems scenarijams, projektas generuoja pakankamą naudą ir išlieka ekonomiškai naudingas.

3.2.15.Projekto jautrumo analizė

Siekiant įvertinti galimą svarbiausių projekto rizikos veiksnių įtaką, buvo išnagrinėta pagrindinių projekto prielaidų galimo pasikeitimo įtaka projekto finansiniams ir ekonominiams rezultatams.

Kadangi projekto investicijos yra faktinės ir jas keisti nebegali, be jų jautrumo analizėje analizuojami šie likusieji pagrindiniai projekto rizikos veiksniai (prielaidos):

IŠKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepliejienė

- projekto pajamos;
- projekto išlaidos;
- projekto išorinis poveikis.

Duomenys apie jautrumo analizėje nagrinėjamus rizikos veiksnių pokyčius, lyginant su labiausiai tikėtinomis reikšmėmis, pateikiami lentelėje 41.

Lentelė 41. Duomenys apie rizikos veiksnių pokyčius

Rizikos veiksniai		
	1 jautrumo analizės atvejis	2 jautrumo analizės atvejis
Projekto pajamos	Pajamos didesnės 10 proc.	Pajamos mažesnės 10 proc.
Projekto išlaidos	Veiklos išlaidos didesnės 10 proc.	Veiklos išlaidos mažesnės 10 proc.
Projekto išorinis poveikis	Išorinis poveikis didesnis 10 proc.	Išorinis poveikis mažesnė 10 proc.

Atliekant projekto rizikos veiksnių arba prielaidų jautrumo analizę, nustatoma kiekvieno rizikos veiksnio pasikeitimo įtaką šiems projekto finansiniams ir ekonominiams rodikliams:

- finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI);
- finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui (FGDVK);
- ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV);
- ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN);
- ekonominis naudos ir sąnaudų santykis.

Projekto jautrumo analizės rezultatai pajamoms pateikiami lentelėje 42.

Lentelė 42. Projekto jautrumo analizės rezultatai pajamoms

Projekto jautrumo analizė (pajamos)				
	vnt.	Labiausiai tikėtinos	Projekto pajamos	
			+10%	-10%
Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai				
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI)	tūkst. Lt	-65.572,3	-56.312,5	-74.832,1
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui (FGDVK)	proc.	-22.515,3	-13.255,5	-31.775,0
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV)	tūkst. Lt	91.407,9	101.468,6	81.347,2
Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN)	proc.	19,3%	20,8%	17,8%
Ekonominis naudos ir sąnaudų santykis		1,56	1,62	1,50
Skirtumas nuo labiausiai tikėtino				
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI)	proc.	0,0%	-14,1%	14,1%
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV)	proc.	0,0%	11,0%	-11,0%

Projekto jautrumo analizės rezultatai veiklos išlaidoms pateikiami lentelėje 43.

Lentelė 43. Projekto jautrumo analizės rezultatai veiklos išlaidoms

Projekto jautrumo analizė (veiklos išlaidos)				
	vnt.	Labiausiai tikėtinos	Projekto išlaidos	
			+10%	-10%
Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai				
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI)	tūkst. Lt	-65.572,3	-72.838,4	-58.306,1
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui (FGDVK)	proc.	-22.515,3	-29.781,4	-15.249,1
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV)	tūkst. Lt	91.407,9	83.484,9	99.330,9
Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN)	proc.	19,3%	18,2%	20,4%
Ekonominis naudos ir sąnaudų santykis		1,56	1,49	1,64
Skirtumas nuo labiausiai tikėtino				
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI)	proc.	0,0%	11,1%	-11,1%

IŠ PIRMŲ RANKŲ
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čaplėjienė

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV)	proc.	0,0%	-8,7%	8,7%

Projekto jautrumo analizės rezultatai išoriniam poveikiui pateikiami lentelėje 44.

Lentelė 44. Projekto jautrumo analizės rezultatai išoriniam poveikiui.

Projekto jautrumo analizė (išorinis poveikis)				
	vnt.	Labiausiai tikėtinos	Išorinis poveikis	
			+10%	-10%
Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai				
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI)	tūkst. Lt	-65.572,3	-65.572,3	-65.572,3
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui (FGDVK)	proc.	-22.515,3	-22.515,3	-22.515,3
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV)	tūkst. Lt	91.407,9	106.667,6	76.148,1
Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN)	proc.	19,3%	21,4%	17,1%
Ekonominis naudos ir sąnaudų santykis		1,56	1,66	1,47
Skirtumas nuo labiausiai tikėtino				
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDVI)	proc.	0,0%	0,0%	0,0%
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV)	proc.	0,0%	16,7%	-16,7%

Apibendrinant rizikos veiksnių jautrumo analizę, galima daryti išvadą, kad galimas projekto pajamų ir išlaidų pasikeitimas daugiau paveiktų projekto finansinius rezultatus ir mažiau ekonominius (EGDV), o galimas išorinio poveikio pasikeitimas neturėtų įtakos finansiniams rodikliams, bet paveiktų EGDV investicijoms.

Siekiant įvertinti kritinį išorinio poveikio dydį projekto rezultatams, buvo nustatytas išorinio poveikio lūžio taškas naudos ir sąnaudų santykio atžvilgiu. Išorinis poveikis, kuriam esant naudos ir sąnaudų santykis būtų lygus 1, per visą laikotarpį turėtų būti 59,9 proc. mažesnis, lyginant su analizuojamu variantu ir tuomet sudarytų 99.646,2 tūkst. Lt, tuo tarpu analizuojamame variante per visa laikotarpį jis sudaro 248.502,4 tūkst. Lt.

Jautrumo analizės rezultatai rodo, kad analizuojamų rizikos veiksnių numatyti galimi pasikeitimai nedaro lemiamos reikšmės projekto ekonominiam naudingumui, kadangi esant skirtingiems neigiamiems scenarijams, projektas generuoja pakankamą naudą ir išlieka ekonomiškai naudingas.

4. PROJEKTO VIEŠINIMAS

4.1. Projekto viešinimo tikslai

Visuomenės aplinkosaugos švietimas ir informavimas — vienas iš svarbiausių aplinkos apsaugos uždavinių ir pagrindinių visuomenės dalyvavimo realizuojant aplinkos apsaugos tikslus garantų. Visuomenės informavimo ir švietimo paslauga skirta tikslinių auditorijų (regiono fizinių ir juridinių asmenų: įmonių, gyventojų, bendruomenių, seniūnijų ir t.t.) informavimui ir švietimui bei pozityvios nuomonės formavimui apie kuriamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą per visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

Visuomenės informavimo ir švietimo programos tikslai:

- Informuoti, kodėl reikalinga regioninė atliekų tvarkymo sistema:
  - Kodėl reikalinga regioninė atliekų tvarkymo sistema;
  - Kaip diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema;
  - Kas finansuoja naujos regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą.
- Siekti, kad gyventojai žinotų ir turėtų teigiamą nuomonę apie atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, o taip pat, kad suvoktų

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėlienė

- Kodėl svarbu rūšiuoti atliekas;
- Kaip jas teisingai rūšiuoti;
- Kaip ir kur šalinti perdirbimui tinkamas medžiagas;
- Padėti gyventojams suprasti, kodėl už skirtingų atliekų tvarkymą reikia susimokėti.

• Informuoti apie būtinybę įvesti didesnius mokesčius už atliekų surinkimą.

Informavimo programos tikslai:

• Informuoti apie projekto įgyvendinimo laikotarpiu vykstančius kitus svarbiausius darbus atliekų tvarkymo sektoriuje;
• Informuoti gyventojus apie Lietuvos atliekų tvarkymui teikiamą ES paramą, pabrėžiant šios teikiamos paramos svarbą ir naudą.

Visuomenės informavimo ir švietimo priemonės:

• Ryšiai su žiniasklaida:
  - Publikacijos spaudoje;
  - Pranešimai spaudai;
  - Užsakomieji straipsniai.
• Kauno RATC Visuomenės informavimo ir švietimo programa.
• Kauno RATC internetinės svetainės sukūrimas.
• Informacinis leidinys apie Kauno RATC tikslus.

4.2. Įgyvendintos projekto viešinimo priemonės

Lentelė 45. Projekto veiklų viešinimas

Priemonės	Priemonės įgyvendinimo data	Nuorodos/informacijos šaltiniai	Priedo Nr.
	(1)	(2)	
Spauda	**2004/11/25**	**Atliekas moderniai tvarkys viena įstaiga** (Straipsnis apie steigiamą Kauno RATC, kuris įgyvendins ES projektą atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui Kauno regione). **Laikinoji sostinė** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 1 1 lapas
	2004/11/27	**Atliekų verslas laukia milijoninių investicijų** (Publikacija apie Kauno RATC pateiktą paraišką ES paramai gauti). **Kauno diena** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 2 1 lapas
	2004/12/01	**Atliekas tvarkys bendrai** (Publikacija apie Kauno RATC ir rengiamą galimybių studiją Kauno regiono savivaldybių bendrai atliekų tvarkymo sistemai). **Kauno diena, psl. 15** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 3 1 lapas
	2006/05/13	**Kodėl kuriamos regioninės atliekų tvarkymo sistemos** (Pranešimas spaudai apie Kauno regione kuriamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, ES paramą ir aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi) **Naujas rytas, psl. 3** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 4 2 lapai
	2007/03/01	**Ketina pertvarkyti sąvartynus** (Publikacija apie numatomus darbus įgyvendinant projektą) **Laikraštis 15 min.** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 5 1 lapas
	2007/06/07	**Šiukšlių kalnai** (Publikacija iš renginio žurnalistams „Sąvartynas — atvirų durų diena" apie Kauno regione įgyvendinamą atliekų tvarkymo sistemą.) **Naujos Tvirtės Šilos Nr. 104, psl. 1** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 6 1 lapas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Addona Čepkėjienė
2011 -06- 23



	2007/06/12	**Mūsų laukia katastrofa?** (Publikacija iš renginio žurnalistams „Savartynas – atvirų durų diena“ apie Kauno regione įgyvendinamą atliekų tvarkymo sistemą.) **Naujos Tėviškės žinios Nr. 105, psl. 4** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 7 1 lapas
	2008/01/07	**Lapės pasmerktos naujam sąvartynui** (Informacija apie konkursą regioninio Lapių sąvartyno statybai laimėtoją ir planuojamus darbus). **Kauno diena psl. 20** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 8 1 lapas
	2008/02/21	**Nereikalingos aistros dėl aikštelės** (Straipsnyje pateikiama informacija apie įgyvendinamą investicinį projektą Kauno regione atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir ES reikalavimus projekto įgyvendinimui bei atliekamų darbų aiškumui). **Kauno diena** (straipsnį patalpino Kauno m. savivaldybė) *(straipsnį patalpino Kauno m. savivaldybė)*	Priedas Nr. 9 1 lapas
	2009/06/04	**Kauno regione – naujas aikštelės atliekomis kompostuoti** (Straipsnis apie ES SF finansuojamą projektą ir jo lėšomis įrengiamas naujas didžiųjų APA Kauno regione) **Kauno diena psl. 8** *(atspausdinta nemokamai)*	Priedas Nr. 10 1 lapas
	2009/02-03	**Užsakomasis straipsnis žurnale „Europos ritmu“ - „Kauno regione – nauja atliekų tvarkymo era“.** *(Kauno RATC lėšos)*	Priedas Nr. 11 1 lapas
Radijas/ Televizija	**2007/07/25 – 2008/04/18**	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimas** (Reklaminis filmas apie atliekų tvarkymo problemas Kauno regione ir kuriamą naują atliekų tvarkymo sistemą. 5 filmo transliacijos) **Pūkas TV** *(iš ES struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinant projektą „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas“, projekto Nr.* BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0037 *)*	Priedas Nr. 12 Filmas
	2007/10/09	Specialī laida apie Kauno regione diegiamą atliekų tvarkymo sistemą (laidoje pristatoma Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema, aptariamos Raseinių, Jonavos atliekų tvarkymo problemos) **Pūkas TV** *(iš ES struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinant projektą „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas“, projekto Nr.* BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0037 *)*	Priedas Nr. 13 Sumontuoti laidos siužetai
	2007/12/21	Radijo laida apie atliekų tvarkymo sistemą bei „teršėjas moka“ principo įgyvendinimą. **Kauno fonas** *(iš ES struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinant projektą „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas“, projekto Nr.*BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0037 *)*	Priedas Nr. 14 Patvirtinimas dėl radijo laidos, 1 lapas
	2008/04/24	Speciali laida apie Kauno regione diegiamą atliekų tvarkymo sistemą (laidoje pristatoma Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema, aptariamos Kaišiadorių, Kauno rajonų atliekų tvarkymo problemos) **Pūkas TV** *(iš ES struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinant projektą „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas“, projekto Nr.* BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0037)	Priedas Nr. 15 TV laidos įrašas
	2008/04/04	Radijo laida apie atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą, netvarkingai eksploatuojamų sąvartynų daromą žalą aplinkai, galimas prevencijos priemones **Kauno fonas** *(iš ES struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinant projektą „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas“, projekto Nr.* BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0037 *)*	Priedas Nr. 16 Radijo laidos įrašas

T I K R A
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čeplėjienė

sanglaudos fondas

	2009/01-12	**Informacinis filmas apie APA** (Reklaminis filmas apie 5 stambiagabaričių APA, kurios Kauno regione buvo pastatytos įgyvendinant projektą) **Filmas TV** *(iš ES struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinant projektą „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas", projekto Nr.* BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0037 *)*	Priedas Nr. 17 Filmas
Internetas	**2007/02/11**	**Rengiamas Kauno regiono atliekų tvarkymo planas** (Skelbimas apie Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto vykdymą, regiono atliekų tvarkymo plano parengimą). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 18 2 lapai
	2007/06/07	**Nuo šiukšlių ginamasi tik švietimu** (Publikacija iš renginio žurnalistams „Savivartynas – atvirų durų diena" apie Kauno regione įgyvendinamą atliekų tvarkymo sistemą.) **Kauno diena** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 19 2 lapai
	2007/09	**Kauno RATC internetinės svetainės atnaujinimas** *(iš projekto lėšų pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui")*	Nepridedama
	2007/12/06	**Informacinis pranešimas** (Skelbimas apie pasirašytą sutartį su UAB „Kamesta" „ Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Žaliojo regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba"). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 20 1 lapas
	2007/12/14	**Žaliojo regioninio sąvartyno statybos darbų pradžia** (Pranešimas apie pasirašytą sutartį su Žaliojo regioninio sąvartyno statybos rangovu) **BNS spaudos centras** *(Kauno RATC lėšos)*	Priedas Nr. 21 1 lapas
	2007/12/18	**Pasirašyta 110 KV elektros linijos iškėlimo sutartis** (Skelbimas apie pasirašytą sutartį „Elektros įrenginių perkėlimo paslaugų sutartis") **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 22 1 lapas
	2007/12/28	**Pasirašyta APA statybos sutartis** (Skelbimas apie pasirašytą rangos sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: APA statyba"). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 23 1 lapas
	2007/12/28	**Pasirašyta Lapių regioninio sąvartyno statybos sutartis** (Skelbimas apie pasirašytą rangos sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba") **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 24 1 lapas
	2008/02/28	**APA statyba** (Pateikiama informacija apie SF projekto lėšomis įgyvendinamą projektą bei reikalavimus APA įrenginiui.) **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 25 9 lapai

KONTROLĖS, AUDITO IR PERGALĖS SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja 2011 -06- 23
Aldona Čepkūjienė

sanglaudos fondas

	2008/07/16	**Trakdama įsisavinti ES lėšas** (Pateikiama informacija apie projekto finansavimą ir galimybę jo neteikti, jei numatyti projekto darbai nebus atlikti, t.y. nebus pastatyta APA Kauno mieste). **Kauno savivaldybės interneinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 26 1 lapas
	2008/09/11	**Naujo lauko eksploatavimas** (pateikiama informacija apie Lapių sąvartyno statybos darbų sutarties vykdymą ir pradėtą eksploatuoti naujai įrengtą atliekų kaupimo sekciją). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 27 1 lapas
	2008/09/19	**Sąvartynų uždarymas** (Pranešimas apie pasirašytą sutartį Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas) **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 28 1 lapas
	2008/11/26	**Sklaidos įrašų sąvartyne teks palaukti** (Straipsnis apie įgyvendinamą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą ir numatomus pokyčius regioniniame Lapių sąvartyne). **Kauno diena internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 29 1 lapas
	2009/01/06	**Siuksles paisidos net sąvartynus** (Publikacija apie Kauno RATC įgyvendinamą projektą, sąvartynų mažinimą Lietuvoje ir poreikį skatinti atliekų rūšiavimą). **Lzinios.lt internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 30 2 lapai
	2009/08/17	**APA Kėdainiuose** (parengta ir paviešinta informacija apie SF lėšomis įrengtos APA Kėdainiuose darbą per pirmąjį veiklos mėnesį). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 31 2 lapai
	2009/08/18	**Zabiliškio sąvartyno pridavimas** (Parengta ir paviešinta informacija apie įvykusią Zabiliškio regioninio sąvartyno pridavimo komisiją ir įvykdytus darbus). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 32 1 lapas
	2009/08/25	**APA Kaune** (Parengta ir paviešinta informacija apie SF lėšomis įrengtos APA Kaune darbą per pirmąjį veiklos mėnesį). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 33 1 lapas
	2009/12/24	**Lapių regioninio sąvartyno pridavimas** (Parengta ir paviešinta informacija apie įvykusią Lapių regioninio sąvartyno pridavimo komisiją ir įvykdytus darbus). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 34 1 lapas
	2010/05/28	**Moksleivių ekskursija į Lapių sąvartyną** (Moksleiviai ir mokytojai supažindinti su regioninio Lapių sąvartyno rekonstrukcijos projektu). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 35 2 lapai
	2010/06/14	**Išvyka į Zabiliškio sąvartyną bei APA Kėdainių mieste** (Kėdainių gyventojams buvo sudaryta galimybė susipažinti su sąvartyno veikla, įvykdytais pokyčiais statybų metu, pristatyta APA). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 36 2 lapai

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čeplėjienė

sanglaudos fondas

	2010/06/23	**Sąvartynų uždarymo darbai** (Pranešimas apie baigtus vykdyti investicinio Projekto sutarties sąvartynų uždarymo darbus). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 37 1 lapas
	2010/10/18	**Jonavos moksleiviai lanko atliekų tvarkymo įrenginius** (Informacija apie moksleivių išvyką į regioninius atliekų tvarkymo įrenginius). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 38 1 lapas
	2010-11-20	**Dviratininkų klubo ekskursija į Lapių sąvartyną** (Informacija apie dviratininkų klubo ekskursiją į regioninį Lapių sąvartyną). **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 39 1 lapas
	2010-12-31	**Nauja APA** (Pranešimas apie baigtą statyti aikštelę Raudondvario pl. 155 D, Kaune). Aikštelės statyba buvo projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: APA statyba" sutarties Nr. A/2007/K/38 dalis. **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 40 1 lapas
	2010-12-31	Pranešimas apie baigtą vykdyti projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2004/LT/16/C/PE/001. **Kauno RATC internetinė svetainė** *(patalpinta nemokamai)*	Priedas Nr. 41 2 lapai
	2007-2010 m.	Periodiškas informacijos atnaujinimas, Projekto įgyvendinimo metu atliktų darbų patvirtinimas, nuotraukų talpinimas.	Nepridedama
	2006-2010 m.	Informacija apie Kauno RATC vykdomą projektą internetinėje svetainėje www.esparama.lt. *(patalpinta nemokamai)*	Nepridedama
	2004-2010 m.	Apie vykdomą projektą nuolat informuojama Finansų ministerijos tinklalapyje www.finmin.lt/sanglaudos_fondas *(patalpinta nemokamai)*	Nepridedama
Kitos priemonės	**2006/04/05**	**2006 m. sausio-kovo mėn. susitikimai su Lapių, Zabieliškio seniūnijų gyventojais, televizijos korespondentais.** Susitikimų metu pateikta informacija apie Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą Kauno regione, planuojamus vykdyti darbus ir būsimus pokyčius. *(organizavo Kauno RATC darbuotojai)*	Priedas Nr. 42 1 lapas
	2007/10/26	**Seminaras „Jonavos rajono atliekų srautai, rūšiavimo reikalavimai ir teisingo rūšiavimo principai".** Pranešimas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinimas". *(organizavo Kauno RATC darbuotojai)*	Priedas Nr. 43 4 lapai
	2007/12/18	**Informacinis leidinys apie Kauno RATC „Atliekų tvarkymas Kauno regione"** *(iš projekto lėšų pagal sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui"*	Priedas Nr. 44 12 lapų
	2008/04-05	**Dalyvavimas projekte „Aš noriu švarios Lietuvėlės"** (Parengtas pristatymas Kauno miesto darželių auklėtiniams. Vaikai supažindinti su kuriama regionine atliekų tvarkymo sistema, aiškinama jos svarba ir kiekvieno mūsų dalyvavimas šiame procese). *(organizavo Kauno RATC darbuotojai)*	Priedas Nr. 45 6 lapai

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepulienė

sanglaudos fondas

	2008/10/21	**Dalyvavimas seminare „Šiandieninės atliekų tvarkymo aktualijos"** (Parengtas pranešimas Kauno rajono savivaldybės, seniūnijų, mokymo įstaigų atstovams. Pristatyta Kauno RATC veikla, jau atlikti ir vykdomi darbai). *(Pranešimą skaitė Kauno RATC darbuotojai)*	Priedas Nr. 46 5 lapai
	2008/11/28	**Paskaita LŽŪU studentams „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos pagrindiniai objektai"** (Parengtas pranešimas LŽŪU IV kurso studentams apie projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", pristatyta Kauno RATC veikla, vykdomi statybos darbai). *(Pranešimą skaitė Kauno RATC darbuotojai)*	Priedas Nr. 47 5 lapai
	2009/01/23	**Paskaita Kauno raj. pagrindinės m-klos aplinkotyros ir kraštotyros klubui.** (Susitikime mokiniams papasakota apie jų rajone buvusius sąvartynus, jų uždarymo metu vykdomus darbus. Pristatytas Kauno RATC vykdomas projektas, siekiami tikslai, parengtas pristatymas, apie atliekų rūšiavimą). *(organizavo Kauno RATC darbuotojai)*	Priedas Nr. 48 5 lapai
	2009/01-08 mėn.	**Lankstinukų apie APA gamyba ir platinimas į gyventojų pašto dėžutes** *(Kauno RATC lėšos)*	Priedas Nr. 49 3 lapai
	2009/12/16	**Mokymai Kauno regiono savivaldybių aplinkosaugos specialistams „Nauji iššūkiai atliekų tvarkyme"** (Renginys savivaldybių atliekų tvarkymo specialistams, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas įvykdytomis veiklomis, pasiektais rezultatais) *(organizavo Kauno RATC darbuotojai)*	Priedas Nr. 50 2 lapai
	2010/05/27	**Parengtas pranešimas Kauno raj. moksleiviams apie Lapių sąvartyną.** (dalyvauta Kauno raj. mokyklų aplinkosauginiame renginyje, kurio dalis buvo išvyka į Lapių sąvartyną. Sąvartyne moksleiviai supažindinti su įgyvendintu projektu). *(Pranešimą skaitė Kauno RATC darbuotojai)*	Priedas Nr. 51 3 lapai

4.3. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

Lentelė Nr.46. Įrengti informaciniai stendai ir atminimo lentos

Priemonė	Įrengimo data	Vieta	Rangos sutarties pavadinimas	Pav. Nr. (žr. priedą 4.2)*
Informacinis stendas	2008 m. sausis iki 2009 m. gruodžio	Prie Lapių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Lapių k. Kauno r.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba Sutarties Nr. A/2007/K/37	4.2.1 pav.
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. gruodžio iki 2014 m.	Prie Lapių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Lapių k. Kauno r.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba Sutarties Nr. A/2007/K/37	4.2.2 pav.
Informacinis stendas	2008 m. sausio iki 2009 m. birželio	Prie Žabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Žabieliškio k. Kėdainių r.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Žabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, [illegible] atliekų perdirbimo	4.2.3 pav.

PATIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepkėjienė

sanglaudos fondas

			aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/Z/32	
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. birželio iki 2014 m.	Prie Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įvažiavimo Zabieliškio k. Kėdainių r.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/Z/32	4.2.4. pav.
Informacinis stendas	2008 m. gegužės iki 2009 m. liepos	Prie Kauno m. stambiagabaričių APA įvažiavimo Nemajūnų g. 15B, Kaunas	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.5. pav.
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. liepos iki 2014 m.	Prie Kauno m. stambiagabaričių APA įvažiavimo Nemajūnų g. 15B, Kaunas	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.6 pav.
Informacinis stendas	2008 m. birželio iki 2009 m. birželio	Prie Kaišiadorių stambiagabaričių APA įvažiavimo Vytauto Didžiojo g. 156, Kaišiadorys	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.7 pav.
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. birželio iki 2014 m.	Prie Kaišiadorių stambiagabaričių APA įvažiavimo Vytauto Didžiojo g. 156, Kaišiadorys	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.8 pav.
Informacinis stendas	2008 m. balandis iki 2009 m birželio	Prie Jonavos stambiagabaričių APA įvažiavimo Jonalaukio k. Jonavos raj.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.9. pav.
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. birželio iki 2014 m.	Prie Jonavos stambiagabaričių APA įvažiavimo Jonalaukio k. Jonavos raj.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.10. pav.
Informacinis stendas	2008 m. kovo iki 2009 m. gegužės	Prie Kėdainių stambiagabaričių APA įvažiavimo J. Basanavičiaus g. 97A, Kėdainiai	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.11. pav.
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. gegužės iki 2014 m.	Prie Kėdainių stambiagabaričių APA įvažiavimo J. Basanavičiaus g. 97A, Kėdainiai	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.12. pav.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepliūnienė

sanglaudos fondas

Informacinis stendas	Nuo 2008 m. vasario iki 2009 m. birželio	Prie Raseinių stambiagabaričių APA įvažiavimo Andriušaičių k. Raseinių raj.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.13. pav.
Atminimo lenta	Nuo 2009 m. birželio iki 2014 m.	Prie Raseinių stambiagabaričių APA įvažiavimo Andriušaičių k. Raseinių raj.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.14 pav.
Informacinis stendas	Nuo 2010 m. lapkričio iki gruodžio	Prie Kauno m. stambiagabaričių APA įvažiavimo Raudondvario pl. 155D, Kaunas	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.15 pav.
Atminimo lenta	Nuo 2010 m. gruodžio iki 2015 m.	Prie Kauno m. stambiagabaričių APA įvažiavimo Raudondvario pl. 155D, Kaunas	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba Sutarties Nr. A/2007/K/38	4.2.16 pav.
Informacinis stendas**	Nuo 2009 sausio iki 2010 m. birželio	**Kauno raj.** prie įvažiavimo į Miškinių sąvartyną. **Raseinių raj.** prie įvažiavimo į Andrušaičių sąvartyną. **Kaišiadorių raj.** prie įvažiavimo į Budnikų sąvartyną. **Jonavos raj.** prie įvažiavimo į Jonalaukio sąvartyną. **Kėdainių raj.** prie įvažiavimo į Babėnų sąvartyną.	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas Sutarties Nr. A/2007/K/40	4.2.17. – 4.2.21. pav.
Atminimo lenta	Nuo 2010 m. birželio iki 2015 m.	***Kauno raj.:*** *Miškinų, Digrių, Dirvinių, Gaiženelių.* ***Kaišiadorių raj.:*** *Budnikų, Tarpumiškio, Rumšiškių, Markūnų, Antakalnio, Kruonio, Graužų, Živinių, Klerišių, Pakalniškių.* ***Kėdainių raj.:*** *Babėnų, Šalčininių, Jovaišų, Graužių, Miltėnų, Šatenių, Arimavėlės, Žiogaičių, Pavermenio, Pajievito, Rekšių, Dotmos, Labūnavos, Čiukiškių, Čystapolio.*	Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas Sutarties Nr. A/2007/K/40	4.2.22. – 4.2.79. pav.

TIKRA
Skyriaus vedėjo
2011 -05- 23
Aldona Čepiskienė

		Gudžiūnų, Vikaičių, Špitolpievio. ***Jonavos raj.:*** *Jonalaukio, Paskutiškių, Kudiškių, Palokės, Naravinėškių, Varpių, Kuigalių, Čičirų, Biržuliškių, Aklių.* ***Raseinių raj.:*** *Andrutaičių, Tarasų, Paskystinio, Puliepių, Paprelkių, Gelsvos, Nemgalių, Diržonių, Girkalnio, Žvirgždėn. Dautartų, Zbaro, Jukainių, Ugionių, Steponkaimio, Meiliškių*		

* Informacinių stendų ir atminimo lentų nuotraukos pateikiamos priede 4.2.

** Pagal pasirašytą rangos darbų sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" (Nr. A/2007/K/40) informacinių stendų kiekis ir stendų įrengimo vietos buvo suderintos projekto priežiūros komitete. Atsižvelgiant į tai, kad uždaromų sąvartynų skaičius pagal šią sutartį buvo didelis, o stendų įrengimas prie kiekvieno uždaromo sąvartyno būtų brangiai kainavęs, buvo nutarta statyti po vieną informacinį stendą prie pagrindinių rajoninių sąvartynų. O uždarius visus sąvartynus prie visų 58 sąvartynų buvo pastatyta po atminimo lentą. Priežiūros komiteto sprendimas įgyvendintas rangos darbų techniniame projekte.

5. IŠVADOS

1. Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" tikslas – sukurti aplinkosaugos požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią nacionalinių ir tarptautinių standartų bei įstatymų nustatytus reikalavimus. Padidinti atliekų tvarkymo efektyvumą ir už prieinamą mokestį teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams.
2. Bendra išmokėtų lėšų suma 24.391.585,53 EUR. Iš šios sumos 13.714.922,96 EUR projekto finansavimui skirta iš ES SF , 3.651.565,52 EUR Nacionalinis kofinansavimas (Valstybės biudžeto lėšos), 920.075,46 EUR paskola/nuosavos lėšos. Papildomai iš LR Vyriausybės arba Kauno RATC projekto įgyvendinimui skirta 6.105.021,59 EUR, tame skaičiuje 3.684.093,50 EUR iš LR biudžeto ir 2.420.928,09 EUR iš Kauno RATC lėšų. Likusi neišmokėta pagal sutartis bendra lėšų suma 987.449,98 EUR. Pagal sutartį „Biuro organizacinės įrangos pirkimas vienai darbo vietai VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui (sutarties Nr.06-18) pripažinta netinkamomis finansuoti išlaidomis už 4.206,73 EUR (14.525,00 Lt), iš kurių 3.155,05 EUR iš SF ir 1.051,68 EUR - bendrojo finansavimo lėšos. 2009 m. lapkričio 30 d. šios lėšos buvo grąžintos į Valstybės iždo sąskaitą. Taip pat pagal sutartį Nr. A/2007/K/24 buvo pripažinta netinkamomis finansuoti 5.744,76 EUR (19.835,52 Lt), šios išlaidos yra užskaitomos iš projektui sumokėtų Užsakovo viršijančių lėšų.
3. Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendinimo metu vykdyti viešieji pirkimai buvo atliekami laikantis Tarybos direktyvos Nr. 92/50/EB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo, Tarybos direktyvos Nr. 93/96/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo, Tarybos direktyvos Nr. 93/37/EB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aidona Čepliėjienė

koordinavimo, Tarybos direktyvos Nr. 93/38/EEB dėl įmonių, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, pirkimo tvarkos koordinavimo reikalavimų ir, nuo jų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus įsigaliojimo dienos, direktyvos Nr. 2004/18/EB dėl viešojo darbų, tiekimo ir paslaugų pirkimo sutarčių tvarkos koordinavimo ir direktyvos Nr. 2004/17/EK dėl įmonių, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, pirkimo tvarkos koordinavimo reikalavimų.

4. Darbai, paslaugos ir prekių tiekimas pagal dvylika viešojo pirkimo sutarčių įvykdyti iki 2010 m. gruodžio 31 d.
5. Įgyvendinus projektą Kauno regione pastatyta ir eksploatuojama:
   - Regioninis sąvartynas Lapių kaime (penkios naujos sekcijos ir pabaigtas rengti 3B laiko dugnas, tarnybinė zona, nuotekų, paviršinio vandens ir filtrato surinkimo sistemos, I kaupimo lauko uždarymas, iškeltos 110 KV ir 10 KV elektros oro linijos)
   - Regioninio sąvartyno Zabieliškio kaime statyba (dvi naujos sekcijos, tarnybinė zona, administracinio pastato su pagalbinėmis patalpomis remontas, nuotekų, paviršinio vandens ir filtrato surinkimo sistemos, esamos sekcijos uždengimas)
   - Privažiavimo kelias iki Zabieliškio regioninio sąvartyno;
   - Statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir perdirbimo aikštelė, Zabieliškio regioninio sąvartyno teritorijoje;
   - Statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir perdirbimo aikštelė, Zabieliškio regioninio sąvartyno teritorijoje;
   - Šešios atliekų priėmimo aikštelės su visa būtina infrastruktūra, trys aikštelės su atliekų perkrovimo stotimis.
   - Uždaryti 59 normatyvinių reikalavimų neatitinkantys sąvartynai ir šiukšlynai, įskaitant ir Lapių sąvartyno I-ą lauką, sumažinta požeminio ir paviršinio vandens tarša.
6. Visuomenė informuota ir formuota jos palanki nuomonė apie investicinio projekto uždavinius ir tikslus, šio projekto sudėtyje vykdomų užduočių eigą ir rezultatus, atsirasiančią naudą vietos bendruomenei bei pagerėsiančią aplinkos būklę, ES paramos reikšmę šio projekto įgyvendinime.
7. 2010 m. birželio 2 d. EK sprendimo Nr. K(2010)3625 (kuris iš dalies pakeitė 2005 m. gegužės 24 d. EK sprendimą Nr. (2005)1610) numatyti tikslai yra pasiekti, o specialiosios sąlygos ir pagrindiniai priežiūros rodikliai yra įgyvendinti laiku ir tinkamai.
8. Po projekto užbaigimo visame Kauno regione yra taikoma vieninga tarifų nustatymo metodika, kuri realiai atitinka įmonės sąnaudas, reikalingas naujų sąvartynų, kompostavimo, statybos bei griovimo atliekų, APA eksploatacijai ir priežiūrai bei atliekų pervežimui nuo perkrovimo stočių iki regioninių sąvartynų.
9. Projektas yra gyvybingas, kadangi akumuliuotas pinigų srautas yra teigiamas. Ekonominės analizės rezultatais leidžia teigti, kad projektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus.
10. Užbaigtas projektas valdomas pagal galiojančius ES ir LR teisės aktus ir kitus norminius dokumentus.
11. Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" įgyvendintas ir atitinka ES keliamus reikalavimus.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

sanglaudos fondas

PRIEDAI *

Priedo Nr.	Dokumento pavadinimas
	Skyrius 2 Projekto įgyvendinimas
	Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis
2.1.1	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba. Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis
2.1.2	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba. Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis
2.1.3	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba. Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis
2.1.4	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas. Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis
	Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai
2.2.1	Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.1 STN4-148 2009-11-20
2.2.2	Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.2 STN-168 2009-12-14
2.2.3	Lapių regioninio sąvartyno I etapo statinių Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2008-10-09d.
2.2.4	Lapių regioninio sąvartyno II etapo statinių Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2008-09-11d.
2.2.5	Lapių regioninio sąvartyno III etapo statinių Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2009-07-01d.
2.2.6	Lapių regioninio sąvartyno IV etapo statinių Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2009-12-24d.
2.2.7.	APA Raseinių raj. Androšaičių k. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.STN-82 2009-06-17
2.2.8	APA Basanavičiaus g. 97 Kėdainiuose Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.STN4-34 2009-05-29
2.2.9	APA Vytauto Didžiojo 136 Kaišiadoryse Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.STN26-09-979/IN-001 2009-07-10
2.2.10	APA Nemajūnų g. 15 B Kaune, Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.STN-334 2009-07-13
2.2.11	APA Jonalaukio k. Ruklos s., Jonavos r. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.STN-25-76/09 2009-09-29
2.2.12	APA Raudondvario pl.155 Kaune. Statybos užbaigimo aktas Nr. (15.34) SUA-29
2.2.13	Jonavos raj. mažųjų sąvartynų uždarymas. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100519-00273 2010-05-19
2.2.14	Jonalaukio sąvartyno uždarymas Jonavos rajone, Jonalaukio k., Ruklos sen. Pripažinimo uždarytu aktas Nr.PTN-20-100619-00424 2010-06-19
2.2.15	Kaišiadorių raj. mažųjų sąvartynų uždarymas. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100406000054 2010-04-06
2.2.16	Tarpumiškio sąvartyno uždarymas Kaišiadorių raj., Žiežmarių sen., Tarpumiškio k. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100406-00052 2010-04-06
2.2.17	Rumšiškių sąvartyno uždarymas Kaišiadorių raj., Rumšiškių sen., Dovainonys. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100406-00053 2010-04-06
2.2.18	Kauno raj. mažųjų sąvartynų uždarymas. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100421-00132 2010-04-21

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

2.2.19	Digrių sąvartyno uždarymas Kauno raj. sav., Digrių k., Alšėnų sen. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100421-00128 2010-04-21
2.2.20	Miškinių sąvartyno uždarymas Kauno raj. sav., Miškinių k., Raudondvario sen. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100421-00131 2010-04-21
2.2.21	Kėdainių raj. mažųjų sąvartynų uždarymas. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100619-00423 2010-06-19
2.2.22	Babėnų sąvartyno uždarymas Kėdainių raj. sav., Babėnų g.24, Kėdainiai Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100619-00422 2010-06-19
2.2.23	Šalčmirių sąvartyno uždarymas Kėdainių raj. sav., Dotnuvos sen., Šalčmiriai Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100507-00214 2010-05-07
2.2.24	Budnikų (Keturokų) sąvartyno uždarymas Kaišiadorių raj. sav. Žąslių sen., Keturokų k. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100615-00400 2010-06-15
2.2.25	Raseinių raj. mažųjų sąvartynų uždarymas . Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100412-00018 2010-04-12
2.2.26	Andrušaičių sąvartyno uždarymas Raseinių raj. Raseinių sen., Andrušaičių k.. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100414-00102 2010-04-14
2.2.27	Gėluvos sąvartyno uždarymas Raseinių raj. Ariogalos sen., Gėluvos k.. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100413-00063 2010-04-13
2.2.28	Numgalių sąvartyno uždarymas Raseinių raj. Viduklės sen., Kempalių k.. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.PTN-20-100412-00079 2010-04-12
2.2.29	110 kV OL „Kaunas-Jonava" iškeltos iš Lapių sąvartyno teritorijos, pakeistos kabeline linija pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2008-10-21
2.2.30	Energetikos inžinerinių statinių 0.4-10kV kabelinių linijų naujai nutiestų iš MT-Sg-442,465 ir jų elektros įvenginių Lepšiškių k. pripažinimo tinkamais naudoti aktas 2009-02-03d.
	Darbų perėmimo pažymos
2.3.1	Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba. Darbų perėmimo pažyma 2009-07-09
2.3.2	Lapių regioninio sąvartyno statyba Darbų grupės perėmimo pažyma 2009-05-08
2.3.2	Lapių regioninio sąvartyno statyba Darbų perėmimo pažyma 2010-01-04
2.3.3	APA statyba. Darbų dalies perėmimo pažyma 2010-10-07
2.3.4	Sąvartynų uždarymas Darbų perėmimo pažyma 2010-07-01
2.3.5	APA statyba. Darbų dalies perėmimo pažyma 2011-02-03
	Darbų atlikimo pažymos
2.4.1	Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba. Darbų atlikimo pažyma 2010-07-21
2.4.2	Kėdainių raj. savivaldybės administracijos Pelėdnagių seniūnijos 2010-11-18pažyma Nr.17-1311 Apie deklaruotus gyvenamą vietą
2.4.3	Lapių regioninio sąvartyno statyba Darbų atlikimo pažyma 2010-12-10
Papildyti po įvykdymo	APA statyba Darbų atlikimo pažyma

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

Papildyti po įvykdymo	Sąvartynų uždarymas Darbų atlikimo pažyma
	Kiti priedai
2.5.1	Statistikos departamento ataskaita „Gyventojų skaičius, natūrali kaita apskrityse ir savivaldybėse“.
2.5.2	Kėdainių miesto atliekų priėmimo aikštelės taršos integruotos prevenzijos ir kontrolės leidimas Nr. 6/36
2.5.3	Kauno miesto Nemajūnų g. 15B atliekų priėmimo aikštelės taršos integruotos prevenzijos ir kontrolės leidimas Nr. 1/23
2.5.4	Kauno miesto Raudondvario pl. 155D atliekų priėmimo aikštelės taršos integruotos prevenzijos ir kontrolės leidimas Nr. 1/52
	Skyrius 3 Finansinė ir ekonominė analizė
3.1	Projekto investicijų finansinių rodiklių skaičiavimas
3.2	Projekto kapitalo finansinių rodiklių skaičiavimas
3.3	Projekto finansinio gyvybingumo skaičiavimai
3.4	Projekto ekonominio įvertinimo skaičiavimai
3.5	Išlaidų ir pajamų skaičiavimo prielaidos
3.6	Komunalinių atliekų priėmimo į savartynus ir aikštelės mokesčio dydis ir atliekų kodai.
	Skyrius 4 Projekto viešinimas
4.1.1 - 4.1.47	Projekto viešinimo priemonės (pagal lentelę 46)
4.2.1	Informaciniai stendai ir atminimo lentos

* Priedai pateikiami elektroniniame formate CD laikmenoje, pridedamoje prie ataskaitos.

** Priedo numeriai atitinka CD laikmenoje nurodytus bylų numerius, nurodytus tų bylų pavadinimų priekyje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čepėjienė

PRIEDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

PRIEDAS 2.1.1 Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba. Atliktų darbų aprašymas su nuotraukomis

Sutarties Nr.	**A/2007/Z/32**
Sutarties pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba**
Darbų rangovas	UAB „Kamesta“
Atliktų darbų aprašymas ir nuotraukos	
įrengta buitinių atliekų sąvartyno 1-a sekcija	

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDITO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

esamos 2-os sekcijos sutvarkymas ir dalinis uždengimas	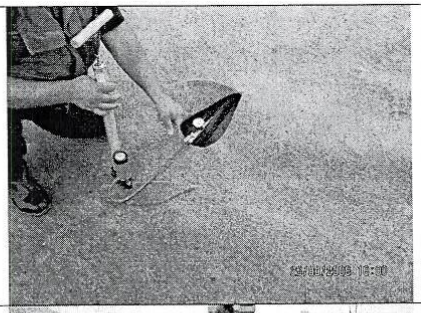	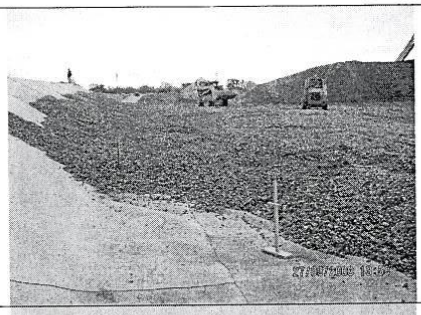
		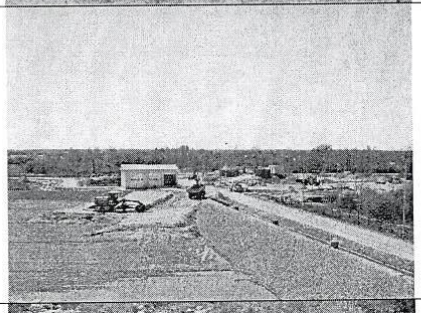
		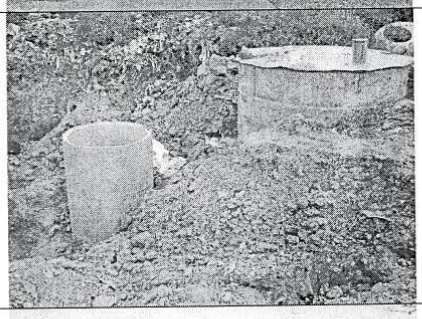

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA * KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė

2011 -06- 23

esamo administracinio pastato remontas,	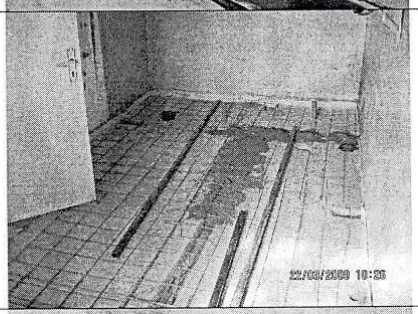	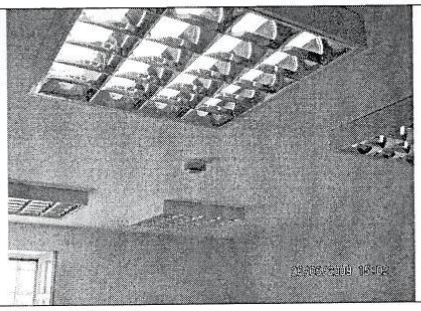
	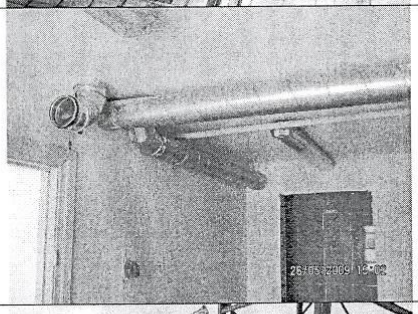	
Įrengta aptarnaujančio transporto stoginė		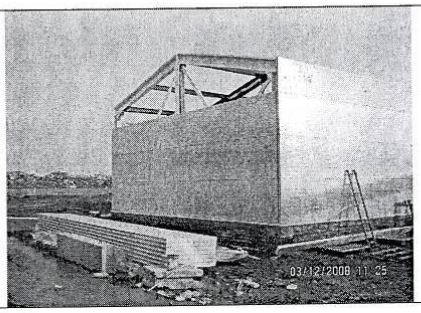

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, AUDITO IR TURTO VALDYMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

2011 -06- 23

sanglaudos fondas

įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo 0,387 ha ploto aikštelė	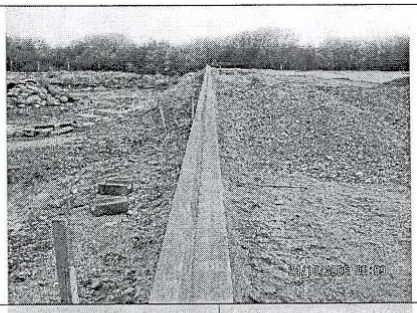	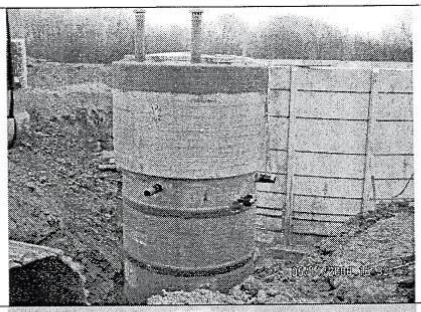
	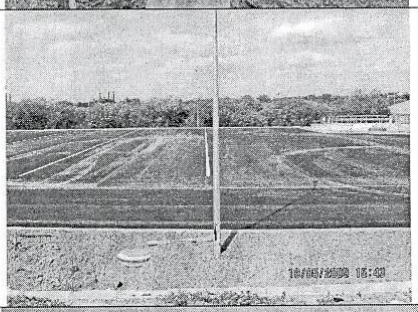	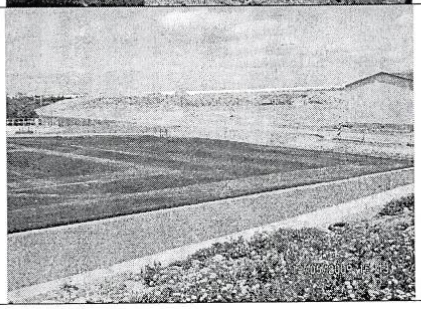
įrengta statybos ir griovimo atliekų 0,2065 ha ploto aikštelė	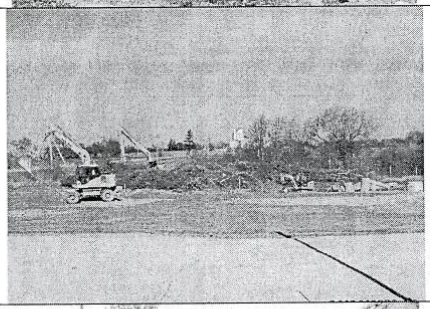	
Įrengtas filtrato kaupimo rezervuaras		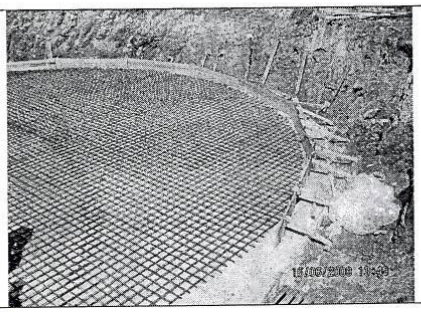

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDITOJŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelėjienė

	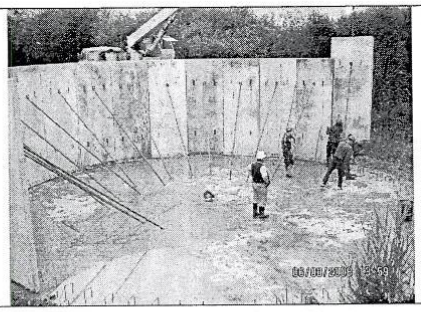	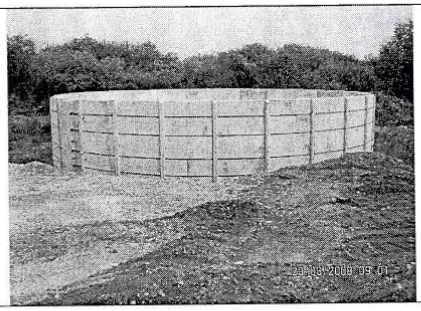
	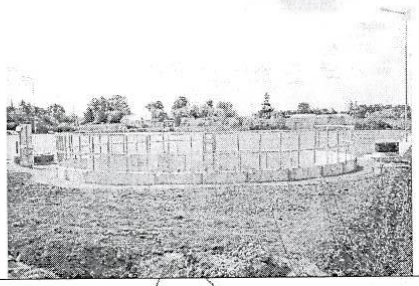	
Atliktas automobilių svarstyklių remontas	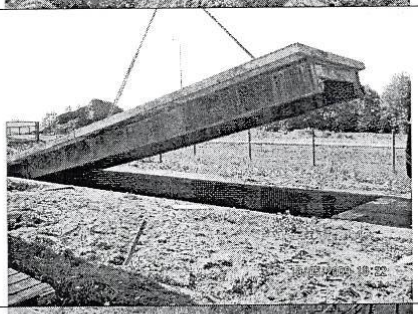	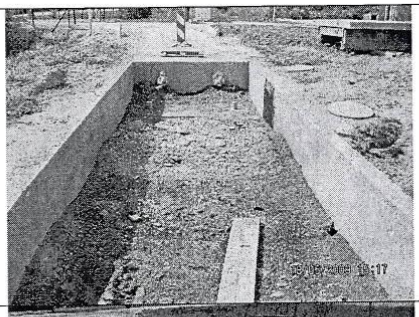
	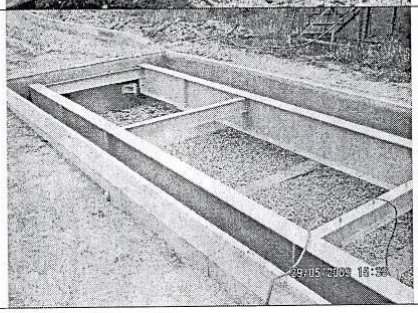	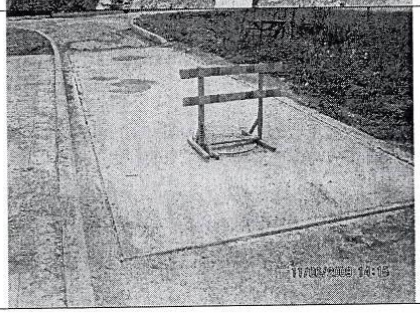

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2011 -06- 23

sanglaudos fondas

Įrengta automobilių ratų dezinfekavimo duobė	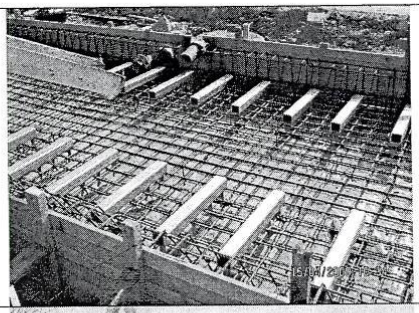	
įrengti priešgaisriniai rezervuarai		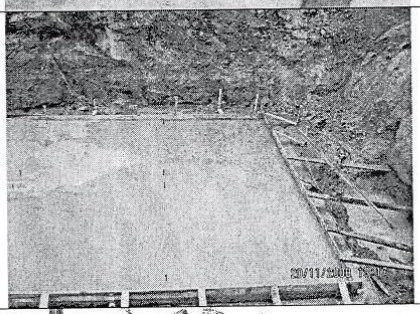
įrengta elektros transformatorinė pastotis	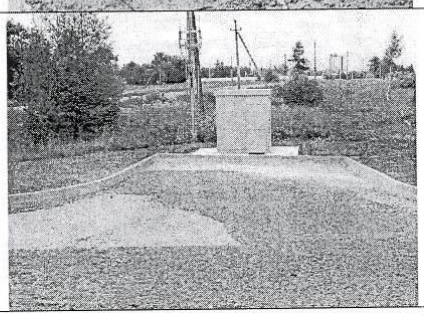	

Kauno RATC sanglaudos fondas

Rekonstruota esama ir įrengta nauja filtrato surinkimo siurblinė	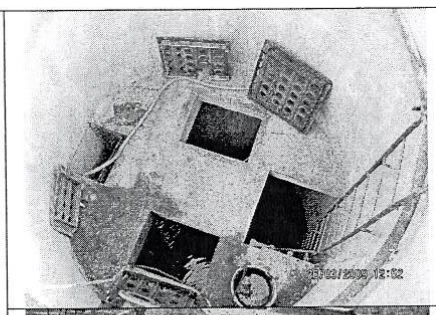	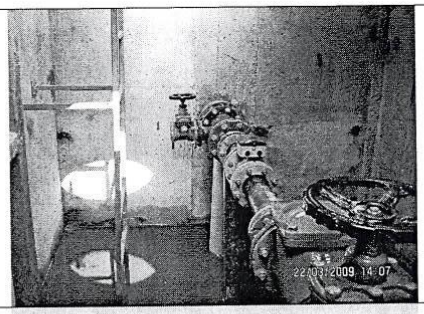
	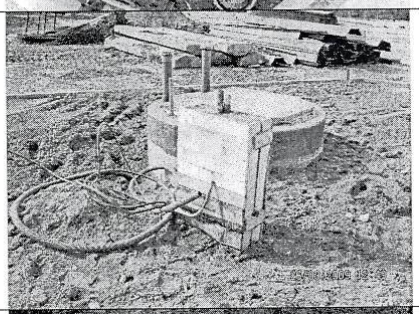	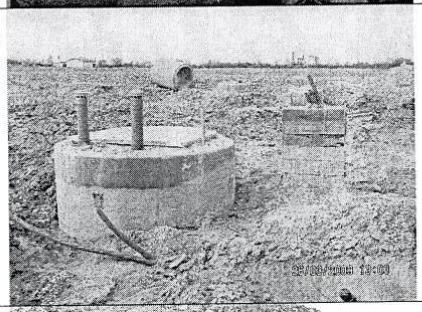
Įrengta drenažinio vandens siurblinė	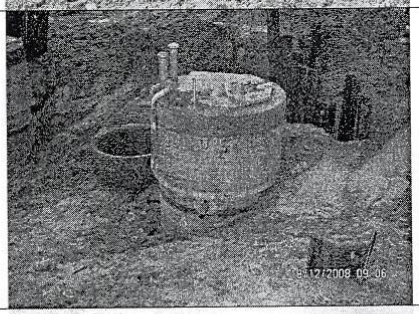	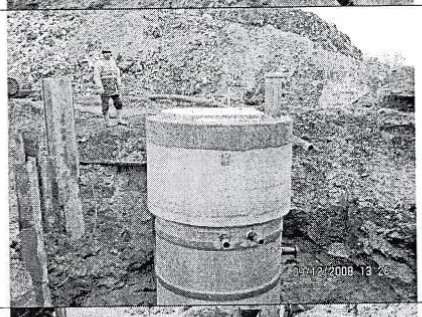
įrengta gruntinio vandens pažeminimo sistema	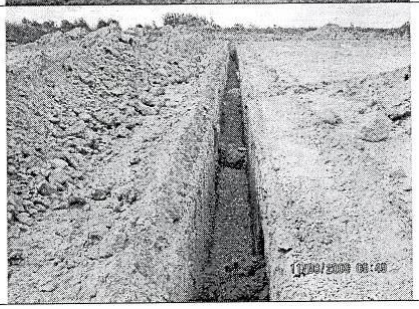	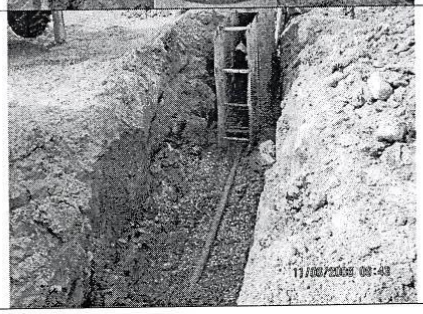

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

Įrengtas purvo ir naftos skirtuvas		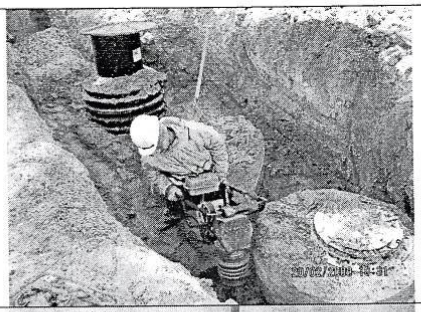
įrengti inžineriniai tinklai		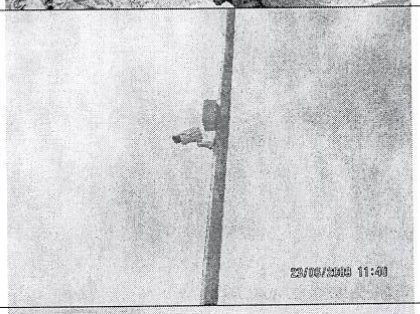
įrengti sąvartyno vidaus keliai	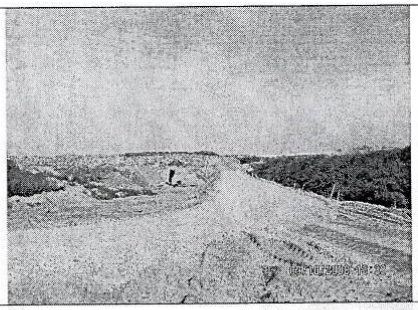	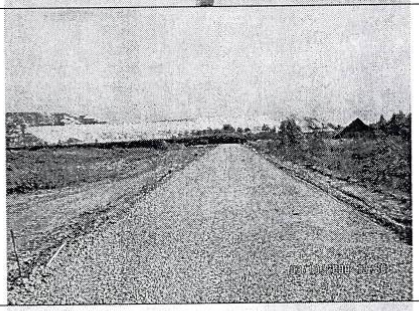
		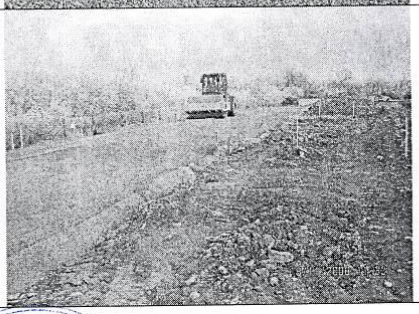

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

įrengti sąvartyno apšvietimą, aptvėrimą ir apželdinimą,		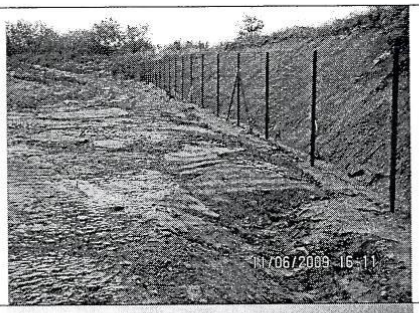
	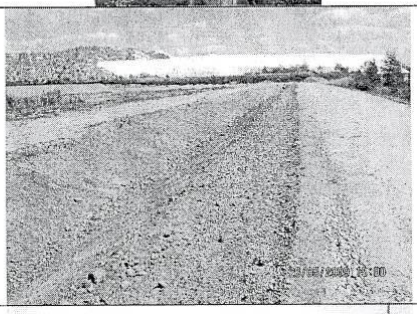	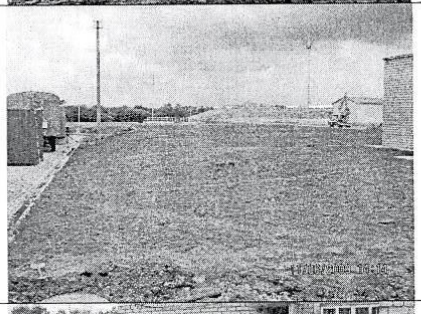
	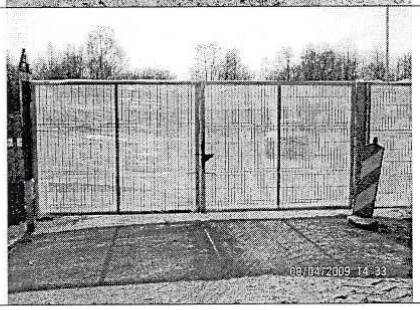	
Įrengtas privažiavimo kelias		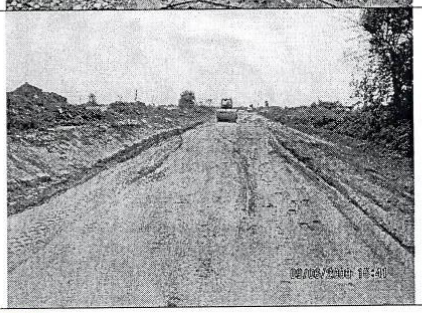

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA * KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS REIKALŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kauno RATC sanglaudos fondas

	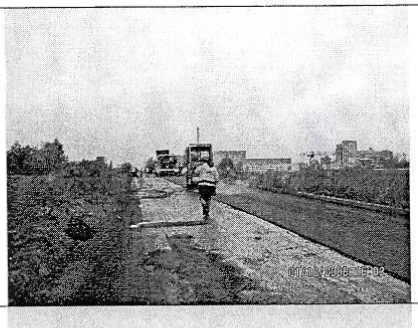 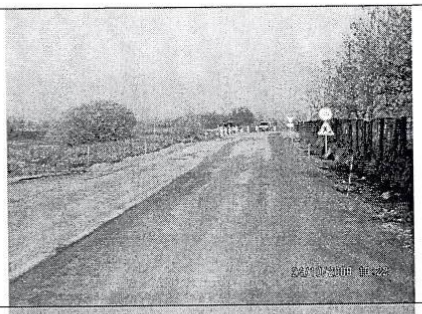
	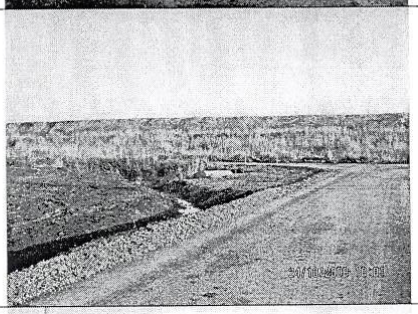 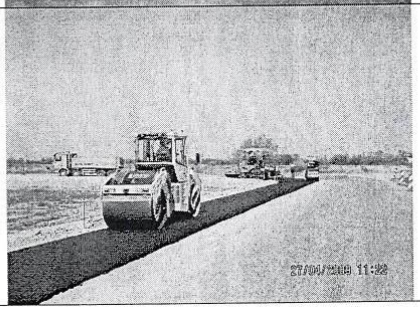
	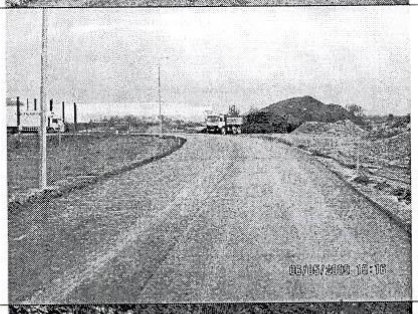
Įrengta monitoringo sistema	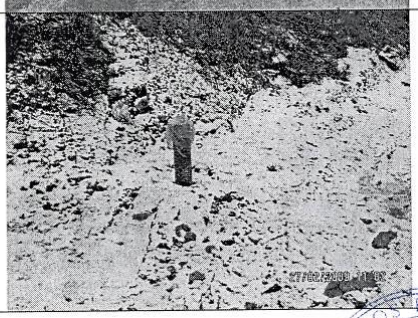 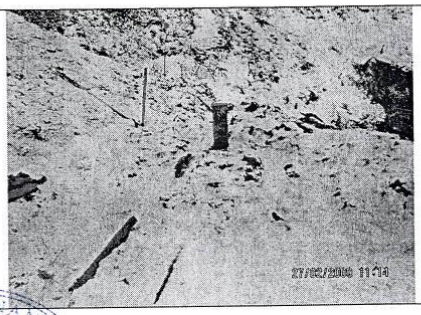

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, AUDITO IR VIDAUS ATSKAITOMYBĖS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

Kauno RATC sanglaudos fondas

Įrengti vandens nuvedimo grioviai ir sutvarkytas melioracijos griovys	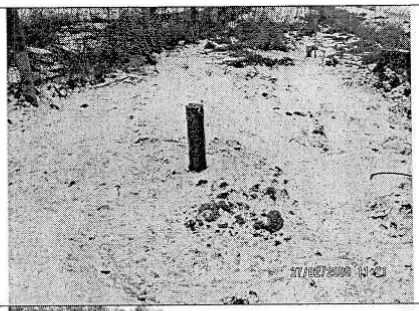	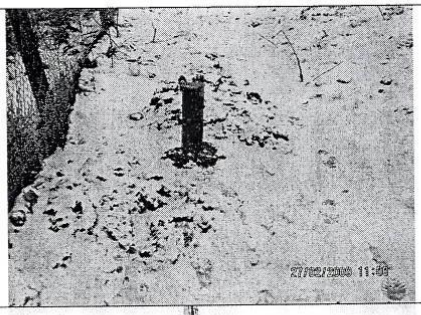
		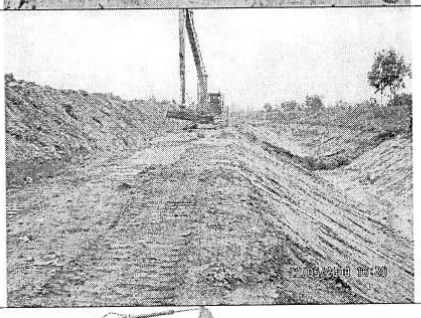
	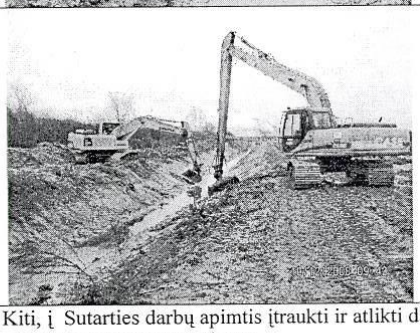	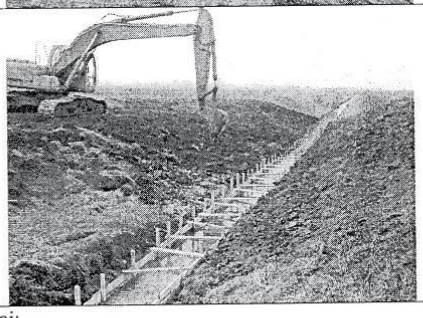
	Kiti, į Sutarties darbų apimtis įtraukti ir atlikti darbai: - Darbo projekto paruošimas; - Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atstatomieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui, - Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas.	

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA KONTROLĖS, KORUPCIJOS IR VIDINIO AUDITO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2011 -06- 23

sanglaudos fondas

PRIEDAS 2.1.2. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba. Atliktų darbų aprašymas su nuotraukomis

Sutarties Nr.	**A/2007/K/37**
Sutarties pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba**
Darbų rangovas	UAB „Sienojus“ ir UAB Laugina“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu
Atliktų darbų aprašymas ir nuotraukos	
-įrengtas buitinių atliekų sąvartyno 2-asis kaupimo laukas	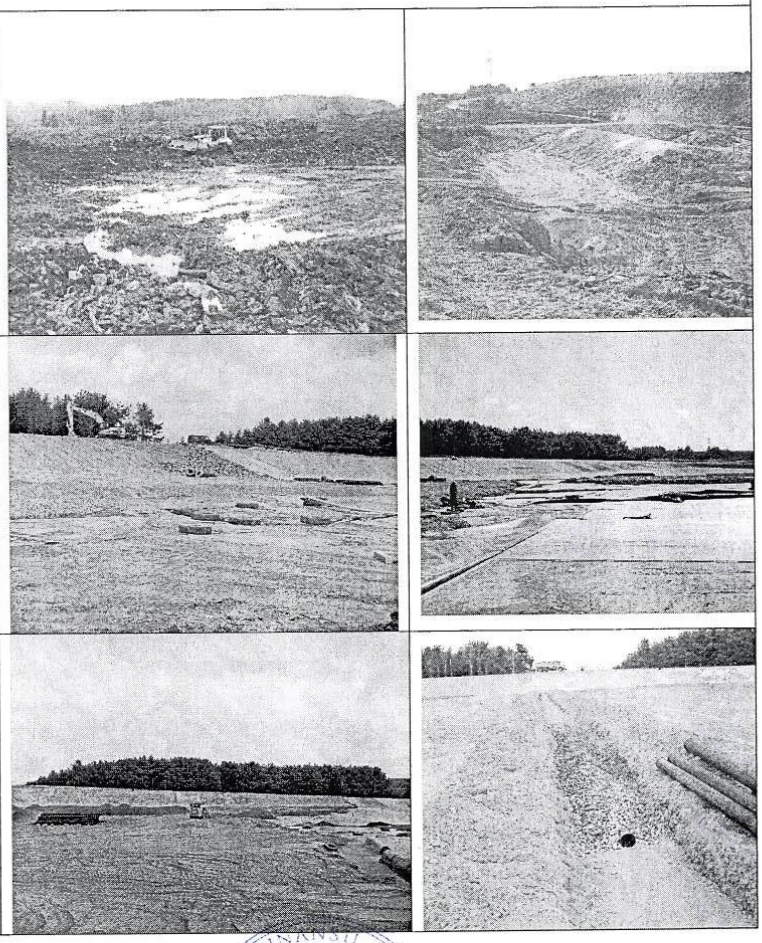

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

	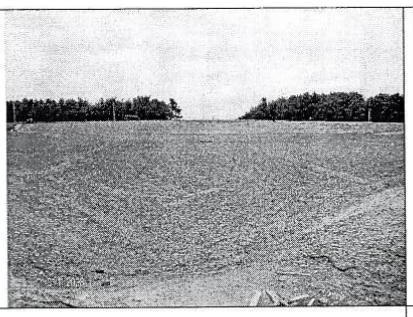	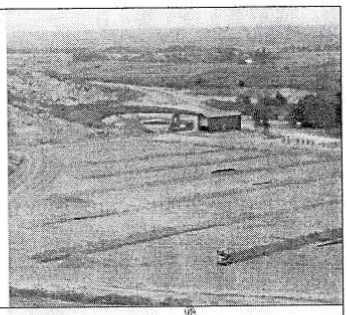
Uždarytas esamas 1-as kaupimo laukas(rekultivavimas);		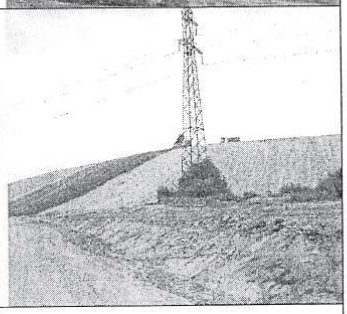
	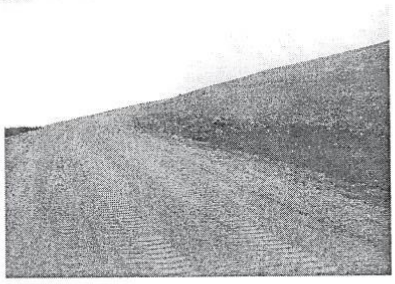	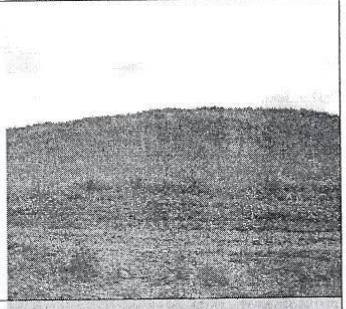
-užbaigta esamo 3-io kaupimo lauko dalis		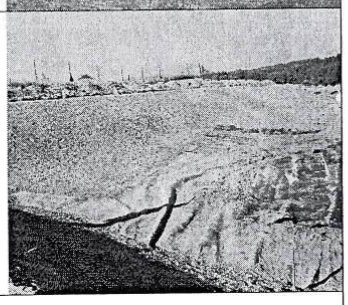

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORUPCIJOS IR VIDAUS AUDITO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

Pastatytas administracinis pastatas		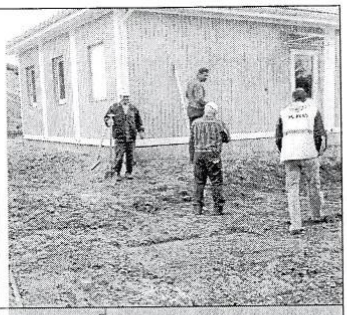
	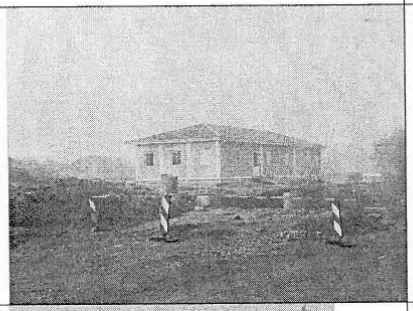	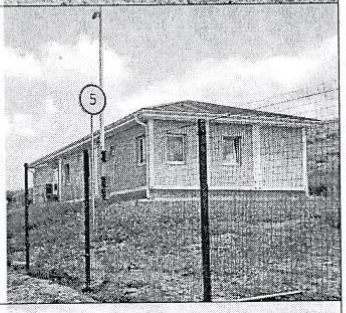
Pastatytas buitinis pastatas	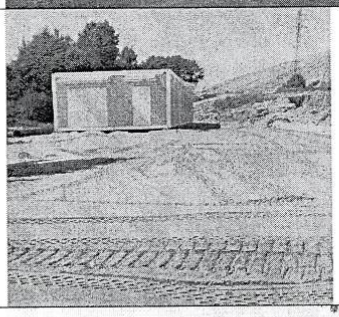	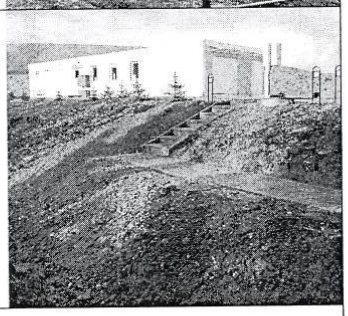
Perkelta esama aptarnaujančio transporto stoginė	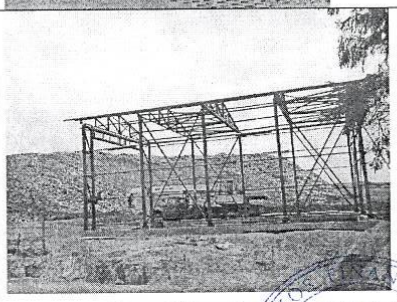	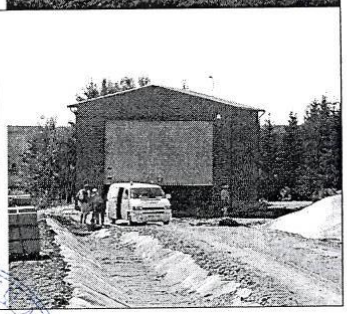

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

Rekonstruotos automobilių svarstyklės	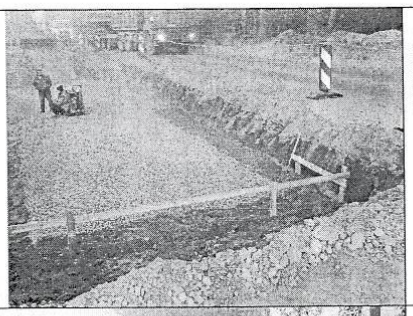	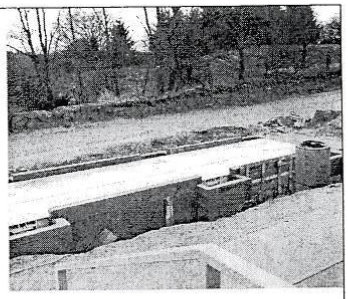
Pastatyta automobilių ratų plovykla	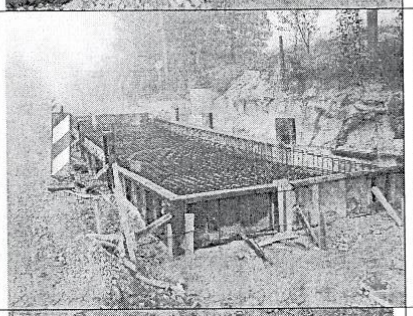	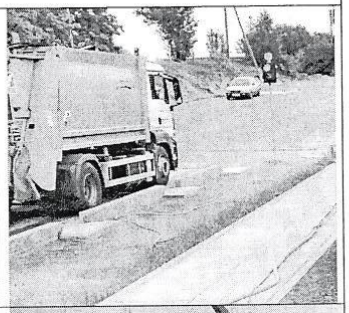
Įrengti priešgaisriniai rezervuarai	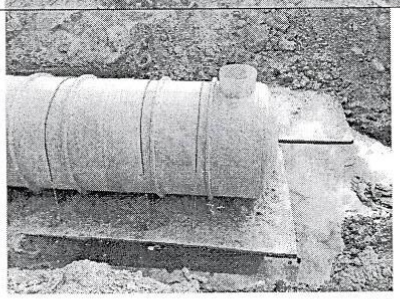	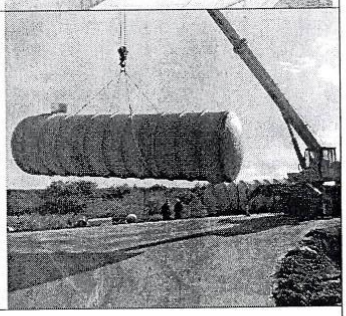
Įrengta gruntinio vandens pažeminimo sistema	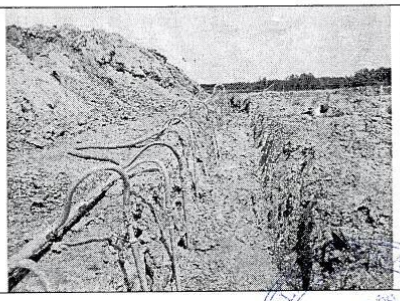	

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS REGIMO SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliejienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

Įrengti inžineriniai tinklai (elektros tinklai, videostebėjimas, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai su valymo įrenginiais, vandentiekio tinklai) ,		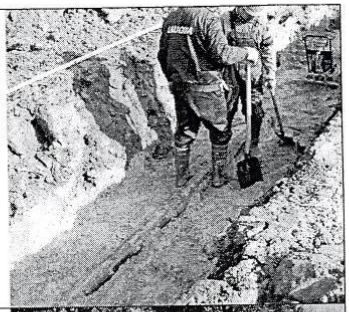
		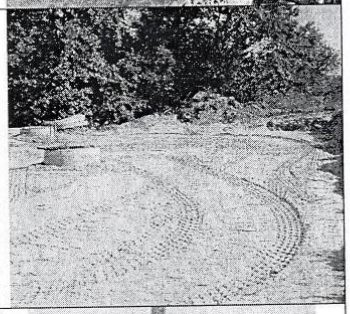
		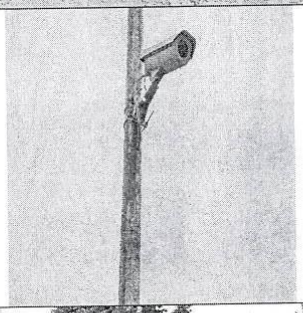
		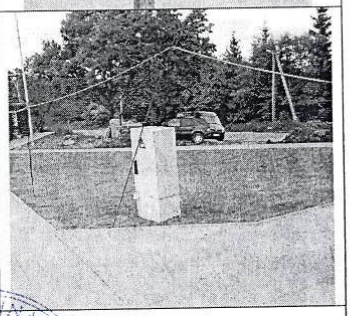

REPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA * LIETUVOS
KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR ĮSTAIGŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė

2011 -06- 23

Patatyti sąvartyno vidiniai keliai ir aikštelės	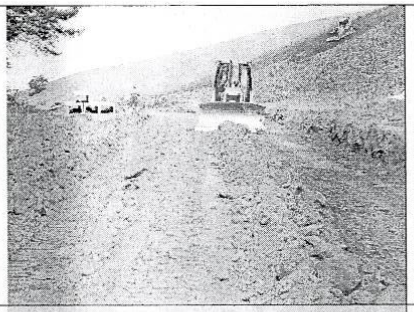	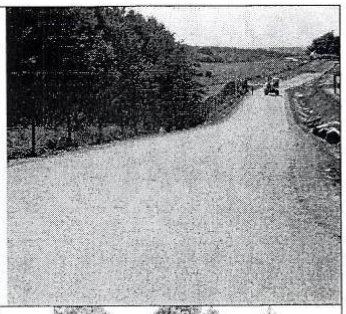
	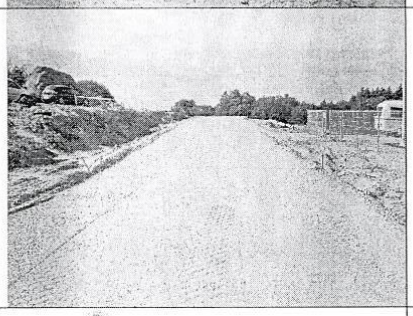	
		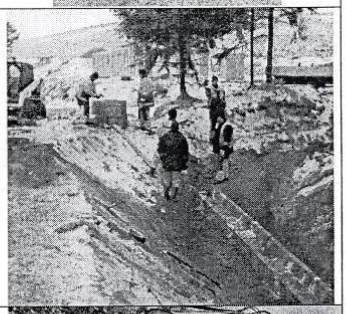
	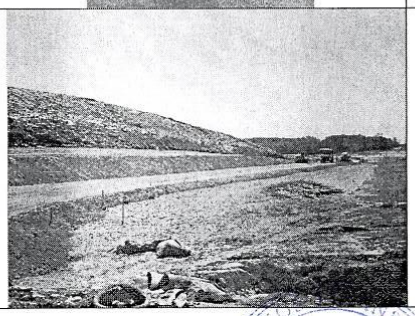	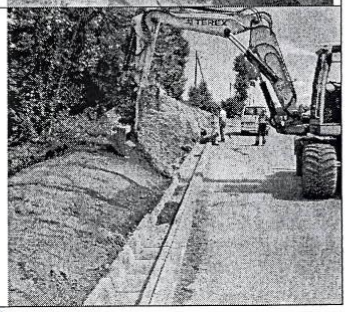

KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

Įrengtas sąvartyno apšvietimas, aptvėrimas ir apželdinimas,		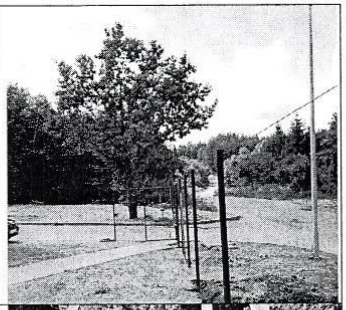
		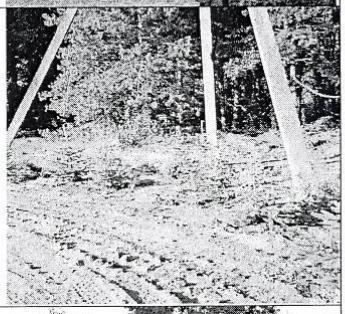
Įrengtas artezininis gręžinys	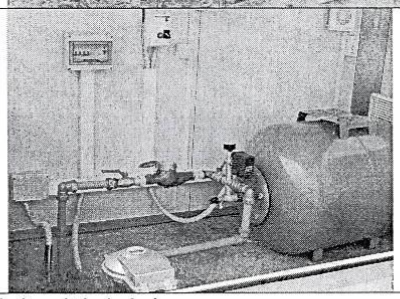	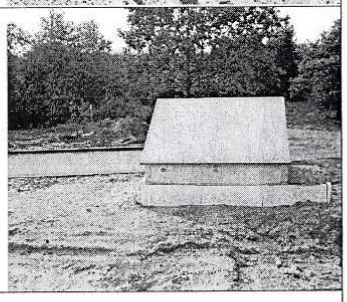

Kiti, į šios Sutarties darbų apimtis įtraukti, darbai:
-Darbo projekto paruošimas ir konstrukcinės dalies ekspertizė,
- Esamų statinių demontavimas,
Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas,
- Parengiamieji statybos darbai,
- Statybos atstatomieji darbai,
- Parengta aplinkos minitoringo programa
- Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui,
- Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDITŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

PRIEDAS 2.1.3 Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Atliekų priėmimo aikštelių statyba. Atliktų darbų aprašymas su nuotraukomis.

Sutarties Nr.	**A/2007/K/38**
Sutarties pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba**
Darbų rangovas	AB „Raseinių melioracija“ ir UAB „Laugina“ veikiantys jungtinės veiklos pagrindu

Pagal sutartį bus pastatytos šešios atliekų priėmimo aikštelės. Penkios aikštelės pastatytos, o šešta statoma Kaune Raudondvario pl. ir bus įrengta iki 2010 m. guodžio mėn. pabaigos. Aikštelės su kietomis asfaltbetonio ir betono dangomis, konteinerinio tipo administraciniais, pavojingų bei stambiagabaričių atliekų saugojimo pastatais, išorės ir vidaus elektros tinklais, teritorijos apšvietimu, paviršinio vandens nuvedimo, buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklais, naftos gaudyklėmis.Buitinės nuotekos nuvedamos į esamus tinklus arba valomos biologinio valymo įrenginiuose vietoje. Įrengti prešgaisrinio vandens rezervuarai arba iki aikštelės atvesti miesto vandentiekio tinklai. Visos aikštelės aptvertos.. Aikštelėse pastatyti konteineriai surenkamom atliekom ir antrinėm žaliavom. Trys aikštelės Raseinių ir Jonavos rajonuose bei Kaišiadoryse su atliekų perkrovimo stotimis –atliekų presavimo technika, trimis atliekų pervežimo konteineriais kiekvienoje stotyje, aptarnaujančio personalo konteinerinio tipo patalpa, atliekų avarinio saugojimo zona ir kita būtina infrastruktūra. Aikštelėse pastatyti informaciniaim stendai ir ženklai.

Atliekų priėmimo aikštelė Kauno m. Nemajūnų g. 15a

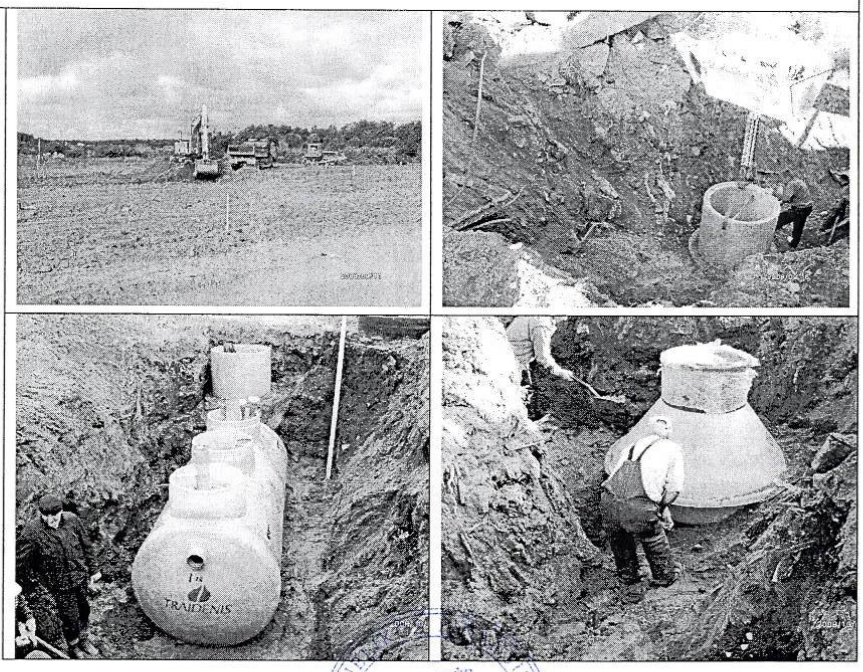

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIETINIŲ REIKALŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIETINIŲ REIKALŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliėjienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

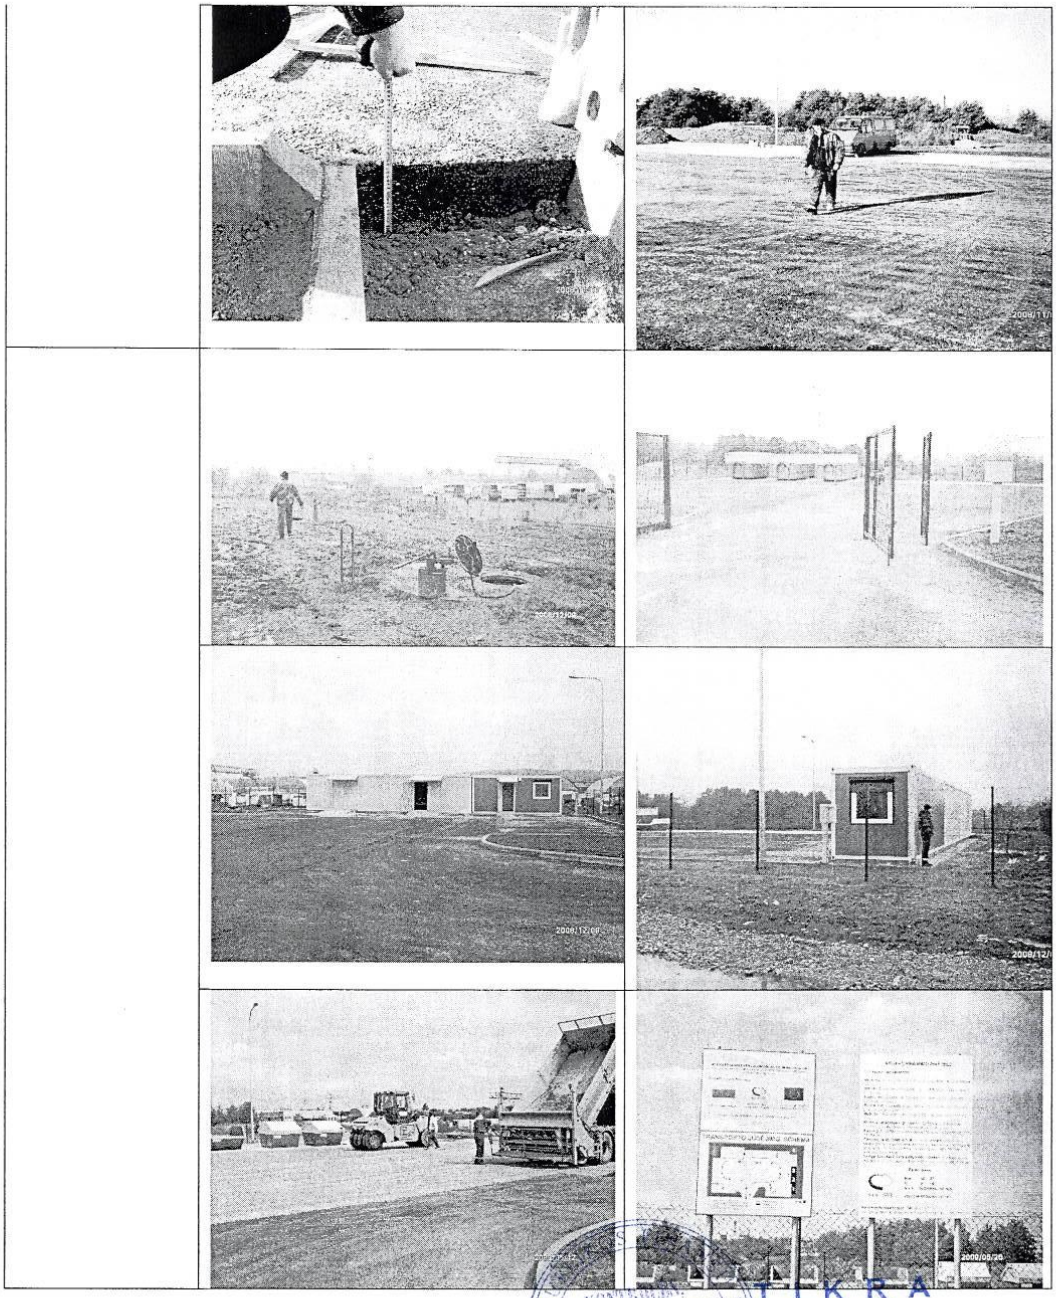

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

2011 -06- 23

Kauno RATC

sanglaudos fondas

Atliekų priėmimo aikštelė Kėdainiai, J. Basanavičiaus g.	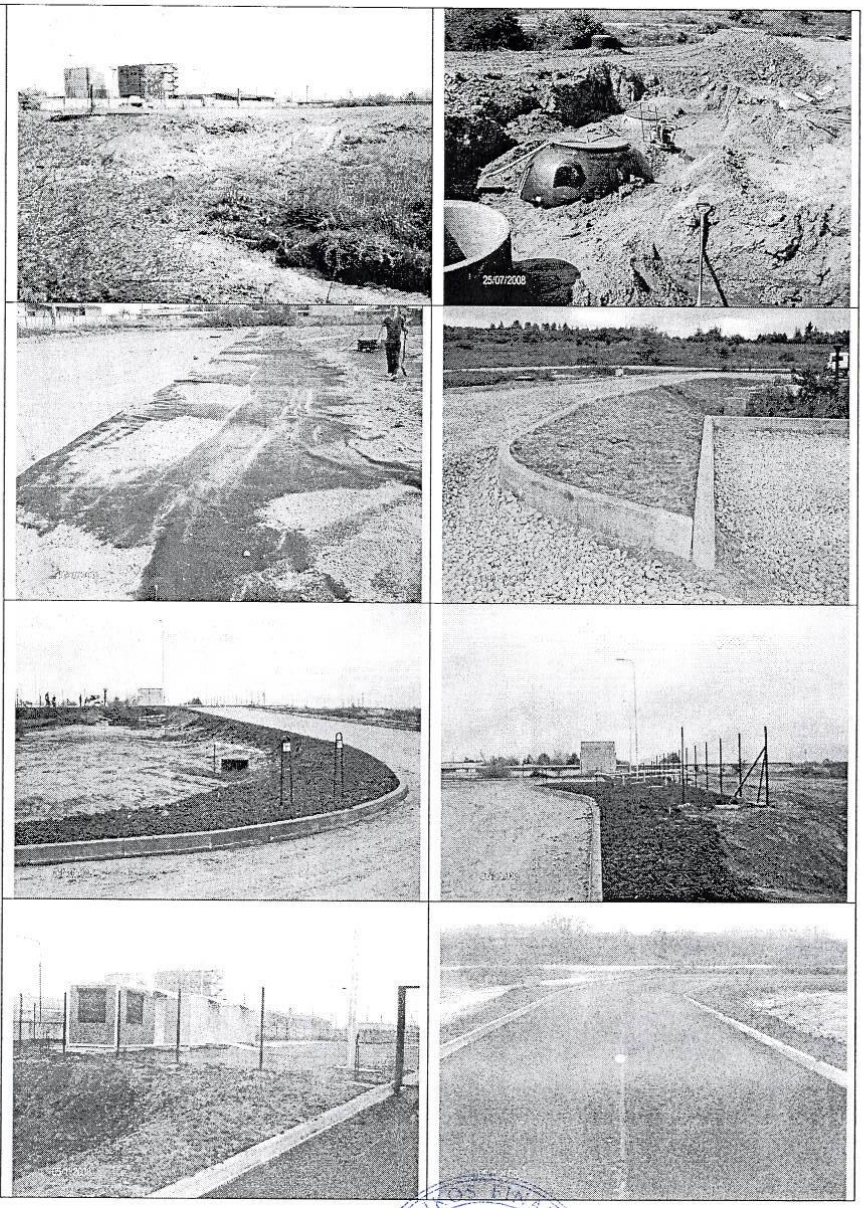

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTINIŲ SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011 -06- 23

Atliekų priėmimo aikštelė Kaišiadorys, Vytauto Didžiojo g. 136

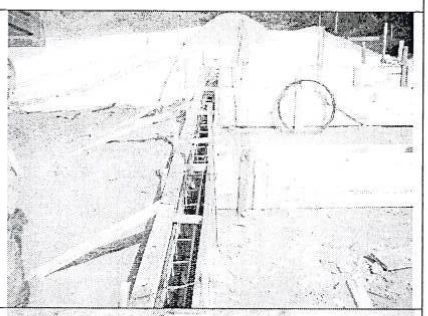

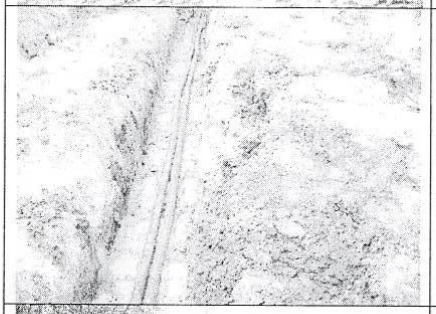

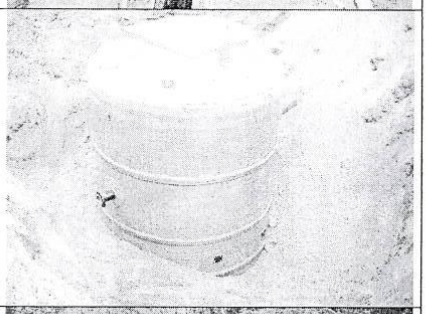

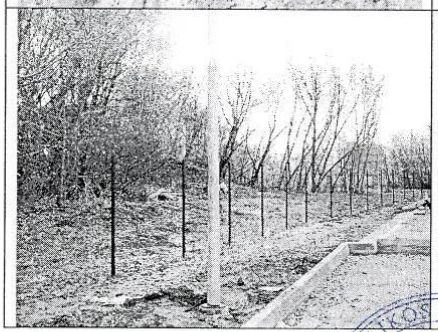

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR TEKSTŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

	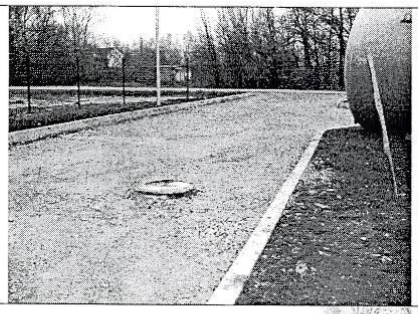	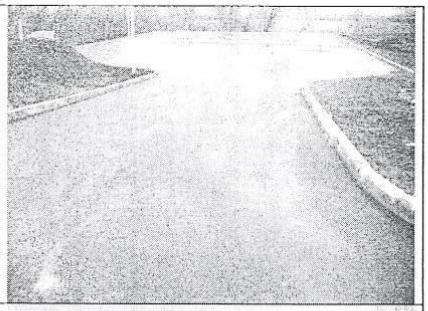
	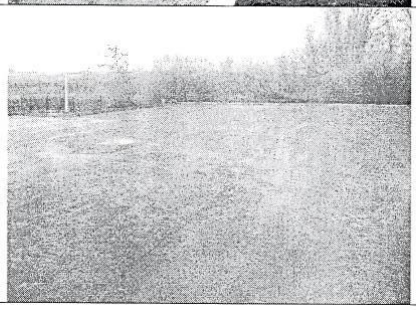	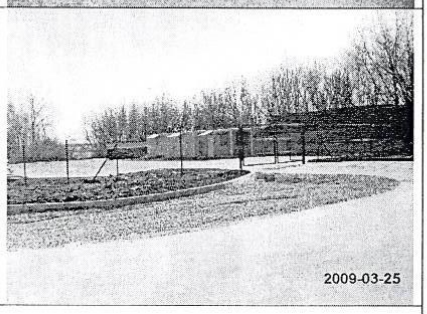
Atliekų priėmimo aikštelė Jonavos raj. Jonalaukio k.	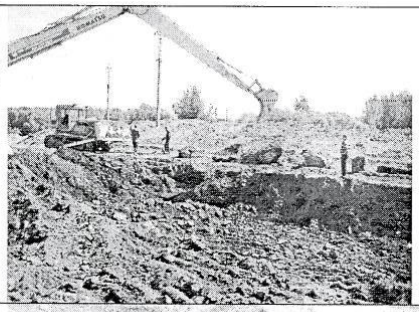	

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTINIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

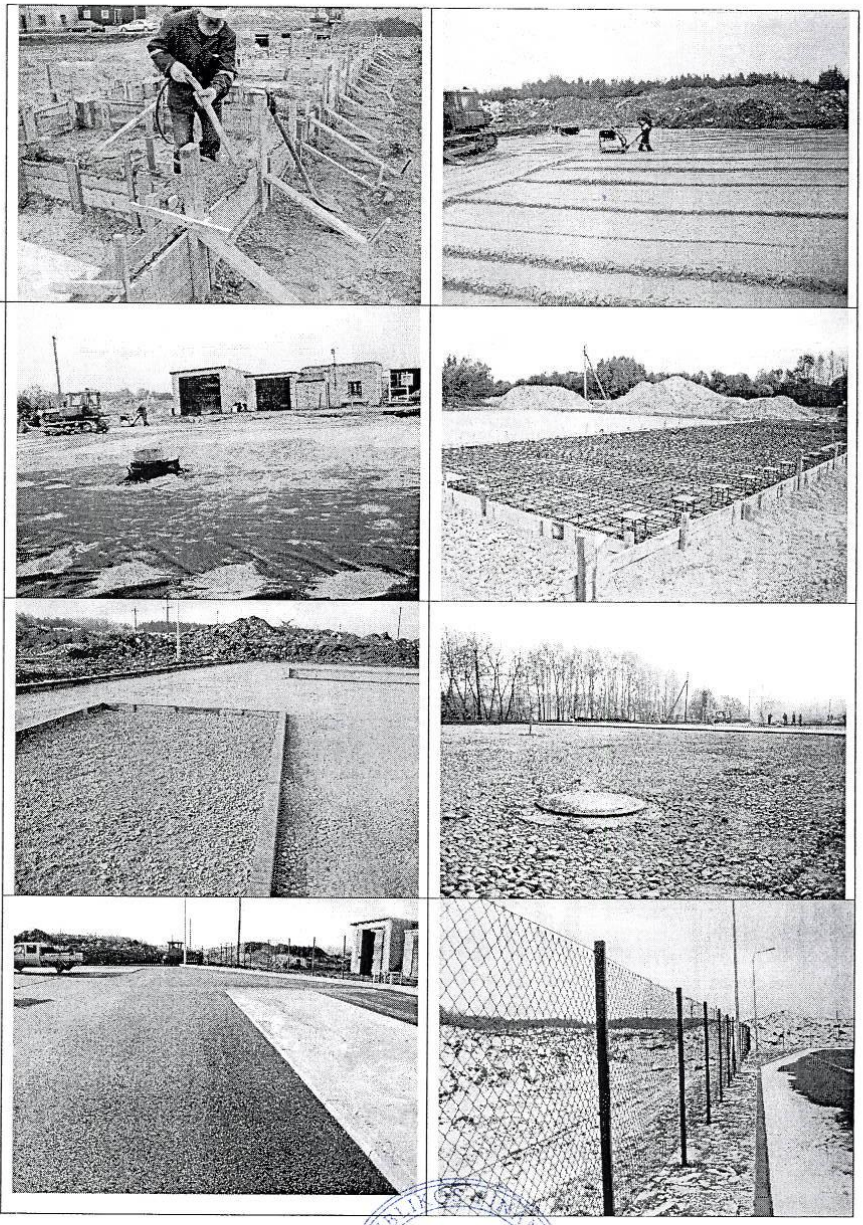

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2011 -06- 23

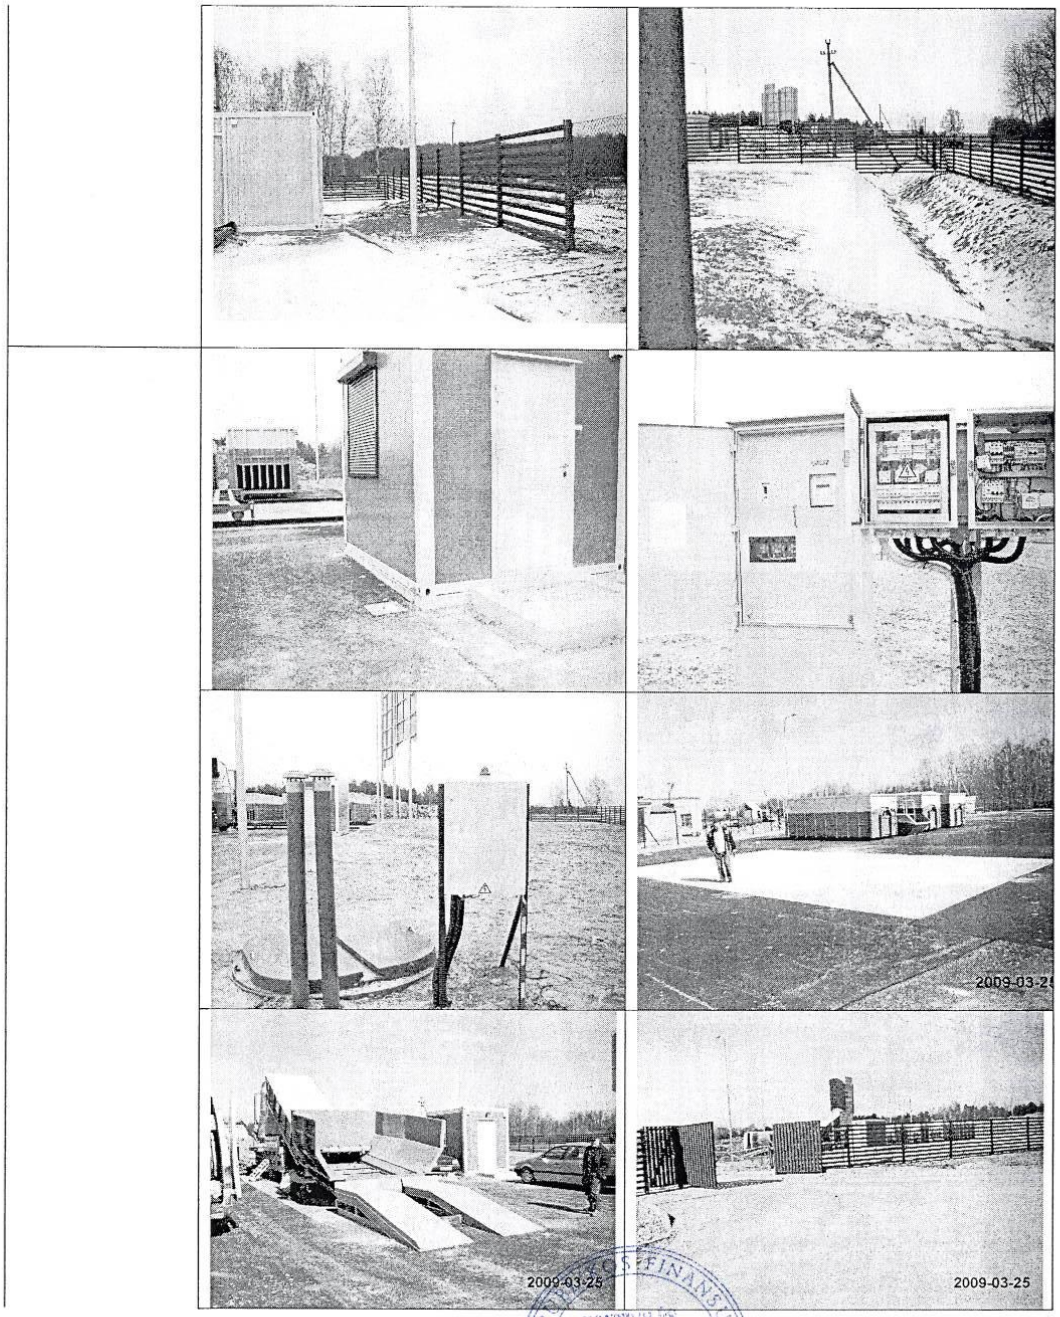

KONTROLĖS, KORESPONDENTIJOS IR PRIEPRIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

Atliekų priėmimo aikštelė Raseinių raj. Andrušaičių k.		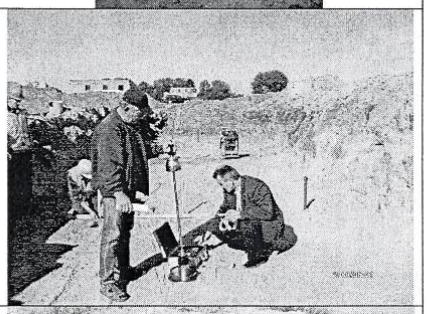
	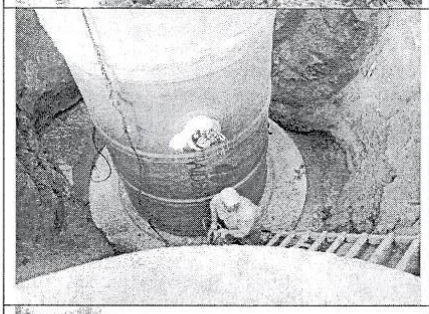	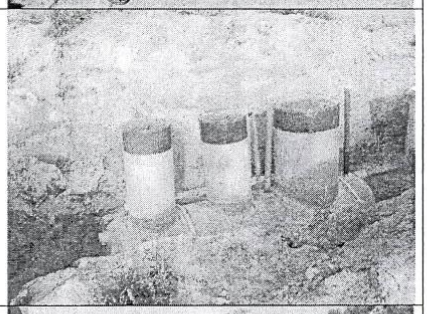
	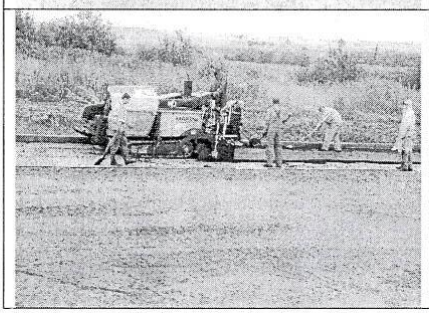	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

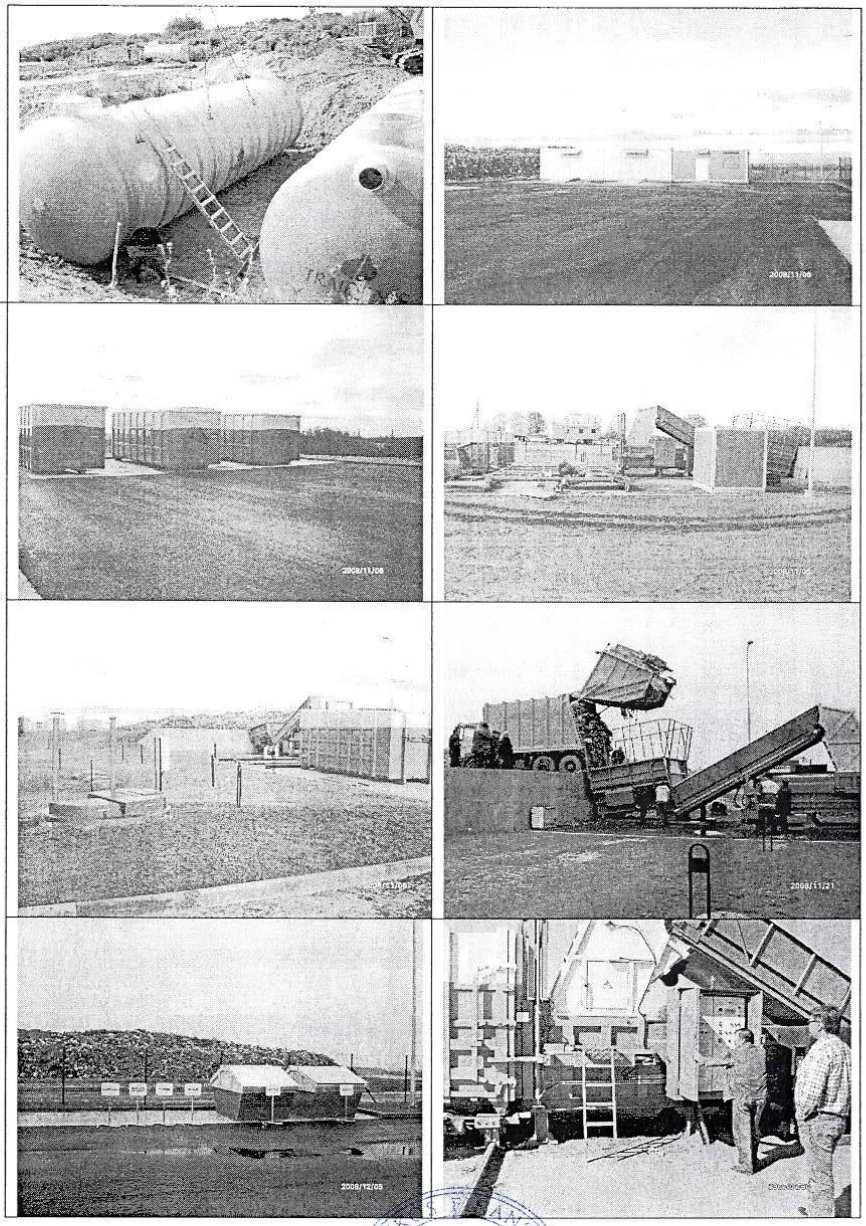

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2011 -06- 23

Kiti į šios sutarties apimtį įtraukti darbai
-Darbo projekto paruošimas,
- Visų pastatytų ir statinių aikštelėje nužymėjimas,
- Parengiamieji statybos darbai,
- Statybos atstatomieji darbai,
- Išpildymo brėžinių parengimas
-Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui gyvendinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, ATITIKTIES IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

PRIEDAS 2.1.4 Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas. Atliktų darbų aprašymas su nuotraukomis.

Sutarties Nr.	**A/2007/K/40**
Sutarties pavadinimas	**Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas**
Darbų rangovas	UAB „Luidas“ ir UAB „Kauno keliai“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu

Atliktų darbų aprašymas ir nuotraukos

KAUNO RAJONAS

1. Miškiniųsąvartyno uždarymas, Raudondvario km.

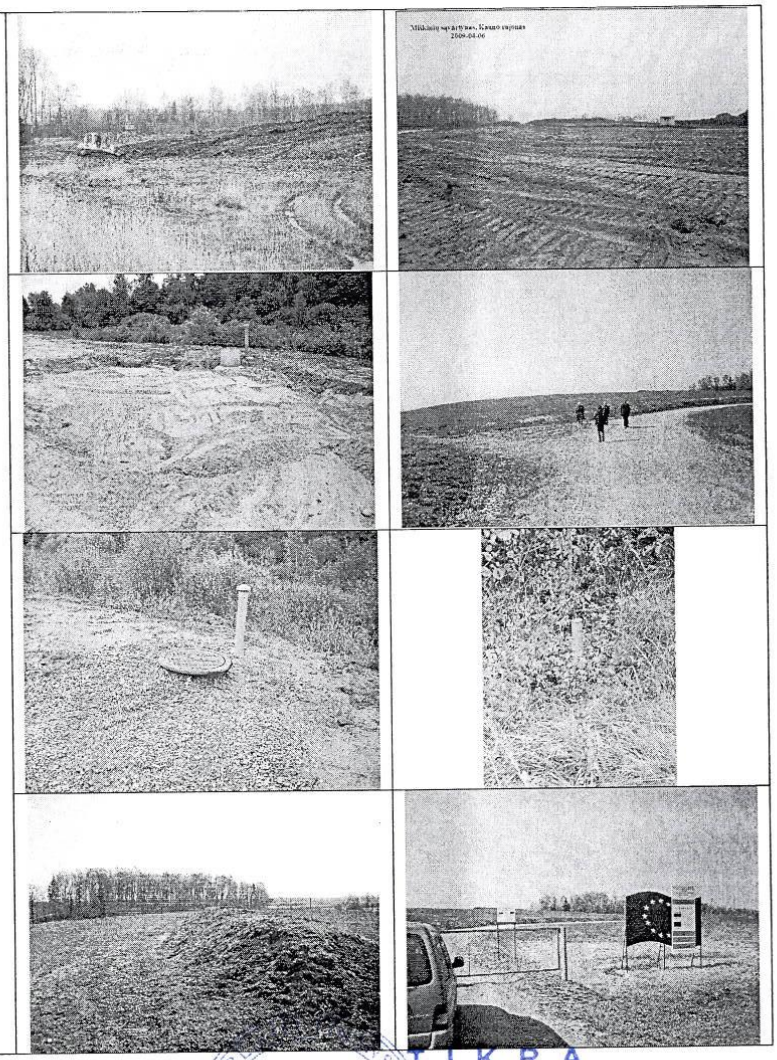

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

2. Digrių atliekų sąvartyno uždarymas, Digrių km	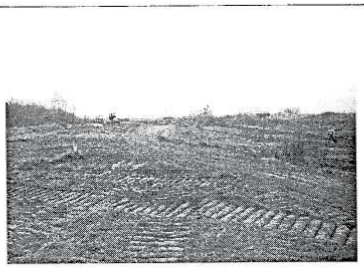	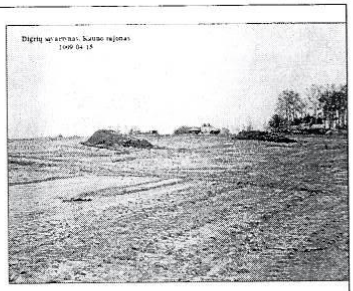
		
	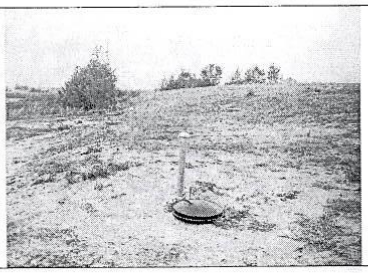	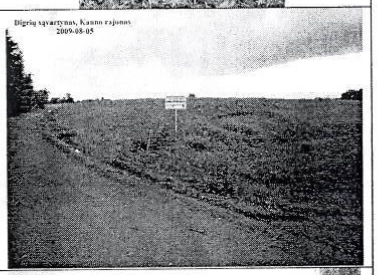
3..Dirvinių sąvartyno uždarymas Babtų seniūnijoje	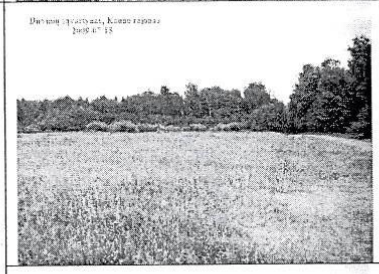	
	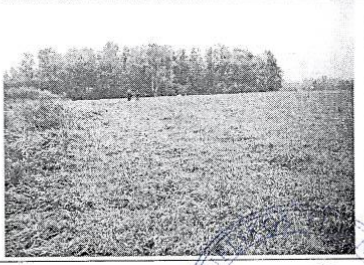	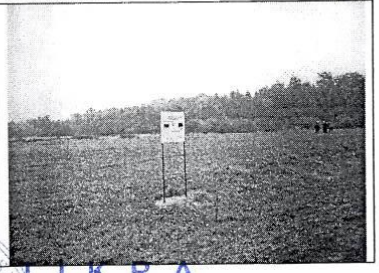

KOPIJA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

4.Gaižėnėlių sąvartyno uždarymas Rimgaudų seniūnijoje		
KAIŠIADORIŲ RAJONAS		
5.Budnikų sąvartyno uždarymas Budnikų (Keturokų) km., Žaslių sen.	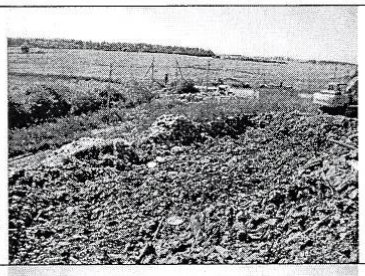	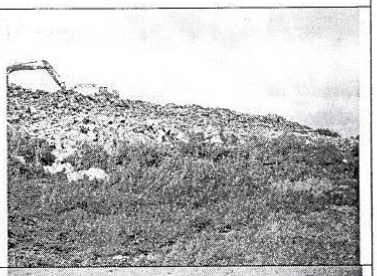
		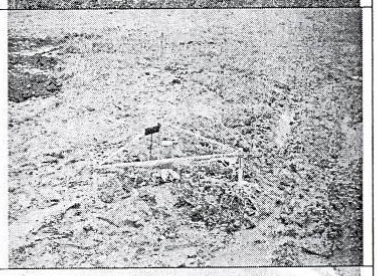

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

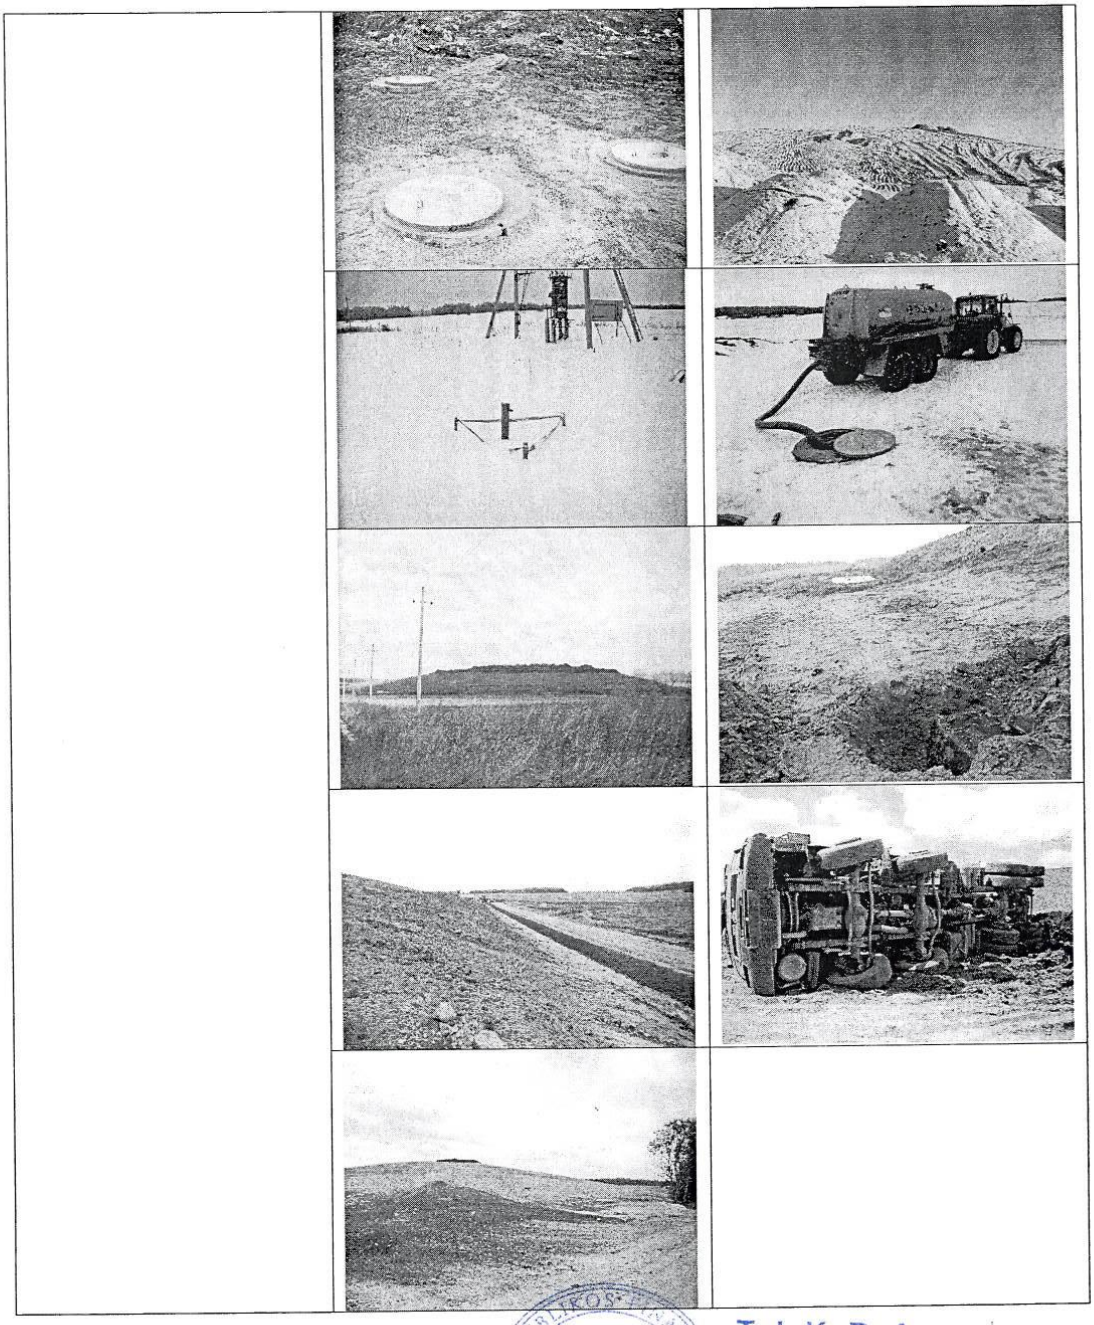

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

6. Rumšiškių buitinių atliekų sąvartyno uždarymas, Dovainonių km, Rumšiškių sen.	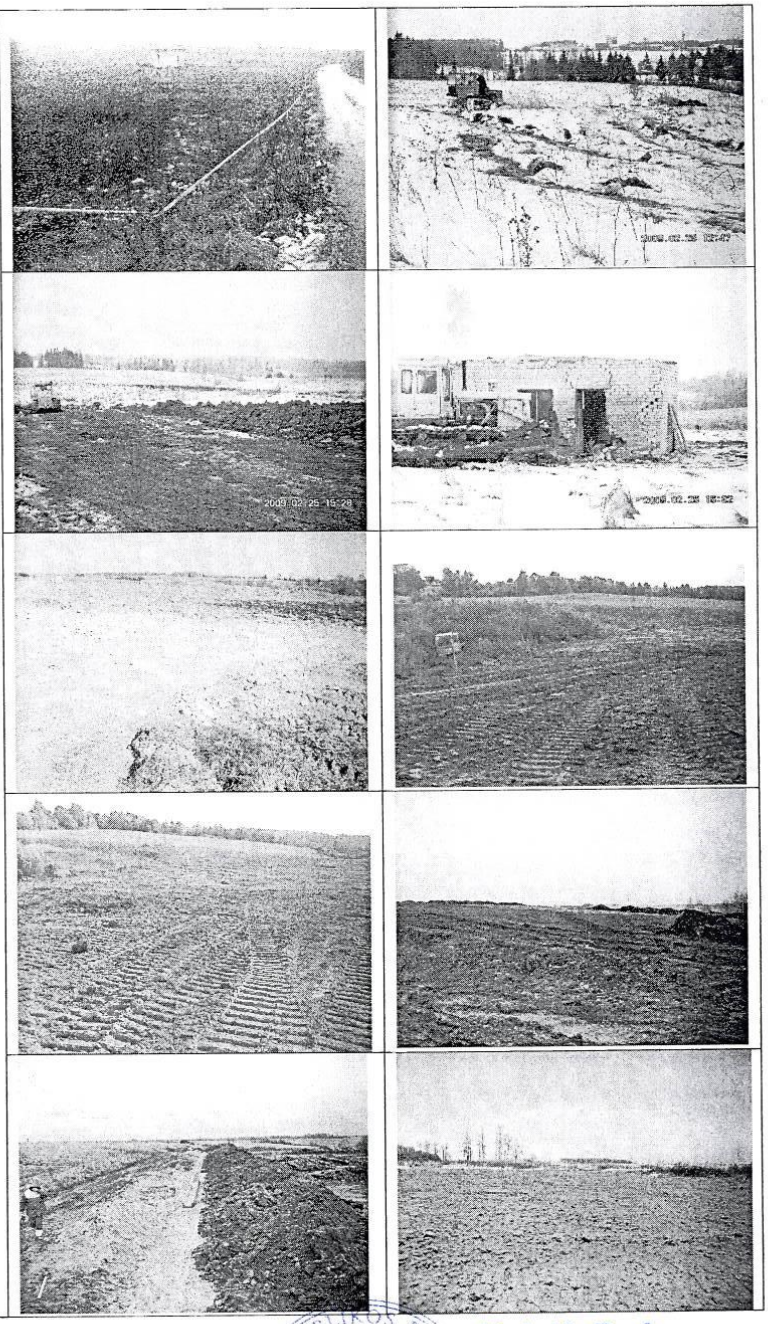

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

7.Tarpumiškio sąvartyno uždarymas Tarpumiškio km, Žiežmarių sen.		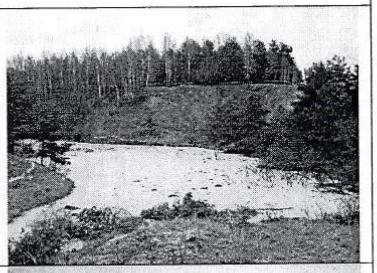
		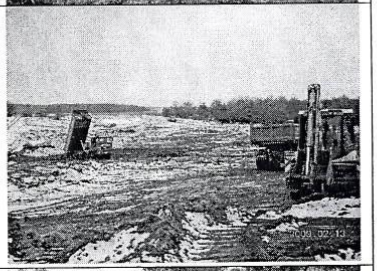
		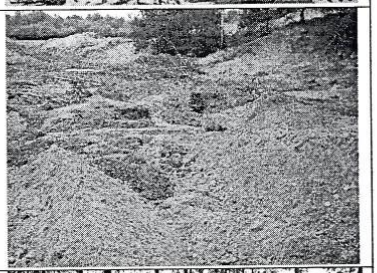
	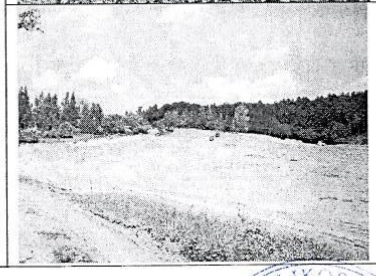	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė

	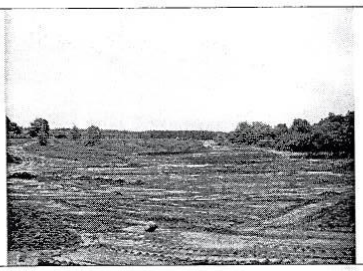	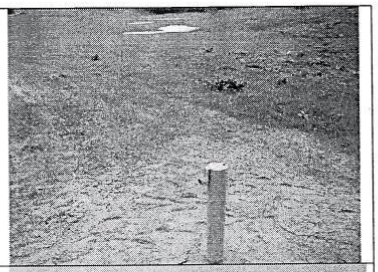
	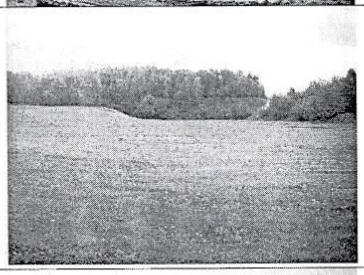	
8. Kruonio sąvartyno uždarymas Kruonio seniūnijoje	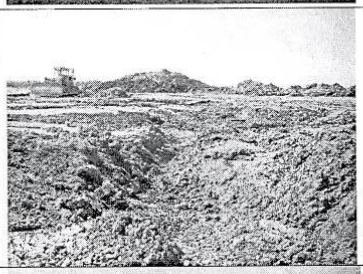	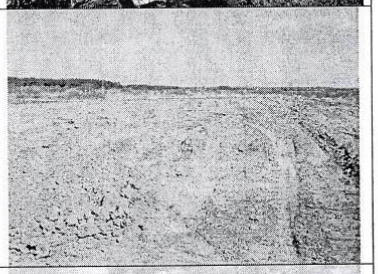
	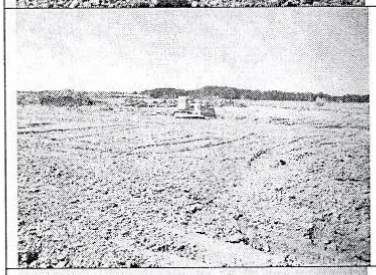	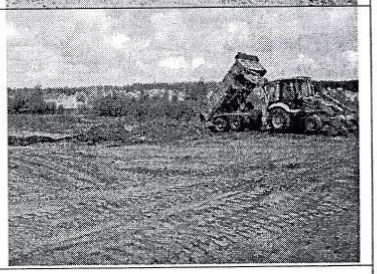
	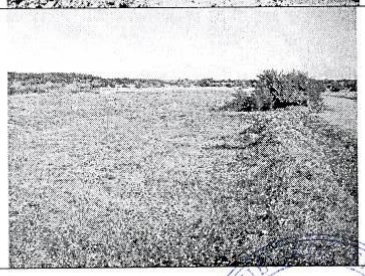	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

KONTROLĖS, KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS AUDITO SKYRIUS

2011 -06- 23
35 7

Kauno RATC sanglaudos fondas

Morkūnų sąvartyno uždarymas Kruonio seniūnijoje	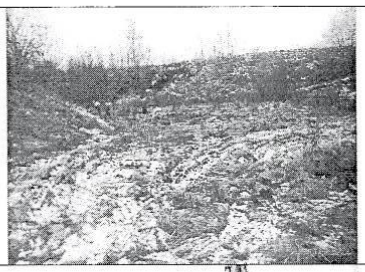	
	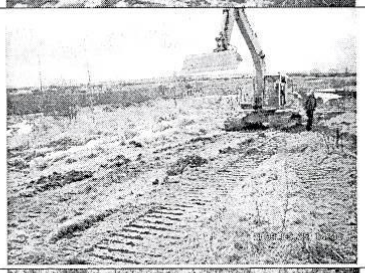	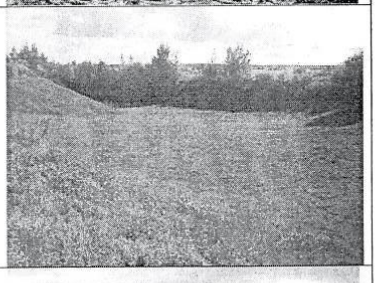
10. Klėriškių sąvartyno uždarymas Nemaitonių seniūnijoje	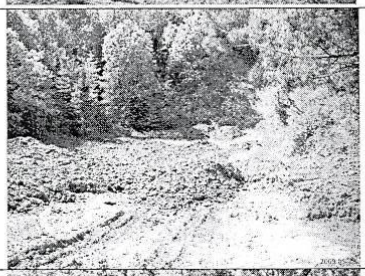	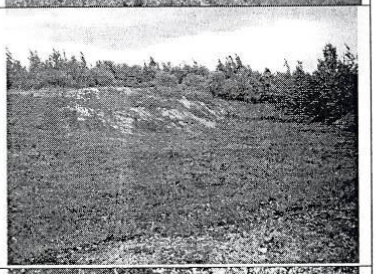
		
11. Živintos sąvartyno uždarymas Palomenės seniūnijoje		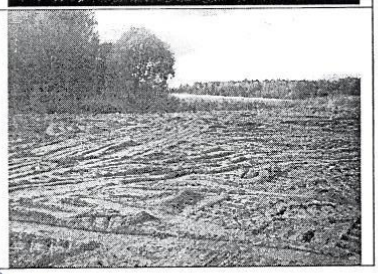

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS REIKALŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

Kauno RATC sanglaudos fondas

	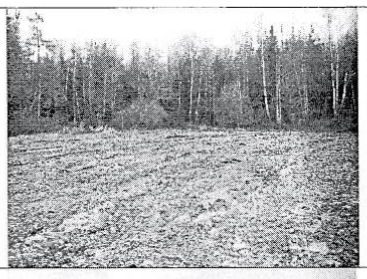	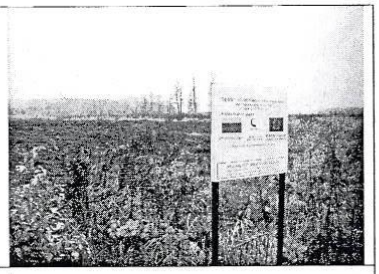
12.Pakalniškių sąvartyno uždarymas Paparčių seniūnijoje	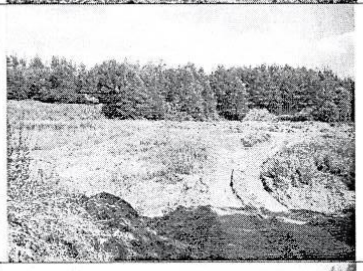	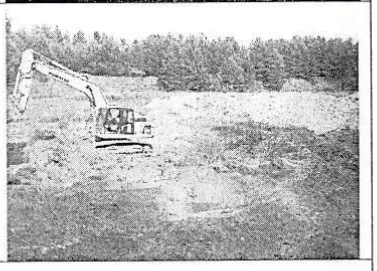
		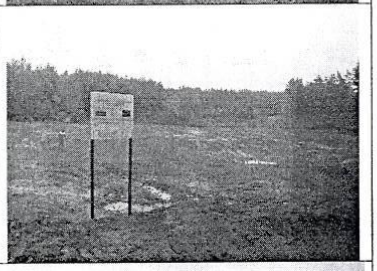
13.Antakalnio sąvartyno uždarymas Rumšiškių seniūnijoje	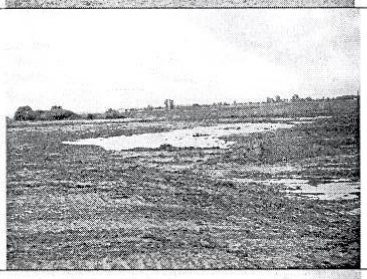	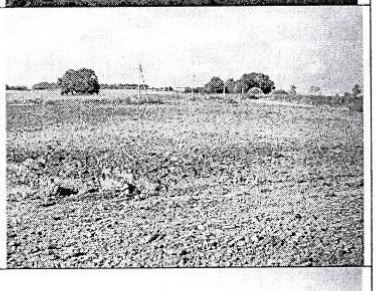

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

14.Graužų sąvartyno uždarymas Žiežmarių seniūnijoje	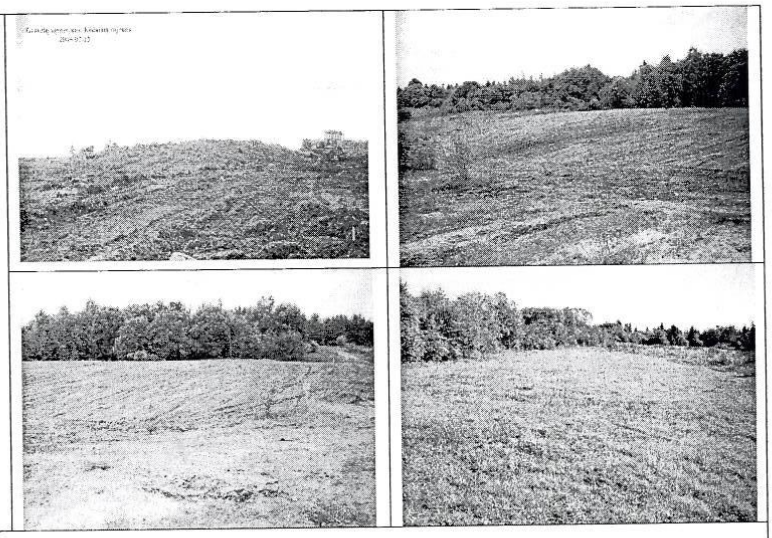
JONAVOS RAJONAS	
15.Jonalaukio sąvartyno uždarymas Jonalaukio kaime, Ruklos seniūnijoje	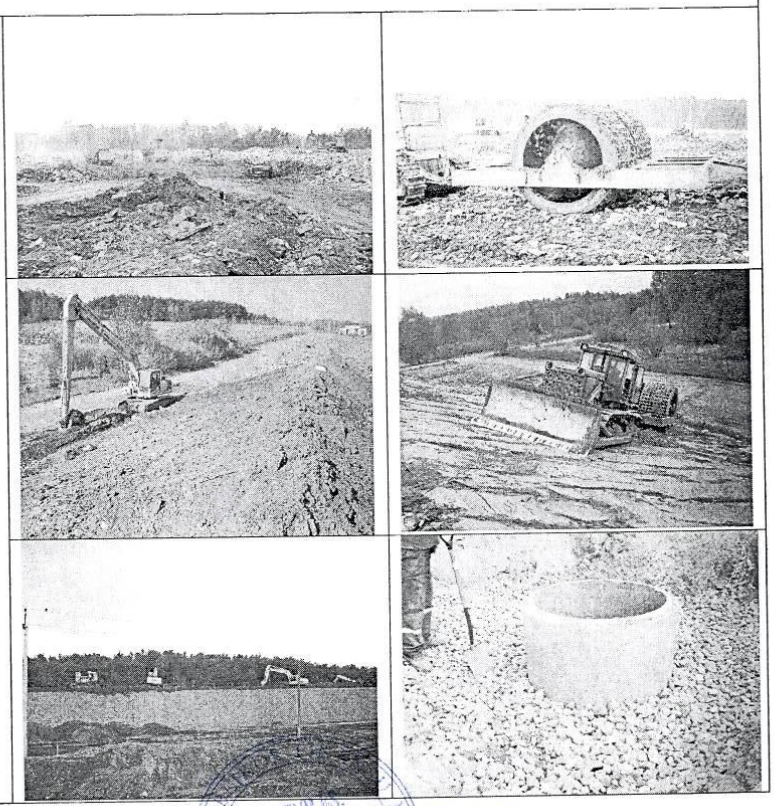

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

		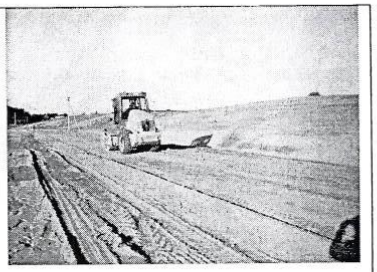
	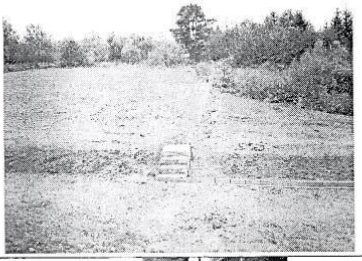	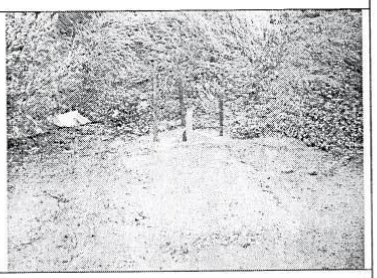
16. Biržuliškių sąvartyno uždarymas Bukonių seniūnijoje		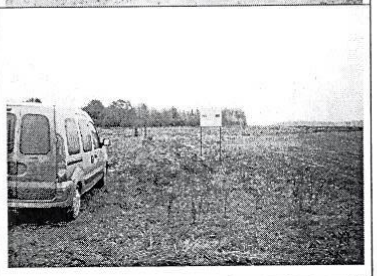
17. Narauninkiškių sąvartyno uždarymas Bukonių seniūnijoje	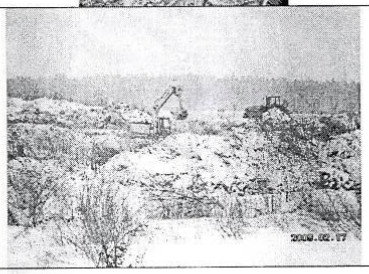	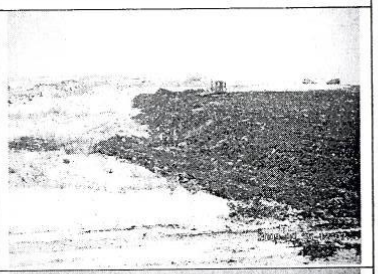
	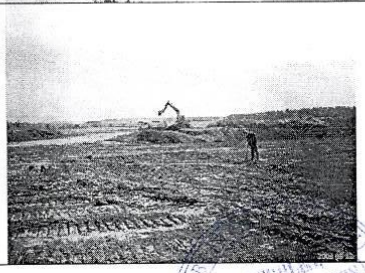	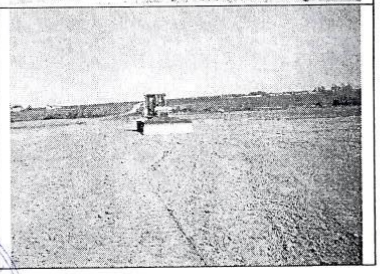

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

	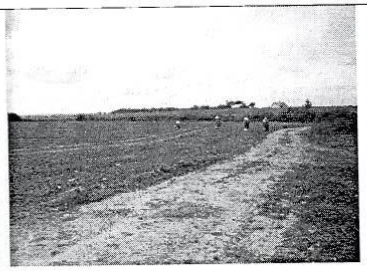	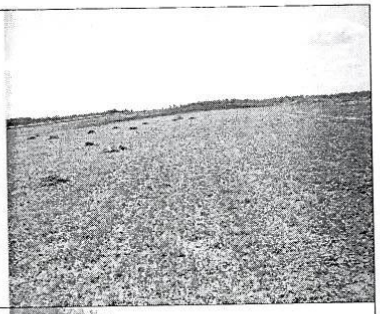
18. Varpių sąvartyno uždarymas Dumsių seniūnijoje	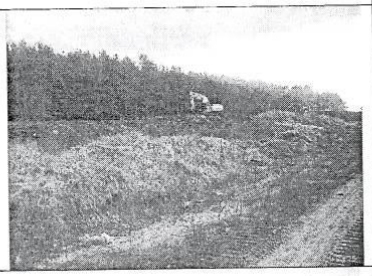	
		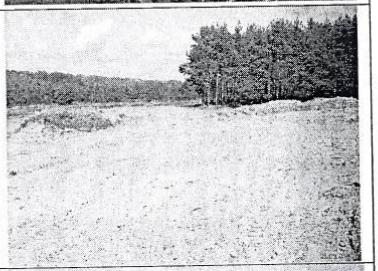
		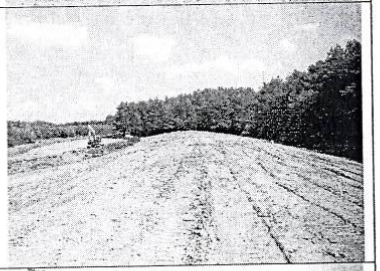
	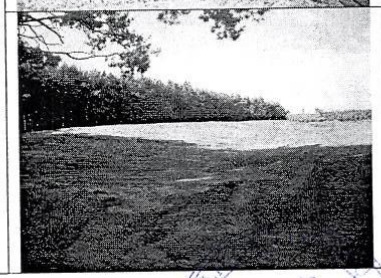	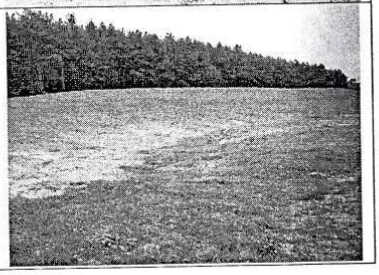

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

19. Čičinų sąvartyno uždarymas Kulvos seniūnijoje		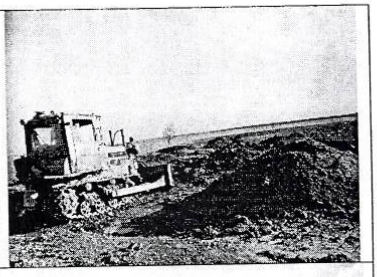
		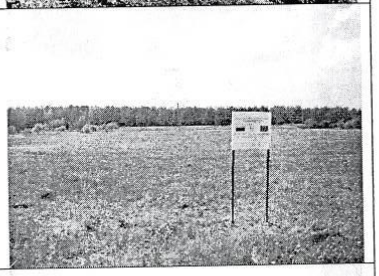
20. Kuliškių sąvartyno uždarymas Šilų seniūnijoje	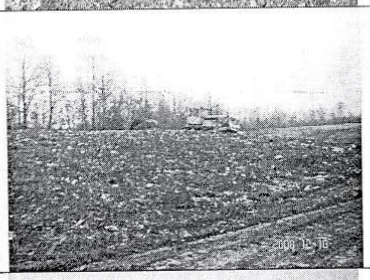	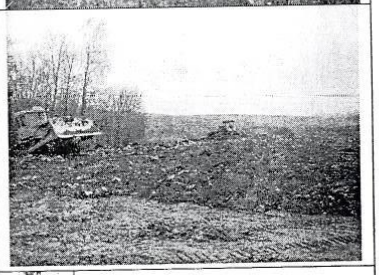
	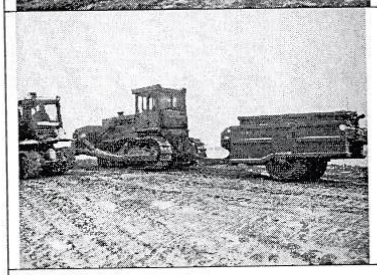	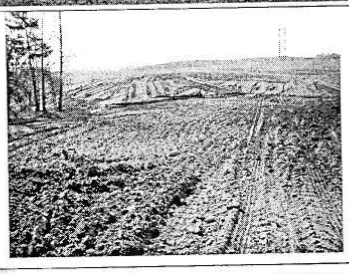

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

21. Palokės sąvartyno uždarymas Šilų seniūnijoje	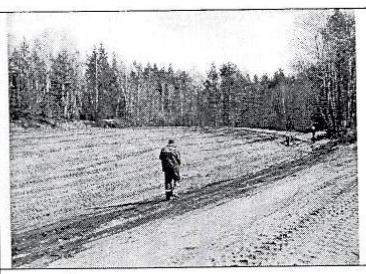	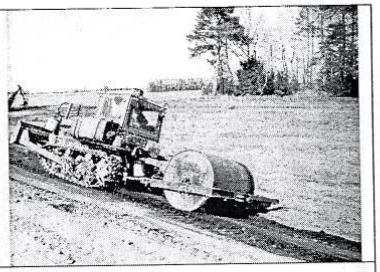
	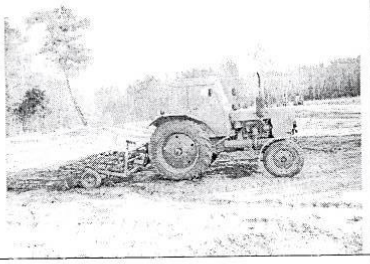	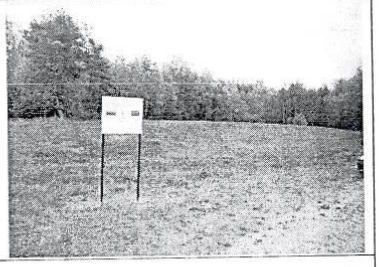
22. Paskutiškių sąvartyno uždarymas Užusalės seniūnijoje		
	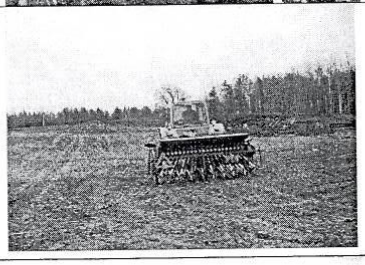	
23. Aklių sąvartyno uždarymas Žeimių seniūnijoje		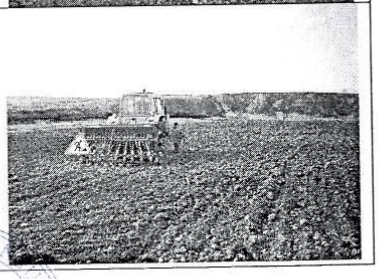

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

	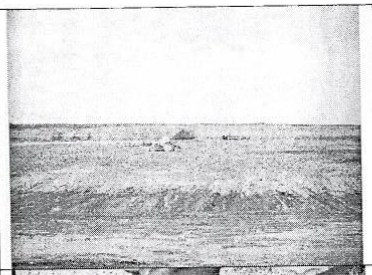	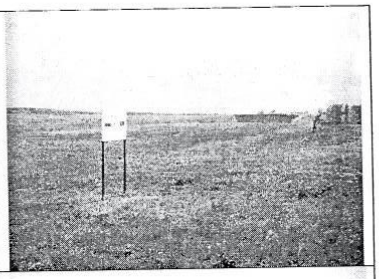
24. Kuigalių sąvartyno uždarymas Žeimių seniūnijoje	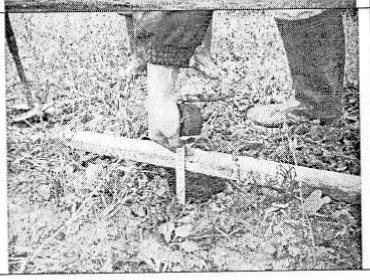	
KĖDAINIŲ RAJONAS		
25. Babėnų sąvartyno uždarymas Babėnų g. 24, Kėdainiai		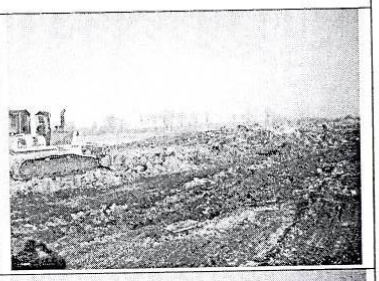
		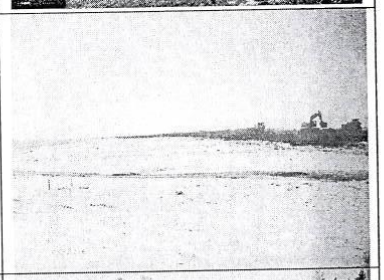

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

		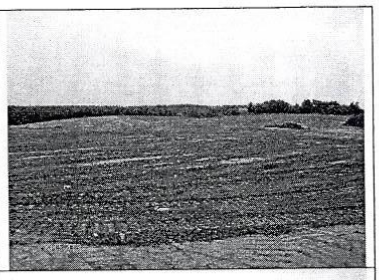
		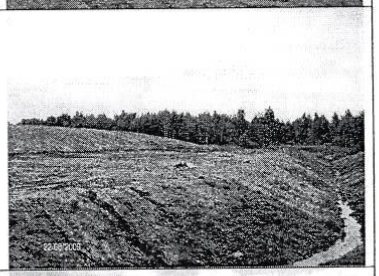
	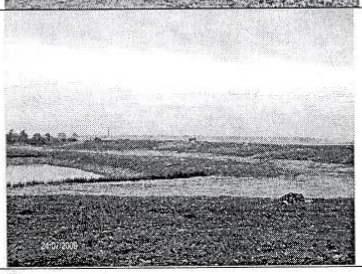	
26. Šalčmirių sąvartyno uždarymas Šalčmirių km., Dotnuvos sen.		

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, AUDITO IR TURTO VALDYMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

27. Jovaišų sąvartyno uždarymas Šėtos seniūnijoje		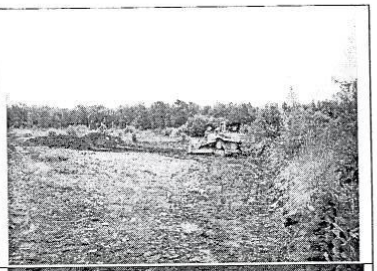
		
	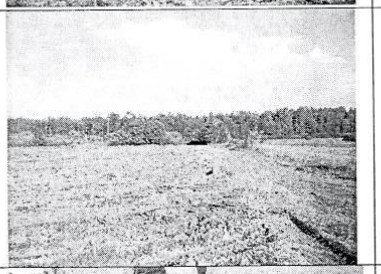	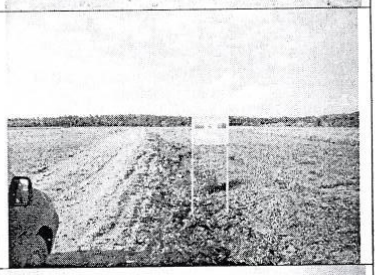
28. Graužių sąvartyno uždarymas Gudžiūnų seniūnijoje		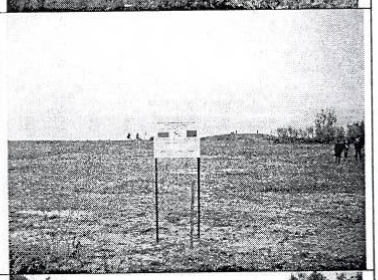
29. Milžemių sąvartyno uždarymas Vilainių seniūnijoje		

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Kauno RATC sanglaudos fondas

	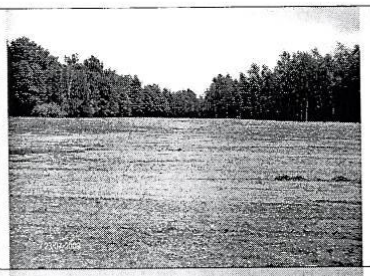	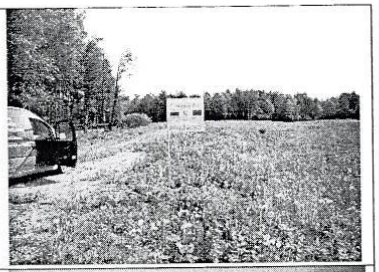
30. Šetenių sąvartyno uždarymas Vilainių seniūnijoje		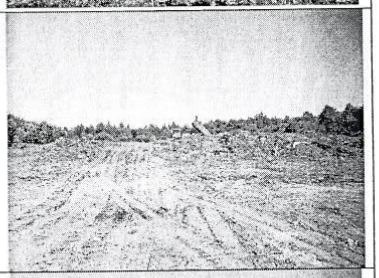
		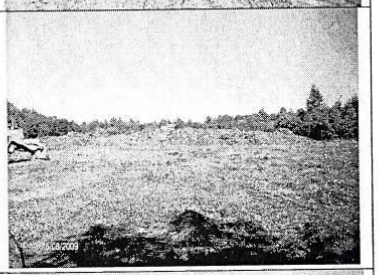
		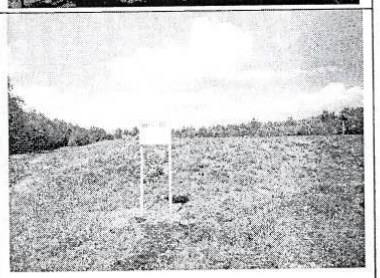
31. Čystapolio sąvartyno uždarymas Krakių seniūnijoje	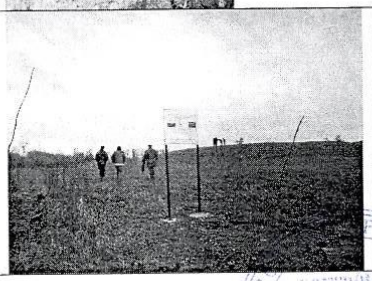	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliejienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

32. Aristavėlės sąvartyno uždarymas Vilainių seniūnijoje	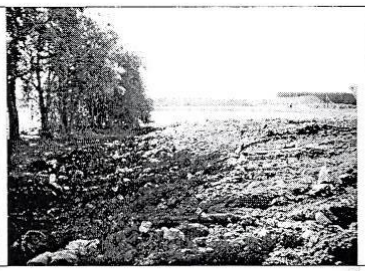	
		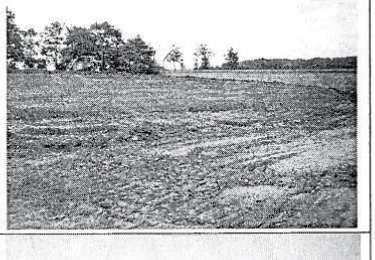
	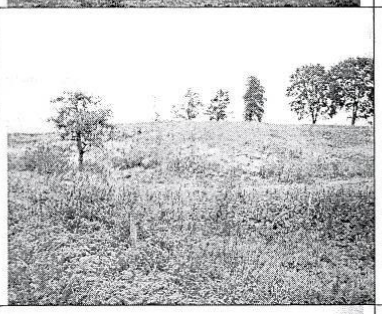	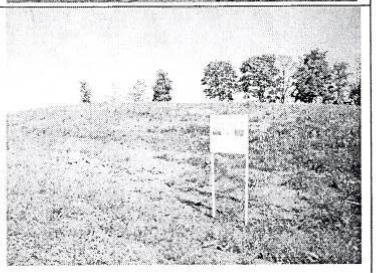
33. Gudžiūnų sąvartyno uždarymas Gudžiūnų seniūnijoje	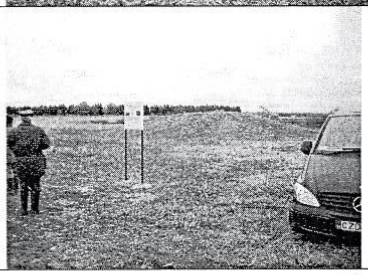	
34. Žiogaičių sąvartyno uždarymas Pelėdnagių seniūnijoje		

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

Kauno RATC sanglaudos fondas

	2010-05-21 Žiogaičių sąvartynas. Mišraus mėlingo grunto įrengimas ant kaupo	
35. Vikaičių sąvartyno uždarymas Gudžiūnų seniūnijoje	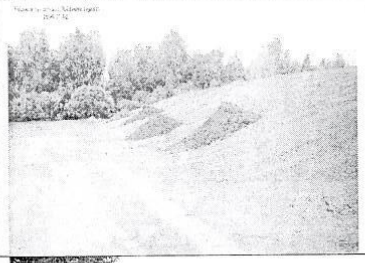	
36. Pavermenio sąvartyno uždarymas Truskavos seniūnijoje	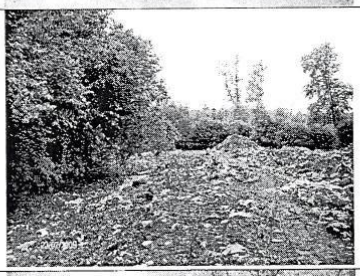	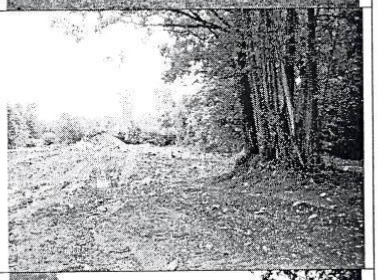
	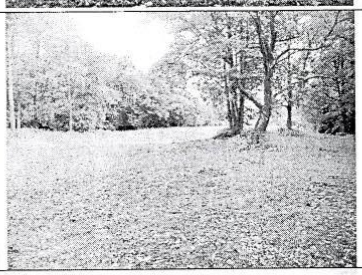	
3. Pajieslio sąvartyno uždarymas Krakių seniūnijoje		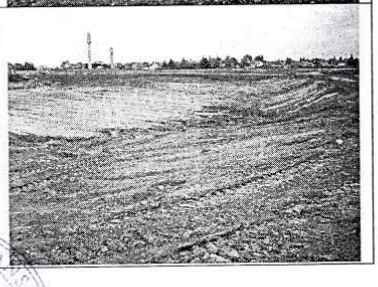

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

	2010-05-21 Pajieslio sąvartynas. Atliekų rinkinius. Dirvožemio derlingumo kaupas ir rekultivuojama teritorija.	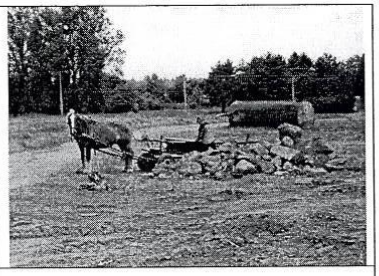
	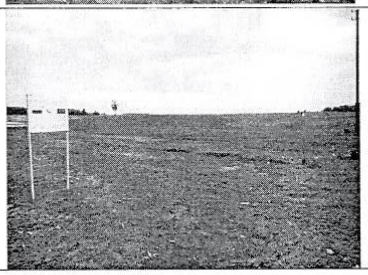	
38. Čiukiškių sąvartyno uždarymas Josvainių seniūnijoje	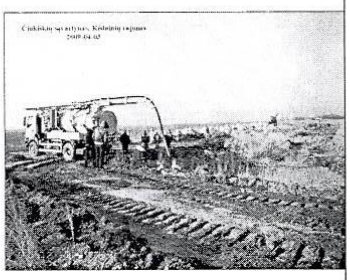	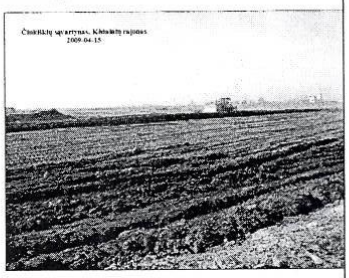
	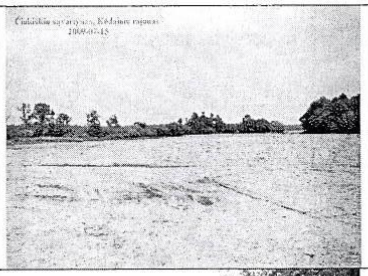	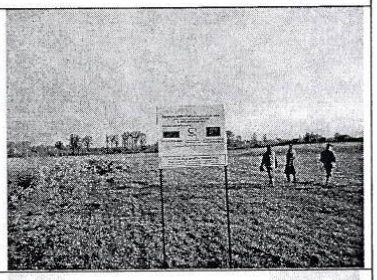
39. Rekšių sąvartyno uždarymas Truskavos seniūnijoje		

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23

Kauno RATC sanglaudos fondas

	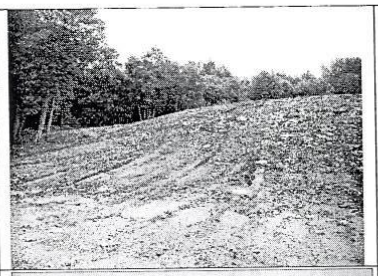	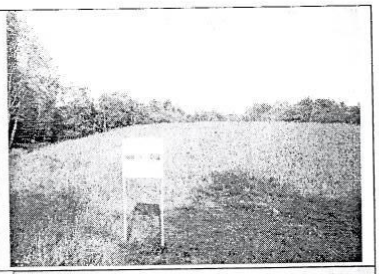
40. Labūnavos sąvartyno uždarymas Pelėdnagių seniūnijoje	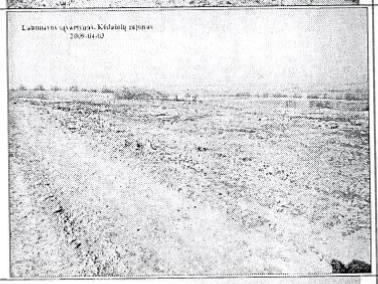	
	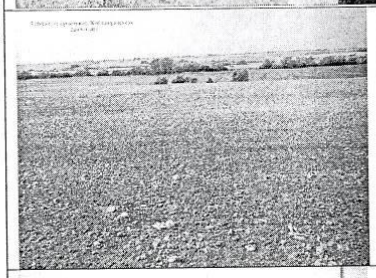	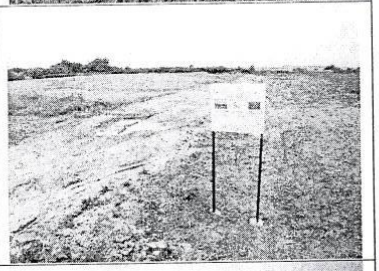
41. Dotnuvos sąvartyno uždarymas Dotnuvos seniūnijoje		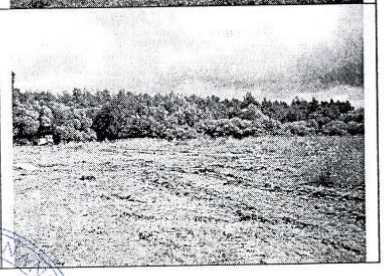

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VESTIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

	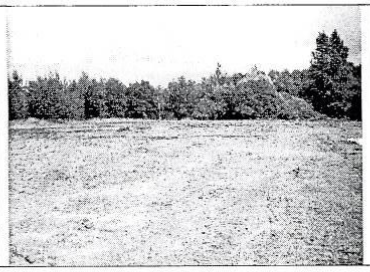	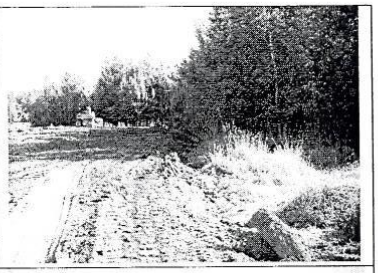
42. Špitolpievio sąvartyno uždarymas Krakių seniūnijoje		
RASEINIŲ RAJONAS		
43. Andrušaičių sąvartyno uždarymas		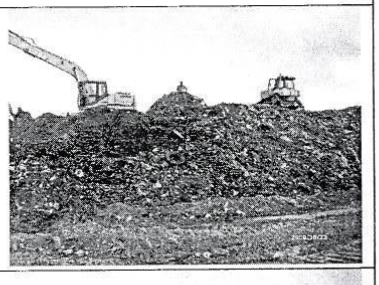
		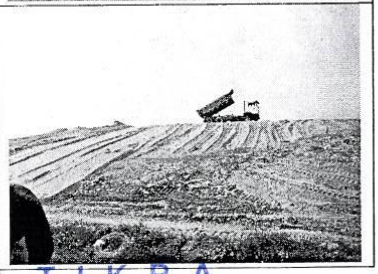

KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR TEISĖS SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

	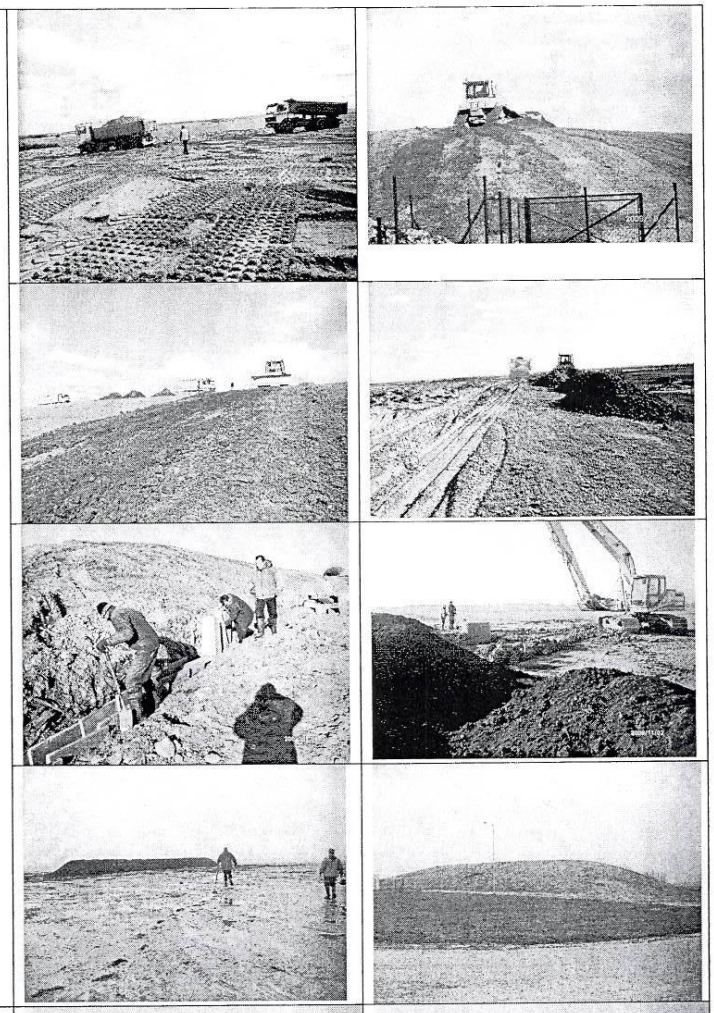
44. Gėluvos sąvartyno uždarymas	

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepiėjienė
2011 -06- 23

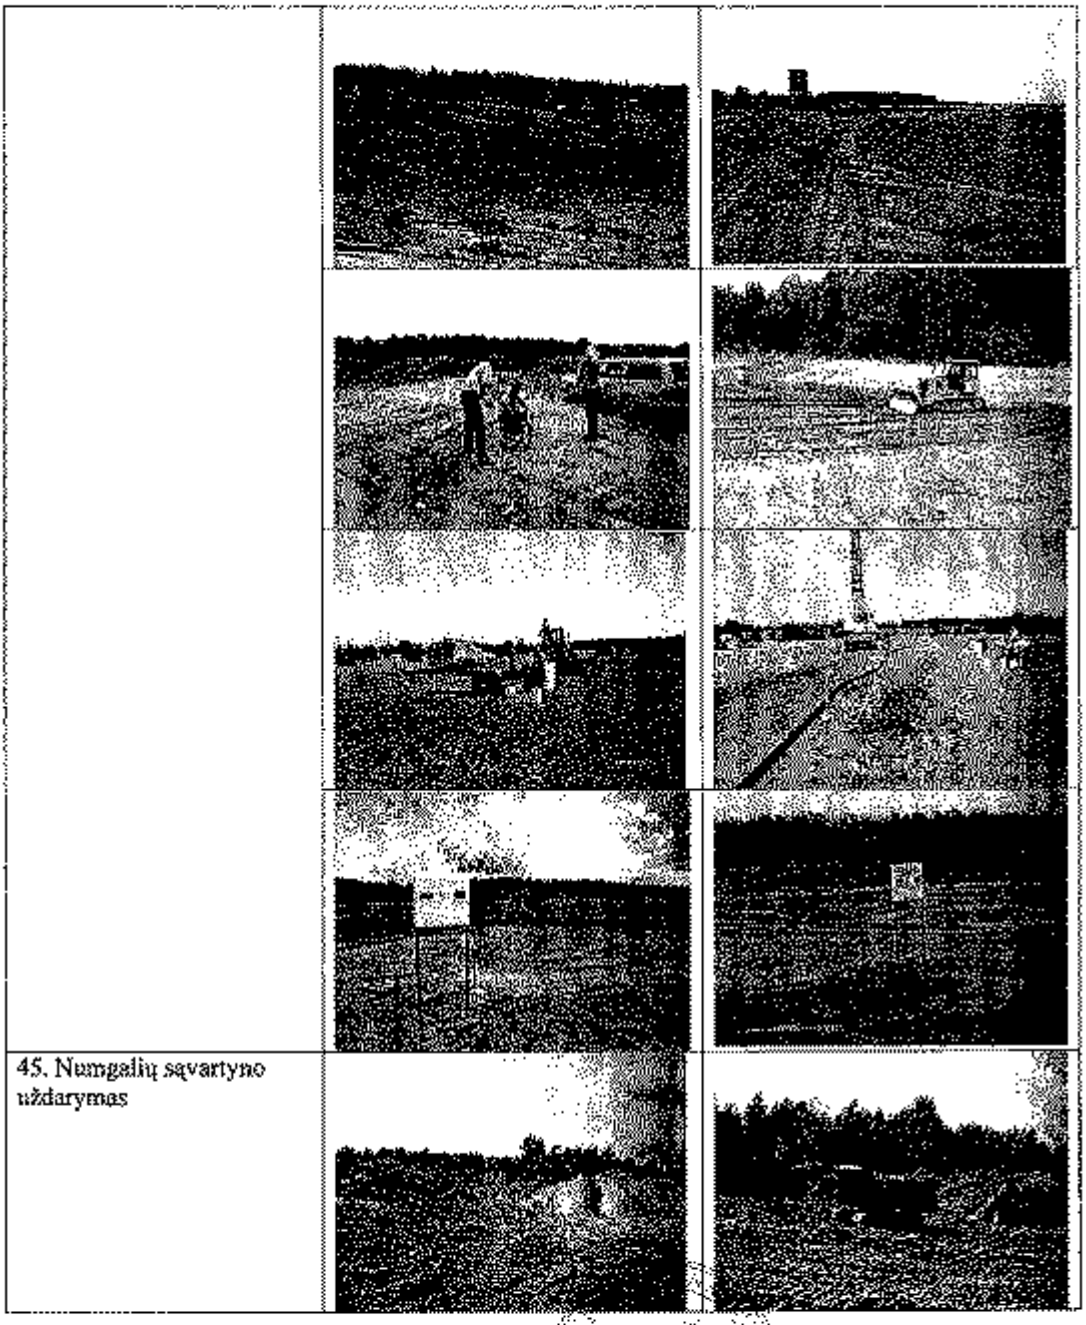

45. Nemgalių sąvartyno uždarymas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2004/LT/16/C/PE/005
GALUTINĖ PROJEKTO ATASKAITA

2011 -06- 23 25

sanglaudos fondas

46. Pelicpių sąvartyno uždarymas	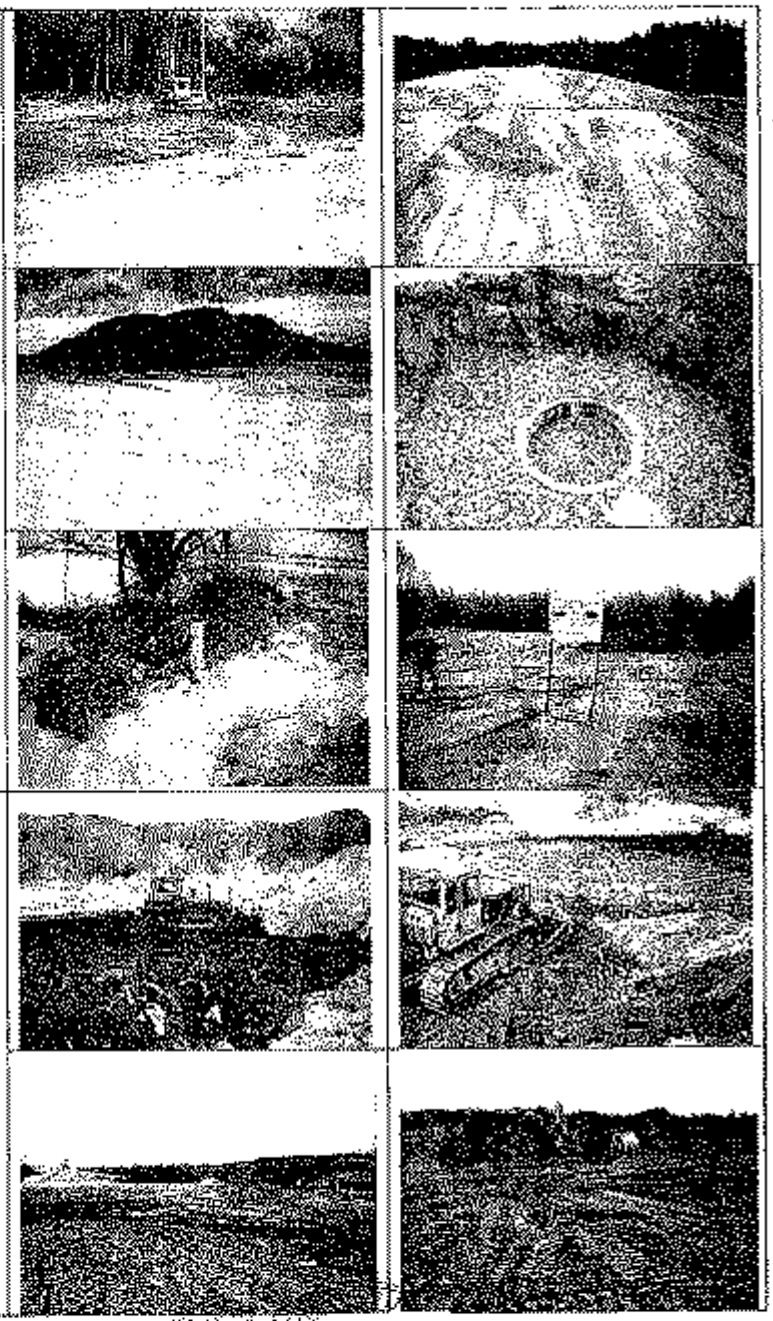

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

47. Paskystūnio sąvartyno uždarymas	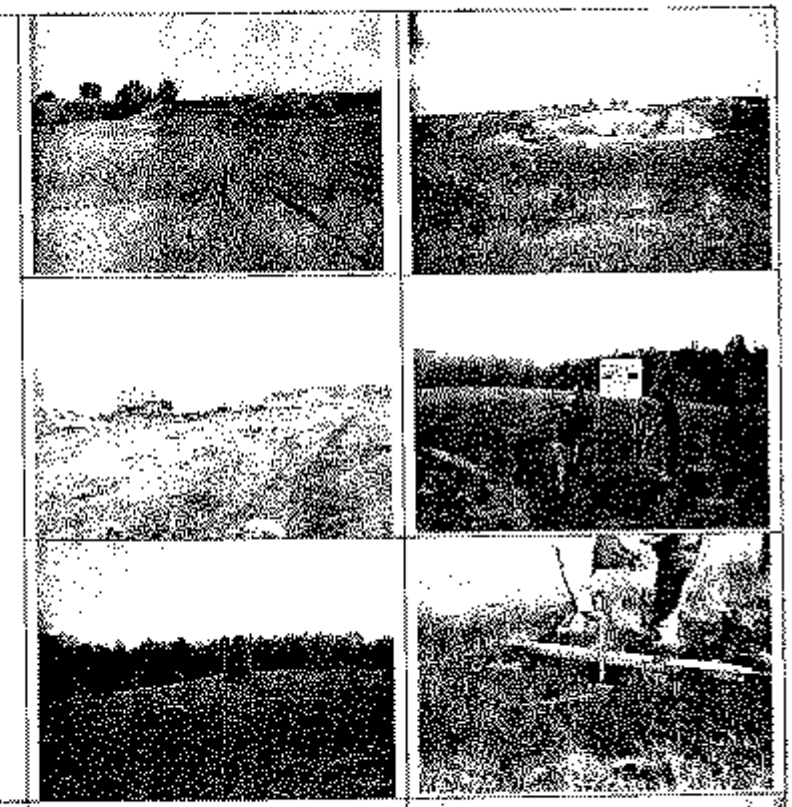
48. Tarosų sąvartyno uždarymas	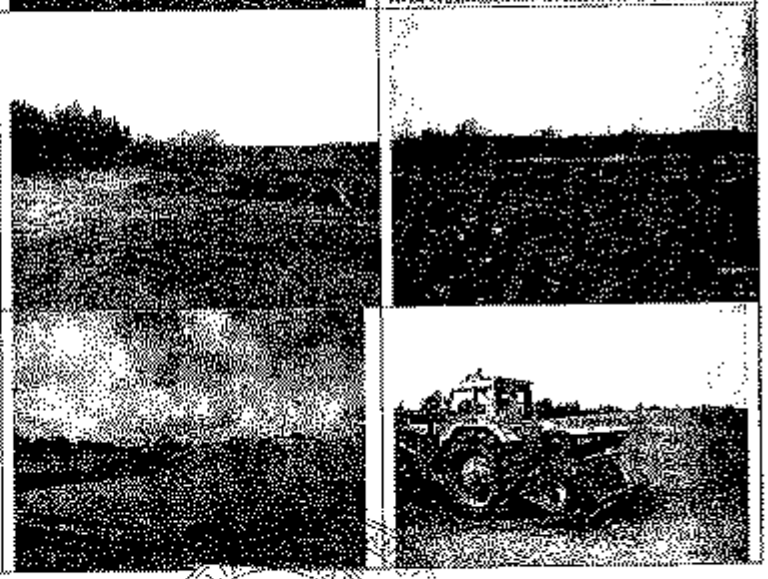

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

		
49. Diržonių sąvartyno uždarymas		
50. Steponkaimio sąvartyno uždarymas		

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

5t. Ugionių sąvartyno uždarymas	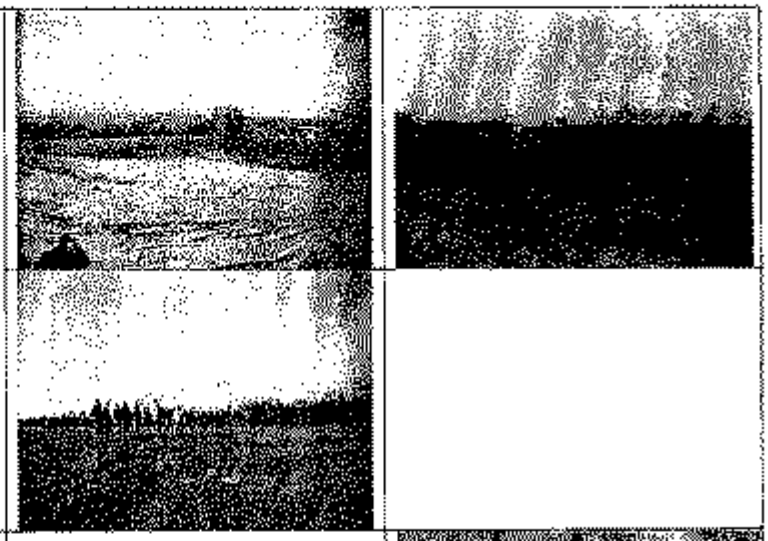
. Girkalnio sąvartyno uždarymas	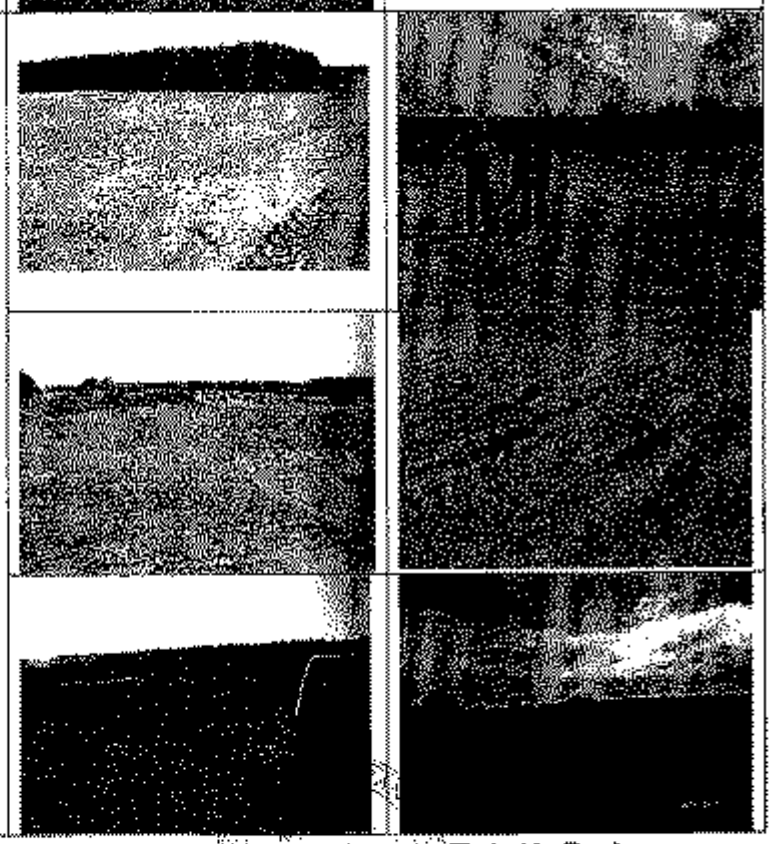

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2004/LT/16/P/PE/001
GALUTINĖ PROJEKTO ATASKAITA

29

sanglaudos fondas

53. Žvirgždės sąvartyno uždarymas	
54. Daužtų sąvartyno uždarymas	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

sanglaudos fondas

55. Meiliškių sąvartyno uždarymas	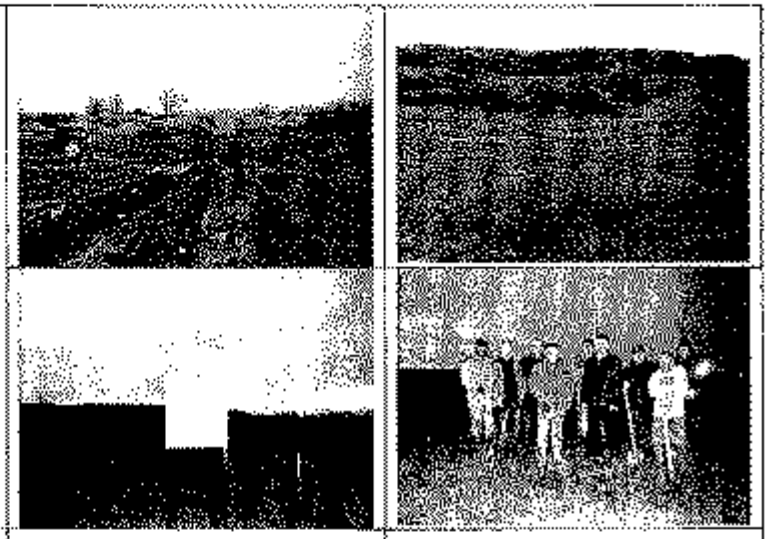
56. Papelkių sąvartyno uždarymas	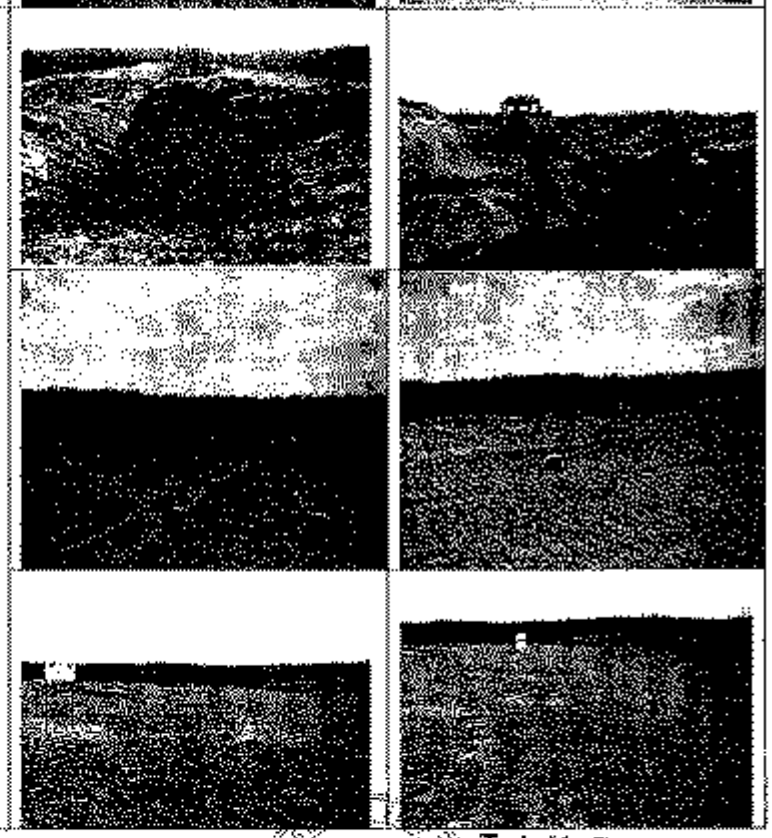

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepienė
2011 -06- 23

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2004/LT/16/C/PE/005
GALUTINĖ PROJEKTO ATASKAITA

31

sanglaudos fondas

57. Zbaro sąvartyno uždarymas	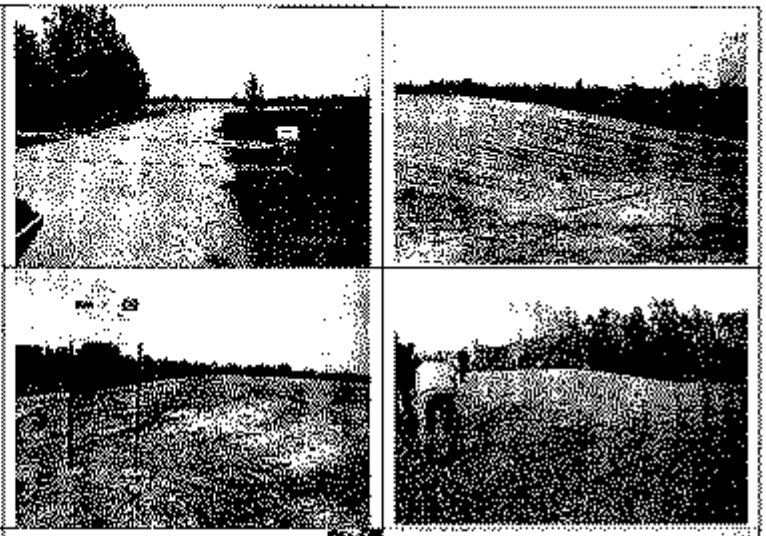
58. Jukainių sąvartyno uždarymas	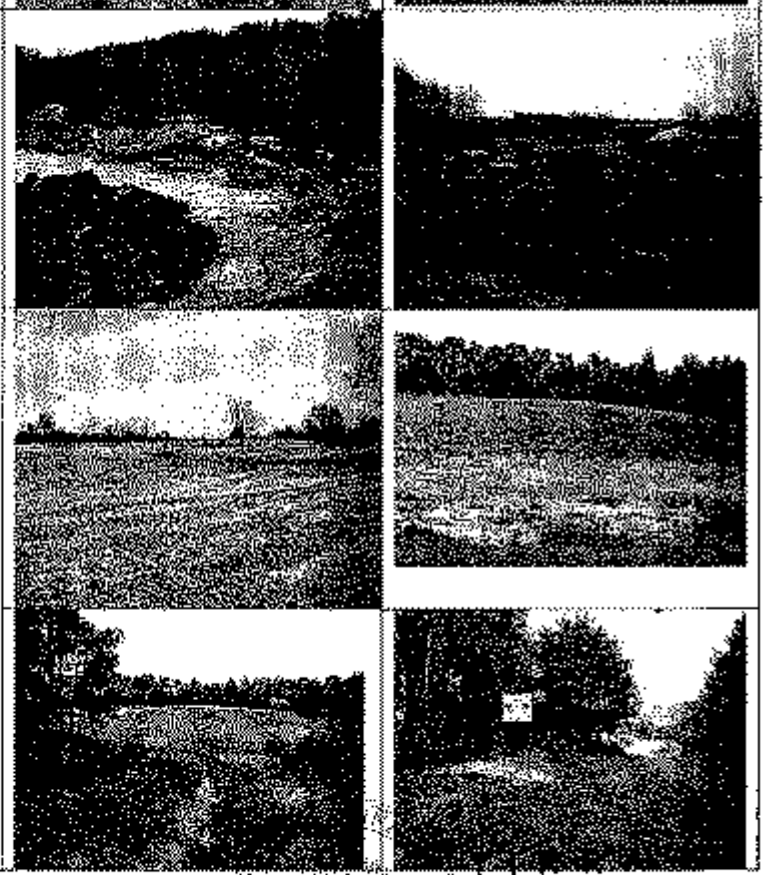

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Nr. 2004/LT/16/C/PE/009
GALUTINĖ PROJEKTO ATASKAITA

Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
- 2011 -06- 23

32



Kiti į šios sutarties apimtį įtraukti darbai
-Darbo projekto parengimas,
- Visų pastatytų ir statinių aikštelėje nužymėjimas,
- Parengiamieji statybos darbai,
- Statybos atstatomieji darbai,
- Išpildymo brėžinių parengimas
-Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui gyvendinimas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

2011 -06- 23

Priedas Nr. 2.2.1
1

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS
DEPARTAMENTAS
STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Juridinių asmenų registras Kodas 188601998,Sapiegos g. 19, 44501 Kaunas
Tel. (8~37) 20 28 15 Faks. (8~37) 20 91 91El. p. statybos.inspekcija@kaunas.apsk.lt
J.Basanavičiaus g. 36, 57288, Kėdainiai, Tel.: (8~347) 6 95 73 , Faks. (8~347) 69573

VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO (įm.k.300092998) ŽABIELIŠKIO REGIONINIO SĄVARTYNO, PRIVAŽIAVIMO KELIO, KOMPOSTAVIMO, STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ PERDIRBIMO AIKŠTELĖS ŽABIELIŠKIO K., KĖDAINIŲ R.,
(administracinis-buitinis pastatas 1B1p, 1b1p (un.nr. 5300-0802-5011), stoginė 3G1g (un.nr. 4400-1866-2049), vandentiekio tinklai V (un.nr. 4400-1932-7436), nuotekų šalinimo tinklai KF, KS, KL (un.nr. 4400-1932-9410), drenažo tinklai D (un.nr. 4400-1933-1416), aikštelių A1, A2, A3, A4, A5, A6 (un.nr. 4400-1933-8419), kiti statiniai t1, t2, 171, 172, 241, 242, 236, 237, K, b1, b2 (un.nr. 4400-1933-6413), kelias iki Žabieliškio sąvartyno 1-16 (un.nr. 4400-1218-1094), kelias Biochemikų g. 1-14 (un.nr. 4400-1182-9795), elektros ir ryšių kabeliai)

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI
A K T A S NR. STN4-148

Kėdainių r. 200 9 m. 11 mėn. 20 d.

Komisija, paskirta Kauno apskrities viršininko 2006 12 22 įsakymu Nr.V-538 šios sudėties:

A.Mockus - Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Kėdainių rajone (komisijos pirmininkas);

V.Čekatauskas – projekto vadovas, UAB "Krašto projektai ir partneriai";

K.Balčiūnas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius;

A.Kleiva – Kėdainių seniūnijos seniūnas;

V.Kundrotas - Kėdainių r. savivaldybės administracijos architekto tarnybos vedėjas;

R.Naruševičius - Kauno apskrities PGV, Kėdainių PGT, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;

K.Mikalauskas - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūros vedėjas;

R.Mykolaitis - Valstybinės energetikos inspekcijos Panevėžio teritorinio sk. vyresn.inž.-inspektorius;

O. Šulcienė - Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėja;

R.Ivanauskienė - Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus Vedėjos pavaduotoja;

E.Čižikienė - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos melioracijos tarnybos vyresn. specialistė;

A.Kutraitė - Kėdainių r. savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyr.specialistė;

G.Čižinauskas - Kedainių r. PK, VP, VTS eismo priežiūros poskyrio viršininkas;

T A R A
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

A.Biskirskas -Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyriausias darbo inspektorius;

R.Lukoševičius - UAB „Kėdainių vandenys" direktoriaus pavaduotojas;

G.Kaminskas - RST atstovas, elektros tinklo grupės vadovas;

E.Kevalaitis – genrangovas, UAB „Kamesta" techninis direktorius;

dalyvaujant:

rangovams (statybos vadovui):

- **P.Makutėnas**, kv.at.nr. 15001, 17321, galioja iki 2010-01-27, 2011-04-26 UAB „Kamestą");
- **P.Ringis**, kv.at.nr. 19292, galioja iki 2012-06-06 (UAB „Kamesta");
- **V.Sabukinas**, kv.at.nr. 18825, galioja iki 2012-03-19 (UAB „Kamesta")

subrangovams:

- **A.R.Yla**, kv.at.nr. 21287, galioja iki 2013-04-11 (UAB „Consena");
- **J.Graželis**, kv.at.nr. 5895, galioja iki 2013-08-12 (AB „Ekra");

techninkam prižiūrėtojui:

- **J.Drižys**, kv.at.nr. 1659, galioja iki 2013-01-18 (UAB „SWECO BKG LSPI");
- **G.Meldaikis**, kv.at.nr. 14766, 24586, 24587, galioja iki 2009-12-09, 2014-06-12 (UAB „SWECO BKG LSPI");

vadovaudamiesi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių priėmimo eksploatuoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą :

ZABIELIŠKIO REGIONINĮ SĄVARTYNĄ, PRIVAŽIAVIMO KELIĄ, KOMPOSTAVIMO, STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ PERDIRBIMO AIKŠTELES

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė ir nėra pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1.Statyba vyko pagal projektą nr.1395-8, kurį 2007 metais parengė UAB„Krašto projektai ir partneriai", įm.k. 124663332, kv.at.nr.1085, Konstitucijos pr. 23C-415, LT-08105 Vilnius; Projekto vadovas V.Čekatauskas (at.nr.1678, galioja iki 2013-02-08). Projekto ekspertizės vadovas V.Papinigis (kv.at.nr. 14286; galioja iki 2014-03-20). Bendrosios ekspertizės akto Nr.29-2007-2, 2007-04-04.

2.Leidimas statyti Nr.s-07-256, išduotas 2007-11-09, koreguotas 2009-05-13, nuolatinės statybos komisijos protokolo nr. 310, 2007-11-07.

3.Statytojas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (įm.k.300092998), Statybininkų g. 3-19, Kaunas;

4.Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas:

- UAB „Kamesta", įm.k.259805810, Liepų g.23, LT-53229 Garliava, Kauno r.; kv.at.nr. 0196, galioja iki 2013-02-15, bendrastatybiniai darbai.

subrangovai:

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

- UAB „Consena“, įm.k. 210670990, Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas, kv.at.nr. 1965, galioja iki 2013-03-28, geosintetinis molio paklotas, geomembranos ir apsauginės neaustinės geotekstilės įrengimas .
- AB „EKRA“, įm.k. 134124027, Ateities pl. 30C, LT-52163 Kaunas, kv.at.nr. 0502, galioja iki 2013-08-29, filtrato rezervuaro montavimas.

5.Statyba pradėta 2007-12-04.

6.Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Indeksas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
Administracinis-buitinis pastatas	**1B1p, 1b1p**			
Užstatytas plotas		m²	102	100
Bendras plotas		m²	74,59	74,32
Pagrindinis plotas		m²		67,68
Statybinis tūris		m³	310	325
Aukštų skaičius		vnt.	1	1
Stoginė	**3G1g**			
Užstatytas plotas		m²	139	135
Bendras plotas		m²	125,82	131,24
Pagrindinis plotas		m²	125,82	131,24
Statybinis tūris		m³	716	603
Aukštų skaičius		vnt.	1	1

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Vandentiekio tinklai (V)			
1.1. vamzdyno ilgis (bendras)	m	625,06	polietilenas
1.2. vamzdyno diametras (d 200)	m	5,25	polietilenas
1.3.vamzdyno diametras (d 63)	m	375,68	polietilenas
1.4. vamzdyno diametras (d 50)	m	35,65	polietilenas
1.5. vamzdyno diametras (d 32)	m	16,33	polietilenas
1.6. vamzdyno diametras (d 25)	m	192,15	polietilenas
1.7. šulinių skaičius	vnt.	7	betonas
2. Nuotekų šalinimo tinklai (KF, KS, KL)			
2.1. vamzdyno ilgis (bendras)	m	3855,56	
2.2. vamzdyno diametras (d 800)	m	22,87	gelžbetonis
2.3 vamzdyno diametras (d 700)	m	62,91	polivinilchloridas
2.4 vamzdyno diametras (d 315)	m	446,57	polivinilchloridas
2.5 vamzdyno diametras (d 200)	m	90,16	polivinilchloridas
2.6 vamzdyno diametras (d 200) iki rekonstrukcijos	m	11	plastikas
2.7 vamzdyno diametras (d 160)	m	1347,43	polivinilchloridas
2.8 vamzdyno diametras (d 160) iki rekonstrukcijos	m	1578	plastikas
2.9 vamzdyno diametras (d 80)	m	332,05	polietilenas
2.10 šulinių skaičius (d 2000)	vnt.	2	gelžbetonis
2.11 šulinių skaičius (d 1500)	vnt.	7	gelžbetonis
2.12 šulinių skaičius (d 1000)	vnt.	27	gelžbetonis
2.13 siurblinės	vnt.	2	stikloplastis
2.14 siurblinės	vnt.	1	gelžbetonis
2.15 naftos produktų gaudyklė	vnt.	1	PE (polietilenas)

KOPIJA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepolėjienė
2011 -06- 23

2.16 grotų kamera	vnt.	1	PE (polietilenas)
2.17 vamzdynas (d 200)	m	3,45	ketus
3. Drenažo tinklai (D)			
3.1 vamzdyno ilgis (bendras)	m	4028,82	
3.2 vamzdyno diametras (d 300) iki rekonstrukcijos	m	271,56	
3.3 vamzdyno diametras (d 200) iki rekonstrukcijos	m	909,63	
3.4 vamzdyno diametras (d 160)	m	14,59	polivinilchloridas
3.5 vamzdyno diametras (d 113)	m	660,56	polivinilchloridas
3.6 vamzdyno diametras (d 90)	m	436,27	polivinilchloridas
3.7 vamzdyno diametras (d 65)	m	466,1	polietilenas
3.8 vamzdyno diametras (d 50)	vnt.	1270,11	polivinilchloridas
3.9 šulinių skaičius (d 1500)	vnt.	6	gelžbetonis
3.10 šulinių skaičius (d 1000)	vnt.	2	gelžbetonis
3.11 šulinių skaičius iki rekonstrukcijos	vnt.	8	
3.12 siurblinė (d 1800)	vnt.	1	stiklaplastis
4. Aikštelės			
A1 – Žaliųjų atliekų kompostavimo	kv. m	3867	asfaltas
A2 – Statybos ir griovimo atliekų	kv. m	2118	žvyras
A3 – Antrinių žaliavų iki rekonstrukcijos	kv. m	666	betonas
A4 – Sąvartynas iki rekonstrukcijos	kv. m	18621	
A5 – Sąvartynas	kv. m	25731	
A6 – Sąvartynas iki rekonstrukcijos	kv. m	14645	
5. Kiti statiniai			
t1 – tvora iki rekonstrukcijos	m	892,31	
t2 – tvora	m	523	
171, 172, 241, 242 – požeminiai priešgaisriniai rezervuarai	kub.m	4 x 50	
236, 237 - požeminiai priešgaisriniai šuliniai (d 1500)	vnt	2	
K - priešgaisrinis rezervuaras iki rekonstrukcijos	kub.m	380	
b1 – automobilinės svarstyklės	kub.m	87,04	
b2 – automobilių ratų dezenfekavimo duobė	kub.m	14	
6. Kelias iki Zabieliškio sąvartyno (I-16)			
6.1 važiuojamoji dalis (A) iki rekonstrukcijos	km	0,894	asfaltbetonis
6.2 važiuojamoji dalis (A)	km	0,816	asfaltbetonis
6.3 Įvažiavimas (Ž)	kv. m	98	žvyras
6.4 Kelkraštis (Ž)	kv. m	2244	žvyras
6.5 želdiniai (veja)	kv. m	11656	
7. Biochemikų gatvė (I-14)			
7.1 važiuojamoji dalis (A)	km	2,527	asfaltbetonis
7.2 važiuojamoji dalis (C) iki rekonstrukcijos	km	0,15	betonas
7.3 važiuojamoji dalis (C) iki rekonstrukcijos	kv. m	1381	betonas
7.4 šaligatvis (A) iki rekonstrukcijos	kv. m	110	
7.5 šaligatvis (C) iki rekonstrukcijos	kv. m	68	
7.6 Įvažiavimas (Ž) iki rekonstrukcijos	kv. m	168	
7.7 Kelkraštis (Ž) iki rekonstrukcijos	kv. m	4500	
7.8 želdiniai (veja) iki rekonstrukcijos	kv. m	49171	
7.9 bordiūras iki rekonstrukcijos	m	818	
8. Elektros ir ryšių kabeliai			
8.1 0,4 elektros kabelio trasos ilgis	m	1249,82	
8.2 Kabelis su aliuminio gyslomis A1-1-4x120	m	75	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė

2011 -06- 23

8.3 Kabelis varinėmis gyslomis LP Nr.7Z PD	m	1935	
8.4 Kabelis su varinėmis gyslomis 3x2,5	m	220	
8.5 Kabelis su varinėmis gyslomis 5x16 LP Nr.7Z ND	m	930	
8.6 Vamzdis PVC (d 110)	m	120	
8.7 Ryšių kanalizacijos ilgis pe d50	m	102,69	
8.8 Ryšių kanalizacijos ilgis pe d32	m	20,82	

Faktinė statybinė vertė : **18461** tūkst.lt.

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika: Pagrindinės statinių k-jos esamo natūralaus ir atvežtinio grunto, monolitinis ir surenkamas nedidelių gabaritų gelžbetonis.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai , inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinės sistemos (elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Terminas

Komisija pripažįsta, kad:

VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO (įm.k.300092998) ZABIELIŠKIO REGIONINIS SĄVARTYNAS, PRIVAŽIAVIMO KELIAS, KOMPOSTAVIMO, STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ PERDIRBIMO AIKŠTELĖS ZABIELIŠKIO K., KĖDAINIŲ R.,
(administracinis-buitinis pastatas 1B1p, 1b1p (un.nr. 5300-0002-5011), stoginė 3G1g (un.nr. 4400-1866-2049), vandentiekio tinklai V (un.nr. 4400-1932-7436), nuotekų šalinimo tinklai KF, KS, KL (un.nr. 4400-1932-9410), drenažo tinklai D (un.nr. 4400-1933-1416), aikštelių A1, A2, A3, A4, AŠ, A6 (un.nr. 4400-1933-8419), kiti statiniai t1, t2, 171, 172, 241, 242, 236, 237, K, b1, h2 (un.nr. 4400-1933-6413), kelias iki Zabiliškio sąvartyno 1-16 (un.nr. 4400-1218-1894), kelias Biochemikų g. 1-14 (un.nr. 4400-1182-9795), elektros ir ryšių kabeliai)

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapiėjienė
2011 -06- 23

6

tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkami naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai: NUODYTI 2009-05-07 AKTĖ NR. M647

1.Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija 1.

2.Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu 1.

3.Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai 1.

4.Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių, priešgaisrinės bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos

5.Statinių ir priklausinių (turi ir – inžinerinių tinklų), kuriuos perduodama naudoti, sąrašas 1.

Komisijos pirmininkas: Armandas Mockus — **A.Mockus**

Komisijos nariai:

Kėdainių miesto savivaldybės vedėjas — Alvydas Kleiva — **A.Kleiva**

Naruševičius — **R.Naruševičius**

Valstybinė energetikos inspekcija Panevėžio teritorinės skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius RAMŪNAS MYKOLAITIS — **R.Mykolaitis**

Ona Šulcienė — **O.Šulcienė**

V.Čekanauskas

K.Balčiūnas

V.Kundrotas

K.Mikalauskas

R.Ivanauskienė

E.Čižikienė

A.Kutraitė

G.Čižinauskas

A.Bisikirskas

R.Lukoševičius

G.Kamlauskas

E.Kevalaitis

Techninis prižiūrėtojas — **J.Dričys**

Techninis prižiūrėtojas — **G.Meldaikis**

Statybos darbų vadovas (rangovas) — **P.Makutėnas**

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliūnienė
2011 -06- 23

07

P.Ringis

V.Sabakinas

Centų vadovas
Antanas Rimvydas
YLA

A.R.Yla

Subrangovai

J.Graželis

Juozas Graželis
Statybos vadovas

Akto vieną egzemplioriumi priedais ir juose išvardytais dokumentais nuolat saugoti:

priėmė _____ (parašas) _____ (v. pavardė)

perdavė _____ (parašas) _____ (v. pavardė)

200 9 m. 11 mėn. 20 d.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Česlėjienė
2011 -06- 23

priedas Nr. 2.2.2
1

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS
DEPARTAMENTAS
STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Juridinių asmenų registro kodas 188601998 L.Sapiegos g. 18, 44501 Kaunas
Tel. (8-37) 20 28 15 Faks. (8-37) 20 91 91 El. p. statybos.inspekcija@kaunas.ata.lt
J.Basanavičiaus g. 36, 57288, Kėdainiai, Tel.: (8-347) 6 95 73 , Faks. (8-347) 69573

VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO (įm.k.300092998)
ZABIELIŠKIO REGIONINIO SĄVARTYNO,
VIETINĖS REIKŠMĖS PRIVATAUS KELIO 1-18 (un.nr.4400-1934-0415)
ZABIELIŠKIO K., KĖDAINIŲ R.,

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI
A K T A S NR. 5784-148

Kėdainių r. **200 9 m. 12 mėn. 14 d.**

Komisija, paskirta Kauno apskrities viršininko 2006 12 22 įsakymu Nr. V-538 šios sudėties:

A.Mockus - *Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Kėdainių rajone (komisijos pirmininkas);*

V.Čekatauskas – *projekto vadovas, UAB "Krašto projektai ir partneriai";*

K.Balčiūnas – *VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius;*

V.Kundrotas - *Kėdainių r. savivaldybės administracijos architekto tarnybos vedėjas;*

R.Naruševičius - *Kauno apskrities PGV, Kėdainių PGT, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;*

K.Mikalauskas – *Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūros vedėjas;*

E.Čėsienė - *Kėdainių rajono savivaldybės administracijos melioracijos tarnybos vyresn. specialistė;*

E.Kevalaitis – *genrangovas, UAB „Kamesta" techninis direktorius;*

dalyvaujant:

rangovams (statybos vadovui):

– **P.Makutėnas**, *kv.at.nr. 15001, 17321, galioja iki 2010-01-27, 2011-04-26 UAB „Kamesta");*

techniniam prižiūrėtojui:

– **J.Drižys**, *kv.at.nr. 1659, galioja iki 2013-01-18 (UAB „SWECO BKG LSPI");*

vadovaudamiesi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą :

ZABIELIŠKIO REGIONINIO SĄVARTYNO VIETINĖS REIKŠMĖS PRIVATAUS KELIĄ

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

2

...es nėra nekilnojamoji kultūros vertybė ir nėra pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1.Statyba vyko pagal projektą nr.1395-8, kurį 2007 metais parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai", įm.k. 124663332, kv.at.nr.1085, Konstitucijos pr. 23C-415, LT-08105 Vilnius; Projekto vadovas V.Čekatauskas (at.nr.1678, galioja iki 2013-02-08). Projekto ekspertizės vadovas V.Papinigis (kv.at.nr. 14286; galioja iki 2014-03-20). Bendrosios ekspertizės aktо Nr.29-2007-2, 2007-04-04.

2.Leidimas statyti Nr.s-07-256, išduotas 2007-11-09, koreguotas 2009-05-13, nuolatinės statybos komisijos protokolo nr. 310, 2007-11-07.

3.Statytojas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (įm.k.300092998), Statybininkų g. 3-19, Kaunas;

4.Statybos ir montavimo darbus atliko:

- *UAB „Kamesta", įm.k.259805810, Liepų g.23, LT-53239 Garliava, Kauno r.; kv.at.nr. 0196, galioja iki 2013-02-15, bendrastatybiniai darbai,*

5.Statyba pradėta 2007-12-04.

6.Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
Vietinės reikšmės privatus kelias (i-18)			
Važiuojamoji dalis (A)	km	0,115	asfaltbetonis
Važiuojamoji dalis (A)	kv. m	1780	asfaltbetonis
Įvažiavimas (š)	kv. m	511	žvyras
Važiuojamoji dalis (š)	km	0,274	žvyras
Važiuojamoji dalis (š)	kv. m	1919	žvyras
Važiuojamoji dalis (š)	km	0,465	žvyras
Važiuojamoji dalis (š)	kv. m	2741	žvyras
Važiuojamoji dalis (A)	km	0,043	asfaltbetonis
Važiuojamoji dalis (A)	kv. m	346	asfaltbetonis
Šaligatvis (c)	kv. m	103	betonas
Pralaida d-800	m	21	gelžbetonis
Pralaida d-800	m	16	gelžbetonis
Pralaida d-500	m	15	gelžbetonis

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika: ---------

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai , inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

10. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

70

3

Komisija pripažįsta, kad:

**VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO (įm.k.300092998)
ZABIELIŠKIO REGIONINIO SĄVARTYNO,
VIETINĖS REIKŠMĖS PRIVATAUS KELIAS 1-18 (un.nr.4400-1934-0415)
ZABIELIŠKIO K., KĖDAINIŲ R.,**

tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1.Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija 1.
2.Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu 1.
3.Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos priėmimo aktai 1.
4.Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos 1.
5.Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kuriuos perduodama naudoti, sąrašas 1.

Komisijos pirmininkas: Raimondas Mockus **A.Mockus**

Komisijos nariai: **V.Čekatauskas**

K.Balčiūnas

Kauno APGV Kėdainių PGT
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
poskyrio viršininkas

Raimondas Narušavičius **V.Kuodrotas**

R.Naruševičius

K.Mikalauskas

E.Čižikienė

E.Kevalaitis

Techninis prižiūrėtojas **J.Držys**

Statybos darbų vadovas (rangovas) **P.Maknėnas**

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23



Arnoldas Mockus

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplikienė
2011-06-29

Priedas 2.2.3

1

Linijinio inžinerinio statinio

LAPIŲ REGIONINIO SAVARTYNO REKONSTRUKCIJA IR IŠPLĖTIMAS
II SAVARTYNO LAUKO 2D SEKCIJOS, KAUPIMO LAUKO 2D,
UN. NR. 4400-1650-0437
KAUNO R. SAV. LAPIŲ SEN. LEPŠIŠKIŲ K.

(pavadinimas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, unikalus Nr. ir adresas)

pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS

KAUNO R. SAV. 2008 m. 10 mėn. 09 d.
(vietovė)

Komisija, paskirta Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-12-22 įsakymu Nr. V-536
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

J. Valūnas - komisiją paskyrusios institucijos KAVA teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),

M. YLA - VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO DIREKTORIUS - statytojas
V. SEKEČIAUSKAS - projekto vadovas(-ė)
- Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos viršininkas
J. Tartėnas - Valstybinio visuomenės sveikatos centro vyr. specialistas
A. Jakubauskas - Energetikos valstybinės inspekcijos KTS vedėjas
V. Rimas - Kauno reg. Aplinkos apsaugos departamento Kauno raj. agent. vedėjas
K.A. GRICIUS - KAUNO R. SAV. VYR. ARCHITEKTAS
E.Ž. TANKEVIČIENĖ - AVB KAUNO RENKAMŲ TARNYBOS VEDĖJAS /ATSAKINGAS UŽ MELIORACIJĄ/
R. STANKUS - LAPIŲ SEN. SENŪNAS
L. MARTINAITIS - VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS TRS VEDĖJAS

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) G. A. KALITA AT. NR. 2013A
(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) _____
(v.pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam prižiūrėtojui G. HELDAIKIUI AT. NR. 19766
(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo LAPIŲ REGIONINIO SAVARTYNO REKONSTRUKCIJĄ IR IŠPLĖTIMĄ, II-OJO SAVARTYNO LAUKO 2D SEKCIJOS, KAUPIMO LAUKO 2D, UN. NR. 4400-1650-0437 KAUNO R. SAV. LAPIŲ SEN. LEPŠIŠKIŲ K.
(statinio pavadinimas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, unikalus Nr. ir adresas)

patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr. 1395-10, kurį parengė UAB „KELIO PROJEKTAS" (projektavimo įmonės pavadinimas)
(Į.K. Nr. 124662338)
ir patvirtino VŠĮ KAUNO REG. ATLIEKŲ TVARK. CENTR. DIREKTORIUS M. YLA V8-38, 2007-09-04
(data, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2007 m. RUGSĖJO mėn. 10 d. Nr. NR. 40 2011-06-23

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS" (Į.K. 300092998, STATYBININKŲ G. 3, KAUNAS 73

2

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „SIEMENS IR LAIGINA" MUNICIPINĖS PASLAUGOS SUTARTIES PAGRINDU UAB „GRANDAS", Ar. KLAIPĖDA
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestato Nr.)
subrangovai _____
(įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatų Nr.)

1. Statyba pradėta 2009 m. 04–09 mėn.

6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. KAUPINIO LAUKAS 2 D	PLOTAS ha	16300,0	SMĖLIS
1.1. DRENAŽO VAMZDYNAS D	ILGIS m'	676,0	SKERSN. 160 MM, POLIETILENAS
1.2. FILTRUO DRENAŽO VAMZDYNAS PD	ILGIS m'	934,0	SKERSN. 160 MM, POLIETILENAS
1.3. FAKTIŠKA STATYBOS KAINA	T. LT	3759,6	
1.4.			
1.5.			
1.6.			
1.7.			
1.8.			
1.9.			
1.10.			
1.11.			
2. Vandentiekio, kanalizacijos:			
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
3. Šilumos perdavimo trasos:			
3.1. tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas į statinį)	x		
3.2. šilumos nešėjas: (vanduo, garas)	x		
3.3. šilumos nešėjo parametrai:			
slėgis	kPa		
temperatūra padavimo vamzdyne	°C		
temperatūra grįžtančio nešėjo	°C		
3.4. vamzdynų rodikliai:			
medžiaga	x		
padavimo vamzdyno skersmuo	mm		
grįžtančio vamzdyno skersmuo	mm		

TIKRA
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

3

3.5. vamzdynų šilumos izoliacija:	x
tipas (medžiaga)	mm
storis	x
apsaugos sluoksnis	cm x cm
3.6. šovio skersmuo ir medžiaga	m
3.7. trasos ilgis	vnt.
3.8. šulinių (kamerų) skaičius	
3.9. kiti svarbūs rodikliai:	
4. Elektros tiekimo linijos:	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
4.4.	
4.5.	
4.6.	
5. Kitų linijinių statinių: *(analogiškai surašomi jų pagrindiniai rodikliai)*	
6. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad II SAVARTYNO LAUKO 2B SEKCIJOS LD, KAPINO LAURAS LD UN. NR. 4480-1650-0437 (statinio pavadinimas) DRENAŽO VAMZDYNAS D IR FILTRATO DRENAŽO VAMZDYNAS FD

PATIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-08-23

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

4

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
1. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
1.
1. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai ,
1.
1. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
1.
1. Statinių ir jų priklausinių, pripažintinų tinkamais naudoti, sąrašas.
1.

Komisijos pirmininkas _____ Jonas Valūnas
(parašas) (v.pavardė)

Komisijos nariai:

J. Tarėnas
V. Rimas
A. Jakubauskas
V. YLA
V. GERETUSKAS
K. A. GRICIUS

Rangovas G. A. KALITA

Subrangovai Seniūnai Rimantas Stankus
E. J. JANKEVIČIUS
P. VSTANKUS

Techninis prižiūrėtojas G. HELDAKIS
L. MARTINAITIS

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

Priėmė: _____
(pareigos, v.pavardė, parašas)

Perdavė: _____
(pareigos, v.pavardė, parašas)

Data _____

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aksana Čepiliauskė
2011-06-23

Priedas 2.29

A

Linijinio inžinerinio statinio

LAPIŲ, REGIONINIO SAVARTYNO REKONSTRUKCIJA IR IŠPLĖTIMAS III-IAS KAUPIMO LAUKAS, GN. NR 4400-0687-7343, KAUPIMO LAUKAS 3B

KAUNO R. SAV. LAPIŲ, SEN. LAPŠIŠKIŲ K.

(pavadinimas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, unikalus Nr. ir adresas)

pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS

KAUNO RAJ. SAV. (vietovė) 2008 m. 09 mėn. 11 d.

Komisija, paskirta Kauno apskrities viršininko administracijos 2008-12-22 įsakymu Nr.V-336
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

Šios sudėties:

J. Valianas - komisiją paskyrusios institucijos KAVA teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),

V. YLA - VĮ, KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO DIREKTORIUS - statytojas
- projekto vadovas(-ė)
- Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos viršininkas
J. Tartėnas - Valstybinio visuomenės sveikatos centro vyr. specialistas
- Energetikos valstybinės inspekcijos KTS vedėjas
V. Rimas - Kauno reg. Aplinkos apsaugos departamento Kauno raj.agent. vedėjas
K.A. GRICIUS - KAUNO R. SAV. VYR. ARCHITEKTAS
V. CEREŠKEVIČIUS - PROJEKTO VADOVAS
E.J. JANKEVIČIUS - KAVA KAUNO VEIKLOS TARNYBOS VEDĖJAS /ATSAKINGAS UŽ MELIORACIJĄ/
R. STANKUS - LAPIŲ SEN. SENJŪNAS
L. MARTINAITIS - VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS TKS VEDĖJAS

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) V. ŽARSKUI AT. NR. B 3610
(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) .....
(v.pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam prižiūrėtojui G. NELDAIKIUI AT. NR. A 0726, V. DRIŽIUI AT. NR. A 1653
(v.pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo LAPIŲ, REGIONINIO SAVARTYNO REKONSTRUKCIJA IR IŠPLĖTIMAS III-IAS KAUPIMO LAUKO UN. NR. 4400-0687-7343 KAUPIMO LAUKĄ 3B KAUNO R. SAV. LAPIŲ, SEN. LEPŠIŠKIŲ, K.
patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1.Statyba vyko pagal projektą Nr. 1395-10, kurį parengė UAB „KRAŠTO PROJEKTAI IR KARTOGRAFIJA" LR. K. NR. 124663332
(projektavimo įmonės pavadinimas)
ir patvirtino VĮ KAUNO REG. ATLIEKŲ TVARK. CENTR. DIREKTORIUS V. YLA 08-04-42, 2007-09-09
(kas, kada, dokumento Nr.)

2.Leidimas statyti išduotas 2007 m. RUGSĖJO mėn. 10 d. Nr. NR-40 2011-06-23

3.Statytojo pavadinimas ir adresas VĮ, KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS" LR.K. 300092998, STATYBININKŲ G. 5, KAUNAS

2

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „SIENOJUS" IR UAB „LAUGINA" JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PAGRINDU
(pavadinimas ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.) TOMAS JUNCYS K. BIRŽŲ SEN. JONAS RAT. ATESTAS
subrangovai _____
(pavadinimai ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatų Nr.)

1. Statyba pradėta 2008 m. 01–05 mėn.

6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. KAUPINIO LAUKAS 38	PLOTAS M²	74600,0	NEDŽIUGA – SMĖLIS
1.1. VIDUTINĖ RINKOS KAINA	T. LT	937,0	
1.2. FAKTINĖ STATYBOS KAINA	T. LT	232,38	
1.3.			
1.4.			
1.5.			
1.6.			
1.7.			
1.8.			
1.9.			
1.10			
1.11			
2. Vandentiekio, kanalizacijos:			
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
3. Šilumos perdavimo trasos:			
3.1. tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas į statinį)	x		
3.2. šilumos nešėjas: (vanduo, garas)	x		
3.3. šilumos nešėjo parametrai:			
slėgis	kN		
temperatūra padavimo vamzdyne	°C		
temperatūra grįžtančio nešėjo	°C		
3.4. vamzdynų rodikliai:			
medžiaga	x		
padavimo vamzdyno skersmuo	mm		
grįžtančio vamzdyno skersmuo	mm		

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -06- 23

70

3

3.5. vamzdynų šilumos izoliacija:	x	
tipas (medžiaga)	mm	
storis	x	
apsaugos sluoksnis	cm x cm	
3.6. lovio skersmuo ir medžiaga	m	
3.7. trasos ilgis	vnt.	
3.8. šulinių (kamerų) skaičius		
3.9. kiti svarbūs rodikliai:		
4. Elektros tiekimo linijos:		
4.1.		
4.2.		
4.3.		
4.4.		
4.5.		
4.6.		
5. Kitų linijinių statinių: *(analogiškai surašomi jų pagrindiniai rodikliai)*		
6. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt	

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad LAPIU REGIONINIO SAVARTYNO III-OJO KAUPINIO LAUKO, UN. NR. 4400-0687-4383, SAVARTYNO LAUKAS 3B (PLOTAS - 4,4600 HA) KAUNO R. SAV. LAPIU SEN., LEPŠIŠKIU K.

(statinio pavadinimas)

TIKRA

Jolanta Grigelienė

79

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

2011 -06- 23

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
1. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,
1.
1. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai ,
1.
1. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,
1.
1. Statinių ir jų priklausinių, pripažįstančių tinkamais naudoti, sąrašas,
1.

Komisijos pirmininkas _____ Jonas Valiūnas
(parašas) (v.pavardė)

Komisijos nariai:
Vyriausiasis specialistas Jonas Tarienas
Kelmelis
Rangovas N. RAKSKUS
Subrangovai Remigijus Ramelka
E. MACDETKIS
Techninis prižiūrėtojas J. ZIEVYS

J. Tarienas
V. Rimus
J. YLA
K. A. GRICIUS
V. ČEKATAUSKAS
E. J. JANKEVICIUS
B. STANKUS
L. MARTINAITIS

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

Priėmė: _____
(pareigos, v.pavardė, parašas)

Perdavė: _____
(pareigos, v.pavardė, parašas)

Data _____

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

80

Priedas 2.2.5

1

**Lapių regioninio sąvartyno rekonstrukcija ir išplėtimas
administracinio pastato 8B1g, unikalus Nr. 4400-1663-9362,
buitinio pastato 9H1g, unikalus Nr. 4400-1663-9384,
kaupimo lauko 2E, unikalus Nr. 4400-1853-9001,
Kauno r., Lapių sen. Lepšiškių k.**

**pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS**

Kauno r., Lepšiškių k. (vietovė) 2009 m. 07 mėn. 01 d.

Komisija, paskirta Kauno apskrities viršininko 2009-06-03 įsakymu Nr. V – 336 šios sudėties:

A. Meilinskienė - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus Kauno rajono vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė)
K. A. Gricius - Kauno r.savivaldybės administracijos Urbanistikos sk. vedėjas
K. Balčiūnas - VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro" direktorius - statytojas
V. Čekatauskas - projektuoto vadovas
A. Kazlauskas - Kauno apskrities PGV valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus statybos priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius
A. Liubinaitė - Kauno visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
A. Tranauskas - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos KTS l. e. vedėjo pareigas
V. Rimas - Kauno rajono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros vedėjas
L. Martinaitis - Valstybinės darbo inspekcijos KTS vedėjas
R. Stankus - Lapių seniūnijos seniūnas

statybos darbų vadovai – M. Žarskus, atestato Nr. B3610, galioja iki 2012-11-20, paskirtas UAB „Siesnojus" direktoriaus 2008-03-20 įsakymu Nr. 12§3.
G. A. Kalita, atestato Nr. 20131, galioja iki 2012-11-20.

ir techninis prižiūrėtojas - J. Drižys, atestato Nr. 1659, galioja iki 2013-01-18.

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą objektą - ***Lapių regioninio sąvartyno rekonstrukcija ir išplėtimas: administracinis pastatas 8B1g, unikalus Nr. 4400-1663-9362, buitinis pastatas 9H1g, unikalus Nr. 4400-1663-9384, kaupimo laukas 2E, unikalus Nr. 4400-1853-9001, esantis Kauno r., Lapių sen. Lepšiškių k.,*** patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007 metais parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai", įmonės kodas 124663332, projekto vadovas V. Čekatauskas, atestato Nr. 1678.

ir patvirtino statytojas VšĮ „Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro" įmonės kodas 300092998, direktorius J. Yla. Įsakymo Nr. 07-42, 2007-08-08. Buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Kaunas.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2. Leidimas statyti Nr. NR - 40, išduotas 2007-09-10.

3. Statybos ir montavimo darbus atliko: UAB „Siesnojus", įmonės kodas 156740160, atestato Nr. 0102, galioja iki 2013-01-11. Buveinės adresas: Joniaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. UAB „Laugina", įmonės kodas 261411420, atestato 180, galioja iki 2013-02-15. Jungtinės veiklos sutartis Nr. A/2007/K/24.

2011 -06- 23

5. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1.Administracinis pastatas 8H1g				
Bendras plotas		m^2	118,23	117,35
Užstatytas plotas		m^2	138	139
Statinio tūris		m^3	380	361
Aukštų skaičius		vnt	1	1
2.Buitinis pastatas 9H1g				
Bendras plotas		m^2	114,70	114,56
Užstatytas plotas		m^2	140	149
Statinio tūris		m^3	396	360
Aukštų skaičius		vnt	1	1
3.Kaupimo laukas 2E				
Plotas		m^2	12 307	12 300
vamzdynas (drenažas) D		m		111
vamzdynas (drenažas) D		m		397
šulinys D-5		vnt.		1
vamzdynas (filtrato dren.) FD		m		86
vamzdynas (filtrato dren.) FD		m		404
4.Pagalbiniai statiniai:				
Aikštelė b (4400-1663-9462)				
b8		m^2		190,27
b9		m^2		264,00
Kiemo statiniai (4400-1853-9012)				
automat.svarstyklės k4		m^3		55,3
ratų plovykla k5		m^3		28,0
atliekų tankintuvo stoginė 10H1g (4400-1861-0394)		m^2		110,63
Artez.gręžinys Nr.44405 (4400-1663-9395)		m		107,00
Kiemo statiniai (5297-6049-4068)				
filtrato kauptuvas 3		m^2		2 352
vandens praleidos 1, 2, 3 ir 5 (bend. ilgis)		m		45,50
keliai b2, b3 ir b4 (žvyras, bendr.plotas)		m^2		13 855
Tvora f		m^2		662
f1		m^2		129
vartai f2		m^2		8,4
tvora b4		m^2		825
lauko tualetas v		vnt.		1
filtrato kauptuvas 4f, 4f1, 4f2, b6		m^2		5 378
Kelias b10 (4400-1861-0344)		m^2		5 510
Vandentiekio tinklai V (4400-1861-0294) bendras ilgis		m		1 114,79
šulinys 135,93 (Ø 2000 mm, gylis-3 m.)		vnt.		2
šulinys 221,2 (Ø 1500 mm, gylis-3 m.)		vnt.		2
šulinys 51,35 (Ø 1000 mm, gylis-3 m.)		vnt.		2
Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (4400-1862-3760) bendras ilgis		m		1 529,2
naftos gaudyklė G-1		m^3		11,3
naftos gaudyklė G-2		m^3		9,2
latakas L-5-L-7		m		27,35
šuliniai:				
61, 71, 161,162 (Ø 1500 mm, gylis-4 m) 133, 134, 182, 231, 151, 152, 152, 201		vnt.		4

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

3

(Ø 1500 mm, gylis-3,5 m)		vnt.		8
139, 140, 195, 1, 62 (Ø 1500 mm, gylis-3 m)		vnt.		5
91, 194 (Ø 1500 mm, gylis-2 m)		vnt.		2
92, 131, 132, 138, 146, 196, 231, 11, 22, 51, 151, 111, 112, 241 (Ø 1000 mm, gylis-3 m)		vnt.		14
91, 136, 137, 141, 142, 143, 147, 148, 52, 53, 101, 61, 31, 54, 141, 142, 191, 192, 193, 197, 23, 25, 31, 2 (Ø 1000 mm, gylis-2 m)		vnt.		25
Nuotekų šalinimo tinklai KF (4400-1862-3939) bendras ilgis		m		211,25
naftos gaudyklė **55**		m^3		3,5
šulinys siurblinė **59** (Ø 1500 mm, gylis-4,2 m)		vnt.		1
196 (Ø 2000 mm, gylis-3,1 m)		vnt.		1
debito išlyginimo šulinys **197** (Ø 2000 mm, gylis-4,2 m)				
sėsdintuvas **192** (Ø 2000 mm, gylis-3,2 m)		vnt.		1
valymo įreng. **193** (Ø 2000 mm, gylis-3,2 m)		vnt.		1
šuliniai:		vnt.		1
62, 56, 57, 58, 94, 141a, 191, 195 (Ø 1000 mm, gylis-2 m)				
102 (Ø 1500 mm, gylis-2 m)		vnt.		8
194 (Ø 2000 mm, gylis-4 m)		vnt.		1
		vnt.		1
Faktiška statybos kaina				
Vidutinė rinkos kaina				
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt		-
		tūkst. Lt		-

6.Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

8B1g pamatai – betonas
sienos – metalas su karkasu
perdanga – metalas
stogas – šlaitinis, danga – metalas.

9B1g pamatai - betonas
sienos – metalas su karkasu
perdanga – metalas
stogas – sutapdintas, danga – bitumas.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai , inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinės sistemos (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti patvirtintoje techninėje dokumentacijoje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Lapių regioninio sąvartyno rekonstrukcija ir išplėtimas: III statybos etapas - administracinis pastatas 8Big, unikalus Nr. 4400-1663-9362, buitinis pastatas 9Hig, unikalus Nr. 4400-1663-9384, kaupimo laukas 2E, unikalus Nr. 4400-1853-9001, ir išvardinti pagalbiniai statiniai, esantys Kauno r., Lapių sen. Lepšikių k., tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkami naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1.Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 34 tomai.

2.Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu.

3.Statinio inžinerinių sistemų bei įrenginių paleidimo aktai.

Komisijos pirmininkas _____ Alfina M. Malinauskienė

Komisijos nariai:

Kauno apskr. PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio inspektorė Edita Kulvinskaitė _____ K. A. Gricius

_____ A. Kazlauskas

Vyriausioji specialistė Jovita Šarkinienė _____ A. Liubinaitė

_____ A. Tranauskas

_____ V. Rimas

_____ R. Stankus

_____ K. Balčiūnas

Vyriausiasis darbo inspektorius Henrikas Žutkauskas _____ L. Martinaitis

_____ M. Žurskus

_____ G. A. Kalita

_____ V. Čekatauskas

Techninis prižiūrėtojas _____ J. Drižys

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais maloniai saugoti:

Priėmė _____ _____ _____
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Perdavė _____ _____ _____
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

_____
(data)

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelėjienė
2011 -06- 23

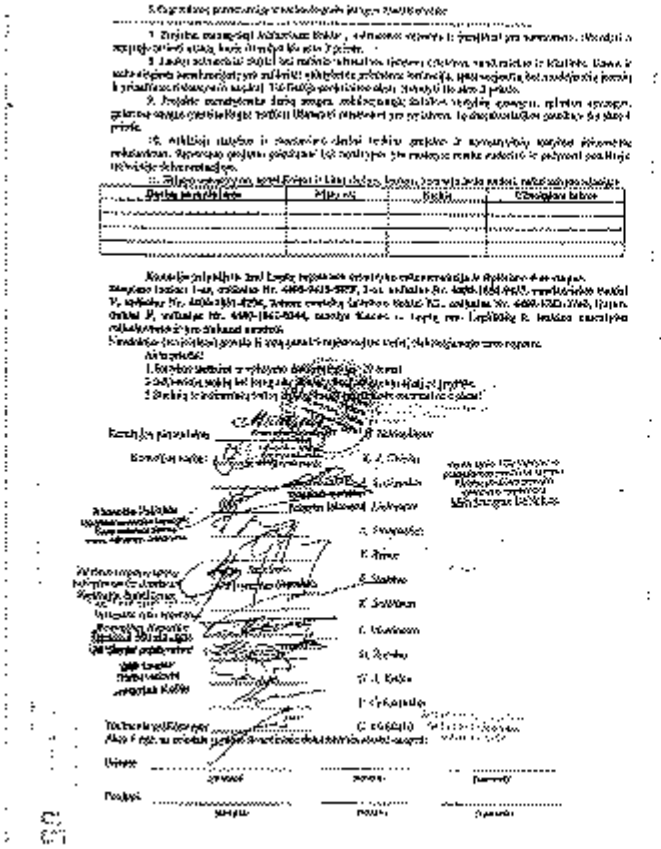

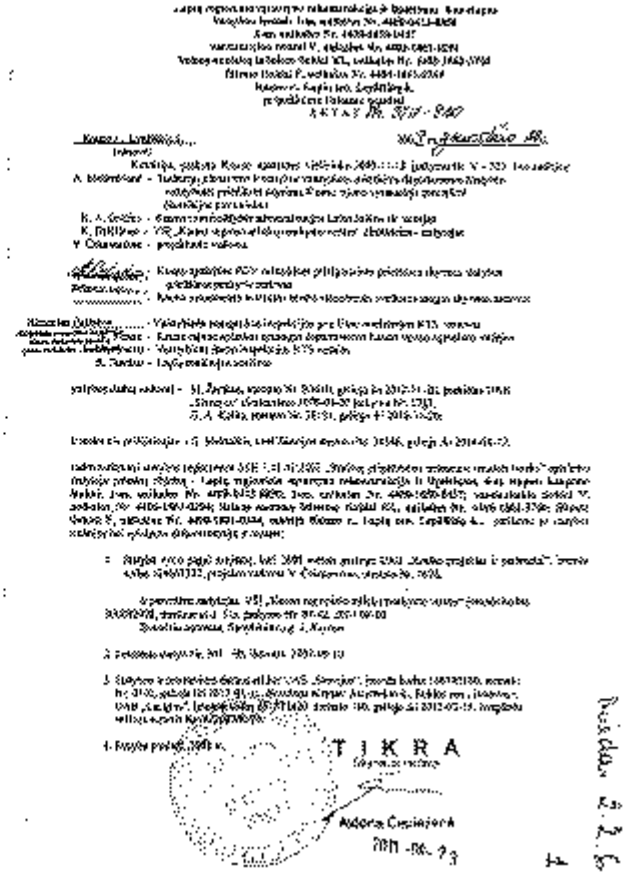
TIKRA

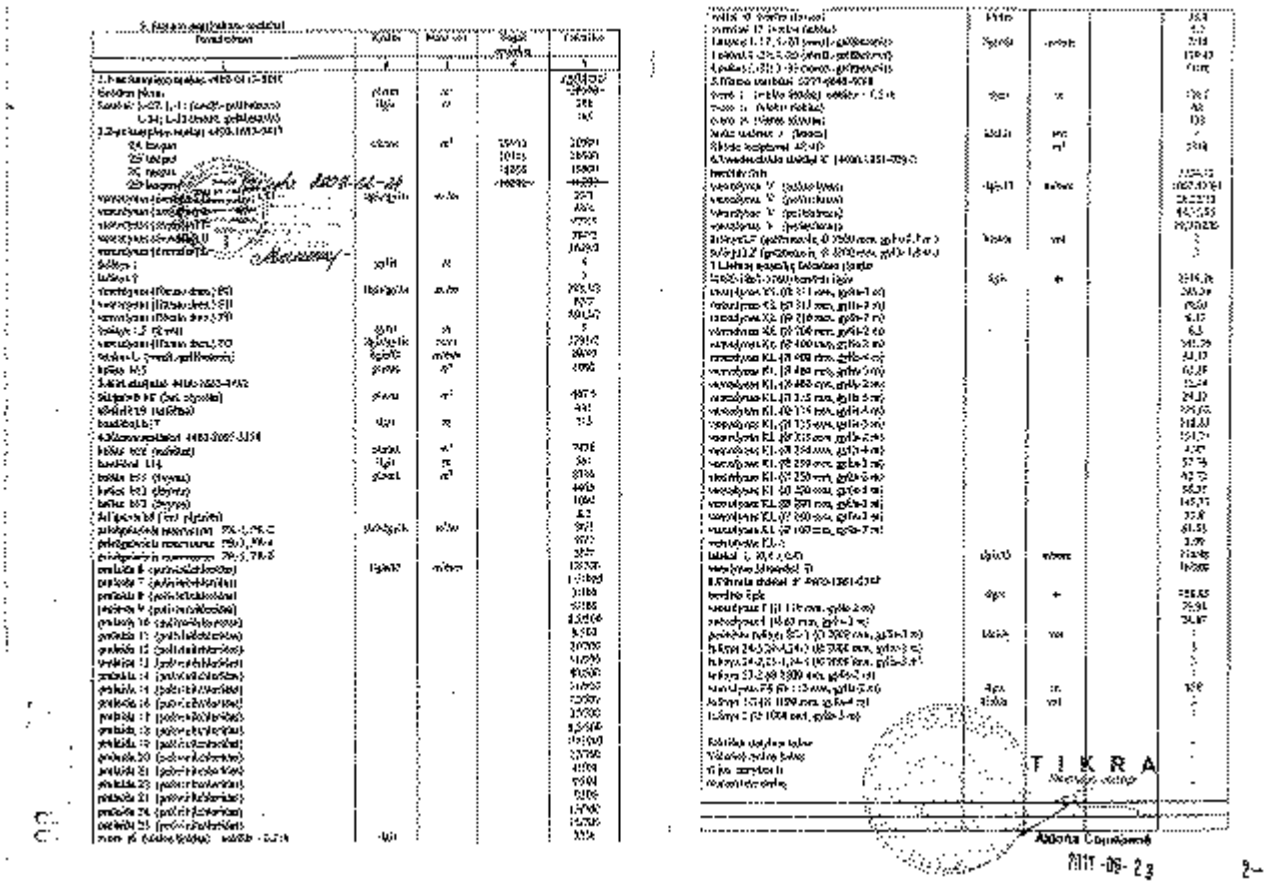

Priedas 2.2.7

1

ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS SU STATINIAIS (PASKIRTIS – KITI STATINIAI, ADMINISTRACINĖ, SANDĖLIAVIMO, INŽ.TINKLŲ), ANDRUŠAIČIŲ K., RASEINIŲ SEN., RASEINIŲ R.,

PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI
A K T A S Nr. STN-82

Raseiniai 2009 m. 06 mėn. 17 d.

Komisija, paskirta Kauno apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.V-537 šios sudėties:

V. Striūga - Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Raseinių rajone vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),

V. Grebliauskas - Raseinių r. savivaldybės architekto tarnybos vyr. specialistas;

A. Siudikas - AB „Raseinių melioracija“ direktorius;

K. Balčiūnas - VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius;

G. Motiejaitis - VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pavaduotojas;

V. Čekatauskas - projekto vadovas;

V. Užringienė - Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus vedėja;

G. Tamašauskis - Kauno regiono aplinkos apsaugos dep. Raseinių r. agentūros viršininkas;

E. Milkevičius - Raseinių PGT VPP atstovas,

V. Vasiliauskas - Valstybinės darbo inspekcijos vyr.inspektorius,

S. Anglickis - Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyr. inspekt., dalyvaujant rangovui (AB „Raseinių melioracija“ statybos vadovui) – **Vygintui Masalskiui** (kv.at. Nr.22526), subrangovui (UAB „Elpreka“ statybos vadovas) – **Jaronimui Brazaičiui** (kv. atestato Nr.E-0614) ir techniniam prižiūrėtojui – **Juozui Dričiui** (kv.atestato Nr.1659), vadovaudamiesi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo atliekų priėmimo aikštelę su statiniais ir inžineriniais tinklais Andrušaičių k., Raseinių sen., Raseinių r., kurie nėra nekilnojamojo kultūros vertybė ir nėra pastatyti nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jų statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1.Statyba vyko pagal projektą Nr.1395-04, kurį 2008m. parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai“;

2.Leidimas statyti išduotas 2008-01-30, Nr.3-2008NS.

3.Statytojas ir adresas: VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, 300092998, Statybininkų g. 3, Kaunas;

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 21

87

2

4.Statybos ir montavimo darbus atliko, rangovai: **AB „Rasčiukų melioracija", 172203882, Žemaičių g. 30, Ariogala;**

- subrangovai: **UAB „Ekpreka", 133538922, Draugystės g. 13A, Kaunas.**

5.Statyba pradėta 2008 m. sausio mėn.

6.Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Projektinis	Faktiškas
1. Bendrieji rodikliai:				
Bendrasis plotas	Administracinis pastatas 1B1/g	m^2	13,16	13,16
Statinio tūris		m^3	40,0	40,0
Aukštų skaičius		vnt.	1	1
Bendrasis plotas	Stambiųjų atliekų sandėlis 2F1/g	m2	16,59	16,59
Statinio tūris		m3	49,0	49,0
Aukštų skaičius		vnt.	1	1
Bendrasis plotas	Pavojingų atliekų sandėlis 3F1/g	m2	16,59	16,59
Statinio tūris		m3	49,0	49,0
Aukštų skaičius		vnt.	1	1
Bendrasis plotas	Perkrovimo stoties operatorinė 4H1/g	m2	6,25	6,25
Statinio tūris		m3	19	19
Aukštų skaičius		vnt.	1	1
Faktiška statybos kaina		Lt	-	3007670
2. Gamybos ir kt. statiniai			-	-
Aikštelė b1		m2	2930	2928,9
Aikštelė b2		m2	695	694,4
Tvora t		m	420	419,3
Priešgaisrinis rezervuaras k1		m3	75	75
Priešgaisrinis rezervuaras k2		m3	75	75
Vandens rezervuaras k3		m3	10	10
Požeminis rezervuaras PR		m3	10	10
Įvadinė vandentiekio linija V		m	20	20
Fekalinė kanalizacija KF1-KF2		m	17	17
Lietaus kanalizacija KL1-KL3		m	390	380
Naftos gaudyklė KL-4		m	11	11
Kiti rodikliai:				

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepelienė
2011 -06- 23

83

3

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės linijos charakteristika: pamatai –betoniniai; sienos – metalas; perdangos – metalas; langai – plastikiniai; šildymas – vietinis centrinis; vandentiekis - vetinis, kanalizacija – vietinė;

8.Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra surinktuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, išvardytais šio akto 2 priede.

9.Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos bei kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažinti tinkamais naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10.Projekte numatytos darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11.Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytąja tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12.Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Terminas

Komisija pripažįsta, kad atliekų priėmimo aikštelė su statiniais ir inžineriniais tinklais Andrušaičių k., Raseinių sen., Raseinių r., tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkama naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1.Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija: projektas, inv. Nr.10325.

2.Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – statybos darbų žurnale ir jo priedose.

3.Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai – statybos darbų žurnale.

TIKRA
Aldona Gaidelienė
2011 -06- 23

89
4

4

4.Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos – žurnalo prieduose.

5.Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas – žurnale.

Komisijos pirmininkas: V. Strūga

Komisijos nariai: V.Grubliauskas

A.Siudikas

K.Balčiūnas

G.Motiejaitis

V.Čekatauskas

E.Milkevičius

V.Užringienė

G.Tamašauskis

V.Vasiliauskas

Rangovas (statybos vadovas) V.Masalskis

Subrangovas (statybos vadovas) J.Brazaitis

Techninis prižiūrėtojas J.Drižys

Akto vienų egzempliorių su priedais ir juose išvardytais dokumentais nuolat saugoti:

priėmė _____ _____ _____

(pareigos) (v. pavardė) (parašas)

perdavė _____ _____ _____

200__ m. _____ mėn. ____ d.

TIKRA

90

2011 -06- 23

2

2.Leidimas statyti N. ... 20[illegible]03-83-07, projekto ekspertizės vadovas V.Papingis, kv.at.nr.14286, ...

3.Statytojas – **VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras** (įm.k.300092998), Statybininkų g.3-19, Kėdainiai

4.Statybos ir montavimo darbus atlikti:

Rangovai – **UAB „Rasvėsių projektavimas"**, įm.k.172203382, Žemaičių g.30, Ariogalos mst., Raseinių r., kv.at.nr.0066.

Subrangovas – **UAB**, ... 0141430, Dainavos g.28, Kėdainiai, kv.at.nr.0180.

5.Statyba pradėta ...

6.Statinio pagrindinės ...

Pavadinimas	Kriterijus	Mato vnt.	Kiekis
Atliekų priėmimo aikštelė ... (unik.nr.3409-1784-8336)			
Aikštelė A	plotas	kv.m	759
Bordiūras b	ilgis	m	277
Šaligatvis c	plotas	kv.m	13
Betono danga c	plotas	kv.m	239
Veja v	plotas	kv.m	662
Tvora tv	ilgis	m	163,5
Vartai var.	ilgis	m	4,5
Varteliai var.	ilgis	m	1
Įvažiavimas į aikštelę 1-6 ... (unik.nr.2358)			
Važiuojamoji dalis A	ilgis	km	0,242
	plotas	kv.m	1680
Įvažiavimas c	plotas	kv.m	16
Bordiūrai b	ilgis	m	261
Šaligatvis c	plotas	kv.m	3
Veja v	plotas	kv.m	628
Vandentiekio tinklai V (unik.nr.3409-1784-8347)	ilgis	m	227
Lietaus nuotekų tinklai KL (unik.nr.3409-1784-8370)	ilgis	m	206,26
Nuotekų šalinimo tinklai K (unik.nr.3409-1784-8369)	ilgis	m	68,06

Statybos darbų vertė ... Eurų.

7. Projekte numatytieji ... ir jų sąmatos yra suderinti, išbandyti ir priimti aktais, kurie įforminti šio ak... priedu.

8. Projekto sprendinių ... aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos ... reikalingos žinybos (išbrauktį) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos ...

9. ... statybos ... sąmatų ... rengiant projektą ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pak... ... nuo jo jis suderinta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentų ... dalyje.

10. Skyrių ... ir kitų ... kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama ... atbaigti.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplajienė
2011 -06- 23

3

Komisija pripažįsta, kad:

VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO (įm.k.300092998) ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖ (unik.nr.4400-1784-8336), ĮVAŽIAVIMAS Į AIKŠTELĘ I-6 (unik.nr.4400-1784-8334), ANDEN ŪKIO TINKLAI V(unik.nr.4400-1784-8347), LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI KF (unik.nr.4400-1784-8370), NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI KF (unik.nr.4400-1784-8361) J.BASANAVIČIAUS G., KĖDAINIUOSE,

tenkina nustatytus reikalavimus ir atitinka projektą.

12. Naudotojas (savivaldybė) privalo užtikrinti šio akto registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninės užduoties kopija (lapų skaičius);
2. Statybos techninių (ypatingų) reikalavimų nustatymo aktas (-ai);
3. Statybos techninės užduoties pakeitimo aktas (-ai);
4. Pagal statybos techninę užduotį ir statybos techninius reikalavimus atliktų specialiųjų tyrimų, ekspertizių, matavimų ir skaičiavimų dokumentų sąrašas, jų autorių pavardės, kvalifikacijos atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir kiti duomenys, reikalingi jų charakteristikai nustatyti, 1 l.
5. Statinio ir jo priklausinių (jei jie yra) techninės apskaitos bylos sąrašas (-ai) 1 l.

Komisijos pirmininkė ..... D.Cironkienė

Komisijos nariai: ..... V.Kundrotas

Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Raimondas Naruševičius ..... V.Čekatauskas

..... R.Naruševičius

Skyriaus vedėja Onė Šulcienė ..... O.Šulcienė

Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas Alvydas Klaiva ..... K.Mikalauskas

Melioracijos skyriaus vyr. specialistas Algimantas Malinauskas ..... A.Klaiva 2009-05-15

Valstybinė energetikos inspekcija Prie Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis kibirkščių inspektorius RAMŪNAS MYKOLAITIS ..... A.Malinauskas

..... R.Mykolaitis

..... G.Matiejaitis

Techninės priežiūros vykdytojas ..... J.Orlikas

Statybos darbų vadovai ..... R.Laurinčius

..... S.Podzečkus

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Česlėjienė
2011-06-23

4

Akto vieną egzempliorių su priedais ir jame nurodytais dokumentais nuolat saugoti:

priėmė _____ _____ _____
(parašas) (vardas, pavardė) (parašas)

perdavė _____ _____ _____
(parašas) (vardas, pavardė) (parašas)

200__ m. _____ mėn. __ d.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

2011 -06- 23

4
94

5

VIDA MIKELIŪNIENĖ
ALYTAUS
LAPAI

Kauno apskrities viešojo administravimo
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros departamento Statybos valst
priežiūros skyriaus Kėdainių rajono
vyriausioji specialistė
Danutė Cironkienė



TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

Priedas 229
1

Naujo statyba

Atliekų tvarkymo aikštelė (unikalus Nr. 4400-1938-2746) – kitos paskirties inžineriniai statiniai
(kadastrinių matavimų byloje (registro Nr. 44/1035051) pažymėtas: aikštelės - 00, 02, kelkvedžiai - 03, 04)
Kiemo įrenginiai (unikalus Nr. 4400-1938-2750) - kitos paskirties inžineriniai statiniai
(tvora - t1, t4, vartai su varteliais – t2, t3; požeminis rezervuaras – PR-1, požeminiai rezervuarai - PR-2, PR-3)
Vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-1938-2706) – vandentiekio tinklų paskirties inžineriniai statiniai
Lietaus nuotekų tinklai (unikalus Nr. 4400-1938-2717) – nuotekų šalinimo tinklų inžineriniai statiniai
(vamzdynai KL, KS, skirbliai S-1, naftos gaudyklė NG-1, šuliniai 121-128, 161-164, 171-172)
Nuotekų šalinimo tinklai (unikalus Nr. 4400-1938-2695) – nuotekų šalinimo tinklų inžineriniai statiniai
(vamzdynai KF, šuliniai 173-174, 2133)
Žemės sklype (sklypo kadastrinis Nr.4918-0005:2) Vytauto Didžiojo g. 156, Kaišiadoryse

pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S Nr. *STN26-09-079/IN-001*

Kaišiadorys — *2009-07-10*
vietovė — data

Komisija, paskirta		*Kauno apskrities viršininko 2006-12-22 įsakymu Nr. V-537*
Šios sudėties :		
Vytautas Košubs	-	*Kauno apskrities viršininko administracijos* *Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento* *Statybos valstybinės priežiūros skyriaus* *Kaišiadorių rajono vyriausiasis specialistas*, komisijos pirmininkas
Rimantas Želvys	-	*Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos* *Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento* *statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus* *vyriausioji architektė*
Kęstutis Balčiūnas	-	*VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius* – statytojas
Gintaras Motiejaitis	-	*VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas* – statytojas
Voldemaras Čekatauskas		*UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas*
Artūras Šalvaitis	-	*Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento* *prie Vidaus reikalų ministerijos* *Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos* *Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos* *Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas*
Kristina Banišonienė	-	*Valstybinės visuomenės sveikatos tarnybos* *prie Sveikatos apsaugos ministerijos* *Kauno visuomenės sveikatos centro* *Kaišiadorių skyriaus vedėja*
Alfredas Ališauskas	–	*Valstybinės energetikos inspekcijos* *prie Ūkio ministerijos* *Kauno teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius;*
Eugenijus Šulskis	-	*Aplinkos ministerijos* *Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento* *Kaišiadorių rajono agentūros vedėjas*
Arūnas Grigonis	-	*Valstybinės darbo inspekcijos* *Kauno skyriaus vyresnysis darbo inspektorius*
Dalyvaujant :		
Antanui Siaučiuk		*AB „Rasainių melioracija" direktorius, rangovo atstovui*
Gediminui Meldaikiui	–	*techniniam prižiūrėtojui ku. diestato Nr. Nr. 14766*

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka",

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
96
2011 -06- 23

2

Įžūrėjo statytojo pateiktą

Atliekų tvarkymo aikštelę (unikalus Nr. 4400-1938-2746) – kitos paskirties inžinerinį statinį
(kadastrinių matavimų byloje (registro Nr. 44/1035061) pažymėta: aikštelės - b1, b2, b4, bordiūrai - b3, b5)
Kiemo įrenginius (unikalus Nr. 4400-1938-2750) - kitos paskirties inžinerinius statinius
(tvoros - t1, t4, vartai su varteliais – t2, t3; požeminis rezervuaras – PR-1, priešgaisriniai rezervuarai – PR-2, PR-3)
Vandentiekio tinklus (unikalus Nr. 4400-1938-2706) – vandentiekio tinklų paskirties inžinerinį statinį
Lietaus nuotekų tinklus (unikalus Nr. 4400-1938-2717) – nuotekų šalinimo tinklų inžinerinį statinį
(vamzdynai KL, KS, šuliniai S-3, naftos gaudyklė NG-1, šuliniai 121-128, 161-164, 171-172)
Nuotekų šalinimo tinklus (unikalus Nr. 4400-1938-2717) – nuotekų šalinimo tinklų inžinerinį statinį
(vamzdynai KF, šuliniai 173-174, 2218)
Žemės sklype (sklypo kadastrinis Nr.4918-0005:2) Vytauto Didžiojo g. 136, Kaišiadorys

kuris yra /nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje /nereikalingus žodžius išbraukti/, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir **nustatė:**

1. Statyba vyko pagal projektą Nr. *2005/19/A/P/LT/139-5* , kurį parengė *2008 m.*
UAB „Krašto projektai ir partneriai" į.k. 124663332, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, kvalifikacijos atestato Nr. 1085, galioja iki 2014-02-27
(projektavimo įmonės pavadinimas, atestato Nr. ir galiojimo data)
ir patvirtino statytojas
(patvirtinimo dokumento Nr., data)
2. Leidimas statyti išduotas *2008-03-15* Nr. *36-ST1* galioja *2018-03-15*
3. Statytojo pavadinimas ir adresas
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, į.k. 300092998, Statybininkų g. 3-19, Kaunas
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
Rangovas:
AB „Raseinių melioracija" į.k. 172203882, Žemaičių g. 30, LT-60255 Ariogala, Raseinių r., atestatas Nr. 66, galioja iki 2013-01-11
(rangovo ir jo atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data, jo atliktų darbų rūšys)
5. Statyba pradėta *2008 m. liepos mėn. 29 d.*
6. **Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:**

pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
4. Gamybos, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
4.1. aikštelės:				
aikštelės b1 plotas		m^2		2741
aikštelės b2 plotas		m^2		377
aikštelės b4 plotas		m^2		272
bordiūrų b3 ilgis		m		590
bordiūrų b5 ilgis		m		95
4.2. kiemo įrenginiai:				
tvoros t1 ilgis		m		351,3
tvoros t4 ilgis		m		65
tvoros t1 aukštis		m		2
tvoros t4 aukštis		m		2
požeminis rezervuaras PR-1		vnt/m^3		1/9,4
priešgaisrinis rezervuaras PR-2		vnt/m^3		1/150
priešgaisrinis rezervuaras PR-3		vnt/m^3		1/150
4.3. vandentiekio tinklai:				
vamzdyno ilgis V		m		130,7
vamzdyno V skersmuo		mm		110
4.4. lietaus nuotekų tinklai:				
vamzdyno KL ilgis		m		184,13
vamzdyno KL skersmuo		mm		200

TIKRA
Skyriaus vedėja
2009.01.20
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 7 3

97

vamzdyno KS ilgis		m		61,87
vamzdyno KS skersmuo		mm		200/160
Šulinių skaičius/ diametras		vnt/mm		2/1500
Šulinių skaičius/ diametras		vnt/mm		6/1000
Šulinių skaičius/ diametras		vnt/mm		4/700
Šulinių skaičius/ diametras		vnt/mm		2/600
siurblinė S-1		vnt/mm		1/2400
naftos gaudyklė NG-1		vnt/mm/m^3		1/1800/11,4
4.5. nuotekų tinklai:				
vamzdyno KF ilgis		m		15,2
vamzdyno KF skersmuo		mm		160/140
Šulinių skaičius/ diametras		vnt/mm		2/1000

1. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

Aikštelės b1, b2, b4 – asfaltas
Bordiūrai b3, b5 – betonas
Tvora t1, t4, vartai su vartoliais t2, t3 – vielos tinklas
Požeminis rezervuaras PR-1 – gelžbetonis
Priešgaisriniai rezervuarai PR-1, PR-2 – stikloplastis
Vandentiekio tinklai V – polietilenas
Lietaus nuotekų tinklai KL, KS – polivinilchloridas
Lietaus nuotekų tinklų šuliniai - gelžbetonis
Lietaus nuotekų siurblinė S-1 - stikloplastis
Naftos gaudyklė NG-1 - stikloplastis
Nuotekų tinklai - polivinilchloridas
Nuotekų tinklų šuliniai - gelžbetonis

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai , inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra surenkamoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinės sistemos (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų surenkamojo transporto įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, atliekos apsauga, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybą techninių reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktuose statybos dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad

Atliekų tvarkymo aikštelė (unikalus Nr. 4400-1938-2746) – kitos paskirties inžineriniai statiniai
(kadastrinių matavimų byloje (registro Nr. 44/1035061) pažymėta: aikštelės - b1, b2, b4; bordiūrai - b3, b5)

Kiemo įrenginiai (unikalus Nr. 4400-1938-2750) - kitos paskirties inžineriniai statiniai
(tvora - t1, t4, vartai su vartoliais – t2, t3; požeminis rezervuaras – PR-1, priešgaisriniai rezervuarai – PR-2, PR-3)

Vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-1938-2706) – vandentiekio tinklų paskirties inžineriniai statiniai

Lietaus nuotekų tinklai (unikalus Nr. 4400-1938-2717) – nuotekų šalinimo tinklų inžineriniai statiniai
(vamzdynai KL, KS, siurblinė S-1, naftos gaudyklė NG-1, šuliniai 121-128, 163-164, 171-172)

Nuotekų šalinimo tinklai (unikalus Nr. 4400-1938-2717) – nuotekų šalinimo tinklų inžineriniai statiniai
(vamzdynai KF, šuliniai 173-174)

Žemės sklype (sklypo kadastrinis Nr.4918-0005:2) Vytauto Didžiojo g. 135, Kaišiadorys

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

TIKRA
Skyrinius vedėja
Aldona Čaplejienė

2011 -06- 23

4

Akto priedai:

1. . Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, l.
5. Pastato energetinio naudingumo sertifikatas l.

Komisijos pirmininkas — **Vytautas Kožuba**

Komisijos nariai:

Rimantas Želvys

Kęstutis Balčiūnas

Gintaras Motiejaitis

Voldemaras Čekatauskas

Artūras Šalvaitis

Kristina Banilūnienė

Alfredas Ališauskas

Eugenijus Šuliskis

Artūras Grigonis

Dalyviai:

Techninis prižiūrėtojas — **Geliminas Meldaikis**

Rangovas — **Antanas Siudikas**

Akto 1 egzemplioriu su priedais ir juose išvardintais dokumentais priėmimo nuolat saugoti.

Priėmė:

Perdavė:

Data

TIKRA
Savininko vardu
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

Priedas 2.2.10

1

STATYBINIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS NEMAJŪNŲ G. 15B, KAUNE

pripažinimo tinkamu naudoti
AKTAS Nr. STN-334

Kaunas 2009 m. Rugpjūčio 13 d.

Komisija, paskirta 2006 m. gruodžio 22 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 537

šios sudėties:

Š.Blažienė – Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus Kauno miesto vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė,

N.Vaitkevičius – Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus vedėjas,

A.Tranauskas – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Le. Kauno teritorinio skyriaus vedėjo pareigas,

Z.Leišienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrio vyriausioji specialistė,

L.Martinaitis – Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vedėjas,

K. Balčiūnas – statytojas – VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius,

V. Čekanauskas – UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas, atestato Nr. 1678, galioja iki 2013-02-08,

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos VPPS Statybų priežiūros poskyrio inspektorius,

A. Liubinaitė – Kauno visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,

E. Vainalavičius – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūros vedėjas,

V. Daugela – UAB „Kauno vandenys" direktorius gamybai,

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) Vygintui Masolskiui, atestatu Nr. 22537, Nr. 22526, galioja iki 2013-06-30,

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) Edmundui Mineikiui, atestato Nr. B3953, galioja iki 2013-05-06

ir techniniam prižiūrėtojui Juozui Diržiui, atestato Nr. 1659, galioja iki 2013-01-18

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statomųjų atliekų priėmimo aikštelę Nemajūnų g. 15B, Kaune,

patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai" ir patvirtino VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras"
2. Leidimas statyti išduotas 2008 m. balandžio 10 d. Nr. 38-SIT134-104/1.
3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras", į. k. 300092998, Statybininkų g. 3, Kaunas
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas AB „Rasinių melioracija", atest. Nr. 0056, galioja iki 2013-01-11,
subrangovai UAB „Eltreka", atest. Nr. 840, galioja iki 2013-11-14, elektros tinklai
5. Statyba pradėta 2008 m. rugsėjo mėn.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

100

6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Vandentiekio tinklai un. Nr. 4400-1821-1390:			
1.1 **vandentiekio tinklai V;**			
vamzdynų medžiaga			polivinilchloridas
vamzdynų skersmuo	mm	25	
vamzdynų ilgis	m	22	
1.2. **gelžbetonio šulinys 181,**			
skersmuo	mm	1500	
gylis	m	2	
1.3. **gelžbetonio šulinys 151,**			
skersmuo	mm	2000	
gylis	m	3	
2. Lietaus nuotekų tinklai un. Nr. 4400-1821-1266:			
2.1. **lietaus nuotekų tinklai KL**			
vamzdynų medžiaga			polivinilchloridas
vamzdynų skersmuo	mm	200	
vamzdynų ilgis	m	108	
2.2. **lietaus nuotekų linija KL**			
vamzdynų medžiaga			polivinilchloridas
vamzdynų skersmuo	mm	160	
vamzdynų ilgis	m	12	
2.3. **valymo įrenginys L1-L2**			
medžiaga			polivinilchloridas
talpa	m^3	6,3	
2.4. **gelžbetonio šuliniai 134, 136, 145**			
skersmuo	mm	1000	
gylis	m	2	
kiekis	vnt.	3	
2.5. **gelžbetonio šuliniai 181, 144**			
skersmuo	mm	800	
gylis	m	2	
kiekis	vnt.	2	
2.6. **gelžbetonio šulinys 133**			
skersmuo	mm	1500	
gylis	m	2	
2.7. **gelžbetonio šuliniai 81, 131, 132**			
skersmuo	mm	1000	
gylis	m	3	
kiekis	vnt.	3	
2.8. **gelžbetonio šulinys 135**			
skersmuo	mm	1000	
gylis	m	2	
3. Nuotekų šalinimo tinklai un. Nr. 4400-1821-1277:			
3.1. **nuotekų šalinimo tinklai KF**			
vamzdynų medžiaga			polivinilchloridas
vamzdynų skersmuo	mm	200	

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2015 -05- 7 d.

104

vamzdynų ilgis	m	49,17	
3.2. **nuotekų linija KF**			
vamzdynų medžiaga			polivinilchloridas
vamzdynų skersmuo	mm	160	
vamzdynų ilgis	m	33	
3.3. **nuotekų linija KF**			
vamzdynų medžiaga			polivinilchloridas
vamzdynų skersmuo	mm	110	
vamzdynų ilgis	m	3,5	
3.4. **gelžbetonio šuliniai 142,143**			
skersmuo	mm	1000	
gylis	m	2	
kiekis	vnt.	2	
3.5. **gelžbetonio šulinys 141**			
skersmuo	mm	1000	
gylis	m	3	
3.6. **valymo įrenginys F2**			
medžiaga			polivinilchloridas
gylis	m	3,6	
skersmuo	mm	1500	
4. Kitų linijinių statinių:			
4.1 **administracinis pastatas 1B1g, un. Nr. 4400-1821-9433:**			
bendras plotas	m^2	13,38	
tūris	m^3	41	
4.2. **sandėlis 2F1g, un. Nr. 4400-1821-9466:**			
bendras plotas	m^2	17,43	
tūris	m^3	50	
4.3. **sandėlis 3F1g, un. Nr. 4400-1821-9477:**			
bendras plotas	m^2	17,43	
tūris	m^3	50	
4.4. **kiemo statiniai un. Nr. 4400-1821-9488:**			
4.4.1. **vielos tinklo tvora t1,** ilgis	m	188	
4.4.2. **vielos tinklo vartai t2,** ilgis	m	4,5	
4.4.3. **vielos tinklo varteliai t3,** ilgis	m	1	
4.4.4. **asfalto aikštelė b1,** plotas	m^2	1268	
4.4.5. **betono aikštelė b2,** plotas	m^2	193	
4.4.6. **betono aikštelė b3,** plotas	m^2	39	
4.4.7. **betono plytelių šaligatvis b4** plotas	m^2	10,5	
5. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt		

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, ~~nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos~~, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus įrašus išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

PATIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad stambiųjų atliekų priėmimo aikštelė, esanti Nemajūnų g. 15B, Kaune, **tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.**

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 15 tomų.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, 4 tomai.
3. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai, 1 tomas.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, ~~nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos~~ ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos, 3 b.

Komisijos pirmininkas Sabina Blažienė

Komisijos nariai: N. Valatkevičius

A. Tranauskas

Z. Leišienė

V. Čekatauskas

K. Balčiūnas

E. Vainalavičius

Jonas Bereika

Edita Kulvinskaitė

Jolanta Šarkinienė

Vladas Marijonas Daugela

V. Daugela

L. Martinaitis

V. Masalskis

Rangovas

Subrangovai E. Mineikis

Juozas Drižys

Techninis prižiūrėtojas

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau naoiat saugoti.

Priėmė:

Perdavė:

Data 2009-04-13

TIKRA

Aldona Čepėlienė

2011-06-23

103

Priedas 2-2.11

1

Įrenginys atliekų priėmimo aikštelės su atliekų surinkimo konteineriais, operatoriaus pastatu - 1H1p , unikalus Nr.4400-1819-7403, buitinis administracinis pastatas -2H1p, unikalus Nr.4400-1819-7436, sandėlis – 3H1p, unikalus Nr.4400-1819-7458, sandėlis – 4H1p, unikalus Nr.4400-1819-7469-, kiemo statiniai, (aikštelės su bordiūrais b1, b2, aikštelės b3, b4, b5, b6,, kiemo aikštelės su bordiūrais b7, b8, b9, tvoros t1, t2 t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, priešgaisriniai rezervuarai R-1, R-2, R3), unikalus Nr.4400-1819-7503, išorės inžineriniai (vandentiekio tinklai, vamzdynas – V, šachtinis šulinys – 213), unikalus Nr.4400-1 863-3094, (nuotekų šalinimo tinklai, vamzdynas – KF,KF, šuliniai 4.1, 4.1), unikalus Nr. 4400-1863-3068, adresas: Jonaiaukio k. Ruklos s.,Jonavos r.,
(statinio pavadinimas pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, unikalus Nr. ir adresas)

pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S Nr. SNT-25-Ž/09

Jonava 2009 m. 04 mėn. 29 d.
(vietovė)

Komisija, paskirta Kauno apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.537

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties komisija:

Henrikas Laudzbergas – apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus Jonavos rajono vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas),

Vaidas Zakarauskas - Jonavos r. savivaldybės administracijos vyr. architekto skyriaus vedėjas;

Eugenijus Zaburauskas - Kauno apskrities Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos VPPP viršininkas

Leonas Martinaitis - Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vedėjas

Algirdas Jakubauskas - Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno skyriaus viršininkas

Kęstutis Celiešius - Kauno RAAD Jonavos rajono agentūros vedėjas

Ina Kazakevičienė - Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus vedėja l.e.p.

Kęstutis Balčiūnas - VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius - statinio naudotojas
Gintaras Motiejaitis - VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas
Gintas Jasiulionis – Ruklos seniūnijos seniūnas.
Virgilijus Vitkauskas – UAB„Jonavos paslaugos" direktorius pavaduotojas
(v. pavardė) (pareigos)
Valdemaras Čekatauskas - UAB "Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas
(v. pavardė) (pareigos)
dalyvaujant rangovui Antanui Sindikui – UAB„Rasainių melioracija" direktorius
dalyvaujant subrangovui Artūrui Gumauskui – UAB,Jonavos hidrotechnika" direktorius
techniniam prižiūrėtojui Jonui Dričiui, atest. Nr 1659. galioja iki 2013-01-18
(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)
Rasa Ilonienė – Jonavos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė(ekologė)
vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą pastatytą , kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr.1395-05, kurį 2008m. parengė UAB "Krašto projektai ir partneriai", atestato Nr.1085, iki 2009-03-19.
2. Leidimas statyti išduotas 2008-07-10d Nr. 38-157(08),iki 2018-07-10d.

K R A
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

104

2.

2

3. Statytojas – VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras į/k 300092998, Statybininkų g.3-19 , Kaunas.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko: AB„Raseinių melioracija" į/k.172203882, adr.Žemaičių g 30.Ariogala. Raseinių r.. UAB„Jonavos hidrotechnika" į/k.256659230, adr.Darbininkų g 17. Jonava. atlikta:

1. Statyba pradėta 2008m.
2. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Bendrieji rodikliai				
Bendras plotas		m^2	57,74	52,93
Statybinis tūris		m^3	182,0	163,0
Aukštų skaičius		vnt.	-	-
Faktišku statybos kaina		tūkst. Lt	-	1216,50
Iš jos statybos ir montavimo darbų				
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:		$W/m^2 K$	-	-
sienų		"	-	-
langų				
dangimio				
2. Gyvenamojo namo:		-	-	-
gyvenamasis plotas		m^2	-	-
naudingas plotas		m^2	-	-
negyvenamųjų patalpų (pardavimo tvės ar pan.) plotas		m^2	-	-
butų skaičius, iš jų:		vnt.		
1 kambario		"		
2 kambarių		"		
3 kambarių		"		
4 kambarių		"		
5 kambarių		"		
6 kambarių		"		
7 kambarių		"		
8 ir daugiau kambarių		"		
3. Visuomeninio objekto:				
pagrindinis plotas		m^2	-	-
vietų skaičius		vnt.	-	-
paslaugų apimtis				
Kiti svarbūs rodikliai:				
4. Gamybos, transporto, ryšių ir kitų statinių:				
pagrindinis plotas				
produkcijos kiekis, pralaidumas		m^2	-	-
kiti svarbūs rodikliai:				
priešgaisriniai rezervuarai(R1,R2,)		m^2		2x50
aikštelės,		m^2		3668,00
tvoros		m		516,07

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 7 d.

105

3

3

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika
Pastato pamatai – betono. Sienos – metalas su karkasu. Perdanga - metalas. Stogas – šlaitinis, metalas.

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai , inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto priede.-

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinės sistemos (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto priede -

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto priede.-

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

1. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad Įrengtos atliekų priėmimo aikštelės su atliekų surinkimo konteineriais, operatoriaus pastatu - 1H1p , unikalus Nr 4400-1819-7403, buitinis administracinis pastatas -2H1p, unikalus Nr.4400-1819-7436, sandėlis – 3H1p, unikalus Nr.4400-1819-7458, sandėlis – 4H1p, unikalus Nr.4400-1819-7469-, kiemo statiniai, (aikštelės su bordiūrais b1, b2, aikštelės b3, b4, b5, b6., kiemo aikštelės su bordiūrais b7, b8, b9, tvoros t1, t2 t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, priešgaisriniai rezervuarai R-1, R-2, R3), unikalus Nr.4400-1819-7503, išorės inžineriniais (vandentiekio tinklai, vamzdynas – V, šachtinis šulinys – 213), unikalus Nr.4400-1 863-3094, (nuotekų šalinimo tinklai, vamzdynas – KF,KF, šulinial 4.1, 4.1), unikalus Nr. 4400-1863-3068, adresu: Jonalaukio k. Ruklos s. Jonavos r..

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 1 tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, - l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, l.
1. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,

Komisijos pirmininkas (parašas) H.Landzbergas

TIKRA
Atdova Oapiejienė
2011 -06- 23

106

Komisijos nariai:

Vyriausioji architekto skyriaus vedėja — V.Zakarauskas (parašas)

K.Balčiūnas (parašas)

V.Čekatauskas (parašas)

E.Zabarauskas (parašas)

A. Jakubauskas (parašas)

I.Kazakevičienė (parašas)

L.Martinaitis (parašas)

K. Celiešius (parašas)

G.Motiejaitis

G.Jasiulionis

V.Vitkauskas

A..Siudikas

A.Gumauskas

Rangovas (parašas)

Vyr.specialistė(raj. savivaldybės ekologė) R.Ilonienė

Techninis prižiūrėtojas (parašas) J.Dižys

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė (pareigos) (parašas) G.Motiejaitis (v.pavardė)

Perdavė (pareigos) (parašas) J.Dižys (v.pavardė)

(data)

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

107

Priedas 2.2.12

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

20 11 m. Rugsėjo 9 d. Nr. (1.53.39) AV1-29

Kaunas
Vieta

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros poskyrio vedėjos Dalios Trilikienės, pavaduojančios skyriaus vedėją 2010-12-29 potvarkiu Nr. P5-9995

2. **Komisijos sudėtis:**

Komisijos pirmininkas Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas Vaida Tvaska *(v. pavardė, pareigos)* — Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas

Komisijos nariai:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistinės plėtros skyriaus vedėja Dainius Valatkevičius *(v. pavardė, pareigos)* — Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistinės plėtros skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas atstovas

Vyriausioji specialistė Jovita Šarkinienė *(v. pavardė, pareigos)* — Kauno regiono visuomenės sveikatos centro atstovas

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA Vyriausiasis darbo inspektorius Alvydas Rudokas *(v. pavardė, pareigos)* — Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus atstovas

Kauno apskr. PGV valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio vyriausiasis inspektorius Mindaugas Belickas *(v. pavardė, pareigos)* — Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus atstovas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūros atstovas Eugenijus VAINAUSKIUS *(v. pavardė, pareigos)*

Gamybos direktorius Vladas Marijonas Danglala *(v. pavardė, pareigos)* — UAB „Kauno vandenys" atstovas

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23

108

3. Statybos adresas Raudondvario pl. 155A, Kaunas
4. Statytojas: VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras", im. k. 300097998
juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė

5. Komisija atlikė šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
5.1. nuoteka tinklų, un. Nr. 4400-2121-4213, nevertinamas statinys, nauja statyba
statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*
5.2 įleitavo nuoteku tinklų, un. Nr. 4400-2121-4224, nevertinamas statinys, nauja statyba
5.3 vandentiekio tinklų, un. Nr. 4400-2121-4202, nevertinamas statinys, nauja statyba
5.4 atliekų priėmimo aikštelės, un. Nr. 4400-2122-3194, nevertinamas statinys, nauja statyba
* jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
6.1. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. 41267, Nr. 42300 (3 vnt.)
dokumento pavadinimas, Nr.
6.2. Kontrolinės – geodezinės nuotraukos
6.3 UAB „Krašto projektai ir partneriai" 2010 m. parengtas techninis projektas
6.4. Kauno m. savivaldybės administracijos 2010-09-24 išduotas statybos leidimas Nr. LNS-21-100924-000996
6.5 Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos
6.6 Statybos darbų žurnalas

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:
7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių yra nesantiniai.
8. **Komisija nusprendė:**

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė:
9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras", direktoriaus pavaduotojas Gintaras Motiejaitis
9.2. statinio projekto vadovas Jurgis Kildišius at. Nr. 4459
9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
9.4. statinio statybos vadovas Arvydas Žukis, at. Nr. B291
9.5 statinio specialiųjų darbų vadovai:
9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas Juozas Drižys, at. Nr. 1659
10. Naujai pastatyti ar rekonstruoti statiniai, nurodyti šio akto 5.1 – 5.4 punktuose, Nekilnojamojo turto registre gali būti registruojami tik kaip žemės sklypo 4400-2062-9638
unik. Nr.
ar statinio ——————, įregistruoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, priklausiniai.
unikalus Nr.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čerškienė
2011 -09- 23

109

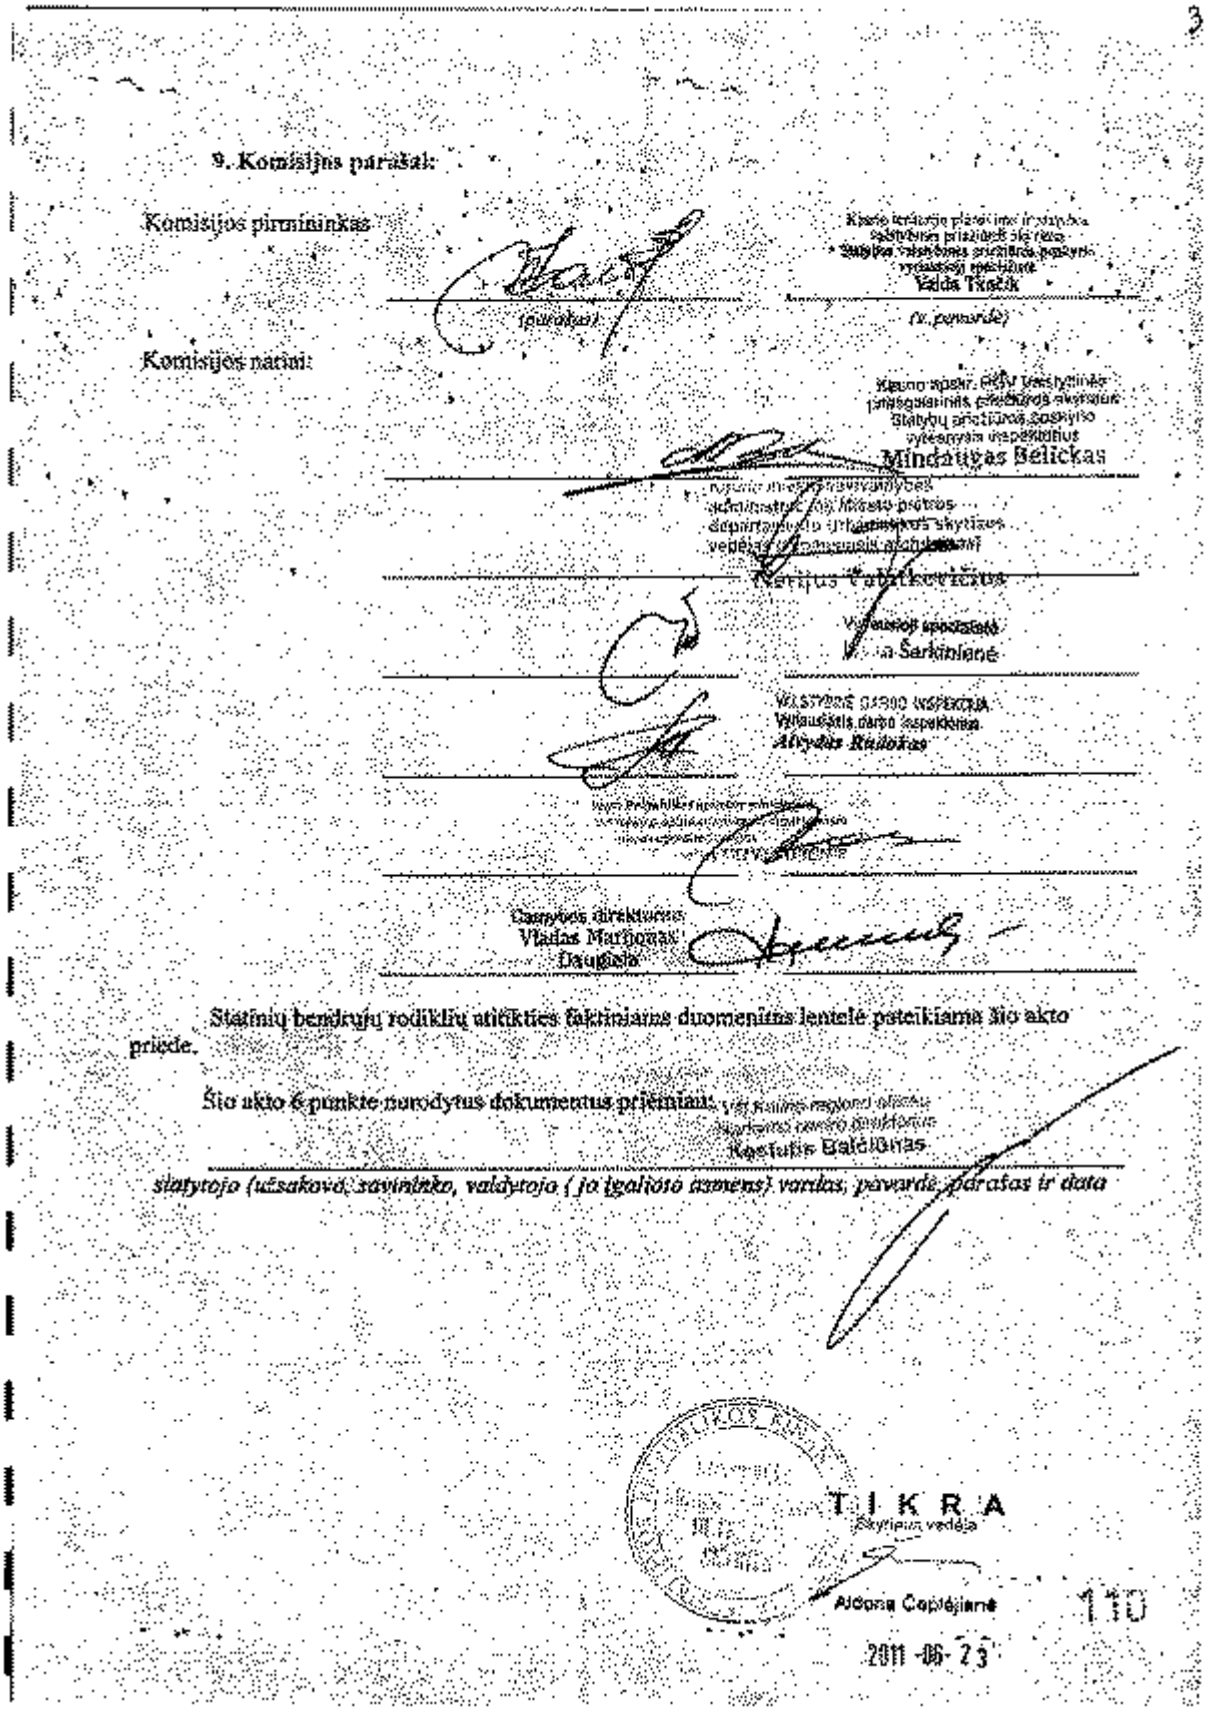

3

9. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Vaida Tiažik

(v. pavardė)

Komisijos nariai:

Mindaugas Belickas

Vilius Šarkinienė

Vladas Marijonas Daugėla

Statinių bendrųjų rodiklių atitikties faktiniams duomenims lentelė pateikiama šio akto priede.

Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus priėmiau:

Kęstutis Galdikas

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data

TIKRA

Aldona Cepėjienė

2011 -06- 23

110

Statybos užbaigimo aktu Nr. (15.24) NR-89 priedas

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1	Nuoteku tinklai			
	ilgis	m	250	250,66
	skersmuo	mm	200	200
	medžiaga		PVC	PVC
5.2	Lietaus nuoteku tinklai			
	ilgis	m	270/23/6	271,37/24,72
	skersmuo	mm	250/200/160	250/200
	medžiaga		PVC	PVC
5.3	Vandentiekio tinklai			
	ilgis	m	350/11,5	369,48/12,68
	skersmuo	mm	160/32	160/32
	medžiaga		polietilenas	polietilenas
5.4	Atliekų priėmimo aikštelė			
	Bendras plotas	m2	1160	1127,24
	medžiaga		asfaltbetonis	asfaltas

Pastaba. Pildant naujai pastatyto gyvenamojo namo rodiklių lentelę, papildomai nurodyti sienų medžiagą (plytų mūras; stambiaplokštės; blokai; monolitinis akmens betonas; metalo konstrukcijų sistema; medienos (rąstai); su medinių karkasu; mediniai skydai; stiklo, plastiko konstrukcijos, plastiko konstrukcijos; kitos sieninės medžiagos).

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo _____
vardas ir pavardė, parašas, data

Komisijos pirmininkas _____
vardas ir pavardė, parašas, data

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Cepkijienė
2011-06-23

Puiton 2.2.13

1

Kauno miesto atliekų tvarkymo objektų pavadinimas, adresas ir unikalus numeris (pavyzdžiui, Kauno rajono atliekų tvarkymo centras (unikalus Nr. 4400-2007-1335 Vilnių kn., Domšių sen., unikalus Nr.4400-1997-7547 Skirsnėlės km. Babtų sen., unikalus Nr. 4400-2007-1336 Neravainiškių km. Babtų sen., unikalus Nr. 4400-1995-1901 Paskutiškės km. Ubiškės sen., unikalų Nr. 4400-1994-1911 Kulėšių km. Šilų sen., unikalus Nr. 4400-1995-1221 Palonės km. Šilų sen., unikalus Nr. 4400-1997-76 Kulaudžių km. Čekonių unikalus Nr. 4400-1994-1899 Čekonių km. Kulnos sen., unikalus Nr. 4400-1994-1988 Akių km. Želvelių sen.

(pavadinimas, pagrindinė žinomų nuosavybės perleidėjų, valdytojų ir. t. adresai)

sąvartynų priskirtinumo užduotyčiai

AKTAS Nr. PIV-20-1005/13-00173

Kaunas 2013 m. gegužės 30 d.
(vieta)

Komisija, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 1-3-459 (Pavadinimas, pavadinimo, datos ir Nr.)

Dalyvavo:

Henrikas Lanickbergus – Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas)

Valdas Zakarauskas – Kauno r. savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;
Kęstutis Celiešius – Kauno RAAD regiono atliekų tvarkytojas vadybininkas;
Eva Narvaišaitė – Kauno visuomenės sveikatos centro Kauno skyriaus vedėja (-s.p.);
Kasa Banienė – Kauno rajono savivaldybės administracijos vyr.specialistė (atstovė);
Alpiras Pajaujis – Babtų seniūnijos seniūnas;
Kazys Damulevičius – Ringų seniūnijos seniūnas;
Dangutė Kampytienė – Lap. Ubiškės seniūnijos seniūnė;
Irena Kunkulienė – Šilų seniūnijos seniūnė;
Faustas Pilipavičius – Želvos seniūnijos seniūnas;
Jurgita Plukys – Kulnos seniūnijos seniūnė;

Kęstutis Balčiūnas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius- vadovo pavaduotojas;
Gintaras Mockaitis – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius-projektų vadovas;
Valdemaras Čepaitauskas – UAB"Dirbtinio poveikio ir saugumo" projektų vadovas
dalyvaujant rangovui Gintarui Vilkyčiui – UAB"Ugiva" laidojimo direktorius,
dalyvaujant subrangovams:
Artūrui Gumauskui – UAB"Zonelita hidrotechnika" direktorius,
Gediminui Baltrušaičiui – UAB"Kauno keliai" projektų vadovas,
Dalyvavo pritarkintos – Jonui Dirbiui, gimusiam 1959 gaikio 01 2013-01-16
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių priskirtinumo Lietuvos Respublikos sąvartynų, kurie nėra nelaikomi kuriais vertinga arba pasiruošti nelaikomosios kuriems vertėjai teritorijų, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir nustatė:

1. Statybos rūšis pagal projektą Nr. 139-S, kurį parengė UAB"Zonelita projektai ir paslaugos" atestato nr. 1895, galioja iki 2009-02-17
(projektavimo įmonės pavadinimas)

2. Leidimas statyti išduotas 2008 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 34-196-(38)

3. Statybos pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Inovacijų kelias 7(6002298 Kauno r. Šlienavos k.) 3,15

KOREKTŪRA
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

112

2

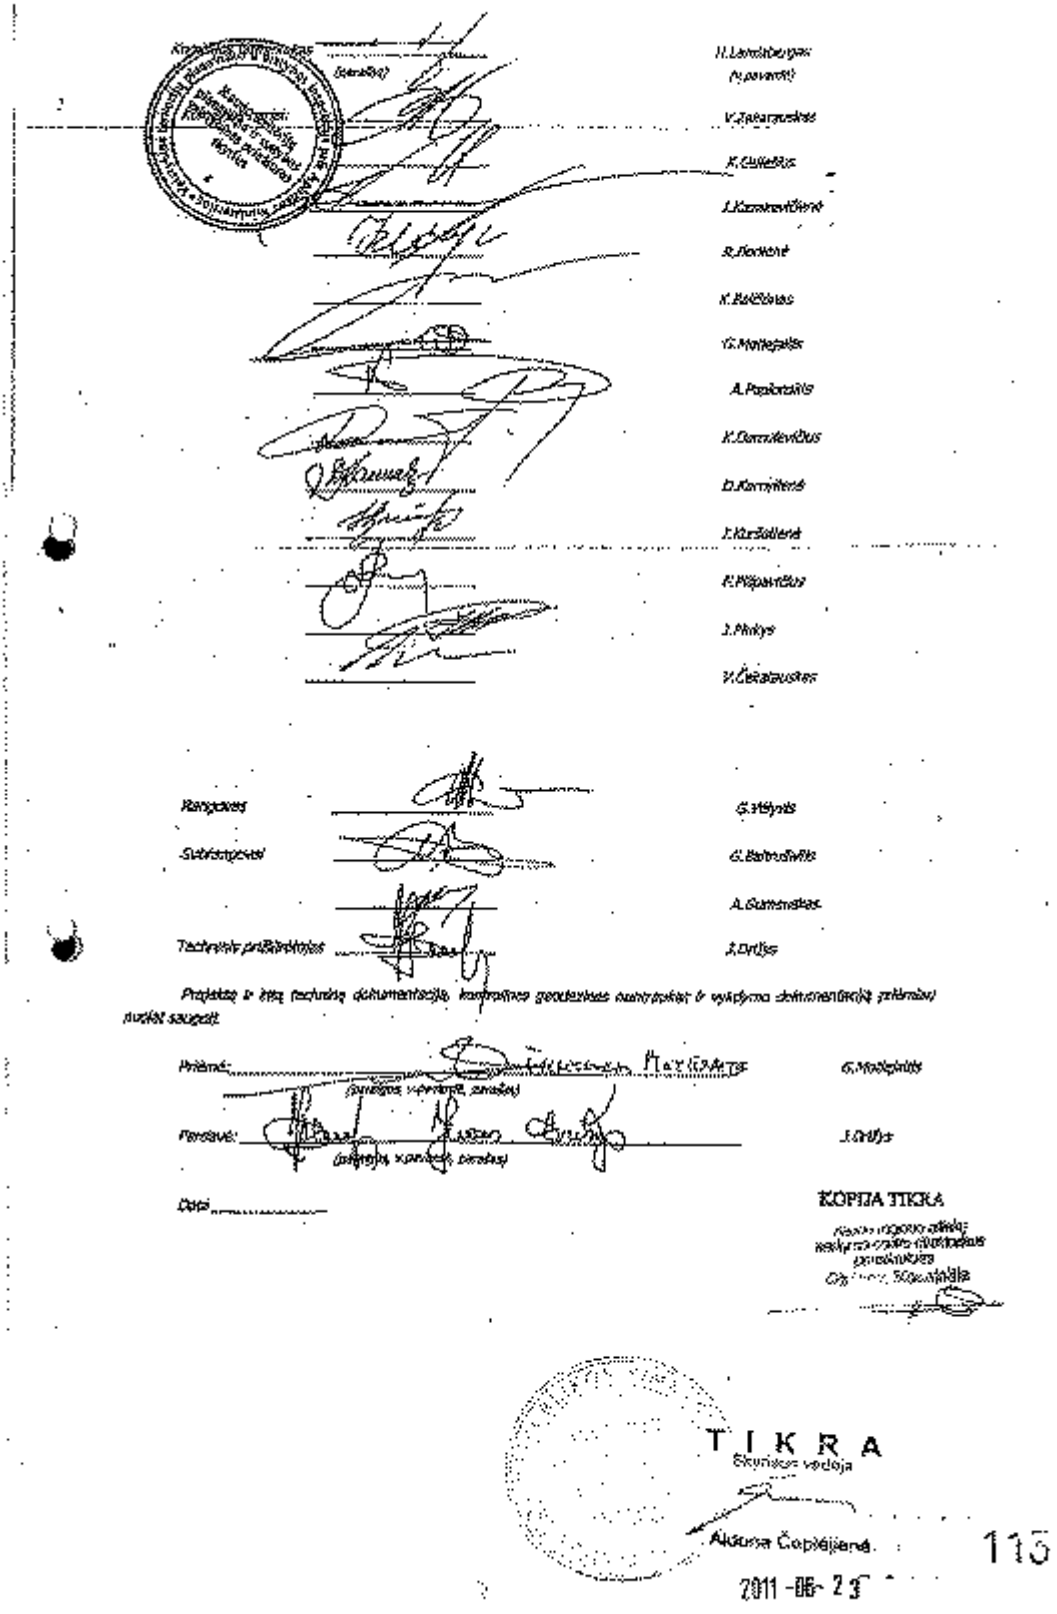

Rangovas ..... G.Mišytė

Subrangovai ..... G.Baltrušaitis

A.Gumauskas

Techninis prižiūrėtojas ..... J.Ortlis

Projektą ir šią techninę dokumentaciją, kontraktinę geodezinius matmenis ir vykdymo dokumentiškai įrašinėju duotą saugoti.

Priėmė: ..... G.Mišytė
(pareigos, vardas, pavardė)

Perdavė: ..... J.Ortlis
(pareigos, vardas, pavardė)

Data .....

KOPIJA TIKRA

TIKRA
Ekspertės vardas

Aldona Čepėlienė

2011-06-23

115

Priedas 2.2.14

1.

Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Jonalaukio sąvartyno uždarymas Jonavos rajone: Jonalaukio k., Rukios sen., unikalus Nr.4400-1982-6692
(pavadinimas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, unikalus Nr. ir adresas)

Sąvartyno pripažinimo uždarytu
AKTAS Nr. PIN-20-100619-00424

Jonava (vietovė) 2010m. birželio mėn. 19 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010m. vasario 11d. potvarkiu Nr. P-3-374
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

Šios sudėties:

Henrikas Landzbergas	- Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas);
Vaidas Zakarauskas	- Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktorius;
Kęstutis Celiešius	- Kauno RAAD Jonavos rajono agentūros vedėjas;
Ina Kazakevičienė	- Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus vedėja l.e.p.;
Rasa Bonienė	- Jonavos rajono savivaldybės administracijos vyr.specialistė (ekologė);
Gintaras Motiejaitis	- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas;
Gintas Jasiulionis	Rukios seniūnijos seniūnas;
Valdemaras Čekatauskas	- UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas;
dalyvaujant rangovui **Gintarui Vėlyviui**	– UAB „Luidas" techninės direktorius;
dalyvaujant subrangovui:	
Arūnui Gumauskui	- UAB „Jonavos hidrotechnika" direktorius;
Techniniam prižiūrėtojui	
Gediminui Meldaikiui	- atestato Nr.24586, galioja iki 2014-06-12 (v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto priežiūros vykdymo vadovui	
Genei Umbrasaitei	- atestato Nr.10516 (v. pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

Vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą uždarytą sąvartyną, kuris nėra nekilnojamo kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patvirtino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr.139-S, kurį parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai" atestato Nr.1085, galioja iki 2009-03-19 (projektavimo įmonės pavadinimas)
2. Leidimas statyti išduotas 2008m. liepos mėn.14d. Nr.3A-116 (69)
3. Statytojo pavadinimas ir adresas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 300092998, Kaunas, Statybininkų g. 3-19.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „Luidas" atest. Nr.1141, išduotas 2004-04-09
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
5. Statyba pradėta 2009m.
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis pagal projektą	Kiekis faktiškai
1	2	3	4

114

I. Bendrieji rodikliai:			
1. Uždengto kaupo viršaus plotas	m2	22379	22464
2. Dujų drenažo d110 perforuotas PVC	m	60,0	60,2
3. G/b šulinys d1,0m	vnt	1	1
4. G/b latakai 0,4x0,15	m	55	58,8
Kaupas „B“			
5. Uždengto kaupo viršaus plotas	m2	13380	13389
6. Dujų drenažo d110 perforuotas PVC	m	100,0	101,1
7. G/b šulinys d1,0m	vnt	1	1
Kaupas „C“			
8. Uždengto kaupo viršaus plotas	m2	43191	43844
9. Dujų drenažo d110 perforuotas PVC	m	80,0	80,0
10. G/b šulinys d1,0m	vnt	1	1
11. G/b latakai 0,4x0,15	m	55,0	66,2
12.Kelias (esamo rekonstravimas)	m2	1344	1348
13. Aikštelė	m2	90,0	133,4
14. G/b laiptai	m2	1,60	1,60
15. Monitoringo gręžiniai	vnt	4	4

	Mato vnt.	Kadastrinė	Faktiškai
Statybos darbų kaina	tūkst. lt.	2174,0	2771,3

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardinti šio akto 2 priede.
8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos yra pateiktos šio akto 4 priede.
9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
----------	----------	----------	----------

Komisija pripažįsta, kad **Jonalaukio savartynas Jonalaukio k., Rukloa sen., unikalus Nr.4400-1982-6692**
(Statinio pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir uždaromas.

11. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:
1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 5 tomų (lapų).
2. Statinių ir jų priklausinių, pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas, 1.

Komisijos pirmininkas (parašas) H. Landzbergas
(v. pavardė)
Komisijos nariai: V. Zakarauskas
K. Celiešius
I. Kazakevičienė

Laikinai vykdantį Skyriaus vedėjos funkcijas Jūra Kazakevičienė

TIKRA Skyriaus vedėja Aldona Čeplėjienė
2011-06-23
115

3

R. Ilonienė

G. Motiejaitis

G. Jasiulionis

V. Čekanauskas

Rangovas G. Vėlyvis

Subrangovai A. Gurnauskas

Techninis prižiūrėtojas G. Meldaikis

Projekto vykdymo priežiūros vadovė G. Umbrasaitė

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

Priėmė: G. Motiejaitis

Perdavė: G. Meldaikis

Data: 2010.06.19

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-09-23

116

Priedas 2.2.15

1

Mažų sąvartynų Kaišiadorių r. - kitos paskirties statinių - uždarymas:
Antakalnio (unikalus Nr. 4400-2007-3920), esančio Antakalnio k., Rumšiškių sen.,
Kruonio (unikalus Nr. 4400-2007-3916), esančio Kruonio II k., Kruonio sen.,
Graužų (unikalus Nr. 4400-2007-3885), esančio Graužų k., Žiežmarių apyl. sen.,
Klėriškių (unikalus Nr. 4400-2007-3852), esančio Klėriškių k., Nemaitonių sen.,
Morkūnų (unikalus Nr. 4400-2007-3909), esančio Morkūnų k., Kruonio sen.,
Pakalniškių (unikalus Nr. 4400-2007-3874), esančio Pakalniškių k., Paparčių sen.,
Žvintos (unikalus Nr. 4400-2007-3863),esančio Žvintos k., Palomenės sen,
Kaišiadorių r. sav.

Pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Nr. PTN-20-100486-00054
2010-04-06
Kaišiadorys

Komisija, paskirta	Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010-03-30 potvarkiu Nr. P3-1319
šios sudėties:	
Vytautas Košuba	- Komisijos pirmininkas, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas
Kristina Baniūnienė	- Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėja
Eugenijus Šulskis	- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių agentūros vedėjas
Rimantas Želvys	- Kaišiadorių r. sav. administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Antanas Jurgaitis	- Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Vidmantas Malinauskas	- Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (ekologas)
Kęstutis Balčiūnas	- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
Gintaras Motiejaitis	- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas
Valdemaras Čekatauskas	UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas
dalyvaujant:	
Rangovo atstovams:	Gintarui Vėlyviui, UAB "Luidas" techninės direktoriui, kv. a. Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23 Paului Mamaičiui, UAB „Luidas" darbų vadovui, kv. a. Nr.22493, galioja iki 2010-12-11
techniniam prižiūrėtojui:	Juozui Orlžiui, kv. a. Nr. 1659, galioja iki 2013-01-18
Pr. vykdymo. priež. vadovui	Genei Umbrasaitei, kv. a. Nr. 10516, galioja iki 2011-05-24

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

1.3.4
117

vadovaujamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių priėmimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktus uždarytus mažus sąvartynus: *Antakalnio* (unikalus Nr. 4400-2007-3920), esančio Antakalnio k., Rumšiškių sen., *Kruonio* (unikalus Nr. 4400-2007-3916), esančio Kruonio II k., Kruonio sen., *Graužų* (unikalus Nr. 4400-2007-3885), esančio Graužų k., Žiežmarių apyl. sen.,. *Klėriškių* (unikalus Nr. 4400-2007-3852), esančio Klėriškių k., Nemaitonių sen., *Morkūnų* (unikalus Nr. 4400-2007-3909), esančio Morkūnų k., Kruonio sen., *Pakalniškių* (unikalus Nr. 4400-2007-3874), esančio Pakalniškių k., Paparčių sen., *Živintos* (unikalus Nr. 4400-2007-3863),esančio Živintos k., Palomenės sen., , Kaišiadorių r. sav.,

patikrino statytojo pateiktą dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektus Nr. 139-S-17; 19; 20; 21; 23, 24; 27, kuriuos 2007 m. parengė UAB "Krašto projektai ir partneriai" , kv. a. Nr. 1085, galioja iki 2014-02-27, Projekto vadovas – Valdemaras Čekatauskas, kv. a. Nr. 1678, galioja iki 2013-02-08

2. Statybos leidimas išduotas 2008-09-12 Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Nr. 141-ST1

3. Statytojas KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, į.k. 300092998, Kauno m. sav., Kaunas, Statybininkų g. 3-19

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB "LUIDAS", kv. a. Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13

5. Statyba pradėta 2008-12-02

6. Statybos objektų pagrindiniai rodikliai:

Inžinerinio statinio pagrindiniai rodikliai:

Antakalnio sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3920) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/591912)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	12164,81
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	12169
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	12169
Kruonio sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3916) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/579715)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	4049,66
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	4497
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	7067
Graužų sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3885) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/579808)		
Atliekų kaupo paviršius (S1 ir S2)	m^2	1920
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	2102
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	2102
Klėriškių sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3852) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/746870)		
Atliekų kaupo paviršius (S1 ir S2)	m^2	1152,99
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	1152,99

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23
2 iš 4
118

Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	1152,99
Morkūnų sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3909) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/579798)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	911,58
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	1902
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	1902
Pakalniškių sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3874) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/588663)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	4999,53
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	5219
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	5219
Živintos sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3863) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/587996)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	1969,85
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	2304,02
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	2304,00

5. Faktinė statybos kaina	tūkst. Lt	700,232	

Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kurjuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti: iki 2010 m. rugpjūčio 1d. ŽIVINTOS SĄVARTYNO PLANUOJAMŲ NUOSEKLAUS DARBŲ DARBŲ

6.5.1. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

6.5.2. Projekto numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

6.5.3. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad uždarytį sąvartynai:

Antakalnio (unikalus Nr. 4400-2007-3920), esantis Antakalnio k., Rumšiškių sen., *Kruonio* (unikalus Nr. 4400-2007-3916), esantis Kruonio II k., Kruonio sen., *Graužų* (unikalus Nr. 4400-2007-3885), esantis Graužų k., Žiežmarių apyl. sen., *Klėriškių* (unikalus Nr. 4400-2007-3852), esantis Klėriškių k., Nemaitonių sen., *Morkūnų* (unikalus Nr. 4400-2007-3909), esantis Morkūnų k., Kruonio sen., *Pakalniškių* (unikalus Nr. 4400-2007-3874), esantis Pakalniškių k., Paparčių sen., *Živintos* (unikalus Nr. 4400-2007-3863),esantis Živintos k., Pakuonės sen., Kaišiadorių r. sav. - kitos paskirties statiniai

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Aldona Čepliejienė

3 lš 4

2011-06-21 119

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija,____ tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,____ l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,____ l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,____ l.

Komisijos pirmininkas — Vytautas Košuba
(parašas) (v., pavardė)

Komisijos nariai:

Kristina Baniūnienė
Eugenijus Šulskis
Rimantas Žeivys
Antanas Jurgaitis
Vidmantas Malinauskas
Kęstutis Balčiūnas
Gintaras Motiejaitis
Valdemaras Čekatauskas

Dalyviai:

Techninis prižiūrėtojas — Juozas Dričys
Projekto vykd.priež. vadovas — Genė Umbrasaitė
Rangovas — Gintaras Vėlyvis
Rangovo darbų vadovas — Paulius Mamaitis
(parašai) (v., pavardė)

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

2011-06-23 120

priedas 2.2.16
1

Tarpumiškio sąvartyno uždarymas (unikalus Nr. 4400-2007-3830), kitos paskirties statinys, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Tarpumiškio k.

Pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Nr. PTN-20-100406-00052
2010-04-06
Kaišiadorys

Komisija, paskirta	Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010-03-30 potvarkiu Nr. P3-1319
šios sudėties:	
Vytautas Košuba	- Komisijos pirmininkas, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas
Kristina Banišinienė	- Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėja
Eugenijus Šulskis	- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių agentūros vedėjas
Rimantas Želvys	- Kaišiadorių r. sav. administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Antanas Jurgaitis	- Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Vidmantas Malinauskas	- Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (ekologas)
Kęstutis Balčiūnas	- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
Gintaras Motiejaitis	- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas
Valdemaras Čekatauskas	UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas
dalyvaujant:	
Rangovo atstovams:	Gintarui Vėlyviui, UAB "Luidas" technikos direktoriui, kv. a. Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23
	Paului Mameičiui, UAB „Luidas" darbų vadovui, kv. a. Nr.22493, galioja iki 2010-12-11
techniniam prižiūrėtojui:	Juozui Drižiui, kv. a. Nr. 1659, galioja iki 2013-01-18
Projekto vykdymo priežiūros vadovui	Genei Umbrasaitei, kv. a. Nr. 10516, galioja iki 2011-05-24

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėnienė
2011-06-23

121

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" atžiūrėjo statytojo pateiktą uždarytą Tarpumiškio sąvartyną (unikalus Nr. 4400-2007-3830), esantį Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Tarpumiškio k.

patikrino statytojo pateiktą dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr. 139-S-26, kurį 2007 m. parengė

UAB "Krašto projektai ir partneriai" , kv. a. Nr. 1085, galioja iki 2014-02-27, Projekto vadovas - Valdemaras Čekanauskas, kv. a. Nr. 1678, galioja iki 2013-02-08

2. Statybos leidimas išduotas 2008-09-12 Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Nr. 141-ST1

3. Statytojas KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, į.k. 300092998, Kauno m. sav., Kaunas, Statybininkų g. 3-19

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB "LUIDAS", kv. a. Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13

5. Statyba pradėta 2008-12-02

6. Statybos objektų pagrindiniai rodikliai:

Inžinerinio statinio pagrindiniai rodikliai:

Statinio pavadinimas:	**atliekų kaupas S1; grunto uždengtas paviršius S2**	
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai	
Statinio kategorija:	Ypatingas	
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba	
Unikalus statinio numeris:	4400-2007-3830	
Registro numeris:	44/594560	
Atliekų kaupo paviršiaus S1 plotas	m^2	16165,53
Grunto uždengto paviršiaus S2 plotas	m^2	3544,58
Papildomai grunto uždengtas paviršius	m^2	16171
Rekultivuota teritorija	m^2	12580

5. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt	736,24	

Pagalbiniai statiniai, jų dydžiai:

monitoringo gręžinys O1 (unikalus Nr. 4400-2010-2510), 18 m gylio;

monitoringo gręžinys O2 (unikalus Nr. 4400-2010-2521), 20 m gylio;

dujų drenažo vamzdynas (unikalus Nr. 4400-2007-3841), 315, 72 m ilgio

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Gaplejienė

Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika:

Sąvartynas uždengtas 0,3 m molingu gruntu, 0,2 m mišrių gruntų ir 0,1 m gruntu praturtintu dirvožemiu

2011-06-23

Dujų drenažo vamzdynas įrengtas iš 92 mm skersmens plastiko vamzdžių

284

122

3

Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti iki 2010 m. rugpjūčio 10 d.

6.5.1. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

6.5.2. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

6.5.3. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nukrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6.5.4. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrenginys, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažinios tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

Komisija pripažįsta, kad

Uždarytas Tarpumiškio sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3830) monitoringo gręžinys O1 (unikalus Nr. 4400-2010-2520), monitoringo gręžinys O2 (unikalus Nr. 4400-2010-2521), dujų drenažo vamzdynas (unikalus Nr. 4400-2007-3841), esantys Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Tarpumiškio k.

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, ____ tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, ____ l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, ____ l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, ____ l.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, ____ l.
6. Pastato garso klasifikavimo protokolas, ____ l.
7. Pastato energinio naudingumo sertifikatas, ____ l.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aktoria Čepėjienė

Komisijos pirmininkas — Vytautas Košuba — 2011-06-23
(parašas) (v., pavardė)

Komisijos nariai:

3154

123

Kristina Beniūnienė
Eugenijus Šulskis
Rimantas Želvys
Antanas Jurgaitis
Vidmantas Malinauskas
Kęstutis Balčiūnas
Gintaras Motiejaitis
Valdemaras Čekatauskas

Dalyviai:

Techninis prižiūrėtojas — Juozas Drižys
Projekto vykd.priež. vadovas — Genė Umbrasaitė
Rangovas — Gintaras Vėlyvis
Rangovo darbų vadovas — Paulius Mamaitis

(parašas) (v.,pavardė)

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

TIKRA
Skyriaus vedėjas
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

124

Priedas 2.2.17

1.

Rumšiškių sąvartyno uždarymas (unikalus Nr. 4400-2012-7600), kitos paskirties statinys, Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonyse

Pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Nr. PTN-20-160406-00051
2010-04-06
Kaišiadorys

Komisija, paskirta	Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010-03-30 potvarkiu Nr. P3-1319
šios sudėties:	
Vytautas Košuba	- Komisijos pirmininkas, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas
Kristina Daniūnienė	- Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėja
Eugenijus Šulskis	- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių agentūros vedėjas
Rimantas Želvys	- Kaišiadorių r. sav. administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Antanas Jurgaitis	- Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Vidmantas Malinauskas	- Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (ekologas)
Kęstutis Balčiūnas	- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
Gintaras Motiejaitis	- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas
Valdemaras Čekatauskas	UAB „Kraito projektai ir partneriai" projekto vadovas
dalyvaujant:	
Rangovo atstovams:	Gintarui Vėlyviui, UAB "Luldas" technikos direktoriui, kv. a. Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23
	Paului Mamaičiui, UAB „Luldas" darbų vadovui, kv. a. Nr.22493, galioja iki 2010-12-11
techniniam prižiūrėtojui:	Juozui Drižiui, kv. a. Nr. 1659, galioja iki 2013-01-18
Projekto vykdymo priežiūros vadovui	Genei Umbrasaitei, kv. a. Nr. 10516, galioja iki 2011-05-24

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą uždarytą Rumšiškių sąvartyną (statinio unikalus Nr. 4400-2012-7600), esantį Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonyse

patikrino statytojo pateiktą dokumentaciją ir nustatė:

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė

1 iš 4

125

2011 -06- 23

2

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktus užbaigtus mažus sąvartynus: *Antakalnio* (unikalus Nr. 4400-2007-3920), esančio Antakalnio k., Ramšiškių sen., *Kruonio* (unikalus Nr. 4400-2007-3916), esančio Kruonio II k., Kruonio sen., *Graužių* (unikalus Nr. 4400-2007-3885), esančio Graužų k., Žiežmarių apyl. sen., *Klėriškių* (unikalus Nr. 4400-2007-3852), esančio Klėriškių k., Nemaitonių sen., *Morkūnų* (unikalus Nr. 4400-2007-3909), esančio Morkūnų k., Kruonio sen., *Pakalniškių* (unikalus Nr. 4400-2007-3874), esančio Pakalniškių k., Paparčių sen., *Živintos* (unikalus Nr. 4400-2007-3863),esančio Živintos k., Palomenės sen., , Kaišiadorių r. sav.,

patikrino statytojo pateiktą dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektus Nr. 139-5-17; 19; 20; 21; 23, 24; 27, kuriuos 2007 m. parengė UAB "Krašto projektai ir partneriai" , kv. a. Nr. 1085, galioja iki 2014-02-27, Projekto vadovas - Valdemaras Čekatauskas, kv. a. Nr. 1678, galioja iki 2013-02-08

2. Statybos leidimas išduotas 2008-09-12 Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Nr. 141-ST1

3. Statytojas KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, į.k. 300092998, Kauno m. sav., Kaunas, Statybininkų g. 3-19

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB "LUIDAS", kv. a. Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13

5. Statyba pradėta 2008-12-02

6. Statybos objektų pagrindiniai rodikliai:

Inžinerinio statinio pagrindiniai rodikliai:

Antakalnio sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3920) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/591912)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	12164,81
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	12169
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	12169
Kruonio sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3916) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/579715)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	4049,66
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	4497
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	7067
Graužių sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3885) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/579808)		
Atliekų kaupo paviršius (S1 ir S2)	m^2	1920
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	2102
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	2102
Klėriškių sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3852) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/746870)		
Atliekų kaupo paviršius (S1 ir S2)	m^2	1152,99
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	1152,99

IŠKRA

Seimas vedėja

2 iš 4

Aldona Čapkajienė

2011 m. [illegible]

126

3

Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	1152,99
Morkaų sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3909) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/579798)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	911,58
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	1902
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	1902
Pakalniškių sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3874) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/588663)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	4999,53
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	5219
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	5219
Živintos sąvartynas (unikalus Nr. 4400-2007-3863) – naujos statybos ypatingos kategorijos kitos paskirties statinys (registro Nr. 44/587996)		
Atliekų kaupo paviršius (S1)	m^2	1969,85
Papildomai gruntu uždengtas paviršius	m^2	2304,02
Užsėta daugiametėmis žolėmis plotas	m^2	2304,00

5. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt	700,232	

Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti: iki 2010 m. rugpjūčio 1d. Živintos sąvartyno plokštės [illegible]

6.5.1. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

6.5.2. Projekte numatytosios darbų saugos, aplinkojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

6.5.3. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad uždaryti sąvartynai:

Antakalnio (unikalus Nr. 4400-2007-3920), esantis Antakalnio k., Rumšiškių sen., *Kruonio* (unikalus Nr. 4400-2007-3916), esantis Kruonio II k., Kruonio sen., *Graužų* (unikalus Nr. 4400-2007-3885), esantis Graužų k., Žiežmarių apyl. sen., *Kleriškių* (unikalus Nr. 4400-2007-3852), esantis Kleriškių k., Nemaitonių sen., *Morkūnų* (unikalus Nr. 4400-2007-3909), esantis Morkūnų k., Kruonio sen., *Pakalniškių* (unikalus Nr. 4400-2007-3874), esantis Pakalniškių k., Paparčių sen., *Živintos* (unikalus Nr. 4400-2007-3863),esantis Živintos k., Palomenės sen, Kaišiadorių r. sav. - kitos paskirties statiniai

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Gepšienė
2011-06-24

3 lt.4

197

Kęstutis Balčiūnas
Gintaras Motiejaitis
Valdemaras Čekatauskas

Dalyviai:

Techninis prižiūrėtojas	Jonzas Drižys
Projekto vykd.priež. vadovas	Genė Umbrasaitė
Rangovas	Gintaras Vėtyvis
Rangovo darbų vadovas	Paulius Mamaitis

(parašas) (vardas, pavardė)

Akto 1 egz. su priedais ir jame išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

TIKRA
Aldona Čepėlienė
2011-06-23
4 iš 4

128

Priedas 2_LT

1

Uždaromasis Gaižėnėlių k. sąvartynas (un. Nr. 4400-1988-7713), Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad Nr. 5250/0001:54 ir uždaromasis Dirvinių sąvartynas (un. Nr. 4400-1987-7093), Šašių k., Babtų sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad Nr. 5203/0003:449

(objekto pavadinimas pagrindinė daiktinė naudojimo paskirtis, adresas, unikalus Nr.)

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI AKTAS

Nr. DTN-20-100421-00132

Kaunas 2010 m. balandžio mėn. 21 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010-04-14 potvarkiu Nr. P3-1693 šios sudėties:

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Sabina Blaliesė

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas (komisijos pirmininkas)

EGIDIJUS KAPTELIUS — Kauno r. savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus atstovas;

GINTARAS MOTEJŪNAITIS — statytojo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" atstovas;

VALDEMARAS ČELKAUSKAS — UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas;

Kauno apskr. PGV Valstybinės priežiūros skyriaus Statybos priežiūros poskyrio inspektorius Žilvinas Bačkus

Kauno m. PGT VPPI statybų priežiūros poskyrio atstovas;

Vyriausioji specialistė Jovita Šarkinienė — Kauno visuomenės sveikatos centro atstovas;

VYTAUTAS RIMAS — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas;

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepaitienė

GITIS ORBELIS — UAB „Giraitės vandenys" atstovas;

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) UAB „Luidas", įmonės kodas 122911551, atestato Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13, buveinės adresas: Karsavių g. 7, Vilnius, Statybos vadovas G. Vėlyvis, atestato Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23

2011 -06- 23

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB „Kauno keliai", įmonės kodas 135640993, atestato 2011, galioja iki 2012-02-23 statybos vadovas G. Baltrušaitis, atestato Nr. 542, galioja iki 2012-10-12

ir techniniam prižiūrėtojui G. Meldaikiui, atestato Nr. 24586, galioja iki 2014-06-12

129

2

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių priėmimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą **uždaromąjį Dirvinių savartyną, Šaltų k., Babtų sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad Nr. 5203/0003:449 ir uždaromąjį Gaižėnėlių k. savartyną, Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad Nr. 5250/0001:54**

(viso statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį **2007 metais parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai", įmonės kodas 124663332, at. Nr. 1985, galioja iki 2009-03-19, projekto vadovas V. Čekanauskas, atestato Nr. 1679, galioja iki 2013-02-08**

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas **VŠĮ „Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro" įmonės kodas 300092998, direktorius J. Yla. Įsakymo Nr. 08-31, 2008-07-11**

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas **2008-10-10** *(data)* Nr. **NR-33, Kauno r. savivaldybės Urbanistikos skyrius** *(numeris, kas išdavė)*

3. Statytojo pavadinimas ir adresas **VŠĮ „Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro" įmonės kodas 300092998, buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Kaunas.**

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas **UAB „Luidas", įmonės kodas 122911551, atestato Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13, Buveinės adresas: Kareivių g. 7, Vilnius. Statybos vadovas G. Vėlyvis, atestato Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23, statybos darbų pėdtiko**

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atliktų darbų rūšis)

subrangovai **UAB „Kauno keliai", įmonės kodas 135640995, atestato 2011, galioja iki 2012-02-23 statybos vadovas G. Baltrušaitis, atestato Nr. 542, galioja iki 2012-10-12, visi statybos darbai**

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta **2008 m. lapkričio 28 d.**

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Dirvinių savartyno bendrieji rodikliai	A			
Kaupas (un. Nr. 4400-1987-7093)		m^2	7523	7523
Plotas		m	1,50	-
Aukštis		m^3	18000	-
Tūris		tūks. Lt	-	-
Faktiška statybos kaina		tūks. Lt	-	49,60
Vidutinė rinkos kaina				
Faktiška statybos kaina				
Gaižėnėlių k. savartyno bendrieji rodikliai	A			
Kaupas (un. Nr. 4400-1988-7713)		m^2	500	500
Plotas		m	3	-
Aukštis		m^3	25200	-
Tūris		tūks. Lt	-	-
Vidutinė rinkos kaina		tūks. Lt	-	
Faktiška statybos kaina				

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplikienė

7. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų

1.50

3

reikalavimus.

8. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Atidedamų darbų nėra			

Komisija pripažįsta, kad Uždaromasis Gaižėnėlių k. savartynas (un. Nr. 4400-1988-7713), Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad Nr. 5250/0001:54 ir uždaromasis Dirvinių savartynas (un. Nr. 4400-1987-7093), Šašių k., Babto sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad Nr. 5263/0003:449

(sutinkio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 3)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Komisijos pirmininkas (parašas) — Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Sabina Blažienė

Nariai — (V. Pavardė)

GINTARAS MOTIEJŪNAS

VALDAS ČEKAVIČIUS

Kauno apskr. VPGI Viešumynės priešgaisrinių priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio inspektorius Žilvinas Bačkus

Vyriausioji specialistė Irena Šarkūnienė

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono aplinkos inspekcijos viršininkas Vytautas RIMAS

Rangovas — UAB „Gintra vandenys" Direktorius Gitis Urbelis

Subrangovas — Aldona Čaplėjienė

GINTARAS KELYNIS

Techninis prižiūrėtojas — 2011 -06- 29 AB „KAUNO ENERGIJA" Projektų vadovas Gediminas Baltrušaitis

GEDIMINAS MELAKIS

151

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė _____ (pareigos) _____ (parašas) _____ (v.pavardė)

Perdavė UAB „KAUNO KELIAI" Projektų vedovas Gediminas Baltrušaitis (pareigos) _____ (parašas) _____ (v.pavardė)

2010-04-21 (data)

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Cepkienė
2011-06-23
132

Priėdas 2.2.13

Digrių savartynų uždarymo, Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., sklypo kad. Nr. 5247/0018:214
(statinio pavadinimas paprastine tiksline naudojimo paskirtis, adresas, unikalus Nr)

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI A K T A S

Nr. PTK-20-10041-00118

Kaunas 2010 m. birželio mėn. 21 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010-04-09 potvarkiu Nr.P3-1492 šios sudėties:

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausioji valstybinės priežiūros poskyrio inspektorė specialistė Julija Kalvinskienė — Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas (komisijos pirmininkas)

EGIDIJUS KAPTELIS — Kauno r. savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus atstovas;

GINTARAS MOTEJŪNAS — statytojo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" atstovas;

VALDEMARAS [illegible] — UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas;

Kauno apskr. PGT VPPI statybų priežiūros poskyrio inspektorius — Kauno m. PGT VPPI statybų priežiūros poskyrio atstovas;
Žilvinas Bačkus

Vyriausioji specialistė Jovita Šarkūnienė — Kauno visuomenės sveikatos centro atstovas;

VYTAUTAS ADMAS — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas;

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) UAB „Lukas", įmonės kodas 122911551, atestato Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13. Buveinės adresas: Kareivių g. 7, Vilnius. Statybos vadovas G. Vėlyvis, atestato Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB „Kauno keliai", įmonės kodas 135640993, atestato 2011, galioja iki 2012-02-23 statybos vadovas G. Baltrušaitis, atestato Nr. 542, galioja iki 2012-10-12

ir techniniam prižiūrėtojui G. Meldaikiui, atestato Nr. 24586, galioja iki 2014-06-12

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą uždaromąjį Digrių savartyno, Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad nr. 5247/0018:214 T I K R A
(viena statinio pavadinimas ir adresas)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

Skyriaus vedėja
Algona Čaplėjienė

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007 metais parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai",

2010 m. 21 birželio

2

įmonės kodas 124663332, at. Nr. 1985, galioja iki 2009-03-19, projekto vadovas V. Čekatauskas, atestato Nr. 1678, galioja iki 2013-02-08
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)
ir patvirtino statytojas VŠĮ „Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro" įmonės kodas 300092998, direktorius J. Yla. Įsakymo Nr. 08-31, 2008-07-11
(įsakymo/pavedimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas 2008-10-10 (data) Nr. NR-31, Kauno r. savivaldybės Urbanistikos skyrius (išdavė, kas išdavė)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas VŠĮ „Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro" įmonės kodas 300092998, buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Kaunas.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Lajdas", įmonės kodas 122911551, atestato Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13, Buveinės adresas: Kargėlių g. 7, Vilnius, Statybos vadovas G. Vėlyvis, atestato Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23, statybos darbų neatliko
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atlikti darbai rūšis)

subrangovai UAB „Kauno keliai", įmonės kodas 135640093, atestato 2011, galioja iki 2012-02-23 statybos vadovas G. Baltrušaitis, atestato Nr. 542, galioja iki 2012-10-12, visi statybos darbai
(įmonių pavadinimai ir atlikti darbai rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Projekto ekspertizę atliko: UAB „Projektų ekspertizė" , atestato Nr. 3636 galioja iki 2014-01-16, Buveinės adresas: A. Vivulskio g. 6, Vilnius, Ekspertizės įvadas data 2008-01-25 Nr. 29R-2007-20

6.Statyba pradėta 2008 m. lapkričio 28 d.

7. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. „A" kaupas (un. Nr. 4400-1987-6763);	plotas	m^2	32 448	32 448
2. k1 Rezervuaras (un. Nr. 4400-1987-7071);	tūris	m^3	50	50
3. k2 Monitoringo gręžinys (un. Nr. 4400-1987-6752);	gylis	m	3	3
4. b1 Aikštelė (un. Nr. 4400-2003-4975)		m^2	358	358
7.Nuotekų šalinimo tinklai (4400-1988-7690) bendras ilgis	ilgis		371,00	377,71
vamzdynas Kl. (Ø 160 mm, gylis-2 m)	ilgis	m		19,4
vamzdynas Kl. (Ø 113/126 mm, gylis-3 m)	ilgis	m		358,31
šulinys 51 (Ø 1500 mm, gylis-3 m)	vnt	m	1	1
šulinys 101 (Ø 1000 mm, gylis-3 m)	vnt	vnt	1	1
Faktiška statybos kaina		vnt.		
Vidutinė rinkos kaina	tūkst. Lt			672,00
	tūkst. Eu			

TIKRA
Skyriaus vedėjo
Aldona Čapeljarė

8. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

124

3

9. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Atidedamų darbų sąrašas			

Komisija pripažįsta, kad **Digrių savartyno uždarymas, Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., sklypo kad. Nr. 5247/0018:214**
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į aktо priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Komisijos pirmininkas (parašas) — Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Jūlita Kairiškštienė (V. Pavardė)

Nariai — Gintaras Motiejaitis; Valdas Grybauskas; Kauno apskr. VGV valdybinės gyvenvietės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio inspektorius Žilvinas Račkus; Vyriausioji specialistė Jovita Šarkūnienė; Vyriausias inspektorius

Rangovas — Gintaras Velyvis

Subrangovas — UAB „Kauno keliai" Projektų vadovas Gediminas Baltrušaitis

Techninis prižiūrėtojas — Gediminas Melaikis

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti: T I K R A

Priėmė (parašas) (vardas) (pareigos) Aldona Cepelienė

Perdavė UAB „Kauno keliai" projektų vadovas Gediminas Baltrušaitis (vardas) (pareigos) 2011 06 23

135

Priedas 2.2.20

Uždaromasis Miškinių k. sąvartynas (un. Nr. 4400-1987-7009), aikštelės kl. (un. Nr. 4400-1987-7017, rezervuaro kl. (un. Nr. 4400-1987-7039) ir listavo naudotų tinklų KL (un. Nr. 4400-1988-7702) Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad. Nr. 4270/0006:196

(statinio pavadinimas pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, adresas, unikalus Nr.)

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI A K T A S

Nr. PTN-20-100421-00131

Kaunas 2010 m. balandžio mėn. 21 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010-04-14 potvarkiu Nr. P3-1604 šios sudėties:

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Sabina Blažienė

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas (komisijos pirmininkas)

EGIDIJUS KATILIUS — Kauno r. savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus atstovas;

GINTARAS MOTIEJAITIS — statytojo VĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" atstovas;

VALDEMARAS ČEKAUSKAS — UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas;

Kauno apskr. PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros ginklyrio inspektorius Žilvinas Bačkus — Kauno m. PGT VPPI statybų priežiūros poskyrio atstovas;

Vyriausioji specialistė Jovita Šarkūnienė — Kauno visuomenės sveikatos centro atstovas;

VYTAUTAS RIMAS — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas;

GITIS UORELIS — UAB „Giraitės vandenys" atstovas;

TIKRA Skyriaus vedėja Aldona Čepėlienė 2011-06-23

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) UAB „Lmidas", įmonės kodas 122911551, atestato Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13, Buveinės adresas: Kareivių g. 7, Vilnius, Statybos vadovas G. Vėtrvis, atestato Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) UAB „Kauno keliai", įmonės kodas 135648993, atestato 2011, galioja iki 2012-02-23 statybos vadovas G. Baltrušaitis, atestato Nr. 542, galioja iki 2012-10-12

ir techninius prižiūrėtojui G. Meldaikiui, atestato Nr. 24586, galioja iki 2014-06-12

136

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą **uždaromąjį Miškinių k. sąvartyną, aikštelę b1, rezervuarą k1 ir lietaus nuotekų tinklus KL Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., žemės skl. kad Nr. 5270/0006:196**

(teisės statinio pavadinimas ir adresatis)

kuris nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį **2007 metais parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai", įmonės kodas 124663332, at. Nr. 1085, galioja iki 2009-03-19, projekto vadovas V. Čekatauskas, atestato Nr. 1678, galioja iki 2012-02-08**

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas **VŠĮ „Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro" įmonės kodas 300092998, direktorius J. Vla. Įsakymo Nr. 08-31, 2008-07-11**

(patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas **2008-10-10** *(data)* Nr. **NR-32, Kauno r. savivaldybės Urbanistikos skyrius** *(numeris, kas išdavė)*

3. Statytojo pavadinimas ir adresas **VŠĮ „Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro" įmonės kodas 300092998, buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Kaunas**

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas **UAB „Laidas", įmonės kodas 122911551, atestato Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13, Buveinės adresas: Karalvių g. 7, Vilnius, Statybos vadovas G. Vėlyvis, atestato Nr. 4505, galioja iki 2013-12-23, statybos darbų nestiko**

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, jo atlikti darbų rūšis)

subrangovai **UAB „Kauno keliai", įmonės kodas 135640993, atestato 2011, galioja iki 2012-02-23 statybos vadovas G. Baltrušaitis, atestato Nr. 542, galioja iki 2012-10-12, visi statybos darbai**

(įmonės pavadinimai ir atlikti darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Statyba pradėta **2008 m. lapkričio 28 d.**

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
I. Statinių bendrieji rodikliai				
1.1. Kaunas A (un. Nr. 4400-1987-7006)	A			
Plotas		m^2	18927	18927
Aukštis		m	7,87	-
Vidutinė rinkos kaina		tūks. Lt		381.000
1.2. Aikštelė b1 (un. Nr. 4400-1987-7017)	b1			
Plotas		m^2	75	75
Medžiaga			žvyras	žvyras
Vidutinė rinkos kaina		tūks. Lt		0,027
1.3. Rezervuaras k1 (un. Nr. 4400-1987-7039)	k1			
Tūris		m^3	30	30
Medžiaga			plastikas	plastikas
Vidutinė rinkos kaina		tūks. Lt		75,000
II. Inžinerinių tinklų bendrieji rodikliai				
Lietaus nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-1988-7702)	KL			
Ilgis	m		53	53,09
Medžiaga			plastikas	plastikas

T I K R A
Aktoriaus Čepėjienė
2011 -06- 7

137

3

7. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

8. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Atidedamų darbų nėra			

Komisija pripažįsta, kad **statomąjį Miškinių k. savartyną, aikštelę bl, rezervuarą kl ir lietaus nuotekų tinklus KL Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.**
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą (Nr. 3))
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Komisijos pirmininkas — (parašas) — Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros padėjėjo vyriausioji specialistė Sabina Blažienė (V. Pavardė)

Nariai — GINTARAS MOTIEJŪNIS

VALDAS ČEKATAUSKAS

Kauno apskr. PGV valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio viršininkas Žilvinas Bačkus

Vyriausioji specialistė Jovita Šarkinienė

Vyriausias inspektorius (vyriausiasis specialistas) Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (Kauno regiono aplinkos apsaugos inspekcija) Vytautas Rimas

UAB „Statilo vadovas" Direktorius Gitis Urbelis

Rangovas — GINTARAS VĖLYVIS

Subrangovas — UAB „KAUNO KELIAI" Projekto vadovas Gediminas Raštikaitis

Techninis prižiūrėtojas — GEDIMINAS NELDANKIS

TIKRA Skyriaus vedėja

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė Gintaras Ši... 2011-06-23 Aldona Čaplikienė

138

4

UAB „[illegible]“
Projektų vadovas
Pardavė Gediminas Baltrušaitis
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

2010-04-21
(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

TIKRA
Sąskaitos vedėja
Aldona Čepiogienė
2011-06-23

139

Puišelaitė 2.2.21

Kėdainių rajono mažų ir vidutinių sąvartynų uždarymas Kėdainių raj. sav.: Jovaišių (unikalus Nr.4400-2012-9393), esančio Jovaišių km., Šėtos sen.; Graužių (unikalus Nr.4400-2007-1290), esančio Graužių km., Gudžiūnų sen.; Milžemių (unikalus Nr.4400-2012-9471), esančio Milžemių km., Vilainių sen.; Šetenių (unikalus Nr.4400-2009-5350), esančio Šetenių km., Vilainių sen.; Čystapolio (unikalus Nr.4400-2007-1278), esančio Čystapolio km., Krakių sen.; Aristavėlės (unikalus Nr.4400-2009-5407), esančio Aristavėlės km., Vilainių sen.; Gudžiūnų (unikalus Nr.4400-2007-1280), esančio Gudžiūnų km., Gudžiūnų sen.; Žiogaičių (unikalus Nr.4400-2012-9439), esančio Žiogaičių km., Pelėdnagių sen.; Vikaičių (unikalus Nr.4400-2007-1303), esančio Vikaičių km., Gudžiūnų se.; Pavermenio (unikalus Nr.4400-2009-5418), esančio Pavermenio km., Truskavos sen.; Pajieslio (unikalus Nr. 4400-2012-9450), esančio Pajieslio km., Krakių sen.; Čiukiškių (unikalus Nr.4400-1987-7252), esančio Čiukiškių km., Josvainių sen.; Rekšių (unikalus Nr.4400-2012-9406), esančio Rekšių km., Truskavos sen.; Labūnavos (unikalus Nr.4400-1987-7340), esančio Labūnavos km., Pelėdnagių sen.; Dotnuvos (unikalus Nr.4400-2055-6772), esančio Aušros km., Dotnuvos sen.; Špitolpievio (unikalus Nr.4400-2007-1314), esančio Špitolpievio km., Krakių sen. Paskirtis – kiti statiniai.

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI AKTAS NR. PN-20-100619-00425

Kėdainiai (vietovė) 2010m. GRUODŽIO mėn. 19 d.

Komisija, paskirta VTPSI, 2010-06-10 potvarkiu Nr. P3-2778 šios sudėties:

Vardas, pavardė	Pareigos
Armandas Mockus	- Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas
Vytautas Kundrotas	- Kėdainių raj. savivaldybės administracijos architekto tarnybos vedėjas
Gintaras Motiejaitis	- statytojo atstovas, VšĮ Kauno RATC direktoriaus pavaduotojas
Valdemaras Čekstauskas	- projektuotojo atstovas, projekto vadovas
Jovita Gražulevičienė	- Kėdainių raj. savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Ona Šulcienė	- Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėja
Kazys Mikalauskas	- Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių raj. agentūros vedėjas

dalyvaujant:

Statybos dalyviai	Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas
Rangovo atstovams:	- Gintaras Vėlyvis, UAB „Luidas" techninkos direktorius - Paulius Mažaitis, UAB „Luidas" darbų vadovas
Subrangovams:	- Gediminas Baltrušaitis, UAB „Kauno keliai" statybos vadovas - Ričardas Valinčius, AB „Raselnių melioracija" statybos direktorius
Techniniam prižiūrėtojui:	- Juozas Drižys, at. Nr.1659, UAB „Sweco Lietuva"
Projekto vykdymo priežiūros vadovui:	- Gesė Umbrasaitė, at. Nr.10916, UAB „Sweco Lietuva"
Dotnuvos seniūnijos seniūnui:	- Antanas Alekna
Gudžiūnų seniūnijos seniūnui:	- Regimantas Valiauskas
Josvainių seniūnijos seniūnui:	- Algimantas Sirvidas
Krakių seniūnijos seniūnui:	- Jonas Dalbokas
Pelėdnagių seniūnijos seniūnui:	- Valentinas Tamulis

TIKRA
Skyriaus vedėja
Jadvyga Čepliejienė

2011-06-23 140

os seniūnijos seniūnui:	- Petras Pupkus
skavos seniūnijos seniūnui:	- Vytautas Zakaryza
lainių seniūnijos seniūnui:	- Antanas Bružas

dovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" užsirėjo statytojo pateiktus uždarytus mažus sąvartynus: Jovaišų (unikalus Nr.4400-2012-9393), esančio Jovaišų km., Šėtos sen.; Graužių (unikalus Nr.4400-2007-1290), esančio Graužių km., Gudžiūnų sen.; Milžemių (unikalus Nr.4400-2012-9471), esančio Milžemių km., Vilainių sen.; Šetenių (unikalus Nr.4400-2009-5350), esančio Šetenių km., Vilainių sen.; Čystapolio (unikalus Nr.4400-2007-1278), esančio Čystapolio km., Krakių sen.; Aristavėlės (unikalus Nr.4400-2009-5407), esančio Aristavėlės km., Vilainių sen.; Gudžiūnų (unikalus Nr.4400-2007-1280), esančio Gudžiūnų km., Gudžiūnų sen.; Žiogaičių (unikalus Nr.4400-2012-9439), esančio Žiogaičių km., Pelėdnagių sen.; Vikaičių (unikalus Nr.4400-2007-1303), esančio Vikaičių km., Gudžiūnų sen.; Pavermenio (unikalus Nr.4400-2009-5419), esančio Pavermenio km., Truskavos sen.; Pajiesilio (unikalus Nr.4400-2012-9450), esančio Pajiesilio km. Krakių sen.; Čiukiškių (unikalus Nr.4400-1987-7252), esančio Čiukiškių km., Josvainių sen.; Rekšių (unikalus Nr.4400-2012-9406), esančio Rekšių km., Truskavos sen.; Labūnavos (unikalus Nr.4400-1987-7340), esančio Labūnavos km., Pelėdnagių sen.; Dotnuvos (unikalus Nr. 4400-2055-6772), esančio Aušros km., Dotnuvos sen.; Špitolpievio (unikalus Nr.4400-2007-1314), esančio Špitolpievio km., Krakių sen.

patikrino statytojo pateiktą dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektus Nr.139-5-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, kuriuos 2007m. parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai", kv.a. Nr. 1085, galioja iki 2014-02-27, projekto vadovas – Valdemaras Čekatauskas, kv.a. Nr.1678, galioja iki 2013-02-08;
2. Statybos leidimas išduotas 2008-09-09 Nr.s-08-150;
3. Statytojas KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Kauno m. sav., Kaunas, Statybininkų g. 3-19;
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
   rangovas UAB „Luidas", dokumento Nr.1141, galioja iki 2014-02-13;
   subrangovai UAB „Kauno keliai", dokumento Nr.2011, galioja iki 2012-10-12; AB „Raselnių melioracija", dokumento Nr.66, galioja iki 2013-01-11;
5. Statyba pradėta 2008-10-23;
6. Statybos objektų pagrindiniai rodikliai:

Statinio pagrindiniai rodikliai:

-1-

Statinio pavadinimas:	Jovaišų sąvartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
nikalus statinio numeris:	4400-2012-9393
Registro numeris:	44/390994

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas A	m2	8050	5386
Rekultivuota teritorija B	m2	21600	19392
Faktiška statybos kaina	Lt		144000

-2-

Statinio pavadinimas:	Graužių sąvartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2007-1290
Registro numeris:	44/601665

TIKRA
Savivaldybės vardas
Aldona Čepėlienė
2011 -06- 23

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas	m2	1960	2040

14

Rekultivuota teritorija R-	m2	16900	16900
Faktiška statybos kaina	Lt		94400

-3-

Statinio pavadinimas:	Miškemių savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2012-9471
Registro numeris:	44/351178

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas A	m2	9480	10104
Rekultivuota teritorija B	m2	1996	8281
Faktiška statybos kaina	Lt		153000

-4-

Statinio pavadinimas:	Šetenių savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2009-5350
Registro numeris:	44/573731

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas A	m2	3500	3703
Rekultivuota teritorija B	m2	1834	4299
Faktiška statybos kaina	Lt		61200

-5-

Statinio pavadinimas:	Čystapolio savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2007-1278
Registro numeris:	44/351117

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas K	m2	4644	5020
Rekultivuota teritorija R-1	m2	3400	13400
Faktiška statybos kaina	Lt		115000

-6-

Statinio pavadinimas:	Aristavičės savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2009-5407
Registro numeris:	44/351144

T I K R A
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliejienė
2011-06-23 142

4.

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas	m2	2880	3301
Rekultivuota teritorija	m2	320	2224
Faktiška statybos kaina	Lt		47800

-7-

Statinio pavadinimas:	Gudžiūnų sąvartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2007-1280
Registro numeris:	44/351155

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas K	m2	1850	1900
Rekultivuota teritorija R-1	m2	2014	2014
Faktiška statybos kaina	Lt		30600

-8-

Statinio pavadinimas:	Žiogaičių sąvartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2012-9439
Registro numeris:	44/351175

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Kaupas „A“	m2	2735	2750
Faktiška statybos kaina	Lt		32100

-9-

Statinio pavadinimas:	Vikaičių sąvartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2007-1303
Registro numeris:	44/554165

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas K	m2	5000	5200
Rekultivuota teritorija R-1	m2	13400	13400
Faktiška statybos kaina	Lt		117000

-10-

Statinio pavadinimas:	Pevermenio sąvartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2009-5418
Registro numeris:	44/573771

TIKRA
Skyriaus vedėja
Adonia Čepėjienė

2011-06-23 143

5

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas	m2	2968	2530
Rekultivuota teritorija B	m2	2580	4112
Faktiška statybos kaina	Lt		46700

-11-

Statinio pavadinimas:	Pajeslio savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2012-9450
Registro numeris:	44/351165

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Kaupas „A“	m2	3990	3990
Faktiška statybos kaina	Lt		46500

-12-

Statinio pavadinimas:	Čiukiškių savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-1987-7260
Registro numeris:	44/1329217

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Kaupas „A“	m2	13175	13175
Faktiška statybos kaina	Lt		154000
Monitoringo gręžinys k1, unikalus Nr.4400-1987-7239	m		3
Faktiška statybos kaina	Lt		1000
Monitoringo gręžinys k2, unikalus Nr.4400-1987-7217	m		3
Faktiška statybos kaina	Lt		1000
Monitoringo gręžinys k3, unikalus Nr.4400-1987-7252	m		3
Faktiška statybos kaina	Lt		1000

-13-

Statinio pavadinimas:	Rėkšių savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2012-9406
Registro numeris:	44/390997

TIKRA
Skynaus viršaja
Aldona Čepėjienė
2011 -06- 23

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas	m2	2760	2246
Rekultivuota teritorija	m2	929	1240
Faktiška statybos kaina	Lt		31400

144

-14-

atinio pavadinimas:	Labūnavos savartynas
atinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
atinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-1987-7293
Registro numeris:	44/1329222

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Kaupas „A"	m2	16200	16200
Faktiška statybos kaina	Lt		189000
Monitoringo gręžinys k1, unikalus Nr.4400-1987-7317	m		3
Faktiška statybos kaina	Lt		1000
Monitoringo gręžinys k2, unikalus Nr.4400-1987-7340	m		6
Faktiška statybos kaina	Lt		1150

-15-

Statinio pavadinimas:	Dotnuvos savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2055-6772
Registro numeris:	44/1366826

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Kaupas „A"	m2	2760	2760
Faktiška statybos kaina	Lt		32200

-16-

Statinio pavadinimas:	Spitolpievio savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2007-1314
Registro numeris:	44/1340130

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupes K	m2	2145	2223
Rekultivuota teritorija R-1	m2	845	845
Faktiška statybos kaina	Lt		29400

Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kurioms komisija leido atidėti, reikalavimus užbaigti:

Aldona Čaplikienė

6.5.1. Projekto numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

2011 -06- 29

145

6.5.2. Projekto numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

6.5.3. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6.5.4. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

Komisija pripažįsta, kad

Kėdainių rajono mažų ir vidutinių sąvartynų uždarymas Kėdainių raj. sav.: Jovaišų (unikalus Nr.4400-2012-9393), esančio Jovaišų km., Šėtos sen.; Graužių (unikalus Nr.4400-2007-1290), esančio Graužių km., Gudžiūnų sen.; Milžemių (unikalus Nr.4400-2012-9471), esančio Milžemių km., Vilainių sen.; Šetonių (unikalus Nr.4400-2009-5390), esančio Šetonių km., Vilainių sen.; Čystapolio (unikalus Nr.4400-2007-1278), esančio Čystapolio km., Krakių sen.; Aristavėlės (unikalus Nr.4400-2009-5407), esančio Aristavėlės km., Vilainių sen.; Gudžiūnų (unikalus Nr.4400-2007-1280), esančio Gudžiūnų km., Gudžiūnų sen.; Žiogaičių (unikalus Nr.4400-2012-9439), esančio Žiogaičių km., Pelėdnagių sen.; Vikaičių (unikalus Nr.4400-2007-1303), esančio Vikaičių km., Gudžiūnų sa.; Pavermenio (unikalus Nr.4400-2009-5418), esančio Pavermenio km., Truskavos sen.; Pajieslio (unikalus Nr. 4400-2012-9450), esančio Pajieslio km., Krakių sen.; Čiukiškių (unikalus Nr.4400-1987-7252), esančio Čiukiškių km., Josvainių sen.; Rekšių (unikalus Nr.4400-2012-9406), esančio Rekšių km., Truskavos sen.; Labūnavos (unikalus Nr.4400-1987-7340), esančio Labūnavos km., Pelėdnagių sen.; Dotnuvos (unikalus Nr.4400-2055-6772), esančio Aušros km., Dotnuvos sen.; Špitolpievio (unikalus Nr.4400-2007-1314), esančio Špitolpievio km., Krakių sen.

Tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija,_____tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,_____l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,_____l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,_____l.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,_____l.
6. Pastato garso klasifikavimo protokolas,_____l.
7. Pastato energinio naudingumo sertifikatas,_____

Komisijos pirmininkas Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas Armandas Mockus

Armandas Mockus

Komisijos nariai:

Vytautas Kundrotas

Gintaras Motiejaitis

Valdemaras Čekatauskas

Jovita Gražulevičienė

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepaitienė
2011-06-23

146

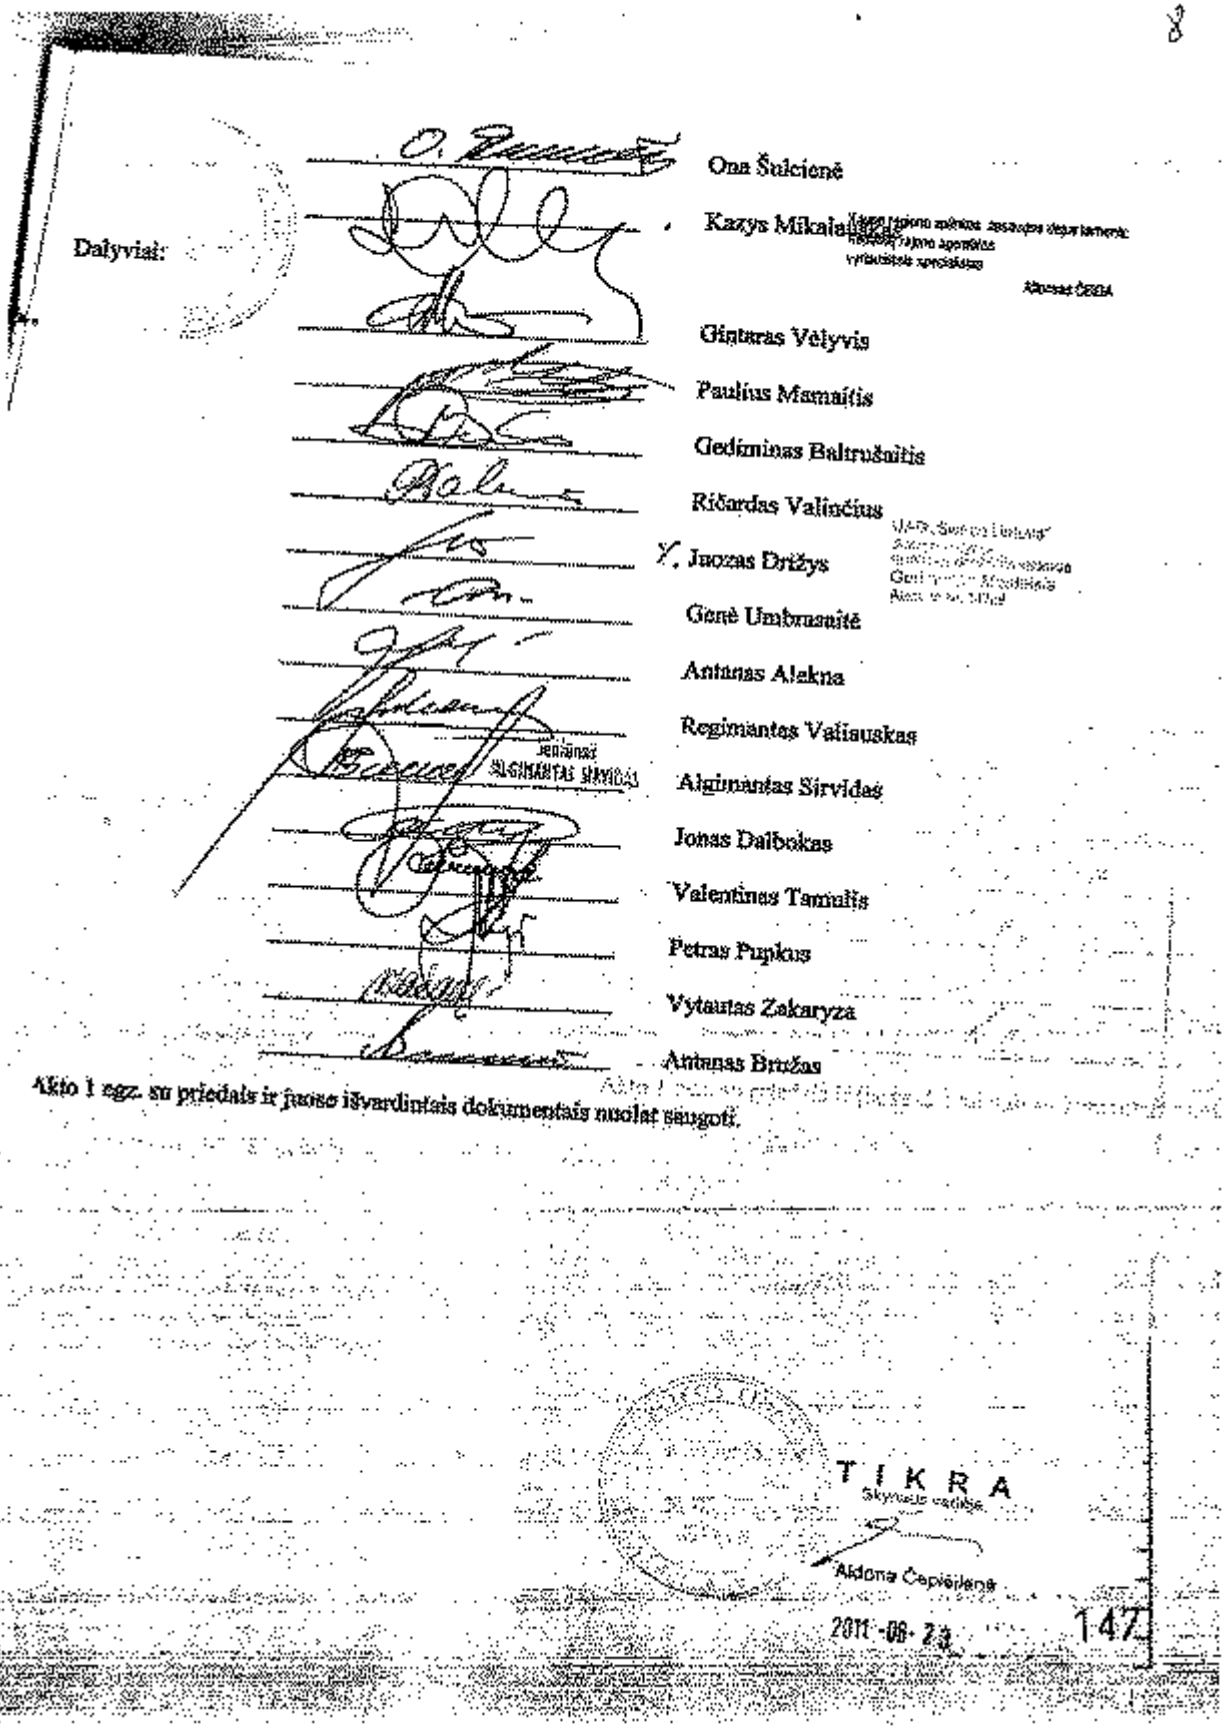
Dalyviai:
Ona Šulcienė
Kazys Mikalauskas
Gintaras Vėlyvis
Paulius Mamaitis
Gediminas Baltrušaitis
Ričardas Valinčius
Juozas Dižys
Genė Umbrasaitė
Antanas Alekna
Reginantas Valiauskas
Alginantas Sirvidas
Jonas Dalbokas
Valentinas Tamulis
Petras Puplus
Vytautas Zakaryza
Antanas Bružas
Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.
TIKRA
Aldona Čepėlienė
2011 -08- 23
147

Paiėdas 2.2.22

Babėnų sąvartyno uždarymas (rekultivavimas): sąvartynas unikalus Nr.4400-2015-4374, Nr.4400-2015-4396, Nr.4400-2059-6236, Nr.4400-2059-6180, kitos paskirties statiniai, Kėdainių raj. sav., Babėnų g. 24, Kėdainiai

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI AKTAS NR. PTV-20-100519-00422

Kėdainiai (vietovė) 2010m. BIRŽELIO mėn. 19 d.

Komisija, paskirta VTPSI, 2010-06-10 potvarkiu Nr. P3-2777 šios sudėties:

Vardas, pavardė	Pareigos
Armandas Mockus	- Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas
Vytautas Kundrotas	- Kėdainių raj. savivaldybės administracijos architekto tarnybos vedėjas
Gintaras Motiejaitis	- statytojo atstovas, VšĮ Kauno RATC direktoriaus pavaduotojas
Valdemaras Čekatauskas	- projektuotojo atstovas, projekto vadovas
Jovita Gražulevičienė	- Kėdainių raj. savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Ona Šulcienė	- Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėja
Kazys Mikalauskas	- Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių raj. agentūros vedėjas

dalyvaujant:

Statybos dalyviai	Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas
Rangovo atstovams:	- Gintaras Vėjyvis, UAB „Luidas" technikos direktorius - Paulius Marnaitis, UAB „Luidas" darbų vadovas
Techniniam prižiūrėtojui:	- Juozas Dričys, at. Nr.1659, UAB „Sweco Lietuva"
Projekto vykdymo priežiūros vadovui:	- Genė Umbrasaitė, at. Nr.10516, UAB „Sweco Lietuva"
Kėdainių miesto seniūnui:	- Alvydas Kleiva

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą užbaigtą sąvartyną: Babėnų (unikalus Nr. 4400-2015-4374, Nr.4400-2015-4396, Nr.4400-2059-6236, Nr.4400-2059-6180), esantį Babėnų g. 24, Kėdainiai
patikrino statytojo pateiktą dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr.139-5, kurį 2007m. parengė UAB „Krašto projektai ir partneriai", kv.a. Nr. 1085, galioja iki 2014-02-27, projekto vadovas – Valdemaras Čekatauskas, kv.a. Nr.1678, galioja iki 2013-02-08;
2. Statybos leidimas išduotas 2008-09-09 Nr.s-08-148;
3. Statytojas KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Kauno m. sav., Kaunas, Statybininkų g. 3-19;
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „Luidas", dokumento Nr.1141, galioja iki 2014-02-13;
Statyba pradėta 2008-10-24;
5. Statybos objektų pagrindiniai rodikliai:

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Cepliejienė
2011-06-23

Statinio pagrindiniai rodikliai:

-1-

Statinio pavadinimas:	Babėnų sąvartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai

148

2

inio kategorija:	Ypatingas
tybos rūšis:	Naujo statinio statyba
ikalus statinio numeris:	4400-2015-4374
egistro numeris:	44/412277

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Kaupas A (uždengtas atliekų kaupas)	m2	39078	38027
Rekultyvuotas plotas D	m2	42968	58281
Faktiška statybos kaina	Lt		1200000

2

Statinio pavadinimas:	Babėnų savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2015-4396
Registro numeris:	44/412277

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Kelias (įvažiavimas) b1	m2	607	507
Vandens pralaida p1	m	23	16
Monitoringo gręžinys M1	m		3
Monitoringo gręžinys M2	m		3
Monitoringo gręžinys M3	m		5
Monitoringo gręžinys M4	m		5
Paviršinio vandens stebėjimo postas a1	m		5.07
Paviršinio vandens stebėjimo postas a2	m		6.29
Faktiška statybos kaina	Lt		58600

3

Statinio pavadinimas:	Babėnų savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2059-6236
Registro numeris:	44/412277

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Kaupas B (uždengtas atliekų kaupas)	m2	9628	9750
Faktiška statybos kaina	Lt		245000

4

Statinio pavadinimas:	Babėnų savartynas
Statinio paskirtis:	Kitos paskirties statiniai
Statinio kategorija:	Ypatingas
Statybos rūšis:	Naujo statinio statyba
Unikalus statinio numeris:	4400-2059-6180
Registro numeris:	44/412277

IŠKRA

Aldona

2011-06-21 149

3

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
...apas C (uždengtas ...ilekų kompas)	m2	8625	9468
...aktiška statybos kaina	Lt		238000

5.5.1. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

5.5.2. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

5.5.3. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

5.5.4. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens parošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

Komisija pripažįsta, kad

Babėnų sąvartyno uždarymas (rekultivavimas): sąvartynas unikalus Nr. 4400-2015-4374, Nr.4400-2015-4396, Nr.4400-2059-6236, Nr.4400-2059-6180 , kitos paskirties statiniai, Kėdainių raj. sav., Babėnų g. 24, Kėdainiai

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, _____ tomų (lapų).
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, _____ l.
3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, _____ l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, _____ l.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, _____ l.
6. Pastato garso klasifikavimo pažymėjimas _____ l.
7. Pastato energinio naudingumo sertifikatas _____ l.

Komisijos pirmininkas _____ Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros padalinio vyriausiasis specialistas Armandas Mockus

Armandas Mockus

Komisijos nariai:

_____ Vytautas Kundrotas

_____ Gintaras Motiejaitis

_____ Valdemaras Čekutauskas

_____ Jovita Gražulevičienė Aldona Čepulienė

_____ Ona Šulcienė 2011-06-23

TIKRA

150

4

Dalyviai:

Kazys Mikalauskas

Gintaras Vėlyvis

Paulius Mamaitis

Juozas Dričys

Genė Umbrasaitė

Alvydas Kleiva

Kadastrų ir registrų agentūros
patikėtinis
Alvydas Kleiva

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

TIKRA

2011-06-13

151

Paildas 2.2.23

1

Šalčmirių sąvartyno uždarymas: sąvartynas un.nr.4400-2007-1236, dujų drenažo sistema un.nr.4400-2007-1269, kitos paskirties statiniai, , Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Šalčmiriai

Pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Nr. PTV-eO-100507-00249

2010-05-07

Kėdainiai

Komisija, paskirta *VTPSI, 2010-05-05, P3-1994*

šios sudėties:

Vardas, pavardė	Pareigos
Armandas Mockus	*- Komisijos pirmininkas, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas;*
Vytautas Kundrotas	*- Kėdainių r. savivaldybės administracijos architekto tarnybos vedėjas;*
Gintaras Motiejaitis	*- statytojo atstovas, VšĮ Kauno RATC direktoriaus pavaduotojas;*
Valdemaras Čekatauskas	*- projektuotojo atstovas, projekto vadovas*
Raimondas Naruševičius	*- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;*
Ona Šulcienė	*- Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėja;*
Kazys Mikalauskas	*- Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių r. agentūros vedėjas;*

dalyvaujant:

Statybos dalyviai	Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas
rangovui (statybos vadovui):	*Gintaras Vėlyvis, UAB "Luidas", at.nr.*
subrangovui (specialiųjų darbų vadovui):	*Ričardas Valinčius, at.nr.506, AB "Raseinių melioracija" statybos direktorius;*
techniniam prižiūrėtojui:	*Juozas Drižys, at.nr.1659, UAB "Sweco Lietuva"*
Projekto vykdymo priežiūros vadovui:	*Gienė Umbrasaitė, at.nr.10516, UAB "Sweco Lietuva"*
Dotnuvos seniūnijos seniūnui:	*Antanas Alekna*

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėja statytojo pateiktą Šalčmirių sąvartyno uždarymas: sąvartynas un.nr.4400-2007-1236, dujų drenažo sistema un.nr.4400-2007-1269 Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Šalčmiriai

patikrino statytojo pateiktą dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007 m. parengė

KOPIJA

Aldona Čapliejienė

2011-08-23

1 lapas

152

2

UAB "Krašto projektai ir partneriai" 1085 2014-02-27

2. Statybos leidimas išduotas 2008-09-09 Nr. s-08-149

3. Statytojas KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS , Kauno m. sav., Kaunas, Statybininkų g. 3-19,

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB "LUIDAS", dokumento Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13

subrangovai AB "Raseinių melioracija", dokumento Nr. 66, galioja iki 2013-01-11

5. Statyba pradėta 2009-03-12

6. Statybos objektų pagrindiniai rodikliai:

Statinio pagrindiniai rodikliai:

Statinio pavadinimas:	*Dujų drenažo sistema*
Statinio paskirtis:	*Kiti statiniai, atitinkantys hidrotechnikos statinių požymius, iš jų melioracijos statiniai*
Statinio kategorija:	*Ypatingas*
Statybos rūšis:	*Naujo statinio statyba*
Unikalus statinio numeris:	*4400-2007-1269*
Registro numeris:	*44/351137*

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Dujų drenažo sistema D	*Vnt.*	*1*	*1*
Dujų drenažo šulinys D-1	*Vnt.*	*1*	*1*
	Skersmuo, mm	*1000*	*1000*
	Gylis, m	*2*	*2*
Dujų drenažo vamzdynas (plastikas), d-110mm	*Ilgis, m*	*19*	*19*

Statinio pagrindiniai rodikliai:

Statinio pavadinimas:	*Sąvartynas*
Statinio paskirtis:	*Kitos paskirties statiniai*
Statinio kategorija:	*Ypatingas*
Statybos rūšis:	*Naujo statinio statyba*
Unikalus statinio numeris:	*4400-2007-1236*
Registro numeris:	*44/351137*

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
Uždengtas atliekų kaupas K (šiaurė)	*Plotas, m2*	*10289*	*10289*

TIKRA

2014

153

3

Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
danga)			
Rekultivuota teritorija R-1 (žolės danga)	Plotas, m2		3569
Gruntinio vandens stebėjimo gręžiniai (plastikas), d-63mm	Vnt.		4
Laipteliai L-1 (gelžbetonis), plotis-0,5m.	Ilgis, m		1
Laipteliai L-2 (gelžbetonis), plotis-1m.			2
Laipteliai L-3 (gelžbetonis)	Plotas, m2		1
Latakas R-1	Plotas, m2		9
5. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt	284	294

Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

6.5.1. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

6.5.2. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

6.5.3. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6.5.4. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

Komisija pripažįsta, kad

Šalčmirių sąvartyno uždarymas: dujų drenažo sistema ir sąvartynas

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, ____ tomų (lapų).

TIKRA

2011-08-23

154

4

2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, ____ l.

3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai, _____ l.

4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, _____ l.

5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, _____ l.

6. Pastato garso klasifikavimo protokolas _____ l.

7. Pastato energinio naudingumo sertifikatas, _____

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas Armandas Mockus

Komisijos pirmininkas — Armandas Mockus

Komisijos nariai:

Vytautas Kundrotas

Gintaras Motiejaitis

Kauno APGV Kėdainių PGT Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Valdemaras Čekatauskas

Raimondas Naruševičius

Raimondas Naruševičius

Statybos vedėja Ona Šulcienė

Ona Šulcienė

Kazys Mikalauskas

Dalyviai:

Gintaras Vėlyvis

Ričardas Valinčius

Juozas Drižys

Genė Umbrasaitė

Antanas Aleksa

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

TIKRA
Statybos vedėja
Aldona Čepukienė
2011-10-24

155

Ruidas 2.2.31

1

Budnikų (Keturokų) sąvartyno rekultivacija (unikalus Nr. 4900-2009-5016), kitos paskirties,
Kiti statiniai (unikalus Nr. 4400-2060-7430), kitos paskirties statiniai,
Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Keturokų k.

Pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Nr. PTN-20-100615-00400
2010-06-15
Kaišiadorys

Komisija, paskirta — Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo r statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010-06-15 potvarkiu Nr. P3-2841

šios sudėties:

Vytautas Košuba — – Komisijos pirmininkas, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas

Kristina Baltūmienė — – Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėja

Eugenijus Šulskis — – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių agentūros vedėjas

Rimantas Žalvys — – Kaišiadorių r. sav. administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

Antanas Jurgaitis — – Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Gintaras Motiejaitis — – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius pavaduotojas

Valdemaras Čekanauskas — – UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas

dalyvaujant:

Rangovo atstovams: Gintarui Vėlyviui, UAB „Luidas" technikos direktoriui

Paului Mamaičiui, UAB „Luidas" darbų vadovui, kv. a. 22493

techniniam prižiūrėtojui Gediminas Meldaikiui, kv. a. 14766

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" apžiūrėjo statytojo pateiktą rekultivuotą Budnikų (Keturokų) sąvartyną (unikalus Nr. 4900-2009-5016) Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Keturokai

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

patikrino statytojo pateiktą dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2009 m. parengė

UAB "Krašto projektai ir partneriai" 1085 2014-02-27

(fizinio/juridinio asmens vardas, pavardė/pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

2. Statybos leidimas išduotas 2009-07-30 Nr. 102-511, Kaišiadorių r. sav. administracijos

3. Statytojas KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS , į.k. 300092998, Kauno

TIKRA
Skyriaus vedėja 1 iš 3

Aldona Čepėlienė

2011 -05- 23

156

m. sav., Kaunas, Statybininkų g. 3-19

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB "LUIDAS", dokumento Nr. 1141, galioja iki 2014-02-13

5. Statyba pradėta 2009-08-10

6. Statybos objektų pagrindiniai rodikliai:

Statinio pavadinimas:		sąvartynas	
Statinio paskirtis:		Kitos paskirties statiniai	
Statinio kategorija:		Neypatingas	
Statybos rūšis:		Statinio rekonstravimas	
Unikalus statinio numeris:		4900-2009-5016	
Registro numeris:		20/268293	
Atliekų kaupo paviršiaus plotas	m^2	15886	
Rekultivuotas plotas	m^2	6123	
Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt		510 200

Kauno teritorinio planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas Vytautas Kobalya

Pagalbiniai statiniai, jų dydžiai:

Kiti statiniai ((unikalus Nr. 4400-2060-7430):

Kelias **b1**, žvyro danga, 779 m^2 ploto;

Monitoringo gręžinys **M1**, 3 m gylio;

Monitoringo gręžinys **M2**, 3 m gylio;

Monitoringo gręžinys **M3**, 3 m gylio;

Monitoringo gręžinys **M4**, 3 m gylio;

Paviršinio vandens stebėjimo postas **g1**, 1 m ilgio;

Paviršinio vandens stebėjimo postas **g2**, 1 m ilgio;

Dujų drenažas **d1**, 110 mm skersmens;

Filtrato drenažas **d2**, 113 mm skersmens; 200,02m ilgio;

Lietaus vandens drenažas **d5**, 50 mm skersmens; 86,11 m ilgio;

Lietaus vandens drenažas **d3**, 50 mm skersmens; 86,11 m ilgio;

Lietaus vandens drenažas **d4**, 125 mm skersmens; 49 m ilgio;

Infiltracinės kasetės **i1, i2**, 12,9 m^3 tūrio

Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

6.5.1. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

6.5.2. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

2 iš 3

157

3

charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

6.5.3. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nukrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

6.5.4. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga, inžinerinės sistemos (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

Komisija pripažįsta, kad

Sąvartynas (unikalus Nr. 4900-2009-5016) ir kiti statiniai(unikalus Nr. 4400-2060-7430): kelias **b1**; monitoringo gręžiniai **M1; M2; M3; M4**; paviršinio vandens stebėjimo postai **g1, g2**, drenažai **d1, d2, d3, d4**, infiltracinės kasetės **i1, i2**, esantys Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Keturokų k..

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija,____ tomų (lapų).

2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,____ l.

3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,____ l.

4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,____ l.

5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,____ l.

Komisijos pirmininkas — Vytautas Košuba
(parašas) (v., pavardė)

Komisijos nariai:

Kristina Banišinienė
Eugenijus Šulskis
Rimantas Želvys
Antanas Jurgaitis
Gintaras Motiejaitis
Valdemaras Čekatauskas
Gintaras Vėlyvis
Paulius Mamaitis
Gediminas Meldaikis
(parašas) (v., pavardė)

Rangovas
Rangovo darbų vadovas
Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

TIKRA
Aldona Čepliejienė
2011-06-23

158

Paėdas 2.2.25

STR 1.11.01:2002
5 priedas (rekomendacinis)

LINIJINIO INŽINERINIO STATINIO: MAŽŲ IR VIDUTINIŲ SĄVARTYNŲ UŽDARYMAS, RASEINIŲ R. SAV.: PALIEPIŲ SEN.: PAPELKIŲ K; ARIOGALOS SEN.: KEJĖNŲ K., PASKYSTŪNIO K, PALIEPIŲ K.; BETYGALOS SEN.: DIRŽIONIŲ K., UGIONIŲ K., STEPONKAIMIO K.; PAGOJUKŲ SEN.: DAUTARTŲ K., MEILIŠKIŲ K.; GIRKALNIO SEN.: GIRKALNIO MST.; NEMAKŠČIŲ SEN.: ŽVIRGŽDĖS K.; ŠILUVOS SEN.: ZBARO K.; VIDUKLĖS SEN.: RIMKIŠKIŲ K.
(PASKIRTIS – KITI STATINIAI)

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI
AKTAS Nr. PTN-22-1014-0002

Raseiniai 2010m. lapkričio mėn. 22 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010 m. lapkričio mėn. 12 d. potvarkiu Nr. PS-1043-(A2) šios sudėties:

G. Arlauskas - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas);

G. Motiejaitis - VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas;

V. Oržekauskas - Raseinių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas;

V. Čekanauskas - UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas;

V. Užringienė - Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus vedėja;

V. Vasiliauskas - Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos vyr. inspektorius;

G. Tamašauskis - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūros vedėjas;

V. Stanys - Tytuvėnų regioninio parko direkcijos direktorius;

V. Kilčiauskas - Dubysos regioninio parko direkcijos direktorius;

dalyvaujant rangovui UAB „Luidas" (kv. atestato Nr.1141, galioja iki 2014-02-13) generaliniam direktoriui **Algimantui Ulickui**, subrangovui AB „Raseinių melioracija" (kv. atestato Nr.66, galioja iki 2013-01-11) statybos direktoriui **Ričardui Valiučiui**, statybos vadovui **Vygintui Masalskiui**, (kv. atestato Nr.22526, galioja iki 2013-06-30), statybos vadovui **Kęstučiui Grigauskui**, (kv. atestato Nr.22533, galioja iki 2013-07-11) techniniam prižiūrėtojui **Juozui Drižiui** (kv. atestato

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėsienė
159

Nr.1659, galioja iki 2013-01-18), projekto vykdymo priežiūros vadovui **Genei Umbrasaitei** (kv. atestato Nr.10516, galioja iki 2011-05-24), vadovaudamiesi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą inžinerinį statinį – sąvartyno uždarymą, esantį Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav., patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr.:1395-49, 1395-50, 1395-51, 1395-53, 1395-54, 1395-55, 1395-56, 1395-57, 1395-57, 1395-58, 1395-59, 1395-61, 1395-62, 1395-63 kurį 2007 m. parengė UAB "Krašto projektai ir projektai" (kv. atestato Nr.1085, galioja iki 2014-02-27) ir patvirtino nuolatinė statybos komisija 2008-08-20 protokolu Nr. 148.

2. Leidimas statyti išduotas 2008-09-22, Nr. AT 119-2008NR.

3. Statytojas, adresas: **Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras** į.k.300092998, Statybininkų g. 3-19, Kauno m., Kauno r. sav.;

4. Statybos ir montavimo darbus atliko: UAB „Luidas" , į.k.122911551, Karolių g. 7, Vilnius, kvalifikacijos atestato Nr.114);

subrangovai: AB „Raseinių melioracija", į.k.172203882, Žemaičių g. 30, Ariogalos m., Raseinių r. sav., kvalifikacijos atestato Nr.66;

5.Statyba pradėta 2008 m. rugsėjo mėn.

6.Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Tarosų sąvartynas Kejėnų k., Ariogalos sen.			4400-1987-1944 7235/0002:336
1.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m^2	7 172	Žolės danga
1.2 Rekultivuota teritorija R-1	m^2	2 668	Žolės danga
2. Paskystūnio sąvartynas Paskystūnio k., Ariogalos sen.			4400-1987-2330 7208/0003:313
2.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m^2	3 990	Žolės danga
2.2 Rekultivuota teritorija R-1	m^2	687	Žolės danga
3. Girkalnio sąvartynas Girkalnio mstl., Girkalnio sen.			4400-1987-2063 7213/0006:326
3.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m^2	2 200	Žolės danga
3.2 Rekultivuota teritorija R-1	m^2	1 633	Žolės danga
4. Paliepių sąvartynas Paliepių k., Ariogalos sen.			4400-1987-1888 7243/0003:333
4.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m^2	4 400	Žolės danga
4.2 Rekultivuota teritorija R-1	m^2	4 032	Žolės danga
5. Diržionių sąvartynas Diržionių k., Betygalos sen.			4400-1987-1966 7253/0003:472

T I K R A

160

5.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m²	800	Žolės danga
5.2 Rekultivuota teritorija R-1	m²	960	Žolės danga
6. Zbaro sąvartynas Zbaro k., Šiluvos sen.			4400-1987-2296 7273/0003:222
6.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m²	2 609	Žolės danga
6.2 Rekultivuota teritorija R-1	m²	2 909	Žolės danga
7. Jūkainių sąvartynas Rimkiškių k., Viduklės sen.			4400-1987-2322 7258/0005:267
7.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m²	1 490	Žolės danga
7.2 Rekultivuota teritorija R-1	m²	2 269	Žolės danga
8. Steponkaimio sąvartynas Steponkaimio k., Beigalos sen.			4400-1987-1988 7268/0002:151
8.1 Rekultivuota teritorija R-1	M²	362	Žolės danga
9. Papelkių sąvartynas Papelkių k., Paliepių sen.			4400-1987-2209 7270/0002:717
9.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m²	603	Žolės danga
9.2 Rekultivuota teritorija R-1	m²	447	Žolės danga
10. Ugionių sąvartynas Ugionių k., Ariogalos sen.			4400-1987-2030 7205/0003: 471
10.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m²	9 800	Žolės danga
11. Dautartų sąvartynas Dautartų k., Pagojukų sen.			4400-1987-2120 7250/0001:296
11.1 Uždengtas atliekų kaupas K	m²	2 673	Žolės danga
11.2 Rekultivuota teritorija R-1	m²	1 819	Žolės danga
12. Meilšikių sąvartynas Meilšikių k., Pagojukų sen.			4400-1987-2163 7283/0005:340
12.1 Uždengtas atliekų kaupas K	M²	400	Žolės danga
13. Žvirgždės sąvartynas Žvirgždės k., Nemakščių sen.			4400 2007 6399 7238/0007:431
13.1 Uždengtas atliekų kaupas K	M²	7 782	Žolės danga
13.2 Rekultivuota teritorija R-1	m²	970	Žolės danga
5. Faktiška statybos kaina be PVM	tūkst. Lt		

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai [illegible] priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

T I K R A

Skyriaus vedėja

Aldona Čepaitienė

2011-06-23

4

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Terminas
Apželdinimą	ha	62,6	2010-09-01

Komisija pripažįsta, kad mažų ir vidutinių sąvartynų uždarymas, Raseinių r. sav.: Paliepių sen., Papelkių k.; Ariogalos sen.: Kejėnų k., Paskystūnio k., Paliepių k.; Betygalos sen.: Diržionių k., Ugionių k., Steponkalnio k.; Pagojukų sen.: Dautartų k., Meiliškių k.; Girkalnio sen.: Girkalnio mst.; Nemakščių sen.: Žvirgždės k.; Šiluvos sen.: Zbaro k.; Vidaklės sen.: Rimkiškių Raseinių r. sav. tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkami naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – žurnale bei priedose.

3. Statinių ir priklausinių kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas (inventorinė byla).

4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos – žurnalo priedose.

5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas – žurnale.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čapkūnienė
2011-06-23

162

5

Komisijos pirmininkas: G. Atlauskas

Komisijos nariai: G. Motiejaitis

V. Oržekauskas

V. Čekatauskas

V. Užringienė

V. Vasiliauskas

G. Tamošauskis

V. Stonys

V. Kilčiauskas

A. Ulickas

R. Valinčius

Statybos vadovas V. Masalskis,

Statybos vadovas K. Grigauskas

Projekto vykdymo priežiūros vadovui G. Umbrasaitė

Techninis prižiūrėtojas J. Drižys

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją nuolatiniam saugojimui

priėmė:

(parašas) (v. pavardė) (parašas)

perdavė:

20___m. _____ mėn. ___ d.

TIKRA

163

Luidas 2.2.26

STR 1.11.01:2002
5 priedas (rekomendacinis)

LINIJINIO INŽINERINIO STATINIO: ANDRUŠAIČIŲ SĄVARTYNO UŽDARYMAS, ANDRUŠAIČIŲ K., RASEINIŲ SEN., RASEINIŲ R. SAV. (PASKIRTIS – KITI STATINIAI, UNIKALUS NR. 4400-1987-0969, ŽEMĖS SKL. UNIKALUS NR. 7240/0001:334)

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI AKTAS Nr. PN-2010-04-20

Raseiniai 2010 m. balandžio mėn. 19 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010 m. kovo mėn. 15 d. potvarkiu Nr. P3-1681-(10.1) šios sudėties:

G. Arlauskas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas);

G. Mošiejaitis – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas;

V. Oržekauskas – Raseinių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas;

V. Čekatauskas – UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas;

V. Užringienė – Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus vedėja;

V. Vasiliauskas – Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos vyr. inspektorius;

G. Tamašauskis – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūros vedėjas,

dalyvaujant rangovui UAB „Luidas" (kv. atestato Nr.1141, galioja iki 2014-02-13) generaliniam direktoriui **Algimantui Ulickui**, subrangovui AB „Raseinių melioracija" (kv. atestato Nr.66, galioja iki 2013-01-11) statybos direktoriui **Ričardui Valinčiui**, statybos vadovui **Vygintui Masalskiui**, (kv. atestato Nr.22526, galioja iki 2013-06-30), techniniam prižiūrėtojui **Juozui Dričiui** (kv. atestato Nr.1659, galioja iki 2013-01-18), projekto vykdymo priežiūros vadovui **Genei Umbrasaitei** (kv. atestato Nr.10516, galioja iki 2011-05-24), vadovaudamiesi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą inžinerinį statinį – Andrušaičių savartyno uždarymą, esantį Andrušaičių k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

TIKRA

Aldona Šeplavičienė

164

2010 04 23

2

1. Statyba vyko pagal projektą Nr.1395-46, kurį 2007m. parengė UAB "Krašto projektai ir projektai" (kv. atestato Nr.1085, galioja iki 2014-02-27) ir patvirtino nuolatinė statybos komisija 2009-05-20 protokolo Nr. NPR-28-090518-00012.

2. Leidimas statyti išduotas 2009-05-28, Nr. LNS-28-090528-00055.

3. Statytojas, adresas: **Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras į.k.300092998, Statybininkų g. 3-19, Kauno m., Kauno r. sav.;**

4. Statybos ir montavimo darbus atliko: UAB „Luidas" , į.k.122911551, Kareivių g. 7, Vilnius, kvalifikacijos atestato Nr.1141;

subrangovai: AB „Raseinių melioracija", į.k.172203882, Žemaičių g. 30, Ariogalos m., Raseinių r. sav., kvalifikacijos atestato Nr.66;

5.Statyba pradėta 2009 m. gegužės mėn.

6.Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Uždengtas mažasis atliekų kaupas K-1	m^2	4 922	Žolės danga
2. Uždengtas didysis atliekų kaupas K-2	m^2	22 048	Žolės danga
3. Rekultivuota teritorija R-1	m^2	1 678	Žolės danga
4. Dujų drenažo sistema D			
4.1. Dujų drenažo šulinys D-1	vnt.	1	d-1000, G/b; h-2 m
4.2 Dujų drenažo vamzdynas D-2	m	20	d-110, plastikas;
5. Latakas B-1	m^3	260	Betonas
6. Faktiška statybos kaina be PVM	tūkst. Lt	994,495	

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nukrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Ceplajienė 165

3

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Terminas
Apželdinimą	ha	28,6	2010-09-01

Komisija pripažįsta, kad Andrušaičių sąvartyno uždarymas, Andrušaičių k., Raseinių sen., Raseinių r. sav. tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkami naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – žurnale bei priedluose.

3. Statinių ir priklausinių kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas (inventorinė byla).

4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos – žurnalo priedluose.

5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas – žurnale.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepaitienė
2011-08-22

166

Komisijos pirmininkas: G. Arlauskas

Komisijos nariai: G. Motiejaitis

V. Oržekauskas

V. Čekatauskas

V. Užringienė

V. Vasiliauskas

G. Tamašauskis

A. Ulickas

R. Valinčius

Statybos vadovas V. Masaitis

Projekto vykdymo priežiūros vadovui G. Umbrasaitė

Techninis prižiūrėtojas J. Dričys

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją nuolatiniam saugojimui priėmė:

(parašas) (v. pavardė) (parašas)

perdavė:

20__ m. _____ mėn. ___ d.

TIKRA

2011-08-23

167

Priedas 2-2-27

1

STR 1.11.01:2002
5 priedas (rekomendacinis)

LINIJINIO INŽINERINIO STATINIO: ARIOGALOS SĄVARTYNO UŽDARYMAS, GĖLUVOS K., ARIOGALOS SEN., RASEINIŲ R. SAV.
(PASKIRTIS – KITI STATINIAI, UNIKALUS NR. 4400-1987-1477, ŽEMĖS SKL. UNIKALUS NR. 7218/0001:475)

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI AKTAS Nr. PN-20-4400-0003

Raseiniai 2010m. balandžio mėn. 13d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010 m. kovo mėn. 11 d. potvarkiu Nr. PS-044(10) šios sudėties:

G. Arlauskas - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas);

G. Motiejaitis - VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas;

V. Oržekauskas - Raseinių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas;

V. Čekatauskas - UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas;

V. Užringienė - Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus vedėja;

V. Vasiliauskas - Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos vyr. inspektorius;

G. Tamašauskis - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūros vedėjas,

dalyvaujant rangovui UAB „Luidas" (kv. atestato Nr.1141, galioja iki 2014-02-13) generaliniam direktoriui **Algimantui Ulickui**, subrangovui AB „Raseinių melioracija" (kv. atestato Nr.66, galioja iki 2013-01-11) statybos direktoriui **Ričardui Valinčiui**, statybos vadovui **Vygintui Masalskiui**, (kv. atestato Nr.22526, galioja iki 2013-06-30), techniniam prižiūrėtojui **Juozui Drižiui** (kv. atestato Nr.1659, galioja iki 2013-01-18), projekto vykdymo priežiūros vadovui **Genei Umbrasaitei** (kv. atestato Nr.10516, galioja iki 2011-05-24), vadovaudamiesi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą inžinerinį statinį – Gėluvos savartyno uždarymą, esantį Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav., patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

TIKRA

Aldona Čepliauskė

168

1. Statyba vyko pagal projektą Nr.1395-47, kurį 2007 m. parengė UAB "Krašto projektai ir projektai" (kv. atestato Nr.1085, galioja iki 2014-02-27) ir patvirtino nuolatinė statybos komisija 2008-08-20 protokolu Nr. 146.

2. Leidimas statyti išduotas 2008-09-22, Nr. AT 117-2008NR.

3. Statytojas, adresas: **Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras į.k.300092998, Statybininkų g. 3-19, Kauno m., Kauno r. sav.;**

4. Statybos ir montavimo darbus atliko: UAB „Luidas" , į.k.122911351, Kareivių g. 7, Vilnius, kvalifikacijos atestato Nr.1141;

subrangovai: AB „Raseinių melioracija", į.k.172203882, Žemaičių g. 30, Ariogalos m., Raseinių r. sav., kvalifikacijos atestato Nr.66;

5.Statyba pradėta 2008 m. rugsėjo mėn.

6.Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Uždengtas atliekų kaupas K	m^2	17 110	Žolės danga
2. Rekultivuota teritorija R-1	m^2	6 500	Žolės danga
3. Dujų drenažo sistema D			
3.1. Dujų drenažo šulinys D-1	vnt.	1	d-1000, G/b; h-2 m
3.2 Dujų drenažo vamzdynas D-2	m	68	d-110, plastikas;
4. Grunčinio vandens stebėjimo gręžinys G-1	vnt.	1	d-63, plastikas
5. Faktiška statybos kaina be PVM	tūkst. Lt	5. Faktiška s 504,750 su/be PVM	tūkst.

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir apie priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė

169

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Terminas
Apželdinimą	ha	23,6	2010-09-01

Komisija pripažįsta, kad sąvartyno uždarymas, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. įrenkinį nustatytus reikalavimus ir yra tinkami naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – žurnale bei prieduose.
3. Statinių ir priklausinių kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas (inventorinė byla).
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos – žurnalo prieduose.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas – žurnale.

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliejienė
2010-08-24

170

Komisijos pirmininkas: G. Artauskas

Komisijos nariai: G. Motiejaitis

V. Oržekauskas

V. Čeketauskas

V. Užringienė

V. Vasiliauskas

G. Tamašauskis

Ulickas

R. Valinčius

Statybos vadovas V. Masalskis

Projekto vykdymo priežiūros vadovui G. Umbrasaitė

Techninis prižiūrėtojas J. Drižys

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją nuolatiniam saugojimui priėmė:

(parašas) (v. pavardė) (pareigos)

perdavė:

20__m._____mėn.___d.

TIKRA

171

Priedas 2.2.28

1

STR 1.11.01:2002
5 priedas (rekomendacinis)

LINIJINIO INŽINERINIO STATINIO: NUMGALIŲ SĄVARTYNO UŽDARYMAS, KEMPALIŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. (PASKIRTIS – KITI STATINIAI, UNIKALUS NR. 4400-1987-1877, ŽEMĖS SKL. UNIKALUS NR. 7280/0004:401)

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI
AKTAS Nr. PN-12-1002442-00019

Raseiniai 2010m. balandžio mėn. 23 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010 m. kovo mėn. 22 d. potvarkiu Nr. PĮ-ĮŪS-(KC)/ šios sudėties:

G. Arlauskas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas);

G. Motiejaitis – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas;

V. Oržekauskas – Raseinių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas;

V. Čekatauskas – UAB „Krašto projektai ir partneriai" projekto vadovas;

V. Užringienė – Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus vedėja;

V. Vasiliauskas – Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos vyr. inspektorius;

G. Tamašauskis – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūros vedėjas,

dalyvaujant rangovui UAB „Luidas" (kv. atestato Nr.1141, galioja iki 2014-02-13) generaliniam direktoriui **Algimantui Ulickui**, subrangovui AB „Raseinių melioracija" (kv. atestato Nr.66, galioja iki 2013-01-11) statybos direktoriui **Ričardui Valinčiui**, statybos vadovui **Kęstučiui Grigauskui**, (kv. atestato Nr.22533, galioja iki 2013-07-11), techniniam prižiūrėtojui **Juozui Drižiui** (kv. atestato Nr.1659, galioja iki 2013-01-18), projekto vykdymo priežiūros vadovui **Genei Umbrasaitei** (kv. atestato Nr.10516, galioja iki 2011-05-24), vadovaudamiesi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo statytojo pateiktą inžinerinį statinį – Numgalių sąvartyno uždarymą, esantį Kempalių k., Viduklės sen., Raseinių r. sav., patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

KOPIJA

172

1. Statyba vyko pagal projektą Nr.1395-48, kurį 2007m. parengė UAB "Krašto projektai ir projektai" (kv. atestato Nr.1085, galioja iki 2014-02-27) ir patvirtino nuolatinė statybos komisija 2008-08-20 protokalu Nr. 147.

2. Leidimas statyti išduotas 2008-09-22, Nr. AT 118-2006NR.

3. Statytojas, adresas: **Viešoji įstaiga Kauno regios atliekų tvarkymo centras j.k.300092998, Statybininkų g. 3-19, Kauno m., Kauno r. sav.;**

4. Statybos ir montavimo darbus atliko: UAB „Luidas" , j.k.122911551, Karčivių g. 7, Vilnius, kvalifikacijos atestato Nr.1141;

subrangovai: AB „Raseinių melioracija", j.k.172203882, Žemaičių g. 30, Ariogalos m., Raseinių r. sav., kvalifikacijos atestato Nr.66;

5.Statyba pradėta 2008 m. rugsėjo mėn.

6.Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Uždengtas atliekų kaupas K	m^2	8 310	Žolės danga
2. Rekultivuota teritorija R-1	m^2	12 170	Žolės danga
3. Rekultivuota teritorija R-2	m^2	1 213	Žolės danga
4. Dujų drenažo sistema D			
4.1. Dujų drenažo šulinys D-1	vnt.	1	d-1000, G/b; h-2 m
4.2 Dujų drenažo vamzdynas D-2	m	58	d-110, plastikas;
5. Grunčinio vandens stebėjimo gręžinys G-1	vnt.	2	d-63, plastikas
6. Faktiška statybos kaina be PVM	tūkst. Lt	408,515	

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nukrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

TIKRA
Aldona Čeplėnienė
2011 m. 173

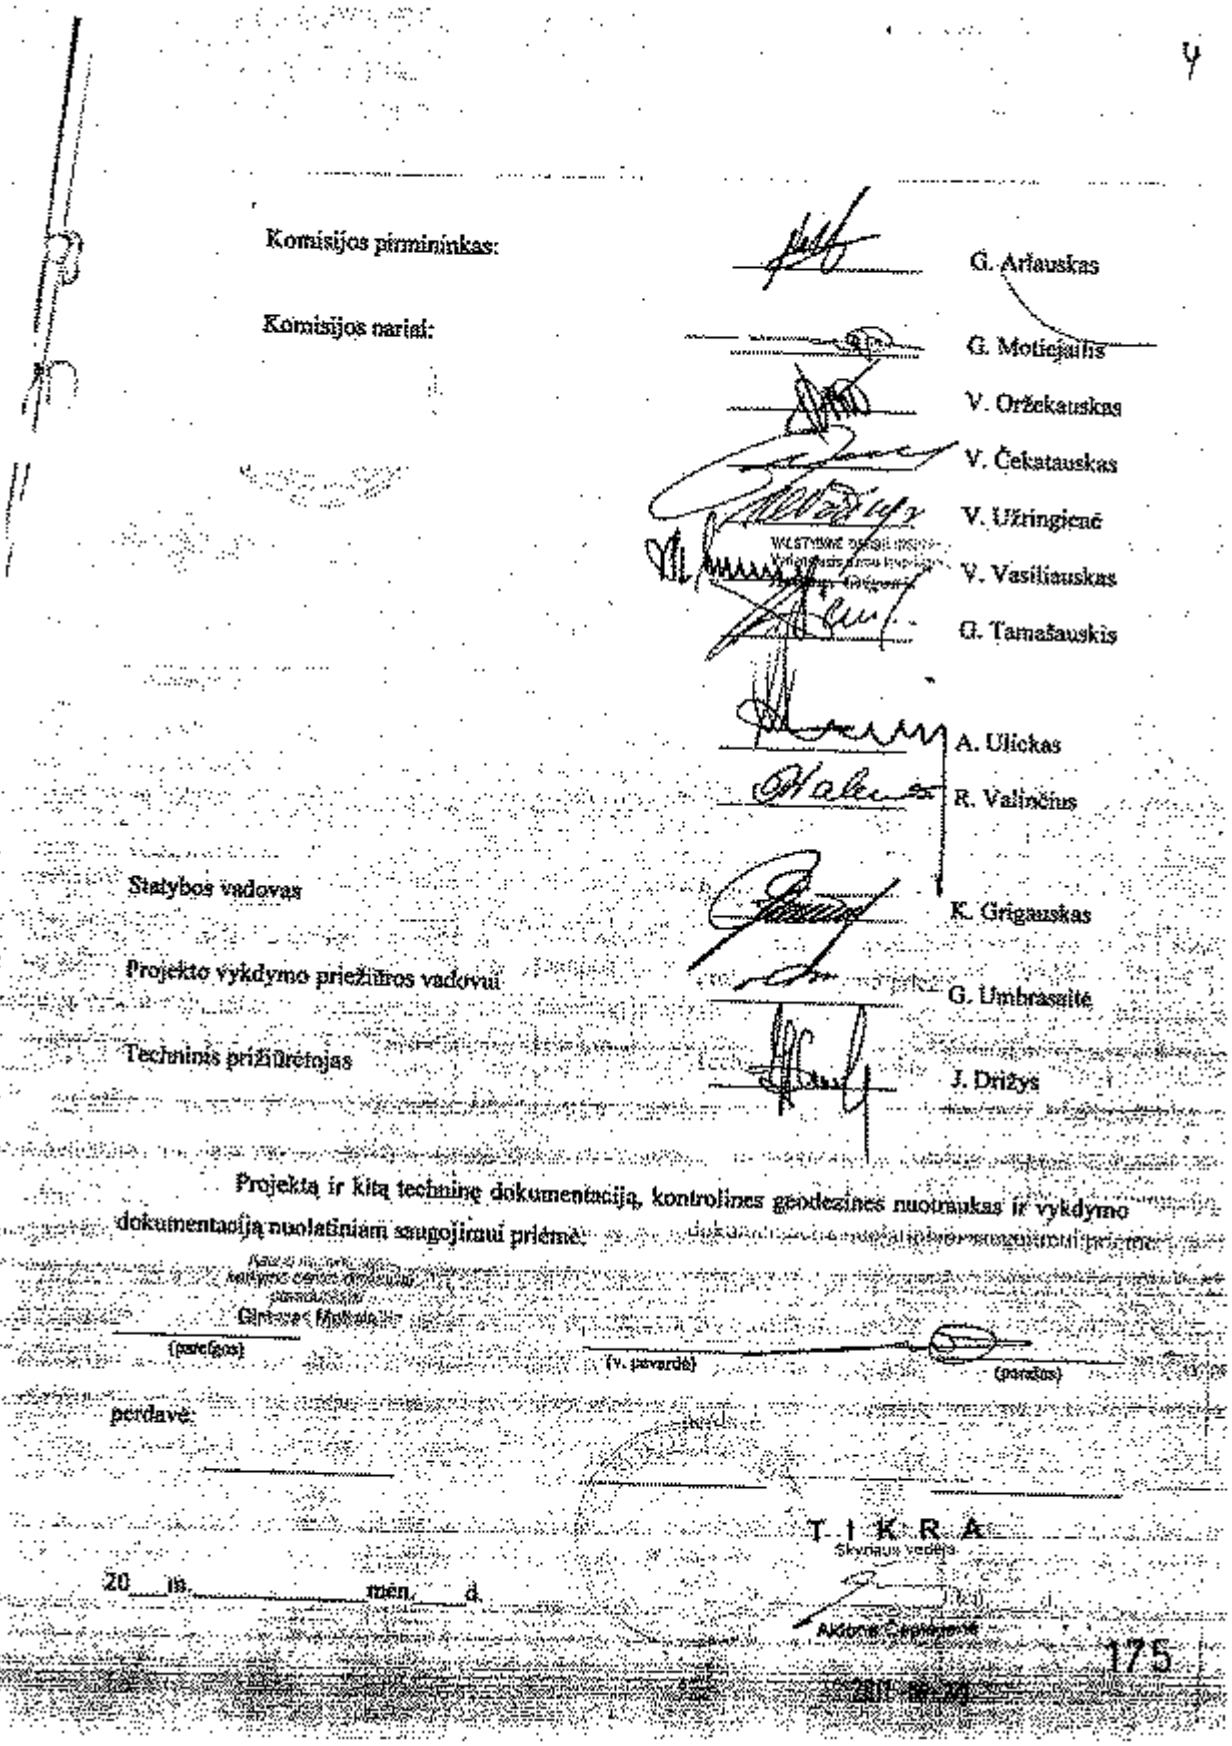

Komisijos pirmininkas: G. Arlauskas

Komisijos nariai: G. Motiejaitis

V. Oržekauskas

V. Čekatauskas

V. Užringienė

V. Vasiliauskas

G. Tamašauskis

A. Ulickas

R. Valinčius

Statybos vadovas K. Grigauskas

Projekto vykdymo priežiūros vadovui G. Umbrasaitė

Techninis prižiūrėtojas J. Drižys

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją nuolatiniam saugojimui priėmė:

(pareigos) (v. pavardė) (parašas)

perdavė:

T. I. K. R. A.

20___m. _____mėn. ___d.

175

Linijinio inžinerinio statinio dalies 110 kV OL „Kaunas-Jonava II" iškeltos iš Lapių savartyno teritorijos, pakeistos kabeline linija, investicinio projekto Nr. FB42002200

pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Kaunas 2008 m. spalio 2 d.

Komisija, paskirta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2008 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 100 šios sudėties:

Komisijos pirmininkas

R. Sadauskas - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Priežiūros skyriaus vyr. inžinierius inspektorius.

Nariai:

J. Valiūnas - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Kauno regiono vyriausiasis specialistas;

E. Katilius - Kauno rajono savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas;

V. Rimas - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros vedėjas;

A. Razma - AB „Lietuvos energija" Įrenginių eksploatacijos skyriaus viršininkas;

N. Ivanickienė - AB „Lietuvos energija" Planavimo ir investicijų skyriaus investicinių projektų vadovė.

Dalyvauja:

Ž. Stankevičius - UAB „Elmonta" direktorius, rangovo atstovas;

V. Damijonaitis - UAB „Elektros tinklų institutas" projekto vadovas;

J. Yla - Viešosios įstaigos Kauno regiono aplinkų tvarkymo centro direktorius;

S. Baužys - AB „Lietuvos energija" Perdavimo tinklo Kauno skyriaus viršininkas;

R. A. Žebrauskas - AB „Lietuvos energija" Perdavimo tinklo Kauno skyriaus Linijų sektoriaus viršininkas, statybos techninis prižiūrėtojas,

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) A. Lubauskas, AB „Elmonta" vyr. inžinieriui, kvalifikacijos atestato Nr. 1539

KOPIJA TIKRA

Aldona Čepaitienė 176

ir techniniam prižiūrėtojams: R.A. Žebrauskui AB „Lietuvos energija" Perdavimo tinklo Kauno skyriaus Linijų sektoriaus viršininkui, kvalifikacijos atestato Nr.10576;

R. Gedvilui AB „Lietuvos energija" Informacinių technologijų ir telekomunikacijų centro Duomenų tinklo skyriaus sektoriaus viršininkui, kv. at. Nr. 6141,

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių priėmimo eksploatuoti tvarka" ir Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2008-10-02 įsakymu Nr.100 apžiūrėjo dalį 110 kV OL „Kaunas-Jonava II" iškeltos iš Lapių savartynų teritorijos, nubiestos kabeline linija, patikrino jos statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko: pagal projektą Nr.23987/1, kurį parengė UAB „Energetikos tinklų institutas" ir patvirtino AB „Lietuvos energija" tinklo direktorius 2007-09-08 nurodymu Nr.146.

2. Leidimas statyti išduotas: 2007 m. rugsėjo 10 d. Nr. 40.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: AB „Lietuvos energija", Žvejų g. 14, Vilnius.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas AB „Elmonta" statybos ir montavimo, derinimo, paleidimo darbai, įmonės kodas 2221776, kvalifikacijos atestato Nr.0773.

5. Statyba pradėta 2008 m. birželio 16 d. ir baigta 2008 m. rugsėjo 30d.

6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos (tipas, galia)
- 110 kV oro linijos kabelinio intarpo ilgis	m	1203,91	110 kV kabelis 2XSFB MK 1x 500/95
- 110 kV kabelių linijos grandžių skaičius	vnt.	1	
- Galinė kabelių mova 110 kV kabelinius	vnt.	6	OHVT-145C
- Inkarinė-kampinė 110 kV linijos atrama	komplekt.	1	UI10-1+5
- Tarpinė 110 kV linijos atrama	komplekt.	1	UI10-1+9
- Viršįtampių ribotuvai	vnt.	6	3P3HSRC102
Statybos kaina (be PVM):			
Sąmatinė statybos kaina	Lt	4 200 172,88	
Sutartinė statybos kaina	Lt	4 051 580,00	
Faktiška statybos kaina (be PVM)	Lt	3 860 963,27	
iš to skaičiaus:			
projektavimo ir inžinerinės paslaugos	Lt	55 000,00	
įrenginiai	Lt	1 876 303,06	
statybos montavimo darbai	Lt	1 929 660,21	

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

KOPIJA TIKRA

177

Aktoriaus [illegible]

2008-10-13

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nukrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderintos ir pažymėtos pateiktuose techniniuose dokumentuose.

Komisija pripažįsta, kad dalis 110 kV OL „Kaunas–Jonava II" iškaitos iš Lapių savastyno teritorijos, pakeistos kabelinę liniją **tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.**

10. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 10 bylų.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai, protokolai su aprašu, 119 lapų.

Komisijos pirmininkas: K. Sadauskas

Komisijos nariai: J. Valiūnas

E. Katilius

V. Rimas

A. Razma

N. Ivanickienė

Dalyvauja: J. Stankauskas

V. Damijonaitis

I. Yla

S. Baužys

Rimas Aluzas Žebrauskas

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

Priėmė: [illegible] (parašas, v.pavardė, paraša)

Perdavė: [illegible] (parašas, v.pavardė, paraša)

2008 m. spalio mėn. 10 d.

TIKRA

KOPIJA TIKRA

178

2011-06-23

Energetikos inžinerinių statinių 0,4-10kV kabelinių linijų naujai nutiestų iš MT- Sg-442, 465 ir jų elektros įrenginių Lopšiškių k.

pripažinimo tinkamais naudoti

AKTAS

Kaunas (vietovė) 200 7 m. 04 mėn. 23 d.

Komisija paskirta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno (institucijos pavadinimas, potvarkio data ir Nr.) teritorinio skyriaus vedėjo , potvarkiu 2008 m. gegužės 19 d. Nr. 13-14

Šios sudėties:

Komisijos pirmininkas:

Rimantas Paliokas (v.pavardė) VEI Kauno teritorinio skyriaus vyresn. inžinierius -inspektorius (atstovo pareigos)

Nariai:

Saulius Alekna (vardas, pavardė) statytojo atstovas Akcinė bendrovė „VST" Kauno m. skyriaus viršininkas (pareigos)

Aurelijus Šukys statytojo atstovas- Elektros tinklo tarnybos Kauno reg Techninio skyriaus inžinierius a/n 131446

Jonas Pranukevičius techninis prižiūrintysis- Akcinė bendrovė „VST" Kauno m. sk. vyr. inžinierius, a/n 2785

Rimantas Kudirka rangovas UAB „Apšvietimas" darbų vadovas (vardas, pavardė,rangovo/subrangovo pavadinimas, atstovo pareigos,)

vadovaudamiesi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo:

10kV kabelių linijų naujai nutiestų iš MT Sg-442, 465 į 10 kV OL L-400 „Lapės" iš Sargėnų TP ir 10 kV OL L-800 iš Sargėnų TP

patikrino jų techninę bei montavimo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą kurį parengė:

UAB Krašto projektai ir partneriai, a/n 1085 , projekto vadovas V.Eckatauskas a/n 12872 (projektavimo įmonės pavadinimas)

2. Patvirtino Akcinė bendrovė „VST" Elektros tinklo tarnyba Kauno regiono vadovas (įmonė)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas Akcinė bendrovė „VST", Jasiuskio g.16c, Vilnius (įmonė)

4. Rangovas UAB"Apšvietimas", Vytauto g. 202a Telelių k. Garliavos sen. Kauno r.

5. Statyba pradėta 2008 m. lapkričio mėn. statybos leidimas Nr.

6. Pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai: I70701020798; I70720020055 R-08-10220-1708

Aldona Čepėlienė

2008-08-29 179

Pavadinimas	Charakteristika (tipas, galia)	Mato vnt.	Kiekis
Modulinė transformatorinė	MT-Sg-442	vnt	1
Galios transformatorius	TMG-250 kVA	vnt	1
Modulinė transformatorinė	MT-Sg-465	vnt	1
Galios transformatorius	TMG-160 kVA	vnt	1
10 kV KL MT Sg 442-MT 465;	AHXAMK-W-3x150+35	km	0.973
10 kV KL MT Sg 442-MT 424	AHXAMK-W-3x150+35	km	0.729
10 kV KL MT Sg 465- MT Sg 425	AHXAMK-W-3x150+35	km	0.848
10 kV KL MT Sg 465- MT Sg 811	AHXAMK-W-3x150+35	km	0.906
0,4kV KL (JAS- 2;)	AXMK-1-4x95	m	10
0,4kV KL (JAS- 1;)	AXMK-1-4x70	m	10

Faktiška statinio kaina 354940,- Lt

7. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų, EĮŠT ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

8. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atlikti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas
Žemės darbai atstatyti			

9. Komisija pripažįsta, kad, 10kV kabelių linijų naujai nutiestų iš MT Sg-442, 465 į 10 kV OL L-400 „Lapės" iš Sargėnų TP ir 10 kV OL L-800 iš Sargėnų TP ir jų elektros įrenginiai, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Elektros įrenginių garantinis laikas 5 metai ir požeminių 10 metų.

Priedai:

1. Projektas — 1 vnt.
2. Statybos darbų žurnalas — 1 vnt.
3. Objekto geodezinė nuotrauka — 1 vnt.

Komisijos pirmininkas: Marius Paliokas — (parašas) — (vardas, pavardė)

Komisijos nariai: S. Alekna — (parašas) — (vardas, pavardė)

A. Šukys

J. Pramkevičius

R. Kudirka

Techninė dokumentacija priimta saugoti Viešinė bendrovė „VST" Kauno m. skyriuje. KOPIJA TIKRA

Perdavė _____ (pareigos, vardas pavardė, parašas)

Priėmė Andrius Oleinikas, Kauno miesto skyriaus inžinierius

T I K R A

Priedas 2.3.4

PROJEKTAS:	**KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS. ZABIELIŠKIO REGIONINIO SĄVARTYNO, PRIVAŽIAVIMO KELIO, KOMPOSTAVIMO, STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ PERDIRBIMO AIKŠTELIŲ STATYBA.**
SUTARTIES NR.:	**A/2007/K/32**
UŽSAKOVAS:	**VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:	**APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA**
RANGOVAS:	**UAB "KAMESTA"**
INŽINIERIUS:	**UAB "SWECO LIETUVA"**

DARBŲ PERĖMIMO PAŽYMA

Vadovaudamiesi Rangovo – UAB "Kamesta" – 2009-06-22 raštu Nr. 1293, 2009-06-25 pasirašytu objekto perdavimo – priėmimo aktu ir FIDIC *Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygų ("Raudonoji knyga", 2002, pirmas lietuviškas leidimas)* 10.1 papunkčiu "Darbų ir Grupių perėmimas", pažymime, kad Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statybos darbai, numatyti sutartyje Nr. A/2007/K/32, baigti 2009 m. birželio mėn. 25 d.

Rangovas Darbus perdavė:	**Užsakovas Darbus priėmė:**	**Inžinierius patvirtino:**
Egidijus Kevalaitis	**Kęstutis Balčiūnas**	**Virginijus Kriščiūnas**
UAB "Kamesta" techninis direktorius	**VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras direktorius**	**UAB "Sweco Lietuva" Statybų techninės priežiūros skyriaus vadovas**
UAB „Kamesta" Techninis direktorius Egidijus Kevalaitis		
.....	.....	.....
Data:	**Data:**	**Data: 2009-07-09**

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011 -08- 23

181

Priedas 2.3.2

PROJEKTAS:	**KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS. LAPIŲ REGIONINIO SĄVARTYNO STATYBA**
SUTARTIES NR.:	**A/2007/K/37**
UŽSAKOVAS:	**VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:	**APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA**
RANGOVAS:	**UAB "SIENOJUS"**
INŽINIERIUS:	**UAB "SWECO BKG LSPI"**

DARBŲ GRUPĖS PERĖMIMO PAŽYMA

Vadovaudamiesi Rangovo – UAB "Sienojus" – 2009-05-06 raštu Nr. 10 ir FIDIC *Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygų ("Raudonoji knyga", 2002, pirmas lietuviškas leidimas)* 10.1 papunkčiu "Darbų ir Grupių perėmimas", pažymime, kad Lapių regioninio sąvartyno 2-os grupės arba III-ojo etapo objektų statybos darbai, numatyti sutartyje Nr. A/2007/K/37, baigti 2009 m. gegužės mėn. 8 d.

Rangovas Darbus perdavė:	**Užsakovas Darbus priėmė:**	**Inžinieriaus patvirtinta:**
Arūnas Zinkevičius	**Kęstutis Balčiūnas**	**Virginijus Kriščiūnas**
UAB "Sienojus" direktorius	**VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras direktorius**	**UAB "SWECO BKG LSPI" projekto vadovas**
Data: 2009-05-08	**Data: 2009-05-08**	**Data: 2009-05-08**

TIKRA
tikrojo vadėja
Aldona Čaplajienė
2011-06-23

182

priedas 2.3.2

PROJEKTAS:	KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS. LAPIŲ REGIONINIO SĄVARTYNO STATYBA
SUTARTIES NR.:	A/2007/K/37
UŽSAKOVAS:	VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:	APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
RANGOVAS:	UAB "SIENOJUS"
INŽINIERIUS:	UAB "SWECO LIETUVA"

DARBŲ PERĖMIMO PAŽYMA

Vadovaudamiesi Rangovo – UAB "Sienojus" – 2009-12-16 raštu Nr. 1048, 2008-09-11, 2008-10-06, 2009-07-01 ir 2009-12-24 pasirašytais statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktais bei FIDIC *Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygų ("Raudonoji knyga", 2002, pirmas lietuviškas leidimas)* 10.1 papunkčiu "Darbų ir Grupių perėmimas", pažymime, kad Lapių regioninio sąvartyno statybos darbai, numatyti sutartyje Nr. A/2007/K/37, baigti 2009 m. gruodžio mėn. 24 d.

Rangovas Darbus perdavė:	Užsakovas Darbus priėmė:	Inžinieriaus patvirtinta:
Artūras Zinkevičius	Kęstutis Balčiūnas	Virginijus Krikščiūnas
UAB "Sienojus" direktorius	VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras direktorius	UAB "Sweco Lietuva" Statybų priežiūros skyriaus vadovas
Data: 2010-01-04	Data: 2010-01-12	Data: 2010-01-04

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

183

Priedas Nr. 33

PROJEKTAS:	**KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS: ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELIŲ STATYBA.**
SUTARTIES NR.:	**A/2007/K/38**
UŽSAKOVAS:	**VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:	**APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA**
RANGOVAS:	**AB "RASEINIŲ MELIORACIJA"**
INŽINIERIUS:	**UAB "SWECO LIETUVA"**

DARBŲ DALIES PERĖMIMO PAŽYMA

Vadovaudamiesi Rangovo – AB "Raseinių melioracija" 2010-09-28 raštu Nr. 1-3-435, Užsakovo - VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2010-10-05 raštu Nr. 365, atliekų priėmimo aikštelių Andrušaičių k. Raseinių raj., Jonalaukio k. Jonavos raj., Vytauto Didžiojo g. 136 Kaišiadorių m., J. Basanavičiaus g. Kėdainių m. ir Nemajūnų g. 15b Kaune m. pripažinimo tinkamomis naudoti aktais ir FIDIC *Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygų ("Raudonoji knyga", 2002, pirmas lietuviškas leidimas)* 10.2 poskyriumi "Darbų dalių perėmimas", pažymime, kad anksčiau įvardintų Kauno regiono atliekų priėmimo aikštelių (5 vnt.) statybos darbai, numatyti rangos sutartyje Nr. A/2007/K/38, baigti 2010 m. spalio mėn. 5 d.

Rangovas Darbus perdavė:	**Užsakovas Darbus priėmė:**	**Inžinierius patvirtino:**
Ramūnas Norcika	**Kęstutis Balčiūnas**	**Virginijus Kriščiūnas**
AB "Raseinių melioracija" Generalinis direktorius	**VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras direktorius**	**UAB "Sweco Lietuva" Statybų priežiūros skyriaus vadovas**
Data: 2010-10-07	**Data: 2010-10-07**	**Data: 2010-10-07**

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

184

Priedas 2.3.4

PROJEKTAS:	**NR. 2004/LT/16C/PE/001. KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS.**
SUTARTIES NR.:	**A/2007/K/40**
UŽSAKOVAS:	**VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**
PERKANČIOJI / ĮGYVENDINANČIOJI ORGANIZACIJA:	**APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA**
RANGOVAS:	**UAB "LUIDAS"**
INŽINIERIUS:	**UAB "SWECO LIETUVA"**

DARBŲ PERĖMIMO PAŽYMA

Vadovaudamiesi Rangovo – UAB "Luidas" 2010-06-21 raštu Nr. 3.9-10-297 ir 2010-04-06 ÷ 2010-06-19 pasirašytais statinių priėmimo tinkamais naudoti aktais bei FIDIC *Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygų ("Raudonoji knyga", 2002, pirmas lietuviškas leidimas)* 10.1 papunkčiu "Darbų ir Grupių perėmimas", pažyminu, kad Kauno regiono sąvartynų uždarymo (statybos) darbai, numatyti sutartyje Nr. A/2007/K/40, baigti 2010 m. birželio mėn. 19 d.

Rangovas Darbus perdavė:	**Užsakovas Darbus priėmė:**	**Inžinieriaus patvirtinta:**
Gintaras Vėlyvis	**Kęstutis Balčiūnas**	**Virginijus Kriščiūnas**
UAB "Luidas" techninis direktorius	**VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras direktorius**	**UAB "Sweco Lietuva" Statybų priežiūros skyriaus vadovas**
Data: 2010 06 28	**Data:** 2010-07-01	**Data: 2010-06-22**

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čopiėjienė
2011 -06- 23

185

priedas 2.3.5

PROJEKTAS:	**KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS: ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELIŲ STATYBA.**
SUTARTIES NR.:	**A/2007/K/38**
UŽSAKOVAS:	**VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:	**APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA**
RANGOVAS:	**AB "RASEINIŲ MELIORACIJA"**
INŽINERIUS:	**UAB "SWECO LIETUVA"**

DARBŲ DALIES PERĖMIMO PAŽYMA

Vadovaudamiesi Rangovo – AB "Raseinių melioracija" 2011-02-02 raštu Nr. 1-3-42, atliekų priėmimo aikštelės Raudondvario pl. 155D Kauno m. 2011-01-07 statybos užbaigimo aktu Nr. (15.34)-8UA-29 ir FIDIC *Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygų ("Raudonoji knyga", 2003, pirmas lietuviškas leidimas)* 10.2 poskyriu "Darbų dalių perėmimas", pažymime, kad aukščiau paminėtos atliekų priėmimo aikštelės statybos darbai, numatyti rangos sutartyje Nr. A/2007/K/38, baigti 2011 m. sausio mėn. 7 d.

Rangovas Darbus perdavė:	**Užsakovas Darbus priėmė:**	**Inžinieriaus patvirtinta:**
Ričardas Valinčius	**Kęstutis Balčiūnas**	**Virginijus Kriščiūnas**
AB "Raseinių melioracija" statybos direktorius	**VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras direktorius**	**UAB "Sweco Lietuva" Statybų priežiūros skyriaus vadovas**
		UAB „Sweco Lietuva" Virginijus Kriščiūnas
Data: 2011.02.03	**Data:**	**Data: 2011-02-03**

TIKRA
Aidona Ceplėjienė
2011-06-23 186

Puilda 2.9.1

PROJEKTAS:	KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS. ZABIELIŠKIO REGIONINIO SĄVARTYNO, PRIVAŽIAVIMO KELIO, KOMPOSTAVIMO, STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ PERDIRBIMO AIKŠTELIŲ STATYBA.
SUTARTIES NR.:	A/2007/Z/32
UŽSAKOVAS:	VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:	APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
RANGOVAS:	UAB "KAMESTA"
INŽINIERIUS:	UAB "SWECO LIETUVA"

ATLIKIMO PAŽYMA

Vadovaudamiesi sutarties Nr. A/2007/Z/32 Bendrųjų sąlygų arba FIDIC *Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygų ("Raudonoji knyga", 2002, pirmas lietuviškas leidimas)* papunkčiu 11.9 "Atlikimo pažyma" ir pasibaigus Pranešimo apie defektus laikui, nustatytam Rangovo Pasiūlymo priede (p. 1.1.3.7), pažymime, kad Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statybos Rangovas - UAB „Kamesta" 2010 m. liepos mėn. 16 d. baigė vykdyti sutartyje Nr. A/2007/Z/32 numatytas prievoles.

FIDIC Inžinieriaus vardu:

Virgilijus Krščiūnas

UAB "Sweco Lietuva"
Statybų techninės priežiūros
skyriaus vadovas

UAB „Sweco Lietuva"
FIDIC inžinierius
Virgilijus Krščiūnas

Data: 2010-07-21

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepidienė
2011-08-23

187

Administracijos direktorius
Kęstutis Balčiūnas 2.4.2

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, 57388 Kėdainiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545.
Seniūnijos duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, V. Kontevičiaus g. 3, Pelėdnagių k., 58160 Kėdainių r.,
tel. (8 347) 67 601, faksas (8 347) 67 612, el. p. pelednagiu.seniunija@kedainiai.lt, filialo kodas 188609697

Notarų biurui

PAŽYMA
APIE DEKLARAVUSIUS GYVENAMĄJĄ VIETĄ

2010-11-18 Nr. 17-1311

Pažymime, kad gyvenamajame name (unik.Nr.5393-9012-1018), esančiame adresu: Kėdainių r.sav., Pelėdnagių sen., Zabieliškio k., nėra savo gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų.

Buvusios gyvenamojo namo savininkės D.Danauskienės šeima pakeitė deklaruotą gyvenamąją vietą.

Vyriausioji specialistė Laimutė Lukoševičienė

Laimutė Lukoševičienė (8 347) 67601 el. paštas: laimute.lukosevicience@kedainiai.lt

ĮTEIKTA
Siunčiama vežėjui
Aldona Čepėjienė 186
2011-06-23

Priedas 2.4.3

PROJEKTAS:	**KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS. LAPIŲ REGIONINIO SĄVARTYNO STATYBA**
SUTARTIES NR.:	**A/2007/K/37**
UŽSAKOVAS:	**VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:	**APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA**
RANGOVAS:	**UAB "SIENOJUS"**
INŽINIERIUS:	**UAB "SWECO LIETUVA"**

ATLIKIMO PAŽYMA

Vadovaudamiesi sutarties Nr. A/2007/K/37 Bendrųjų sąlygų arba FIDIC *Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygų ("Raudonoji knyga", 2003, pirmas lietuviškas leidimas)* papunkčiu 11.9 "Atlikimo pažyma" ir Rangovui ištaisius visus statybos defektus bei atsižvelgiant į Užsakovo 2010-12-10 raštu Nr. 447 išdėstytas aplinkybes ir Užsakovui sutikus, pažymime, kad Lapių regioninio sąvartyno statybos Rangovas - UAB „Sienojus" 2010 m. gruodžio mėn. 10 d. baigė vykdyti sutartyje Nr. A/2007/K/37 numatytas prievoles.

FIDIC Inžinieriaus vardu:

Virginijus Kriščiūnas

UAB "Sweco Lietuva"
Statybų priežiūros skyriaus
vadovas

UAB „Sweco Lietuva"
FIDIC inžinierius
Virginijus Kriščiūnas

.....

Data: 2010-12-10

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepliejienė

2011-08-23 189

PRIEDAS 2.5.1

Statistikos departamento ataskaita „Gyventojų skaičius, natūrali kaita apskrityse ir savivaldybėse“[1]

	Gyventojų skaičius, metų pradžioje	Gimusiųjų skaičius	Mirusiųjų skaičius	Natūrali kaita (prieaugis/ sumažėjimas)
	2011	2010		
Iš viso	**3244929**[2]	**35948**	**42114**	**-6166**
Miestas	2172074	25856	25127	729
Kaimas	1072435	10092	16987	-6895
Alytaus apskritis	**167262**	**1596**	**2405**	**-809**
Miestas	98142	989	1098	-109
Kaimas	69120	607	1307	-700
Alytaus m. sav.	**63651**	**610**	**606**	**4**
Alytaus r. sav.	**29898**	**296**	**482**	**-186**
Miestas	2991	45	48	-3
Daugai	1343	28	25	3
Simnas	1648	17	23	-6
Kaimas	26907	251	434	-183
Druskininkų sav.	**23300**	**226**	**314**	**-88**
Druskininkai	15547	163	209	-46
Kaimas	7753	63	105	-42
Lazdijų r. sav.	**23699**	**231**	**464**	**-233**
Miestas	6182	67	106	-39
Lazdijai	4697	61	82	-21
Veisiejai	1485	6	24	-18
Kaimas	17517	164	358	-194
Varėnos r. sav.	**26714**	**233**	**539**	**-306**
Miestas	9771	104	129	-25
Varėna	9771	104	129	-25
Kaimas	16943	129	410	-281
Kauno apskritis	**647509**	**7250**	**8252**	**-1002**
Miestas	459632	5416	5563	-147
Kaimas	187877	1834	2689	-855
Birštono sav.	**5094**	**53**	**77**	**-24**
Birštonas	3074	36	39	-3
Kaimas	2020	17	38	-21
Jonavos r. sav.	**50104**	**534**	**595**	**-61**
Miestas	33178	365	359	6
Jonava	33178	365	359	6
Kaimas	16926	169	236	-67
Kaišiadorių r. sav.	**34502**	**360**	**560**	**-200**
Miestas	13042	166	170	-4
Kaišiadorys	9395	116	118	-2
Žiežmariai	3647	50	52	-2
Kaimas	21460	194	390	-196
Kauno m. sav.	**336817**	**3976**	**4023**	**-47**
Kauno r. sav.	**89258**	**1103**	**935**	**168**

KOPIJA
Atitinka vertoją
Aldona Čepėlienė
05
2011-05-23

2

Miestas	17116	260	184	76
Ežerėlis	1889	23	37	-14
Garliava	12938	117	121	-4
Vilkija	2289	120	26	94
Kaimas	72142	843	751	92
Kėdainių r. sav.	**60206**	**613**	**861**	**-248**
Miestas	29850	342	354	-12
Kėdainiai	29850	342	354	-12
Kaimas	30356	271	507	-236
Prienų r. sav.	**32052**	**277**	**553**	**-276**
Miestas	11723	128	192	-64
Jieznas	1234	8	25	-17
Prienai	10489	120	167	-47
Kaimas	20329	149	361	-212
Raseinių r. sav.	**39476**	**334**	**648**	**-314**
Miestas	14832	143	242	-99
Ariogala	3188	12	56	-44
Raseiniai	11644	131	186	-55
Kaimas	24644	191	406	-215
Klaipėdos apskritis	**366935**	**4333**	**4362**	**-29**
Miestas	265982	3282	2948	334
Kaimas	100953	1051	1414	-363
Klaipėdos m. sav.	**177823**	**2142**	**1954**	**188**
Klaipėdos r. sav.	**51639**	**673**	**589**	**84**
Miestas	17908	267	175	92
Gargždai	16314	249	167	82
Priekulė	1594	18	8	10
Kaimas	33731	406	414	-8
Kretingos r. sav.	**44032**	**538**	**584**	**-46**
Miestas	22490	310	261	49
Kretinga	20776	291	235	56
Salantai	1714	19	26	-7
Kaimas	21542	228	323	-95
Neringos sav.	**3846**	**51**	**43**	**8**
Palangos m. sav.	**17244**	**190**	**202**	**-12**
Skuodo r. sav.	**22469**	**219**	**361**	**-142**
Miestas	6920	94	98	-4
Skuodas	6920	94	98	-4
Kaimas	15549	125	263	-138
Šilutės r. sav.	**49882**	**520**	**629**	**-109**
Miestas	19751	228	215	13
Šilutė	19751	228	215	13
Kaimas	30131	292	414	-122
Marijampolės apskritis	**173686**	**1793**	**2346**	**-553**
Miestas	85799	962	1090	-128
Kaimas	87887	831	1256	-425
Kalvarijos sav.	**12899**	**149**	**191**	**-42**
Miestas	4811	56	80	-24
Kalvarija	4811	56	80	-24
Kaimas	8088	93	111	-18
Kazlų Rūdos sav.	**13816**	**156**	**199**	**-43**
Miestas	6658	80	101	-21

T I K R A
Skaitės vedėja
Aldona Čepinėjienė
2011-06-23

Kazlų Rūda	6658	80	101	-21
Kaimas	7158	76	98	-22
Marijampolės sav.	**66467**	**708**	**792**	**-84**
Marijampolė	44910	510	505	5
Kaimas	21557	198	287	-89
Šakių r. sav.	**34644**	**319**	**525**	**-215**
Miestas	9985	110	145	-35
Gelgaudiškis	1824	13	23	-10
Kudirkos Naumiestis	1875	7	45	-38
Šakiai	6286	90	77	13
Kaimas	24659	200	380	-180
Vilkaviškio r. sav.	**45860**	**470**	**639**	**-169**
Miestas	19435	206	259	-53
Kybartai	5797	40	82	-42
Vilkaviškis	12483	153	151	2
Virbalis	1155	13	26	-13
Kaimas	26425	264	380	-116
Panevėžio apskritis	**270798**	**2466**	**3842**	**-1376**
Miestas	160769	1541	1990	-449
Kaimas	110029	925	1852	-927
Biržų r. sav.	**31052**	**258**	**540**	**-282**
Miestas	14852	132	251	-119
Biržai	13780	126	231	-105
Vabalninkas	1072	6	20	-14
Kaimas	16200	126	289	-163
Kupiškio r. sav.	**21692**	**173**	**367**	**-194**
Miestas	8869	86	128	-42
Kupiškis	7833	79	102	-23
Subačius	1036	7	26	-19
Kaimas	12823	87	239	-152
Panevėžio m. sav.	**109034**	**996**	**1237**	**-241**
Panevėžio r. sav.	**41292**	**419**	**610**	**-191**
Miestas	1645	57	23	34
Ramygala	1645	57	23	34
Kaimas	39647	362	587	-225
Pasvalio r. sav.	**30863**	**294**	**499**	**-205**
Miestas	9315	113	124	-11
Joniškėlis	1318	9	30	-21
Pasvalys	7997	104	94	10
Kaimas	21548	181	375	-194
Rokiškio r. sav.	**36865**	**326**	**589**	**-263**
Miestas	17054	157	227	-70
Obeliai	1204	9	20	-11
Pandėlys	903	3	16	-13
Rokiškis	14947	145	191	-46
Kaimas	19811	169	362	-193
Šiaulių apskritis	**329063**	**3302**	**4478**	**-1176**
Miestas	203770	2187	2602	-415
Kaimas	125293	1115	1876	-761
Akmenės r. sav.	**25729**	**249**	**383**	**-134**
Miestas	15967	163	248	-85
Akmenė	2491	16	27	-11

TIKRA
Aldona Čeplėjienė
2011 -08- 29

4

Naujoji Akmenė	10733	122	173	-51
Venta	2743	25	48	-23
Kaimas	9762	86	135	-49
Joniškio r. sav.	**28266**	**259**	**424**	**-165**
Miestas	12293	125	173	-48
Joniškis	10312	111	141	-30
Žagarė	1981	14	32	-18
Kaimas	15973	134	251	-117
Kelmės r. sav.	**35570**	**339**	**565**	**-226**
Miestas	13288	140	187	-47
Kelmė[3]	9984	115	125	-10
Tytuvėnai	2516	18	41	-23
Užventis	788	7	21	-14
Kaimas[3]	22282	199	378	-179
Pakruojo r. sav.	**25740**	**245**	**372**	**-127**
Miestas	7139	83	102	-19
Linkuva	1679	13	39	-26
Pakruojis	5460	70	63	7
Kaimas	18601	162	270	-108
Radviliškio r. sav.	**45772**	**462**	**742**	**-280**
Miestas	21428	238	350	-112
Radviliškis	18453	209	285	-76
Šeduva	2975	29	65	-36
Kaimas	24344	224	392	-168
Šiaulių m. sav.	**120934**	**1319**	**1371**	**-52**
Šiaulių r. sav.	**47052**	**429**	**621**	**-192**
Miestas	12721	119	171	-52
Kuršėnai	12721	119	171	-52
Kaimas	34331	310	450	-140
Tauragės apskritis	**120692**	**1204**	**1763**	**-559**
Miestas	49584	510	666	-156
Kaimas	71108	694	1097	-403
Jurbarko r. sav.	**33074**	**285**	**551**	**-266**
Miestas	13079	116	185	-69
Jurbarkas	12510	108	167	-59
Smalininkai	569	8	18	-10
Kaimas	19995	169	366	-197
Pagėgių sav.	**10743**	**127**	**166**	**-39**
Miestas	2403	31	51	-20
Pagėgiai	2108	29	41	-12
Panemunė	295	2	10	-8
Kaimas	8340	96	115	-19
Šilalės r. sav.	**28703**	**325**	**374**	**-49**
Miestas	5843	93	63	30
Šilalė	5843	93	63	30
Kaimas	22860	232	311	-79
Tauragės r. sav.	**48172**	**467**	**672**	**-205**
Miestas	28239	270	367	-97
Skaudvilė	1815	12	37	-25
Tauragė	26444	258	330	-72
Kaimas	19913	197	305	-108
Telšių apskritis	**166312**	**1816**	**1963**	**-147**

K O P I J A
Skyriaus vedėjo
Aldonos Čepulienės
2011 . 06 . 23

5

Miestas	98386	1147	1050	97
Kaimas	67936	669	913	-244
Mažeikių r. sav.	**62518**	**740**	**699**	**41**
Miestas	42084	519	417	102
Mažeikiai	38840	485	376	109
Seda	1129	13	13	0
Viekšniai	2115	21	28	-7
Kaimas	20434	221	282	-61
Plungės r. sav.	**41798**	**470**	**488**	**-18**
Miestas	22311	296	222	74
Plungė	22311	296	222	74
Kaimas	19487	174	266	-92
Rietavo sav.	**9581**	**83**	**144**	**-61**
Miestas	3727	24	74	-50
Rietavas	3727	24	74	-50
Kaimas	5854	59	70	-11
Telšių r. sav.	**52425**	**523**	**632**	**-109**
Miestas	30264	308	337	-29
Telšiai	29119	299	309	-10
Varniai	1145	9	28	-19
Kaimas	22161	215	295	-80
Utenos apskritis	**163351**	**1371**	**2686**	**-1315**
Miestas	92130	813	1044	-231
Kaimas	71221	558	1642	-1084
Anykščių r. sav.	**30279**	**241**	**574**	**-333**
Miestas	12538	101	178	-77
Anykščiai	11400	96	151	-55
Kavarskas	664	5	17	-12
Troškūnai	474		10	-10
Kaimas	17741	140	396	-256
Ignalinos r. sav.	**18886**	**136**	**414**	**-278**
Miestas	6747	57	106	-49
Dūkštas	908	2	18	-16
Ignalina	5839	55	88	-33
Kaimas	12139	79	308	-229
Molėtų r. sav.	**21999**	**191**	**411**	**-220**
Miestas	6771	66	59	7
Molėtai	6771	66	59	7
Kaimas	15228	125	352	-227
Utenos r. sav.	**45747**	**371**	**643**	**-272**
Miestas	31142	250	308	-58
Utena	31142	250	308	-58
Kaimas	14605	121	335	-214
Visagino sav.	**27311**	**275**	**249**	**26**
Visaginas	26805	273	237	36
Kaimas	306	2	12	-10
Zarasų r. sav.	**19329**	**157**	**395**	**-238**
Miestas	8127	66	156	-90
Dusetos	778	1	15	-14
Zarasai	7349	65	141	-76
Kaimas	11202	91	239	-148
Vilniaus apskritis	**838891**	**10817**	**10017**	**800**

KOPIJA
Atitinka pateiktą dokumentą
Aldona Čeplėjienė
2011-05-23

6

Miestas	657880	9009	7076	1933
Kaimas	181011	1808	2941	-1133
Elektrėnų sav.	**26914**	**259**	**420**	**-161**
Miestas	18116	190	239	-49
Elektrėnai	13248	135	167	-32
Vievis	4868	55	72	-17
Kaimas	8798	69	181	-112
Šalčininkų r. sav.	**36320**	**389**	**639**	**-250**
Miestas	10926	147	141	6
Baltoji Vokė	1046	9	18	-9
Eišiškės	3478	38	54	-16
Šalčininkai	6402	100	69	31
Kaimas	25394	242	498	-256
Širvintų r. sav.	**18138**	**172**	**309**	**-137**
Miestas	6654	76	82	-6
Širvintos	6654	76	82	-6
Kaimas	11484	96	227	-131
Švenčionių r. sav.	**29205**	**237**	**591**	**-354**
Miestas	17424	150	275	-125
Pabradė	5995	38	89	-51
Švenčionėliai	5950	38	98	-60
Švenčionys	5479	74	88	-14
Kaimas	11781	87	316	-229
Trakų r. sav.	**35172**	**392**	**553**	**-161**
Miestas	18852	218	261	-43
Lentvaris	11277	110	146	-36
Rūdiškės	2403	23	25	-2
Trakai	5172	85	90	-5
Kaimas	16320	174	292	-118
Ukmergės r. sav.	**43070**	**383**	**684**	**-301**
Miestas	25886	239	364	-125
Ukmergė	25886	239	364	-125
Kaimas	17184	144	320	-176
Vilniaus m. sav.[4]	**554192**	**7848**	**5648**	**2200**
Miestas	554192	7848	5648	2200
Grigiškės	11121	145	93	52
Vilnius	543071	7703	5555	2148
Vilniaus r. sav.	**95880**	**1137**	**1173**	**-36**
Miestas	5830	141	66	75
Nemenčinė	5830	141	66	75
Kaimas	90050	996	1107	-111

[1] Išankstiniai duomenys.
[3] Remiantis galutiniais gyventojų tarptautinės migracijos statistikos duomenimis, patikslinus (2011-03-09) tik bendras Lietuvos gyventojų skaičius.
[3] Remiantis 2010 kovo mėn. 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 287 dėl Kelmės miesto teritorijos ribų pakeitimo, Kelmės miesto teritorijai priskirti Kelmės rajono Kukečių seniūnijos Paverpenio kaimo teritorijos 250 gyventojų.
[4] Į Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų, gimusių, mirusių skaičių įtraukti ir šios savivaldybės kaimo gyventojai.

ĮTAKA
Raštvedės vardas
Aldona Čepėlienė
2011 -03- 23

priedas 2.5.2

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
KAUNO
REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMAS Nr.6/36

3	0	0	0	9	2	9	9	8

(Objekto kodas)

Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė,
Adresas: J. Basanavičiaus g. 97 A, Kėdainiai
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“,
Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124, tel. 837 311267, faksas 837 490734,
el. paštas: info@kaunoratc.lt
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą sudaro ..24...puslapiai.

Išduotas 2009.m..liepos 2d.

A.V.

Direktorius pavaduotojas, ... Alfredas Vaišnoras
pavaduojantis direktorių (parašas) (Vardas, pavardė)

Šio leidimo parengti ...4... egzemplioriai.

Paraiška TIPK leidimui gauti suderinta su:

Kėdainių rajono savivaldybe 2009-03-09
(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

Koreguotas .....m.....d.

A.V.

Direktorius ....
(Vardas, pavardė) (Parašas)

Pastaba: koreguojant Leidimą, kiekvieną kartą rengiamas naujas Leidimo viršelis.

VALSTYBĖS FINANSŲ KONTROLĖS, KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIEŠTINIŲ INTERESŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čaplėjienė

190

2[illegible]

I. BENDROJI DALIS. DUOMENYS APIE ĮRENGINĮ, ŪKINĘ VEIKLĄ, VYKDOMĄ VEIKLOS APLINKOSAUGINĮ VALDYMĄ IR KONTROLĘ

1. Ūkinės veiklos objekto pavadinimas.
Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė.

2. Adresas korespondencijai (jei skiriasi nuo veiklos vykdymo adreso).
J. Basanavičiaus g. 97A, Kėdainiai, LT-57352.

3. Ūkinės veiklos įrenginio vieta, jo valdytojas ir/ar naudotojas. Nurodoma ūkinės veiklos vietos veiklos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų išsidėstymu.

Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė įrengta žemės sklype, esančiame Kėdainių mieste J. Basanavičiaus g. 97A, teritorijoje už automerviso ir antrinių žaliavų bei AB „Panevėžio energija" sklypų. Pagrindinis įvažiavimas į teritoriją yra iš J. Basanavičiaus gatvės. Aikštelės teritorijų iš šiaurinės ir vakarų pusės riboja AB „Panevėžio energija" sklypas, iš pietinės ir pietrytinės pusės nėra jokių sklypų. Apie 350 m į šiaurės vakarus yra J. Basanavičiaus gatvė, apie 600 m į pietvakarius nuo sklypo yra Nevėžio upė. Aikštelei nustatyta 50 m sanitarinė apsaugos zona. Į šią zoną gyvenamieji namai nepatenka.

Atliekų priėmimo aikštelės valdytojas ir vykdytojas yra viešoji įstaiga „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras". VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro registravimo pažymėjimo kopija pateikiama Paraiškos 1 priede.

Atliekų priėmimo aikštelės padėties vietovėje planas pateikiamas 2 priede.

4. Žemės, kurioje vykdoma ūkinė veikla, plotas (ha), teisinis registracijos dokumento numeris, naudotojo ir/ar savininko pavadinimas, pavardė, vardas, adresas.

Sklypas, kuriame įrengta Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė, užima 0,3712 ha plotą. Sklypo kadastro numeris 5333/0003:79, unikalus Nr. 4400-1485-4652. Žemės teisinės registracijos dokumentų kopijos pateikiamos Paraiškos 3 priede. Tiksliai žemės paskirtis - atliekų saugojimo, apdirbimo ir šalinimo teritorijos.

Sklype naudotojas pagal panaudos sutartį Nr. NS3A/8-16 (panaudos 50 metų) yra viešoji įstaiga „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras", Statybininkų g. 3, Kaunas. Sutartis pateikiama Paraiškos 4 priede.

Ūkinę veiklą sklype vykdo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

5. Pastatų, pagalbinių patalpų, kuriose vykdoma ūkinė veikla, savininko ir/ar naudotojo pavadinimas, pavardė, vardas ir adresas.

Visi atliekų priėmimo aikštelės teritorijoje esantys statiniai ir patalpos nuosavybės teise priklauso VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" (toliau – Kauno RATC), Statybininkų g. 3, Kaunas. Teisinės registracijos dokumentai pateikiami Paraiškos 3 priede.

Pastatų ir pagalbinių patalpų išdėstymo schema pateikiama Paraiškos 6 priede.

TIKRA

Aldona Čepaitienė

2011-06-23

3□

6. Darbuotojų skaičius.
Kėdainių atliekų priėmimo aikštelėje dirbs du darbuotojai.

7. Informacija apie ūkinę veiklą:
7.1. ūkinės veiklos rūšis;
Kedainių atliekų priėmimo aikštelėje vykdomas išrūšiuotų atskirų komunalinių atliekų srautų priėmimas ir laikinas saugojimas iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Sutartys su atliekas tvarkančiomis įmonėmis pateikiamos 17 priede.
Aikštelėje surenkamos ir tvarkomos medžios. Pavirtusios medžios valomos vežimėnuose valymo įrenginiuose ir išvežiojamos į Kedainių miesto lietaus nuotekų tinklus. Buitinės nuotekos iš administracinio pastato nuvedamos į Kedainių miesto buitinių nuotekų tinklus ir nukreipiamos valyti į UAB „Kėdainių vandenys" eksploatuojamus miesto nuotekų valymo įrenginius. Sutartis dėl nuotekų tvarkymo pateikiama 18 priede.

7.2. nurodomos įmonėje vykdomos veiklos, kuriems šiaudamas Leidimas. Taisyklių 1 priedo įrenginiuose nurodomi, kuriai ūkinės veiklos rūšiai/rūšims priskirtinas pateikiamas ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie įrenginius, kuriuos šiaudamas Leidimas, projektinį pajėgumą;
Atliekų priėmimo aikštelės veikla priskirtina ūkinės veiklos, nurodytos Taisyklių 1 priede.
Atliekų priėmimo aikštelę eksploatuojančiai įmonei veikla leidimo pagal reikalavimus, nurodytus Taisyklių 2 priedo 9 punkte.

„9. atliekas surenkančios įmonės, kurios eksploatuoja atliekų surinkimo ir laikinojo saugojimo aikšteles ar įrenginius, kuriuose atliekos kaupiamos, rūšiuojamos ar kitaip apdorojamos iki jų perdavimo atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms ir pagal Atliekų tvarkymo įstatymą yra priskirtinos atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms".

Atliekų priėmimo aikštelės projektinis pajėgumas – 553 t atliekų per metus.

7.3. kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginiai priskirtinami prie įrenginių, kuriam eksploatuoti reikalinga gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas, atskirai nurodomi, kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskirtinos šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie to įrenginio projektinį pajėgumą;
Kedainių atliekų priėmimo aikštelė leidimu išmest šiltnamio dujas neturi.

7.4. įrenginiuose, kurių veikloje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir preparatai, pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 16.6 punkte.

Kedainių atliekų priėmimo aikštelė savo šiukšlėje veikloje nenaudoja tirpiklių turinčių medžiagų ir preparatų.

8. Ūkinės veiklos aprašymas. Pateikiama nuoroda į paraišką, kurioje turi būti detalus tikslus veiklos aprašymas.

Ūkinės veiklos aprašymas pateiktas paraiškos IX skyriuje GAMYBOS PROCESAI.

9. Veiklos aplinkosauginės valdymo ir kontrolės. Pateikiamas įmonėje vykdomos veiklos aplinkosauginio valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas:

9.1. veiklos valdymo struktūra (įmonės valdymo organizacinė schema), aprašant, kaip bendroje veiklos valdymo sistemoje realizuojamos veiklos aplinkosauginės valdymas (išskiriai už aplinkosaugą įmonėje atsakingi asmenys, darbuotojų įsipareigojimai aplinkosaugos klausimais, nurodyti jų pareigybės instrukcijose, įmonės vidaus taisyklėse, kitos organizacinės priemonės);

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriaus įsakymu atliekų priėmimo aikštelės veiklos kontrolę vykdyti paskirtas VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" techninis inžinierius, kuris kontroliuoja ne aikštelės veiklą atsijusius techninio ir organizacinio pobūdžio klausimus, tikrina, ar tinkamai vykdoma aikštelės eksploatacija ir yra atsakingas už aplinkos apsaugą aikštelėje. VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriaus įsakymas pateikiamas 10 priede. Atsakingas darbuotojas prižiūri, kad aikštelę eksploatuojantys darbuotojai (atliekų priėmėjas ir darbininkas) tinkamai vykdytų savo pareigas, užtikrintų švarą ir tvarką bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

Už kasdienę technologinio proceso kontrolę bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi aikštelėje yra atsakingi aikštelės darbuotojai. Darbuotojų įsipareigojimai aplinkosaugos klausimais nurodyti jų pareigybių aprašymuose.

Atliekų priėmimo aikštelės šiukšlės veiklos valdymo organizacinė schema pateikiama 9 priede.

9.2. veiklos aplinkosauginio valdymo programos (strategijos, jei ūkinės veiklos objektas turėjo tokį);

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" nėra įdiegusi aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001:2005 standartą, tačiau aikštelės veikla vykdoma taip, kad neliktų daromas neigiamas poveikis aplinkai bei būtų laikomasi Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos aplinkosauginių reikalavimų. Aikštelė įrengta taip, kad laiku sutvarkoma visa galima tarša: gaunamų atliekų konteineriai yra hermetiškai ir turi nuotėkių surinktuvą, todėl joks atliekų nuotėkis negalimas, o visos aikštelėje susidarančios nuotekos yra valomos. Galima transporto priemonių tarša neutralizuojama naftos gaudyklėje. Užtikrinama, kad aikštelės darbuotojai būtų tinkamai kvalifikuoti, jie yra supažindinami su aplinkosauginiais bei darbų saugos reikalavimais, o jų darbo kokybė yra nuolat kontroliuojama direktoriaus įsakymu (10 priedas) paskirto darbuotojo.

9.3. veiklos aplinkosauginės priežiūros priemonės (techninės veiklos poveikio aplinkai kontrolės priemonės);

Aikštelė įrengta taip, kad būtų sutvarkoma visa galima tarša. Atliekų konteineriams [illegible] bei privažiavimai yra asfaltuoti. Nepavojingos atliekos klientai talpina į konteinerius tik prižiūrint specialiai apmokytam [illegible]. Pavojingos nuotekos nuo aikštelės yra

TIKRA

2013 -06- 13

5□

surenkamos per naftos gaudyklę ir išvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Sostdarniškos buitinės atliekos prieš išleidžiant į aplinką taip pat išvalomos vietiniuose valymo įrenginiuose. Nuotekų tvarkymas smulkiau aprašytas VII skyriuje.

Visos pavojingų atliekų tvarkymo operacijos (įrenginiai, paskirstymas į atitinkamus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus pažymėtus talpas, saugojimas) atliekamos tik išorinėse/lauko pavojingų atliekų skyriaus-konteineryje, kuriame įrengtas gaisrinių nuotekų surinktuvas, pavojingų atliekų saugojimui pasirinktos hermetiškos statinės bei konteineriai. Pavojingos atliekos yra laikomos atskirose grupėse pagal atliekų fizines ir cheminės savybes, taip užtikrinama, kad jos negalėtų kontaktuoti tarpusavyje. Pavojingų atliekų konteineryje taip pat laikomos pavojingų atliekų nentalizavimo priemonės: sorbentas, kalkės, oxivio šarmo tirpalas, konteinerio su plovimosi, darbuotojo apsaugai dirbant su pavojingosiomis atliekomis naudojamė specialūs darbo drabužiai, respiratoriai bei akių apsaugos priemonės, yra įrengtas akių dušas bei vaistinėlė.

Užpildyti nepavojingų atliekų konteineriai iki išvežimo perdirbėjams yra uždengiami brezentu, kad vejas negalėtų išpūsti jame sukauptų atliekų.

Aikštelėje yra įrengtas priešgaisrinis hidrantas, kiekviename pastate-konteineryje yra gesintuvai, o prie administracinio pastato įėjimo įrengtas pilnai sukomplektuotas priešgaisrinis skydas.

Visos atvežamos atliekos yra registruojamos Priimamose atliekų apskaitos žurnale, VšĮ „Kauno RATC" kasmet teikia atliekų apskaitos ataskaitas Kauno RAAD Kėdainių rajono agentūrai. Pavojingų atliekų priėmimas papildomai registruojamas pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo jungtinės darbo žurnale.

Aikštelės eksploatuotą darbą ir aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi periodiškai kontroliuoja direktoriaus įsakymu (33 priedas) paskirtas darbuotojas (vyriausiasis inžinierius).

9.4. uždavinius atsižvelgiant į planuojamai veiklai keliamus įpareigojimus (nuorodos į Gamintojo išteklių taupymo ir atliekų tvarkymo ar kitus su aplinkosaugos veiksmingumo gerinimu susijusius planus);

Papildomos sąlygos nenustatomos.

9.5. pažymima, ar įmonėje naudojama vadybos sistema leidžia laikytis Leidime nustatytų reikalavimų. Jeigu įmonėje naudojama vadybos sistema yra nepakankama, Leidime, kaip sąlyga, nurodomos papildomos priemonės, kurių įgyvendinimas leistų laikytis Leidime nustatytų reikalavimų, bei nurodomas šių priemonių įgyvendinimo terminas.

Jeigu veiklos vykdytojas yra įdiegęs LST EN ISO 14001:2005 standartą arba EMAS aplinkosaugos vadybos sistemą, aukščiau nurodytas aprašymas nereikalingas. Šiuo atveju pakanka įpareigoti veiklos vykdytoją laikytis LST EN ISO 14001:2005 arba EMAS reikalavimų.

Įmonėje naudojama vadybos sistema leidžia užtikrinti Leidime nustatytų reikalavimų vykdymą.

10. Leidimo išdavimo, jo nuostatų ir sąlygų apskundimo tvarka.

Leidimo išdavimą, jo nuostatas veiklos vykdytojas gali apskųsti Valstybiniui aplinkos apsaugos [illegible] per 15 dienų nuo leidimo gavimo dienos. Jeigu veiklos vykdytojas nesutinka su Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos [illegible] sprendimo skundo, jis gali įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą.

TIKRA

2011-08-23

503

11. Suinteresuotus visuomenės pastabos ir pasiūlymai.
Paraiška Kėdainių rajono savivaldybėje tenderiui gauti 2009-08-09 suderinta be pastabų

TIKRA
2009 -08- 13

7[illegible]

II. LEIDIMO SĄLYGOS

12. Šioje Leidimo dalyje pateikiamos Leidimo sąlygos, įtikinė veikla turi būti vykdoma ir kontroliuojama, laikantis šiame Leidime nustatytų sąlygų.

1. Pavojingas atliekas tvarkyti vadovaujantis reikalavimais išdėstytais 2007 m. balandžio 2 d. LR aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-193 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr.42-1594).

2. Buitines atliekas tvarkyti vadovaujantis reikalavimais išdėstytais 2007 m. spalio 8 d. LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-515 Dėl Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2007, Nr.110-4522).

3. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą vykdyti vadovaujantis „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu" (Žin.2001 Nr.85-2968) ir pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin.2002 Nr.81-3503), mokesčius apskaičiuoti vadovaujantis mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2003 Nr.13-474), iki kovo mėnesio pateikti pakuočių ataskaitą už praėjusius metus.

4. Visas surinkiamas buitinių atliekas perduoti utilizavimui ar tvarkymui įmonėms, kurios įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre.

5. Atliekų tvarkymą ir dokumentacijos pildymą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-30 d. įsakymu Nr.732 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Žin.,2004, Nr.68-2381).

6. Pavojingų atliekų tvarkymą vykdyti vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" nuostatomis (Žin.2002 Nr.1-12).

7. Statybines atliekas priimti, jas saugoti ir tvarkyti vadovaujantis nurodymais išdėstytais LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin.2073 Nr.16-603).

8. Alyvų atliekas priimti, jas saugoti ir tvarkyti vadovaujantis Alyvų atliekų tvarkymo taisyklėmis ir jų pakeitimais (Žin.2003 Nr.33-1391).

KLAIPĖDOS KOREKSPONDENCIJOS IR ĮVAIRIOS SKYRIUS

TIKRA

2011-01-23

8[illegible]

9. Tvarkant išeikvotus akumuliatorius ir baterijas vadovautis LR Aplinkos apsaugos ministro įsakymo "Dėl išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo " ir jo pakeitimais. (Žin.2003 Nr.1-12)

10. Tvarkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas vadovautis LR Aplinkos apsaugos ministro įsakymu "Dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo " (Žin.2004 Nr.141-5168).

11. Atliekų tvarkymą ir pirminių atliekų apskaitą vykdyti vadovaujantis LR Atlinkų tvarkymo įstatymu (Žin.1998 Nr.61-1726) ir LR aplinkos ministro 2003-12-30 d. įsakymu Nr.522 "Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2004,Nr.68-2381). Pasibaigus kalendoriniams metams, pagal to paties įsakymo reikalavimą ne vėliau kaip iki sausio 25 d. pateikti pirminės atliekų apskaitos ataskaitą Kėdainių agentūrai. Maksimalus alkšteliėjn saugomų atliekų kiekis neturi viršyti patvirtų Atliekų tvarkymo veiklos nuotraukimo plane.

12. Pradėjus atliekų aikštelės eksploatuoti, atlikti triukšmo matavimus ir nustatyti didžiausius garso slėgio lygius, kurie susidaro garsui jautriose vietose už veiklos ribų (gyvenamosios, rekreacinės teritorijos, švietimo įstaigos ir pan.šiai).

13. Pradėjus atliekų priėmimo veiklą Kauno RAAD pristatyti ataskaitą su atliekų tvarkytojais.



13. **Gaminama produkcija ir naudojamos transporto priemonės.**

1 lentelė. Gaminama produkcija.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė produkcijos negamina o tvirkia atliekų tvarkymo paslaugas.

2 lentelė. Naudojamos transporto priemonės.
Lentelė nepildoma. Transporto priemonių Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė neturi.

14. Tuo atveju, jeigu Garantas įsiteikia taupymo ir atliekų mažinimo planu nebuvo numatyta pakankamų priemonių, papildomi reikalavimai įrašomi kaip atitinkama Leidimo sąlyga.
Papildomos sąlygos Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei nenustatomos.

15. Veiklos vykdytojas turi įgyvendinti pateiktos Leidimui gauti 14 ir 15.4 punktuose nurodytą Aplinkosaugos veiksmų planą. Ši Leidimo sąlyga taikoma tik Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams.
Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė yra autro priedo įrenginys.

3 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas.
Lentelė nepildoma. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas neatliekamas. nes Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė nepriklauso Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams.

4 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas.
Lentelė nepildoma. Aplinkosaugos veiksmų planas neprivalomas, nes Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė nepriklauso Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS REIKALŲ SKYRIUS

TIKRA
2011 -05- 23

16

16. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas ir saugojimas.

Gamtos ištekliai ir žaliavos turi būti naudojamos pagal šiame Leidime punkte nustatytas Leidimo sąlygas.
Žaliavų ir pagalbinių medžiagų naudojimas turi atitikti 5–12 lentelėse pateikiamas Leidimo sąlygas.

5 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimo planuojami kiekiai.

Eil. Nr.	Žaliavos ar medžiagos pavadinimas	Vnt.	Didžiausias kiekis per 2008 metus	Leidžiamas metinis kiekis		
				2008 m.	2009 m.	nuo 2010 m.
1	2	3	4	5	6	7
1	Sorbentas	t		30	30	30
2	Kalkės	t		20	20	20
3	Natrio šarmo tirpalas	t		10	10	10
4	Flokuotė	t		50	50	50

Pastaba. Lentelė gali būti papildoma. Kaulelyje 7 gavo.

6 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų saugojimas.

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas[1]	Transportavimo būdas	Didžiausias kiekis vienoje, t	Saugojimo būdas[2]
1	2	3	4	5
1	Sorbentas	Autotransportu	30	Dažyje modifikuoje silose
2	Kalkės	Autotransportu	20	Plastikiniuose maišuose sandėlyje
3	Natrio šarmo tirpalas	Autotransportu	10	Specialiose talpose modifikuoje sandėlyje
4	Flokuotė	Autotransportu	50	Plastikiniame konteineryje

Pastabos:
[1] - žaliavos/ir arba sumaišytos su degalais pavadinimai 13 lentelėje;
[2] - pateikiamas tikpos, sistemos, saltinio, įrenginio aplinkai rizikų mažinantys laikymo/saugojimo būdo aprašymas pagal 13 lentelę.

7 lentelė. Tiriamųjų teršalų medžiagų ir preparatų naudojimas ir saugojimas.
Lentelė nepildoma. Kadangi atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje nenaudoja tiriamųjų teršalų medžiagų ir preparatų.

8 lentelė. Kitų naudingųjų iškasenų gavyba ir paviršių žemių rekultivavimas.
Lentelė nepildoma. Kadangi atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje veiklos rūšies specifikos

9 lentelė. Naftos telkinių ištekliai ir eksploatacinių gręžinių sąrašas[1].
Lentelė nepildoma. Kadangi atliekų priėmimo aikštelė naftos gavybos nevykdo.

KAUNO APS. KOMPETENCIJOS IR TARPTAUTINIO SKYRIUS

TIKRA
Asmens parašas
2011 -06- 24

11

10 lentelė. Leidžiama išgauti nafta.
Lentelė nepildoma. Kėdainių srities naftos gavybos nevykdo.

17. Kuro ir energijos vartojimas. Energijos gamyba.
Energetiniai įrenginiai turi būti naudojami 11 lentelėje nustatytų dydžių ribose.

11 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas[1].

Energetinio ar technologinio įrenginio	Matavimo vnt., t, m³, KWh ir kt.	Sumontavimas / ...2008 m.	Sunaudojimas 2009 m.	Sunaudojimas nuo 2010 m.	Apskaitos priemonės	Įrenginių pavisto šaltinis
1	2	3	4	5	6	7
a) elektros energija	KWt	Veikia tachyvo vykdomo, nes objektas parijo	19 000	19 000	Elektros skaitiklis	AB „KST"
b) šilumine energija						
c) gamtinės dujos						
d) naftos produktai						
e) anglys						
f) biokuras						
g) dyzelinas						
h) akmens anglis						
i) benzinas						
j) biokuras:						
1)						
2)						
k) ir kiti						

Pastabos:
[1] – lentelėje nurodomi pagrindiniai objekto naudojamų įrenginių kiekiai ir numatomi kiekiai artimiausiems metams,
[2] – nurodyti, kur sunaudojami lentelėje nurodyti įrenginiai, pvz., gamybos, nuvedimo, kokiems technologiniams procesams, patalpų ar teritorijos šildymui, pagaminta energija parduodama ir kt. Jei lentelės su viršiku užtinka naudą nenaudoja, tuomet papildyti arba tekste pateikti detalesnį lentelėje pateiktų duomenų paaiškinimą.

12 lentelė. Energijos gamyba.

12

Lentelė papildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo ūkinėje veikloje energijos negamina.

13

18. Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas.

TIPK leidimo dalis **Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas** Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišdėstoma, kaip nesiekiantį kriterijų, keliamų šiai daliai autro priedo įrenginiams.

Vanduo atliekų priėmimo aikštelei tiekiamas iš Kėdainių miesto centralizuoto vandentiekio tinklų, prisijungus prie esamos Ø100 mm vandentiekio linijos. Suvestinių inžinerinių tinklų planas pateikiamas 12 priede.

13 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio imamas vanduo, vandens ėmimo vietą bei įrenginį.
Kiekvienai vandens ėmimo vietai (vandenvietei) pildomas atskiras lentelės stulpelis.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje paviršinio vandens nenaudoja.

14 lentelė. Duomenys apie naudojamus požeminio vandens vandenvietes.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė požeminio vandens gavybos nevykdo.

15 lentelė. Vandens pečiolinas ir vartojimas.
Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis **Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas** Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišdėstoma, kaip nesiekiantį kriterijų, keliamų šiai daliai autro priedo įrenginiams

16 lentelė. Paimamo vandens apskaitos priemonės.
Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis **Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas** Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišdėstoma, kaip nesiekiantį kriterijų, keliamų šiai daliai autro priedo įrenginiams

17 lentelė. Numatomos racionalaus vandens vartojimo ir šiekčių apsaugos priemonės.
Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis **Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas** Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišdėstoma, kaip nesiekiantį kriterijų, keliamų šiai daliai autro priedo įrenginiams

18 lentelė. Vandens naudotojų abonentų vartojamo vandens kiekiai.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė vandens kitoms organizacijoms netiekia.

TIKRA
Jūrinė dalis
Alina Čeponienė
2013 -05- 29

14

19. Oro tarša.

TIPK leidimo dalis „**Oro tarša**“ Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduodama, nes neatitinka „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir pakeitimo taisyklių“ 2 priedo kriterijų.

Stacionarių oro taršos šaltinių Kėdainių atliekų priėmimo aikštelėje nėra.

19 lentelė. Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje į aplinkos orą teršalų neišmeta.

19 (1) lentelė. Leidžiamos iš įrenginio _____(-ių) išmesti šiltnamio dujos
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė leidimo išmest šiltnamio dujas neturi.

20 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys[1].
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių neturi.

21 lentelė. Tarša į aplinkos orą[1].
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje į aplinkos orą teršalų neišmeta.

22 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir kitos taršos prevencijos priemonės[1].
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje į aplinkos orą teršalų neišmeta.

23 lentelė. Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės[1].
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje į aplinkos orą teršalų neišmeta.

24 lentelė. Neutilizuotai teršalų išmetimai į aplinkos orą.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje į aplinkos orą teršalų neišmeta.

20. Teršalų išmetimo į orą kontrolė ir matavimai.
Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo veikloje į aplinkos orą teršalų neišmeta, teršalų išmetimo į orą kontrolė ir matavimai netaikytini.

TIKRA
2011 -09- 23

15

21. Aplinkos oro monitoringas.
Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo ūkinėje veikloje į aplinkos orą teršalų nešiosno, aplinkos oro monitoringas nereikalingas.

22. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.

TIPK leidimo dalis „**Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir kanalizacijos tinklus**" Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduodama, nes neatitinka „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir pakeitimo taisyklių" 2 priedo kriterijų.

Buitinės nuotekos iš administracinio pastato nukreipiamos į 9500 mm talpos Kėdainių miesto nuotekų tinklus, esančius šalia sklypo. Paviršinės lietaus nuotekos iš aikštelės surenkamos per važiuojamąją gatvelę ir valomos vietiniuose mechaniniuose valymo įrenginiuose (3 vnt. pašiupo), iš kurių išleidžiamos į 9100 mm miesto lietaus nuotekų šulinėlį. Buitinių nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklai, valymo įrenginiai bei nuotekų išleidimo vietos pažymėti situaciniame inžinerinių tinklų plane 12 priede.

25 lentelė. Informacija apie paviršinių vandens telkinį (priimtuvą), į kurį išleidžiamos nuotekos.
Ši lentelė pildoma, jeigu nuotekos išleidžiamos į paviršinį vandens telkinį.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė savo ūkinėje veikloje nuotekų į paviršinius vandens telkinius neišleidžia.

26 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius ir žemdirbystės dirbtinius laukus), į kurį išleidžiamos nuotekos.
Ši lentelė pildoma, kai nuotekos infiltruojamos į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, perduodamos tvarkyti kitiems asmenims (išleidžiamos į kitkos asmenims priklausančias kanalizacijos sistemas), kaupiamos sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.
Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis „**Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir kanalizacijos tinklus**" Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduodama, nes neatitinka „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir pakeitimo taisyklių" 2 priedo kriterijų.

23. Numatant atitinkamų nuotekavalkystas ataskaitą ŽŪI., prie Leidimo turi būti pridedamas kiekvieno lauko planas su pažymėtomis ūkinės naudojimo aplinkosauginių apribojimų ribomis ir aprūpinimo [illegible] apribojimai nustatyti. Pridedamuose planuose laukai turi būti sunumeruoti.
Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė nuotekas išleidžia į [illegible] tinklus.

TIKRA

16

24. Prideda(a)i dokumentą, įrodančių Leidime turėtojo teisę naudoti laukus nuotekų/nuosėdų atliekų laistymui (nuosavybės dokumentų arba atitinkamų sutarčių), originalai ar jų patvirtinti nuorašai. Paslaugos mišrių dokumentų gabėjimo laikui. Leidimas nuotekų/nuosėdų atliekų laistymui turės būti koreguojamas/atnaujinamas.

Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė sudaromas nuotekos išleidžia į miesto kanalizacijos tinklus.

27 lentelė. Informacija apie Kauno miesto drėkinimo laukus (ŽDL), kuriuose leidžiama išlaistyti (užilaistyti) nuotekas (mažo filtrato, skysto mėšlo, srutos, skysto atliekos, šlamšto ar pan.).

Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė susidarančios nuotekos išleidžia į miesto kanalizacijos tinklus.

28. Prie Leidimo turi būti pridėta schema su pažymėtomis nuotekų išleistuvų ir/arba nuotekų šalinių vietomis ir matmenimis.

Schema su Kėdainių atliekų priėmimo aikštelės kanalizacijos tinklais pateikta paraiškoje IE priede.

28 lentelė. Duomenys apie nuotekų šalinius ir/arba išleistuvus.

Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir kanalizacijos tinklus“ Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduodama, nes neatitinka „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ 2 priedo kriterijų.

29 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.

Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir kanalizacijos tinklus“ Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduodama, nes neatitinka „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ 2 priedo kriterijų.

30 lentelė. Objekte/įrenginyje esančios (tikėtinos) nuotekų kiekių ir taršos mažinimo priemonės.

Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir kanalizacijos tinklus“ Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduodama, nes neatitinka „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ 2 priedo kriterijų.

31 lentelė. Privalomos įdiegti nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės.

Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir kanalizacijos tinklus“ Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduodama, nes neatitinka „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ 2 priedo kriterijų.

17

32 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių priimamos nuotekos (ne paviršinės), sąrašas ir priimamų nuotekų savybės.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė svetimų nuotekų netvarko.

33 lentelė. Paviršinių įmonių ir kitų abonentų, iš kurių priimamos paviršinės nuotekos, sąrašas ir priimamų nuotekų savybės.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė svetimų nuotekų netvarko.

34 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai.
Lentelė nepildoma. TIPK leidimo dalis „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir kanalizacijos tinklus" Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduotas, nes neatitinka „Teršalų integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių" 2 priedo kriterijų.

Selgos: 1. Paviršinės nuotekos tvarkytį vadovaujantis reikalavimais išdėstytais 2007 m. balandžio 2 d. LR aplinkos ministro įsakyme Nr. 131-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr.42-1594).

2. Buitines nuotekas tvarkyti vadovaujantis reikalavimais išdėstytais 2007 m. spalio 8 d. LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-515 „Dėl Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2007, Nr.110-4522).

36. Dirvožemio apsauga.

Duomenų apie anksčiau dirvožemio tarša nėra, siekiant jokių tyrimų ir įrenginių, galinčių sukelti taršą, montavimo nėra buvę.

Atliekų priėmimo aikštelė saugiame povelkio dirvožemiui ir gruntiniam vandeniui nedaro, nes visos atliekų priėmimo aikštelėje susidarančios nuotekos surenkamos buitinių ir paviršinių nuotekų tinklais, iš kurių patenka į Kėdainių miesto tinklus bei valymo įrenginius. Sukauptos dirvožemį ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių surenkamas ir perduodamas jų tvarkytojui įmonei.

Sąlygos:

Kėdainių atliekų priėmimo aikštelės administracija privalo griežtai kontroliuoti paviršinių nuotekų valymo įrenginių darbą.

Užtikrinti, kad operatyviai būtų surenkami teršalų išsiliejimo židiniai teritorijoje, panaudojant turimas teršalų išsiliejimų surinkimo priemones

Atvežtas pavojingas atliekas priimti tik uždarytoje tam skirtoje patvirtintų atliekų surinkimo patalpose

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

TIKRA

Aldona Česnienė

2007 -06- 29

28

27. Atliekų susidarymas, naudojimas ir/ar šalinimas:

27.1. Atliekų susidarymas.

Atliekų priėmimo aikštelėje susidarys mišrios buitinės atliekos. Numatoma, kad šios atliekos susidarys iš dviejų pagrindinių šaltinių: 1) aikštelės darbuotojų mišrios buitinės atliekos: maisto pakuotės atliekos, užkąstosios perdirbti kanceliarinės atliekos ir pan.; 2) nepavojingų neperdirbamų likučių nuo atliekų: pvz., netinkamai išrūšiuotos, užterštos metalas ir pan. atliekos, jei aikštelės darbuotojai tokių atliekų aptinka tarp klientų pristatytų rūšiuotų atliekų, taip pat neperdirbamos klientų atvežtų atliekų pakuotės atliekos. Numatoma, kad per metus susidarys 4 t mišrių buitinių atliekų.

Pavojingų naftos gaudyklėje ir buitinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarys nuotekų valymo dumblas (0,5 t per metus.).

35 lentelė. Leidžiamos pagaminti atliekos.

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju)

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginių atveju) Kylančių atliekų priėmimo aikštelė

Atliekos			Atliekų susidarymo būdas ir technologiniame procese	Numatomas	
Kodas[1]	Pavadinimas	Pavojingumas[2]		Projektinis kiekis[3], t/m.	Didžiausias leidžiamas pagaminti kiekis, t/m
1	2	3	4	5	6
13 05 02*	paviršinio nuotekų valymo dumblas	H14	Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (naftos gaudyklė)	0,5	0,5
15 01 10*	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kuriose yra jomis užterštos	H5 H6A	Klientų pristatytų atliekų surūšiavimas	0,05	0,05
15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibūdintas tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis	H5	Reikšmingų ar leidžiamos pavojingų atliekų viršijimas	0,05	0,05
19 02 11*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (perdirbtos naftos turinys)	H5 H6	Reikšmingų pavojingų atliekų neturėsiantiems	0,01	0,01
20 03 01	mišrios buitinės atliekos	Nepavojingos	Darbuotojų buitinės atliekos bei pradžioje priimkami klientai nuo atliekų surūšiuoja atskiras atliekas	4	4

Pastabos.

atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro [illegible] d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065, 2004, Nr. 05-2581) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 2 priedą;

TIKRA

19

[3] – nurodyta, kuriuo pavojingumu atliekos yra pavojingos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą;
[4] – per metus naudojamų didžiausios atliekų talpos, kai įrenginys ar technologinis procesas veikia visu pajėgumu (projektinis kiekis).

36 lentelė. Atliekos, leidžiamos perduoti atliekų naudinimo ar šalinimo įrenginiams.

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju) _____

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) Kedainių atliekų priėmimo aikštelė

Atliekos	
Kodas[1]	Pavadinimas
1	2
15 05 02*	pavojingų medžiagų užterštos sugertinės
15 02 10*	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis
19 02 11*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant mišrius junginius)
20 03 01	mišrios komunalinės atliekos

Pastaba. [1] – atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą.

27.2. Atliekų naudojimas ir/ar šalinimas.

37 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos (atliekas naudojančios įmonės).

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju) _____

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) Kedainių atliekų priėmimo aikštelė

Atliekos			Naudojimas		
Kodas[1]	Pavadinimas	Pavojingumas[2]	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo būdas[3]	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
08 01 11*	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HSB	5	R12, S1	6
08 01 21*	dažų ar lako nuėmiklių atliekos	HS	5	R13, S1	
08 04 09*	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HS, HSB	5	R13, S1	
13 02 06*	sintetinė variklių, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HSB	5	R13, S1	
13 02 05*	kita variklių, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HS	5	R13, S1	
13 08 99*	kitaip nenugrinktinos atliekos (tepalinės nuoviros)	HS	5	R13, S1	
15 02 10*	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	HS, HSA	5	R13, S1	

TIKRA

Žilė -06- 23

20

15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip nenurodytus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis	HI3B	5	R13, S1	
16 01 07*	tepalų filtrai	HI4	5	R13, S1	
16 01 13*	stabdžių skystis	HI5	5	R13, S1	
16 01 14*	antifrizuotojai skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HI5	5	R13, S1	
16 01 21*	pavojingųjų sudedamosiosios dalys (kuras, oro filtrai, amortizatoriai)	HI4	5	R13, S1	
16 05 06*	laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytus iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčius	HI5, HI8	5	R13, S1	
16 06 01*	švino akumuliatoriai	HI8	5	R13, S1	
16 06 02*	nikelio-kadmio akumuliatoriai	HI8	5	R13, S1	
16 06 03*	gyvsidabrio baterijos	HI8	5	R13, S1	
20 01 13*	dažiklis	HI5A	5	R13, S1	
20 01 14*	rūgštys	HI8	5	R13, S1	
20 01 15*	šarmai	HI8	5	R13, S1	
20 01 21*	dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HI6	5	R13, S1	
20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HI5, HI4	5	R13, S1	
20 01 33*	baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos	HI8	5	R13, S1	
20 01 35*	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	HI5	25	R13, S1	12,5
20 01 37*	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HI3B	525	R13, S1	2
15 01 01, 20 01 01	popierius ir kartonas	Nepavojingos	525	R13, S1	188
15 01 02, 20 01 39	plastikas	Nepavojingos	525	R13, S1	51
15 01 04, 20 01 40	metalai	Nepavojingos	525	R13, S1	36
15 01 07, 20 01 02	stiklas	Nepavojingos	525	R13, S1	69
16 01 03	nusidėvėjusios padangos	Nepavojingos	525	R13, S1	6
16 06 05	kitos baterijos ir akumuliatoriai	Nepavojingos	6	R13, S1	6
17 09 04	mišrios statybinės ir griovimo atliekos	Nepavojingos	525	R13, S1	32
20 01 34	baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33	Nepavojingos	6	R13, S1	6
20 01 36	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	Nepavojingos	525	R13, S1	24

TIKRA
2018 -06- 23

20 01 36	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	Nepavojingas	25	R13, 51	1,5
20 01 38	medžiena	Nepavojingas	525	R13, 51	50
20 03 07	didžiosios atliekos	Nepavojingas	525	R13, 51	105

Pastabos:
1 – atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą;
2 – pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedą;
3 – pagal Atliekų tvarkymo taisykles.

27.3. Patikslinti papildomi duomenys, jei reikia, nustatomos Leidimo sąlygos pagal Atliekų savartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 344 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), reikalavimus.

38 **lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos (atliekas šalinančiojo įmonės).**
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė atliekų šalinimo veiklos nevykdo.

28. Į aplinką išmetamų (išleidžiamų) teršalų apskaita. Ūkio subjekto aplinkos monitoringas.

39 lentelė. Nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planas.
Lentelė nepildoma. ŪPK leidimo dalis „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir kanalizacijos tinklus“ Kėdainių atliekų priėmimo aikštelei neišduodama, nes neatitinka „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidinių išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ 2 priedo kriterijų keliamų šiai veiklai. Paviršinės ir buitinės nuotekos pagal sutartį išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus.

40 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolės grafikas.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių neturi.

41 lentelė. Ūkio subjekto aplinkos (poveikio aplinkai) monitoringo planas.
Lentelė nepildoma. Kėdainių atliekų priėmimo aikštelė stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių neturi. Paviršinės ir buitinės nuotekos pagal sutartį išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus.

29. Trūkstamo kontrolė.

Trūkstamo kontrolės dalies sudarymą Kauno Visuomenės sveikatos centro Kėdainių [illegible] 2008-06-15 raštu Nr. 2-204-14 [illegible]

12

Leidime sąlygos triukšmo mažinimui nustatomos, kai triukšmą skleidimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos galiojantys teisės aktai (viešieji įpareigojimai). Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklių 1 priede nurodytus įrenginius, turi atsižvelgti į BS GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas gairėmatas bei taikyti šiuose dokumentuose nurodytus GPGB triukšmui mažinti.

Veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems Taisyklių 1 priede nurodytus įrenginius, kuriems ES GPGB informaciniai dokumentai rengiami, ar Taisyklių 2 priede nurodytus įrenginius, patekti triukšmo ribinės vertės nėra privaloma, jeigu Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta kitaip.

Jei įrenginiai eksploatuojami šalia gyvenamųjų rajonų, skleidžiamo triukšmo lygis gali daryti poveikį aplinkinius gyventojams, todėl būtina įvertinti triukšmo maksimalaus priemonės ir jų įdiegimo galimybes įrenginiuose.

Triukšmas gali būti sumažintas, sustačius įrenginį eksploatavimo arba triukšmą keliančius veiklos vykdymo sąlygas. Pvz., Leidime nurodant, kad sakties vartu į ūkinės veiklos vietą negali įvažiuoti/išvykti transporto priemonės, techninė įrenginių priežiūra negali būti atliekama per šventes (pvz., valymas). Triukšmo mažinimo priemonės gali būti triukšmą keliančių įrenginių apdengimas, reikalavimai apriboti transporto priemonių darbo nuožiūrą ugą, techninės priežiūros darbų ir naudojamų transporto priemonių skaičiaus ribojimas naktimis, savaitgaliais, švenčių dienomis.

Jei būtina, suderinę su veiklos vykdytoju, apibrėžkite triukšmo ribinės vertės decibulais (dB), siektinas artimiausioje gyvenamosios aplinkoje.

30. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

Dažnai triukšmo skleidimo skyrių įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas nenurodytas.

Leidime nurodomi įrenginiai padalinimai, cechai ar kt. įrenginio dalys, kurių darbo laikas gali būti apribotas, jei dėl veiklos ypatumų neigiamo poveikio negalima apriboti kitomis priemonėmis. Turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių bus ribojamas įrenginio, jo dalies ar padalinio, ceche darbo laikas. Siekiant išvengti triukšmo naktimis, savaitgaliais ar kitais atvejais. Leidime gali būti nurodoma įrenginių valymą, profilaktinį patikrinimą ar remontą atlikti tuo laiku, kai poveikis aplinkai ir gyventojams yra mažiausias.

Leidime gali būti numatomos specialios sąlygos, pvz., aplinkai galimybę triukšmą skleidžiančią veiklą vykdyti savaitgaliais bei vakarais/naktimis (apdorojimas smulkia, apdorojimas garais ir kt.), nurodyti gamybos procesą, iš kurio skleidžiamas triukšmas, pradžios/pertraukų laiką ir kt. Leidimo sąlygas.

31. Triukšmo kontrolė ir matavimai. Duomenys apie triukšmo šaltinių charakteristikas.

Pradėjus atlikti eksploataciją, atlikti triukšmo matavimus ir nustatyti didžiausią garso slėgio lygius, kurie susidaro gretimų įmonės vietose už veiklos(-ų) gyvenamosios, rekreacinės teritorijos, švietimo įstaigos ir panašiai).





23

42 lentelė. Triukšmo šaltinių ir parametrų suvestinė.

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju)_____
Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju)_____

Šalti-nis	Triukš-mo skle-dimo eilės Nr.	Įrangos tipo, mar. Nr.	Garso galia dB(A); nuo-žvalgos metodas	Oktavinės dažnių juostos (Hz) Garso galios lygiai dB (perskaičiuoti pagal)									Įrenginio ar imtis	Skleidimo periodai	Pastaba
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

32. Kvapų kontrolė.
Derinant paraišką Kauno Visuomenės sauro Kėdainių skyriuje kvapų kontrolė nereguliuota.(2009-06-15, Nr.2-296-14)

Reikalavimai kvapų parametrams nustatomi pagal Lietuvoje galiojančių, kvapus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklių 1 priede nurodytus įrenginius, turi atsižvelgti į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas nuostatas bei taikyti šiuose dokumentuose nurodytus GPGB kvapams mažinti.

Leidime nurodomos priemonės kvapams sumažinti, pvz., rezervuarų uždengimas/uždarymas, garų, susitarusių užpildant rezervuarus, surinkimas ir apdorojimas, tinkamos rezervuarų įrenginys, optimi parinkimas (dėl šiuose aliuose talpos spalvos padidina laikų medžiagų garavimą). Kvapus galima vertinti tiriant, išmatuojant iš atskirinių šaltinių, parametrais.

33. Avarijų ir teršalų neatitiktinių išmetimų prevencija.
Nustatoma, ar veiklos vykdytojo paraiškoje pateiktame Avarijų likvidavimo plane yra išnagrinėti rizikos faktoriai, nurodyti ES GPGB informaciniuose dokumentuose (ši nuostata taikoma Taisyklių 1 priede nurodytų įrenginių atveju), numatytos priemonės (neatitiktinių teršalų išmetimo prevencija, galimų avarijų rizika ir t.t.) šiems faktoriams sumažinti (visiems įrenginiams). Šioje Leidimo dalyje nurodomos Leidimo sąlygos, užtikrinančios, kad avarijų ir teršalų neatitiktinių išmetimų atveju iki minimumo bus sumažinta rizika bei žala žmogui ir aplinkai.

34. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai.
Sąlyga: Pradėjus atliekų sąvartos eksploataciją, atlikti triukšmo matavimus ir nustatyti didžiausius garso slėgio lygius, kurie susidaro garsui jautriuose vietose už veiklos ribų (gyvenamosios, rekreacinės teritorijos, [illegible]).

TIKRA
2011-06-23

24

35. Apskaitos vykdymas ir ataskaitų rengimas.
Sąlyga: Atliekų apskaitai vadovaujantis direktoriaus įsakymu (10 priedas) pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą.

III. LEIDIMO PRIEDAI

Schemos ir žemėlapiai.

2 priedas – Atliekų priėmimo aikštelės padėties vietovėje planas;

6 priedas – Pastatų ir gaisrinių patalpų išdėstymo schema;

12 priedas – Suvestinis inžinerinių tinklų planas;

Suinteresuotų institucijų išvados ir komentarai.
Kėdainių rajono savivaldybėje pateikta TIPK leidimui gauti 2009-03-09 suderinta be pastabų.

Dokumentai, kurie buvo naudoti sprendimams priimti.

1 priedas – Všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro registravimo pažymėjimo kopija;

3 priedas – Žemės teisinės registracijos dokumentų kopijos;

4 priedas – Žemės sklypo panaudos sutartis;

5 priedas – Statinių ir patalpų teisinės registracijos dokumentų kopijos;

7 priedas – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo;

8 priedas – Statybos leidimas;

9 priedas – Atliekų priėmimo aikštelės fizinės veiklos valdymo organizacinė schema;

10 priedas – Všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymas dėl darbuotojų, atsakingų už aplinkos apsaugą bei kontrolę, skyrimo;

11 priedas – Všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymas dėl eco[illegible]patvirtinimo;

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

TIKRA

25

13 priedas – Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimai;
14 priedas – Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;
15 priedas – Atliekų tvarkymo veiklos automatikos planas;
16 priedas – Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planas;
17 priedas – Sutartys su atliekas tvarkančiomis įmonėmis;
18 priedas – Sutartis dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo;
19 priedas – viešųjų pirkimų charakteristika ir atliekties deklaracija;
20 priedas - Kauno visuomenės sveikatos centro (Kėdainių skyriaus) išvada;
21 priedas – Paraiška registruotis Atliekų registre;

KONTROLĖS, STEBĖSENOS IR TIKRINIMŲ SKYRIUS
TIKRA

Priedas
Priedas Nr. 2.5.3

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 5 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. 1/23

3	0	0	0	9	2	9	9	8

(Objekto kodas)

VšĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė,
Nemajūnų g. 15B, LT – 52471 Kaunas
tel. 8 (37) 311267, faks. 8 (37) 490734, el.paštas info@kaunoratc.lt

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“,
Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124 tel. 8(37) 311267, faksas 8 (37) 490734
el. paštas: info@kaunoratc.lt

(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, faksо Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą sudaro 23 puslapiai.

Išduotas 2009 m. liepos 13 d.

Direktorius Antanas Petrauskas
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

Šio leidimo parengti 4 egzemplioriai.

Paraiška TIPK leidimui gauti suderinta su:
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyriumi 2009 m. vasario 17 d.
Kauno visuomenės sveikatos centru 2009 m. birželio 15 d.

(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

Pastaba: koreguojant Leidimą, kiekvieną kartą rengiamas naujas Leidimo viršelis.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIRŠUTINIO SKYRIUS

TIKRA

Aldona Seokajienė
2009-08-13

224

I. BENDROJI DALIS. DUOMENYS APIE ĮRENGINĮ, ŪKINĘ VEIKLĄ, VYKDOMĄ VEIKLOS APLINKOSAUGINĮ VALDYMĄ IR KONTROLĘ

1. Ūkinės veiklos objekto pavadinimas.

Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė. Adresas: Nemajūnų g. 15G, Kaunas, LT-52471.

Visi „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" registracijos pažymėjimo kopijoje pateikiama paraiškos TIPK leidimui gauti (toliau – *paraiškos*) **1 priede.**

2. Adresas korespondencijai (jei skiriasi nuo veiklos vykdytojo adreso).

Statybininkų g. 3, LT - 50124 Kaunas, tel. 8(37) 311267, faksas 8 (37) 490734, el. paštas: info@kaunoregionas.lt.

3. Ūkinės veiklos/įrenginio vieta, jo valdytojas ir/ar naudotojas. Nurodoma ūkinės veiklos vietos veiklos padėtį vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų išdėstymu.

Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė įrengta žemės sklype, esančiame Kauno mieste, Nemajūnų gatvėje, Kauno miesto pramoninėje zonoje, šalia Kauno oloso Petrašiūnų ir Aunelių rajonų. Aikštelės teritoriją iš pietinės pusės riboja esamų žaliųjų ir kitų organinių atliekų kompostavimo aikštelių kompleksas, iš rytinės – AB „Mileta" ir iš vakarinės - metalinių garažų kooperatyvas „Kauno mariot". Apie 280 m į pietvakarius nuo aikštelės yra Neries upė, apie 620 m į pietryčius – geležinkelis, apie 700 m į pietryčius – Kauno marios, apie 300 m – rajoninės reikšmės kelias į Garliavą. Artimiausios gyvenamosios namas yra už 100 m. Valstybinės reikšmės Kauno zoologinis draustinis yra nutolęs apie 4 km į vakarus nuo aikštelės. Jiesios kraštovaizdžio draustinis – apie 4 km į pietvakarius, Pažaislio ežas yra nutolęs apie 6,6 km į šiaurės rytus. Julijanavos fortas, priskirtas Europinės svarbos saugomoms teritorijoms, yra nutolęs apie 5 km į pietvakarius. Nemajūnų Fredos fortas – apie 4,4 km į pietvakarius. Rokų fortas - apie 2,6 km į pietvakarius, Milikonio fortas – apie 5,2 km į šiaurės vakarus nuo aikštelės. Su rekreacinėmis teritorijomis bei kitais svarbiais objektais skypas nesiriboja. Aikštelei nustatyta 50 m sanitarinė apsaugos zona. Į šią zoną gyvenamieji namai nepatenka.

Atliekų priėmimo aikštelės padėties vietovėje planas pateikiamas *paraiškos* **3 priede.**

Atliekų priėmimo aikštelės valdytoja ir ūkinės veiklos vykdytoja yra viešoji įstaiga „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras".

4. Žemės, kurioje vykdoma ūkinė veikla, plotas (ha), teisinės registracijos dokumento numeris, naudotojo ir/ar savininko pavadinimas, pavardė, vardas, adresas.

Sklypas, kuriame įrengtu Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė, užima 0,2175 ha plotą. Sklypo kadastro numeris 1901/0201:107, unikalus Nr. 4400-1487-0485. Žemės teisinės registracijos dokumentų kopijos pateikiamos *paraiškos* **3 priede.** Tikslinė žemės paskirtis - atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos.

Sklypo naudotojos pagal panaudos sutartį Nr. M39/2008-R yra viešoji įstaiga „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras", Statybininkų g. 3, Kaunas. Sutartis pateikiama *paraiškos* **4 priede.**

2011 -06- 23

5. Pastatų, pagalbinių patalpų, kuriose vykdoma ūkinė veikla, savininko ir/ar naudotojo pavadinimas, pavardė, vardas ir adresas.

Visi atliekų priėmimo aikštelės teritorijoje esantys statiniai ir patalpos nuosavybės teise priklauso VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" (toliau – *Kauno RATC*), Statybininkų g. 3, Kaunas, kur šiame sklype vykdo ūkinę veiklą. Teisinės registracijos dokumentus *Kauno RATC* išparcigojo patikti iki 2009-07-31 (žr. *paraiškos* **5 priedą**). Pastatų ir pagalbinių patalpų išdėstymo schema pateikiama *paraiškos* **6 priede**.

6. Darbuotojų skaičius.

Atliekų priėmimo aikštelėje dirba du darbuotojai, už juos atsakingas teritorijos inžinierius.

7. Informacija apie ūkinę veiklą:

7.1. ūkinės veiklos rūšis:

Atliekų priėmimo aikštelėje vykdomos ūkinės veiklos:

- *išrūšiuotų atskirų komunalinių atliekų srautų priėmimas;*
- *išrūšiuotų atskirų komunalinių atliekų srautų saugojimas iki perdavimo atliekų tvarkytojams;*
- *nefrakcionuoti išrūšiuotų atliekų perrūšiavimas;*
- *aikštelės eksploatavimo metu susidarančių pavojingų ir buitinių nuotekų valymas vietiniuose valymo įrenginiuose prieš išleidžiant į aplinką.*

7.2. nurodomas įmonėje vykdomos veiklos, kuriems išduodamas Leidimas, Taisyklių 1 priede įrenginiams nurodoma, kuriai ūkinės veiklos rūšiai/rūšims priskirtinas pateikiamos ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie įrenginio, kuriam išduodamas Leidimas, projektinį pajėgumą;

Įmonės vykdoma veikla nepriskiriama Taisyklių 1 priedo įrenginiams.

TIPK leidimas ūkinės veiklos vykdytojui reikalingas pagal šios LR Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymo Nr. D1 - 330 patvirtintų "Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių" 2-ojo priedo kriterijus:

9. p. – atliekos surenkamos įmonėse, kurios vykdo atliekų surinkimo ir laikinojo saugojimo aikštelės ar įrenginius, kuriuose atliekos kaupiamos, rūšiuojamos ar kitaip apdorojamos iki jų perdavimo atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms ir pagal Atliekų tvarkymo įstatymą yra priskiriamos atliekas naudojančioms ir šalinančioms įmonėms;

Kauno RATC Kauno miesto Nemajūnų atliekų priėmimui aikštelės projektinis pajėgumas:

- Nepavojingos atliekos – 259 t/m;
- Pavojingos atliekos – 3 t/m.

TIKRA

2011-05-23

2 VšĮ „Kauno RATC" K[illegible] o miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė" TIPK leidimas

7.3. kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginys priskirtinas prie įrenginių, kuriam eksploatuoti reikalinga gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas, atskirai nurodoma, kokiai veiklos rūšiai ar rūšims priskirtinas šiltnamio dujas išmetantį ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie to įrenginio projektinį pajėgumą;

Įmonės veikla nepriskirtina veiklos rūšims, kuriems reikalingas leidimas išmesti šiltnamio dujas.

7.4. įrenginiams, kurių veikloje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir preparatai, pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 16.6 punkte.

Įmonėje nėra įrenginių, naudojančių tirpiklius ar tirpiklių turinčias medžiagas.

8. Ūkinės veiklos aprašymas. Pateikiama nuorodą į paraišką, kurioje turi būti detalus ūkinės veiklos aprašymas.

Atliekų priėmimo aikštelė yra reginiais komunalinių atliekų surinkimo sistemos dalis. Aikštelė yra skirta priimti ir saugoti įvairiausias nepavojingas ir pavojingas buityje susidarančias Kauno miesto bei Kauno rajono gyventojų atliekas bei perduoti jas tvarkyti atitinkamoms perdirbėjams. Pagrindinius aikštelėje vykdomi procesai yra šie:

- Nepavojingų atliekų priėmimas;
- Buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimas;
- Priimtų atliekų sangrūdimas ir perdavimas licencijuotoms perdirbėjams;
- Aikštelės veiklos metu susidarančių nuotekų valymas.

Detalesnis ūkinės veiklos aprašymas įskaitant procesus ir įrangą pateiktas *paraiškos* 8 ir 11 punktuose.

9. Veiklos aplinkosauginis valdymas ir kontrolė. Pateikiamas įmonėje vykdomos veiklos aplinkosauginio valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas:

9.1. veiklos valdymo struktūra įmonės valdymo organizacinė schema), aprašant, kaip bendroje veiklos valdymo sistemoje realizuojamas veiklos aplinkosauginis valdymas (tiesioginė už aplinkosaugą įmonėje atsakingo asmens, darbuotojų įsipareigojimai aplinkosaugos klausimais, nurodyti jų pareiginėse instrukcijose, įmonės vidaus taisyklėse, kitos organizacinės priemonės);

Kauno RATC direktoriaus įsakymu atliekų priėmimo aikštelės veiklos kontrolę vykdyti paskirtas *Kauno RATC* techninis inžinierius, kuris kontroliuoja su aikštelės veikla susijusius techninio ir organizacinio pobūdžio klausimus, tikrina, ar tinkamai vykdoma aikštelės eksploatacija ir yra atsakingas už aplinkos apsaugą aikštelėje. *Kauno RATC* direktoriaus įsakymas pateiktas *paraiškos* **10 priede.** Atsakingas darbuotojas prižiūri, kad aikštelę eksploatuojantys darbuotojai (atliekų priėmėjas ir dashinkas) tinkamai vykdytų savo pareigas, užtikrintų švarą ir tvarką bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi. Atliekų priėmimo aikštelės ūkinės veiklos valdymo organizacinė schema pateikiama *paraiškos* **9 priede.**

9.2. veiklos aplinkosauginio valdymo nuostatos (strategija, jei ūkinės veiklos objektas tokią turi);

UAB „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" nėra įdiegusi aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001:2005 standartą, tačiau aikštelės veikla vykdoma taip, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis aplinkai bei būtų laikomasi Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos aplinkosauginių reikalavimų. Aikštelė įrengta taip, kad būtų sudaikoma visa galima tarša: pavojingų atliekų konteineriai yra hermetiškai ir turi mažėjų svarbtuvą, todėl

2011 -09- 23

1) Už „Kauno RATC" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelės" TIPK įrašymas

joks atliekų nuorėkis negalimas, o visos aikštelėje susidarančios nuotekos yra valomos. Galimos transporto priemonių tarša neutralizuojama naftos gaudyklėje. Aikštelėje susidarančios atliekos yra tvarkomos laikantis aplinkosauginių reikalavimų. Užtikrinama, kad aikštelės darbuotojai būtų tinkamos kvalifikacijos, jie yra supažindinami su aplinkosauginiais bei darbų saugos reikalavimais, o jų darbo kokybė yra nuolat kontroliuojama direktoriaus įsakymu **(10 priedas)** paskirto darbuotojo. Už kasdienę technologinio proceso kontrolę bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi aikštelėje yra atsakingi aikštelės darbuotojai. Darbuotojų įsipareigojimai aplinkosaugos klausimais nurodyti jų pareigybių aprašymuose.

9.3. veiklos aplinkosauginės priežiūros priemonės (techninės veiklos poveikio aplinkai kontrolės priemonės);

Aikštelė įrengta taip, kad būtų sudaromos visa galima tarša. Atliekų konteineriams skirta aikštelė, kelias bei privažiavimai yra asfaltuoti. Nepavojingas atliekas klientai atgabena į konteinerius tik prižiūrimi specialiai apmokyto aikštelės personalo. Visos pavojingų atliekų tvarkymo operacijos (priėmimas, paskirstymas į atitinkamus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus pažymėtas talpas, saugojimas) atliekamos tik uždarose patalpose, saugojimas atliekų skyriuje-konteineryje, kuriame įrengtas galimų nuotėkių surinktuvas, pavojingų atliekų saugojimui pastatytos hermetiškos statinės bei konteineriai. Pavojingos atliekos yra laikomos atskiromis grupėmis pagal atliekų fizines ir cheminės savybes, taip užtikrinama, kad jos negalėtų kontaktuoti tarpusavyje. Pavojingų atliekų konteineryje taip pat laikomos pavojingų atliekų neutralizavimo priemonės: sorbentas, kaštės, natrio šarmo tirpalas, konteineris su pjuvenomis. Darbuotojų apsaugai dirbant su pavojingomis atliekomis naudojami specialūs darbo drabužiai, respiratoriai bei akių apsaugos priemonės, yra įrengtas akių dušas bei veislinėlė.

Užpildyti nepavojingų atliekų konteineriai iki išvežimo perdirbėjams yra uždengiami brezentu, kad vėjas negalėtų išnešioti jame sukauptų atliekų.

Aikštelėje yra įrengtas priešgaisrinis hidrantas, kiekviename pastate-konteineryje yra gesintuvai, o prie administracinio pastato įėjimo įrengtas pilnai automatizuotas priešgaisrinis skydas.

9.4. numatomi atliekų ir planuojamai veiklai jiems įgyvendinti (nuorodos į Garnos išteklių tausojimo ir atliekų tvarkymo ar kitus su aplinkosaugos veiksmingumo gerinimu susijusius planus);

Numatomi veiksmai ir techninės priemonės aprašyti „Garnos išteklių tausojimo ir atliekų tvarkymo plane" (*pateiktas paraiškos* **16 priede**).

9.5. pažymima, ar įmonėje naudojama vadybos sistema leidžia laikytis Leidime nustatytų reikalavimų. Jeigu įmonėje naudojama vadybos sistema yra sertifikuojama, Leidime, kaip sąlyga, nurodomos papildomos priemonės, kurių įgyvendinimas leistų laikytis Leidime nustatytų reikalavimų, bei nurodomas šių priemonių įgyvendinimo terminas.

Įmonėje nėra įdiegtas LST EN ISO 14001:2005 standartas, tikimės veikloje numatyta tvarka laikytis bendrosios aplinkosauginės reikšmės. Papildomi reikalavimai nustatyti II leidimo dalyje „Leidimo sąlygos".

10. Leidimo galiojimo, jo nuostatų ir sąlygų sprendimo tvarka.

Veiklos vykdytojas gali apskųsti RAAD veiksmus ar neveikimą, susijusius su Leidimo galiojimu, sustabdymu, keitimu arba panaikinimu, teisinei įstatymų nustatyta tvarka.

TIKRA

II. Subjekto vidaus kontrolės pastabos ir pasiūlymai.

Paraiškos pagrindžiamųjų ir leidžiamų atlikti veiksmų pastabų ir pasiūlymų nepateikta. Paraiškos TIPK leidimui gauti suderinimo su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyriumi. Paraiškos TIPK leidimui gauti XI dalis „Triukšmo skleidimas ir kvapų kontrolė" suderinta su Kauno visuomenės sveikatos centru.

UAB „Kvalto projektai ir partneriai" parengė projekto „Kauno regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" techninio projekto „Atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 156, Kaunas" dalį "Aplinkos apsauga". LR AM Kauno RAAD 2008-03-18 projekto sprendiniams pritarė.

TIKRA

Aktuvo išrašas

2011 -08- 23

5 Vėl „Kauno RATC" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelei TIPK leidimas

II. LEIDIMO SĄLYGOS

12. Šioje Leidimo dalyje pateikiamos Leidimo sąlygos. Ūkinė veikla turi būti vykdoma ir kontroliuojama, laikantis šiame Leidime nustatytų sąlygų.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. *Ūkinė veikla turi būti vykdoma ir kontroliuojama, laikantis šiame Leidime nustatytų sąlygų.*
2. *Įmonė gali vykdyti savo veiklą, įvykdžiusi keliamus aplinkosauginius reikalavimus bei vykdydama reikalaujamus kontrolės sąlygas.*
3. *Pranešti LR AM Kauno RAAD apie planuojamus įrenginio eksploatavimo arba vykdomos ūkinės veiklos esminius pakeitimus (esminio ūkinės veiklos pakeitimo sąvoka apibrėžta Taisyklių II skyriaus 5.3 p.) (Žin., 2005, Nr.153-5629; Žin., 2006, Nr.120-4571).*
4. *Planuojant esminius ūkinės veiklos pakeitimus, Taisyklėse nustatyta tvarka (Taisyklių X skyriaus 56 p.) pateikti paraišką TIPK leidimo atnaujinimui.*
5. *Planuojant ūkinės veiklos pasikeitimus, atgriokiriamus prie esminių, Taisyklėse nustatyta tvarka (Taisyklių II skyriaus 5.3 p.; X skyriaus 60 p.) pateikti paraišką TIPK leidimo koregavimui.*
6. *Vadovaujantis Taisyklių 16.3 punktu, nitlinys užpažįstamas tinkamu naudoti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo Leidimo išdavimo, jei 2009 m. gruodžio 31 d. privalote pateikti statinio priėmimo tinkamu naudoti akto kopiją, taip pat įregistruoti nikšnelę VĮ „Registrų centras".*
7. *Vykdyti Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane numatytas priemones bei laikytis šių aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.*

ŽALIAVŲ NAUDOJIMAS

1. *Siekiant užtikrinti racionalų išteklių naudojimą nuolat vesti jų apskaitą vykdant registraciją perkamo vandens. Sunaudojamo vandens registraciją vykdyti skaitikliu, kurie atitinka metrologinius reikalavimus, patvirtinus. (Žin. 2001 Nr. 28-955; Žin., 2005, Nr. 24-785).*
2. *Žaliavų, pagalbinių medžiagų, kuro ir energijos naudojimas turi atitikti 5, 6, 11 lentelėse pateikiamus Leidimo sąlygas.*
3. *Planuojant didinti fosfatų ir papildomų medžiagų sunaudojimą, dėl ko didėtų susidarančių atliekų kiekiai, TIPK leidimo koregavimui tvarka pateikti paraišką leidimui koreguoti.*

TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS

1. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-588 „Dėl nuotekų reglamento patvirtinimo" bei 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų reglamento patvirtinimo" laikytis aplinkosauginių reikalavimų nuotekoms taršyti. (Žin., 2007, Nr. 110—4522; Žin. 2007, Nr. 42 – 1594).*
2. *Užtikrinti efektyvią paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos veiklą, vykdant tinkamą eksploatacijos kontrolę. Į valymo įrenginius gali būti išleidžiamos tik tokios nuotekos, kurios netrikdo nuotekų valymo įrenginių darbo bei gali būti išvalytos iki teisės aktuose nustatytų ribinių dydžių. Nuolat pildyti lietaus ir buitinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo žurnalą, pažymint valymo įrenginių remonto ir valymo atlikimo laiką.*
3. *Nuotekų valymo įrenginiuose susikaupęs dumblas turi būti valomas periodiškai ir pardavinėjamas atliekų tvarkytojui kaip pavojinga atlieka.*

6 VšĮ „Kauno RATC" K. ... miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė TIPK leidimas

ATLIEKŲ TVARKYMAS

1. *Pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą pagal LR Aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722 patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių 7 priedą; (Žin., 2004, Nr. 68-2381).*
2. *Pirminės atliekų apskaitos pagrindu, kasmet iki sausio 25 d. LR AM Kauno RAAD Kauno miesto agentūrai teikti metinę pirminės atliekų apskaitos ataskaitą. Ataskaita turi būti parengiama užpildant tam tikrą formą, pagal reikalavimus, nurodytus 2003-12-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 8 priede (Žin., 2004, Nr. 68-2381).*
3. *Pradėjus eksploatuoti aikštelę bei surogaliavus priimamų atliekų srautus, pirminės atliekų apskaitos pagrindu iki 2010 m. liepos 1 d. privalote patikslinti 37 lentelę. Atsiradus būtinybei keisti duomenis turite pateikti paraišką atitinkamam Leidimo dalies koregavimui.*
4. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr.D1-443 „Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 664 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" 2 punktu Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (toliau – Licenciją) privalo gauti pavojingas atliekas surenkančios, saugančios, šalinančios ir naudojančios įmonės (Žin., 2004, Nr.133-4823). VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" privalo artimiausiu metu gauti Licenciją ir jos kopiją pateikti LR AM Kauno RAAD. Pavojingų atliekų surinkimas ir saugojimas neturint Licencijos VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų atliekų priėmimo aikštelėje yra draudžiamas.*
5. *Privalote užtikrinti, kad įmonėje leidžiamų saugoti atliekų kiekiai neviršytų Atliekų tvarkymo veiklos plane numatytų atliekų kiekių. Leidžiamų surinkti atliekų kiekis nustatytas pagal VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų atliekų priėmimo aikštelės" veiklos nutraukimo ir atliekų sutvarkymo plane numatytus atliekų kiekius. Įvigu bendrovės ūkinėje veikloje numatomas didesnis susidarančių atliekų kiekis nei leidžiama Leidime, pateikti prašymą Leidimo koregavimui naujiems atliekų kiekiams ir naujai parengtą atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą.*
6. *Veiklos nutraukimo atveju, įmonė nustatyta tvarka privalo praneštį LR AM Kauno RAAD apie atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.*
7. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 rugsėjo mėn. 25 d įsakymo Nr. 469 „Dėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo" 16 punktu, Jūsų įmonė turi pateikti naują Garantą ar pratęsti Garantiją (pratęsti laidavimo draudimo sutartį ir pagal ją išduotą naują laidavimo raštą), ne vėliau kaip 6 savaitės iki draudimo poliso ir laidavimo rašto galiojimo pabaigos .*
8. *Prižiūrėti, kad įmonės teritorijoje laikomų atliekų ir medžiagų sandėliavimo vietose, transporto laikymo vietose, atskirų priklausymų pavojingais aplinkai skysčiais ar priklausymų pavojingomis medžiagomis ir, kad tarpusavyje nepatektų į aplinką ar grunčinius vandenis. Užtikrinti įmonės teritorijoje ir aplinkoje tvarką ir švarą. Įmonėje nuolat turi būti medžiagų (pvz. smėlio, pjuvenų, smėlio ir pan.), kad avarinio atvejo, įvykus pavojingų skysčių išsiliejimui, būtų galima lokalizuoti jų plitimą.*
9. *Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose saugomų atliekų savybes, turi atitikti tokius aikų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Atliekas galite priduoti tik tvarkymui ar šiuriimui įmonėms, kurios registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre (http://193.219.35.1/atir/ATIR.jsp).*

2009-04-13

V. VšĮ „Kauno RATC" Kauno miesto atliekų tvarkymo centro direktoriaus [illegible]

13. Gaminama produkcija ir naudojamos transporto priemonės.

Įmonė produkcijos negamina, tačiau surenkios ir išrūšiuotos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams kaip antrinės žaliavos.

1 lentelė. Gaminama produkcija. (Surenkamos antrinės žaliavos)

Pavadinimas (asortimentas)	Matas vnt., t, m³, vnt. ir kt./m.	Projektinis pajėgumas	Pagaminta 2009 m.	Planuojama pagaminti nuo 2009 m. (kasmet)
1	2	3	4	5
Standžiosios atliekos	t/m	245	-	80
Elektros ir elektroninė įranga	t/m		-	13
Naudotos padangos	t/m		-	9
Komunalinio srauto atliekos	t/m		-	178
Baterijos ir akumuliatoriai	t/m	5	-	2
Kitos pavojingos atliekos	t/m		-	1

Pastaba. Lentelė gali būti pratęsiama, keičiant ir gyvą.

2 lentelė. Naudojamos transporto priemonės.

Lentelė nepildoma, nes įmonė nuosavo transporto neturi. Numatoma, kad atliekos bus atvežamos klientų transportu, o išvežamos kitų atliekų tvarkytojų transportu.

14. Tuo atveju, jeigu Gamtos išteklių taupymo ir atliekų susidarymo plane nebuvo numatyta pakankamų priemonių, papildomi reikalavimai įrašomi kaip atitinkama Leidimo sąlyga.

Papildomos leidimo sąlygos nenustatomos.

15. Veiklos vykdytojas turi įgyvendinti pateiktus Leidimui gauti 14 ir 15.4 punktuose nurodytą Aplinkosaugos veiksmų planą. Ši Leidimo sąlyga taikoma tik Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams.

Punktas nepildomas, nes įmonėje nėra Taisyklių 1 priede išvardintų įrenginių.

3 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas.

Lentelė nepildoma, nes įmonėje nėra įrenginių, atitinkančių Taisyklių 1 priede keliamus reikalavimus.

4 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas.

Lentelė nepildoma, nes įmonėje nėra įrenginių, atitinkančių Taisyklių 1 priede keliamus reikalavimus.

TIKRA

Vilma Gaigalienė

2011-05-23

8 VšĮ „Kauno RATC" K. ...o atliekų priėmimo aikštelė" TIPK leidimas

16. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas ir saugojimas.
Gaminio ištekliai ir žaliavos turi būti naudojamos pagal šiame Leidime nustatytas Leidimo sąlygas.

5 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimo planuojami kiekiai.

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Vnt.	Didžiausias naudojimo per 2016 metus kiekis	Leidžiamas naudoti kiekis	
				eilė 2500 m. ligšiol toks	nuo 2016 m. (kasmet)
1	2	3	4	5	6
1	Sorbentai	t/m.	-	0,05	0,05
2	Pjuvenos	t/m	-	0,07	0,07
3	Įvairios paskirties (plastikinės talpos, dėžės)	t/m	-	20	20

Pastaba. Lentelė gali būti pratęsiama, naudojant 6 grafą.

6 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų saugojimas.

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas [1]	Transportavimo būdas	Kiekis saugomas vienoje, t	Saugojimo būdas [2]
1	2	3	4	5
1	Sorbentai	Pristatymas pagal užsakymą	0,05	Patalpinti šiltuosiuose priešgaisrinio tipo skyde
2	Pjuvenos	Pristatymas pagal užsakymą	0,07	Patalpinti šiltuosiuose priešgaisrinio tipo skyde
3	Įvairios paskirties (plastikinės talpos, dėžės)	Pristatymas pagal užsakymą/pavieniui	20	Buitinės patalpos

Pastabos:
1 – informacija apie susidarančią atlieką ir degalus pateikiama 11 lentelėje;
2 – priklausomai talpos, sistemos, medžiagai, pavyzdžio aplinkai ir/arba naudojamo betonui dengti kuro saugyklų plotui ir pan.

7 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir preparatų naudojimas ir saugojimas.
Lentelė nepildoma, nes įmonėje dėra įrenginių, naudojančių tirpiklių turinčias medžiagas ir preparatus.

8 lentelė. Kietųjų nuslinkusių išmetamų garų valymo ir pažeistų žemių rekultivavimas.
Lentelė nepildoma, nes nustatinguoju išmetamų įmonė neišgamina ir pažeistų žemių nerekultivuoja.

9 lentelė. Naftos telkinių ištekliai ir eksploatacinių gręžinių sąrašas[1].
Lentelė nepildoma, nes įmonė neeksploatuoja naftos telkinių ar gręžinių.

10 lentelė. Leidžiama išgauti nafta.
Lentelė nepildoma, nes įmonė naftos neišgauna.

TIKRA

9 VšĮ „Klaipėdos RATC“ Kasmet mišrių atliekų [illegible] TIPK leidimas

17. Kuro ir energijos vartojimas. Energijos gamyba.

Atliekų priėmimo aikštelėje technologiniame procese kuras ir energija nenaudojami. Per metus aikštelėje sunaudojama 19 x 10^3 kWh elektros energijos administracinio pastato šildymui, apšvietimui bei buitiniams reikmėms. Elektros energija atliekų priėmimo aikštelėje negaminama.

Energetiniai ištekliai turi būti naudojami 11 lentelėje nustatytų dydžių ribose.

11 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas[1].

Energetiniai ir technologiniai ištekliai	Matavimo vnt., t, m³, KWh ir kt.	2008 m.	Sunaudojimas 2009 m.	Sunaudojimas[2] nuo 2010 m. (kasmet)	Apskaitos įrenginiai:	Atliekų gavimo šaltinis
1	2	3	4	5	6	7
a) elektros energija	KWh	Veikla nebuvo vykdoma	19000	60000	Skaitiklis	AB „VST“
b) šiluminė energija						
c) gamtinės dujos						
d) suskystintos dujos						
e) mazutas						
f) akmeninė anglis						
g) dyzelinas						
h) durpės anglis						
i) benzinas						
j) biokuras:						
1)						
2)						
k) t. t. kiti						

Pastabos:

[1] – lentelėje nurodomi pagrindiniai metais naudojami ištekliai šiekiai ir nurodomi šiekiai apskaitos įrenginiai.

[2] – nurodyti, kas sunaudojami lentelėje nurodomi šiekiai, pvz., gamybai, naudojant, kokiems gamybiniams procesams, patalpų ar vandens šildymui, gaminama energija parduodama ir kt. Jei įmonėje ar visiškai atitinka vieną iš minėtų, užtenka jas papildyti arba esamo pakeisti įmonėje taikomu pavadinimu.

12 lentelė. Energijos gamyba.

Lentelė nepildoma, nes *Kauno RATC* Kauno miesto Nemajūnų g. Atliekų priėmimo aikštelė nemano vykdyti energijos gamybos.

Leidimo sąlyga

1. ***Žaliavų, pagalbinių medžiagų, kuro ir energijos naudojimas turi atitikti 5–12 lentelėse patvirtintas Leidimo sąlygas.***
2. ***Planuojant didinti žaliavų ir papildomų medžiagų sunaudojimą, dėl ko didėtų į aplinkos oro užterštumą kenksmingų medžiagų kiekiai, tvirtina sudaromųjų atliekų kiekiai, TIPK teisės aktuose numatyta tvarka patikslinti parašiką leidimui koreguoti.***

18. Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas.

Leidimo dalis neišduodama, nes įmonės vykdomo ūkinė veikla neatitinka Tarybos įsteigtojos prievesijos ir kontrolės nuostatų 2 priedo 1 punkto reikalavimų – „iš paviršinių ar požeminių vandens telkinių paimamas ar pernuojamas imtis 100 m³ per parą ir daugiau vandens".

Vandens įmonėje naudojamas lik buitiniuose reikmėms. Technologiniam procesui vanduo nėra naudojamas. Vanduo buitinėms reikmėms tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų. Vandeo atliekų priėmimo aikštelei tiekiamas iš Kauno miesto viešojo vandens tiekimo sistemos, prisijungus prie esamos Ø110 mm vandentiekio linijos. Suvestinės inžinerinių tinklų plano patvirtinimas *pateikiamas* **12 priedė.** Suvartuoto vandens kiekis objekte nustatomas remiantis veikiančiu vandens skaitikliu. Sutartis su vandens tiekėju bus pasirašyta iki 2009-07-21.

Detalesnė informacija apie vandens suvartojimą pateikta pateiškos TIPK leidimui gauti V dalyje „Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas".

13 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio imamas vanduo, vandens čiulpo vietą bei įrenginį.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišduodama.

14 lentelė. Duomenys apie naudojamas požeminio vandens vandenvietes.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišduodama.

15 lentelė. Vandens paėmimas ir vartojimas.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišduodama.

16 lentelė. Paimamo vandens apskaitos prietaisas.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišduodama.

17 lentelė. Numatomos racionalaus vandens vartojimo ir tiekimo sąlygos įmonėje.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišduodama.

18 lentelė. Vandens naudotojų abonentų vartojamo vandens kiekiai.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišduodama.

Leidimo sąlyga

1. *Siekiant užtikrinti racionalų išteklių naudojimą nuolat vesti jų apskaitą vykdant registraciją paimamo vandens. Sunaudojamo vandens registraciją vykdyti skaitikliu, kuris atitinka metrologinius reikalavimus, patvirtinti. (Žin. 2004, Nr. 29-941; Žin., 2005, Nr. 24-785).*

TIKRA

Asistentė Consulting

13 VšĮ „Kauno RATC" Kauno [illegible] ir vidinių nuotekų tinklų eksploatavimo ir priežiūros" TIPK leidimas

2011 m. ...

19. Oro tarša.
Leidimo dalis neišdėstoma, nes įmonės vykdoma ūkinė veikla nereglia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įstatymo 2 priede 6 punkto reikalavimų – „išmetama į aplinkos orą 10 tonų per metus ar daugiau teršalų"; 5 punkto reikalavimų – „naudojamas bent vienas kietasis kuru šildomas katilas, kurio šilumos galia, kurio kūrykios šiluminis našumas yra 0,5 MW ar daugiau"; 6 punkto reikalavimų – „naudojamas stacionarus dujinis šaltinis, kurio šiluminis našumas yra 1,0MW ar daugiau". Detalesnė informacija apie oro taršą pateikta paraiškos ŪPK leidimui gauti VI dalyje „Į aplinkos orą išmetami teršalai".

20. Teršalų išmetimo į orą kontrolė ir matavimai.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

21. Aplinkos oro monitoringas.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

19 lentelė. Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

19[1] lentelė. Leidžiamos iš įrenginio išmesti šiltnamio dujos.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

20 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių techniniai duomenys[1].
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

21 lentelė. Tarša į aplinkos orą[1].
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

22 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir kitos taršos prevencijos priemonės.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

23 lentelė. Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

24 lentelė. Neorganizuoti teršalų išmetimai į aplinkos orą.
Nepildoma, nes Leidimo dalis neišdėstoma.

20. Teršalų išmetimo į orą kontrolė ir matavimai.
Punktas nepildomas, nes leidimo dalis neišdėstoma.

21. Aplinkos oro monitoringas.
Punktas nepildomas, nes leidimo dalis neišdėstoma.

KOMISIJOS KORESPONDENTAS IR PERIMTOJI SKYRIUS

TIKRA

2011 -08- 23

[1] VšĮ „Kauno RATC" K[illegible] p mases Nemėžinų g. atliekų priėmimo aikštelei" ŪPK leidimas

22. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.

Leidimo dalis neišnaudojama, nes įmonės vykdoma ūkinė veikla neatitinka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės taisyklių 2 priedo 2 punkto reikalavimų – „išleidžiama (planuojama išleisti) į aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, kaupiklio rezervuarus, žemdirbystės dirbamuosius laukus ir kt.)“; 2.1 punkto reikalavimą – „5 m³ per parą ir daugiau buitinės, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršinės) nuotekų“; 3 punkto reikalavimą – „išleidžiama ar planuojama išleisti į aplinką paviršines nuotekas, kurių išleidimas pagal galiojančius teisės aktus paviršinėms nuotekoms tvarkyti galiamas tik turint Leidimą“.

Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 26.2 punktu (Žin., 2007, Nr. 42-1594) įmonės teritorija nevisiškai 1 ha ploto, nuo kurio surenkamos paviršinės nuotekos į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą, todėl leidžiami paviršinių nuotekų išleidimo parametrai nenustatomi.

Aikštelėje prieš buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginius. Buitinės nuotekos iš administracinio pastato nuvedamos į buitinių nuotekų valyklą (aerobinis biologinis valymo įrenginys, 0,7 m³/d. našumo), iš kurios nuvedamos į išvalytų lietaus nuotekų tinklus. Paviršinės lietaus nuotekos iš aikštelės surenkamos per vandens praleidimą gaudyklę ir valomos vietiniuose mechaniniuose valymo įrenginiuose (5 ls talpumo), iš kurių kartu su išvalytomis buitinėmis nuotekomis teršta nuotekyne išleidžiamos į Amušės upelį. Nuotekų valymo įrenginiai veikia nepertraukiamai. Valymo įrenginių užtikrtės deklaracijos bei charakteristikos pateikiamos *paraiškos* **19 priede.**

Laboratorinė kontrolė atliekama kartą per ketvirtį šiuose taškuose: nevalytų paviršinių nuotekų mėginiai imami paskirstymo šulinyje Nr. 4; išvalytų paviršinių nuotekų mėginiai imami kontroliniame šulinyje Nr. 7; nevalytų buitinių nuotekų kontrolė atliekama šulinyje Nr. 2, o išvalytų buitinių nuotekų mėginys imamas už valymo įrenginių, šulinyje Nr. 3. Laboratorinė kontrolė atliekama pagal sudėtinį Nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planą (žr. *paraiškos* 29 lentelė).

Schema su pažymėtais buitinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, priėmimais ir laboratorinės kontrolės vietomis pateikiama *paraiškos* **12 priede.**

25 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priėmimą), į kurį išleidžiamos nuotekos.

Lentelė nepildoma, nes vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu (Žin., 2006, Nr. 59-2203; 2007, Nr. 110-4522) atliekų priėmimo aikštelės veikloje susidarantis buitinių nuotekų kiekis neviršija 5 m³/d.

26 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priėmimą (išskyrus paviršinius vandens telkinius ir žemdirbystės dirbamuosius laukus), į kurį išleidžiamos nuotekos.

Lentelė nepildoma, nes nuotekos išleidžiamos į paviršinį vandens telkinį.

23. Numatomi atitinkami nuotekų valymo užtikrinti ŽŪL prie Leidimo turi būti pridedamas žemėjimo lauko planas su pažymėtomis žemės naudojimo apribojimų ribomis ir apribojimų aprašymu (jeigu apribojimų nustatyta). Pridedamame plane laukai turi būti sunumeruoti.

Punktas nepildomas, nes užšiurnti nuotekų ŽŪL nenumatoma.



13 VšĮ „Kauno RATC“ Kauno miesto ir rajonų g. atliekų priėmimo aikštelės TIPK leidimas

24. Pridedami dokumentų, įrodančių Leidimo turėtojo teisę naudoti šiuos nuotekų/skysčių atliekų laistymui (nuosavybės dokumentų arba atitinkamų sutarčių), originalai ar jų patvirtinti nuorašai. Pasibaigus minėtų dokumentų galiojimo laikui, Leidimas nuotekų/skysčių atliekų laistymui turės būti koreguojamas/atnaujinamas.

Punktas nepildomas, nes nuotekos ŽŪI, neutilizuojamos, sutartys nesudaromos.

27 lentelė. Informacija apie žemdirbystės dirbamuosius laukus (ŽDL), kuriuose leidžiama laistyti (utilizuoti) nuotekas (mėšlo filtratą, skystą mėšlą, srutas, skystas atliekas, žiužutus ar pan.).

Lentelė nepildoma, nes nuotekos ŽŪI, neutilizuojamos.

25. Prie Leidimo turi būti pridėta schema su pažymėtomis nuotekų išleistuvų ir/arba nuotekų šaltinių vietomis ir numeriais.

Schema su pažymėtais taškinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, priimtuvais ir šaltosiomis kontrolės vietomis pateikiama *paraiškos* **12 priede.**

28 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus.

Lentelė nepildoma, nes leidimo dalis neišduodama.

29 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.

Lentelė nepildoma, nes leidimo dalis neišduodama.

30 lentelė. Objekte/įrenginyje esančios (taikomos) nuotekų kiekių ir taršos matavimo priemonės.

Lentelė nepildoma, nes leidimo dalis neišduodama.

Šiuo metu įdiegtos nuotekų kiekių ir taršos matavimo priemonės. Nuotekų valymo įrenginių apvalymai bei užlikties deklaracijos pateikiamos *paraiškos* **19 priede.**

31 lentelė. Privalomos įdiegti nuotekų kiekio ir taršos matavimo priemonės.

Lentelė nepildoma, nes nuotekų kiekio ir taršos matavimo priemonių nenumatoma.

32 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių priimamos nuotekos (su paviršinės) apraša ir priimamų nuotekų savybės.

Lentelė nepildoma, nes leidimo dalis neišduodama.

33 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių priimamos paviršinės nuotekos, sąrašas ir priimamų nuotekų savybės.

Lentelė nepildoma, nes leidimo dalis neišduodama.

34 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai.

Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis neišduodama.

Leidimo sąlygos

1. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. D1-515 „Dėl nuotekų reglamento patvirtinimo" bei 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų reglamento patvirtinimo" laikytis aplinkosauginių reikalavimų nuotekoms tvarkyti. (Žin., 2007, Nr. 110 – 4522; Žin. 2007, Nr. 42 – 1594).*
2. *Užtikrinti efektyvų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos veiklą, vykdant tinkamą eksploatacijos kontrolę. Į valymo įrenginius gali būti išleidžiamos tik tokios nuotekos, kurios neviršija bei valymo įrenginių darbo bei gali būti žiravios iki teisės aktuose nustatytų ribinių dydžių. Nuolat pildyti lietaus ir buitinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo žurnalą, pažymint valymo įrenginių remonto ir valymo atlikimo laiką.*
3. *Nuotekų valymo įrenginiuose susikaupęs dumblas turi būti valomas periodiškai ir perduodamas atliekų tvarkytojui kaip pavojinga atlieka.*

26. Dirvožemio aprašas.

Dirvožemio bei gruntinio vandens užterštumo tyrimų atlikta nėnuo. Aikštelės teritorijoje UAB „HGN Hydrogeologie Baltic" atlikо inžinerinius – geologinius tyrimus, kurių metu gruntinis vanduo nenustatytas. Atliekų priėmimo aikštelė yra pramoninėje miesto zonoje. Kuri plyti Nemuno žemupio lygumoje, Nemuno slėnio aliuvinės terasinėje zonoje. Žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 34,0 m iki 36,3 m. Visoje teritorijoje vyrauja pilkas gruntas, sudarytas iš smulkiojo lauko, smėlio, žvyro ir siekia iki 5,0 m.

Atliekų priėmimo aikštelė suformuota bei įrengta taip, kad užterštas nuotekos produktais lietaus vanduo yra surenkamas paviršinių nuotekų tinklais, iš jų patenka į valymo įrenginius, iš kurių išvalytos išleidžiamos į Atmalės upėlį. Buitinės nuotekos iš administracinio pastato nukreipiamos į vietinius valymo įrenginius, iš kurių išvalytos nukreipiamos į lietaus nuotekų tinklus.

SS Všį „Kauno HATO" Kauno miesto Nemuno g. atliekų priėmimo aikštelės" TIPK leidimas
290 -56- 23

27. Atliekų susidarymas, naudojimas ir/ar šalinimas:

27.1. Atliekų susidarymas.

Atliekų priėmimo aikštelėje susidarys nepavojingos mišrios buitinės atliekos. Numatoma, kad šios atliekos susidarys iš trijų pagrindinių šaltinių: 1) aikštelės darbuotojų atliekos buitinės atliekos: maisto pakuotės atliekos, netinkamos perdirbti kanceliarinės atliekos ir pan.; 2) nepavojingi nepavojingi likučiai iš jų atliekų: pvz., netinkamai išrūšiuotos, užterštos žiebtelės ir pan. atliekos, jei aikštelės darbuotojai tokių atliekų aptinka tarp klientų pristatytų rūšiuotų atliekų, taip pat nepavojingos klientų atvežtų atliekų pakuotės atliekos. Numatoma, kad per metus susidarys 2 t mišrių buitinių atliekų. Paviršinių nuotekų surinkimo grupuotuvėje ar buitinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarys nuotekų valymo dumblas (pavojingo dumblo iš surinkimo grupuotuvės ~ 0,05 t per metus, nepavojingo dumblo ~ 0,5 t per metus).

35 lentelė. Leidžiamos pagaminti atliekos.

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) *VšĮ „Kauno RATC" atliekų priėmimo aikštelė, Nemalėnų g. 15, Kaunas*

Atliekos				Susidarymas	
Kodas[1]	Pavadinimas	Pavojingumas[2]	Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Projektinis kiekis[3], t/m.	Didžiausias leidžiamas pagaminti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
13 05 02*	Naftos produktų/ vandens separatorių dumblas (dumblas iš naftos gaudyklės)	H14- pavojingas aplinkai	Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (dumblas iš naftos gaudyklės)	0,5	0,5
19 08 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (buitinių nuotekų valymo dumblas)	Nepavojingos	Buitinių nuotekų valymo įrenginiai	0,05	0,05
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojingos	Darbuotojų buitinės atliekos bei perdirbti netinkami likučiai nuo atliekų priėmimo aikštelės	2	2

Pastabos.

[1] – atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 217 (žin., 1999, Nr. 63-2065, 2004, Nr. 65-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 2 priedą;

[2] – savybė, kuria pasižyminčios atliekos yra pavojingos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedą;

[3] – per metus susidarantis didžiausias atliekų kiekis, kai įrenginys ar technologinis procesas veikia visu nuleistu (projektiniu) kiekiu).

36 lentelė. Atliekos, leidžiamos perduoti atliekų naudojimo ar šalinimo įmonėms.

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) *VšĮ „Kauno RATC" atliekų priėmimo aikštelė, Nemalėnų g. 15, Kaunas*

Atliekos	
Kodas[1]	Pavadinimas
1	2
13 05 02*	Naftos produktų/ vandens separatorių dumblas (dumblas iš naftos gaudyklės)
19 08 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (buitinių nuotekų valymo dumblas)
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos

Pastabos. [1] – atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą.

LR VšĮ „Kauno RATC" K[illegible] r. savivaldybės Nemalėnų g. atliekų priėmimo aikštelė" TIPK leidimas

27.2. Atliekų naudojimas ir/ar šalinimas.

Nepavojingų atliekų priėmimas vykdomas asfaltuotoje aikštelėje, kurioje išdėstyti konteineriai (konteinerių išdėstymas pateikiamas Statinių bei patalpų išdėstymo schemoje **6 priede**). Priimamos tik išrašiusiotos atliekos, įrašytos į aikštelėje saugomų atliekų sąrašą (žr. 37 lentelę), jose negali būti kitų atliekų priemaišų ar pavojingų atliekų. Po patikrinimo, prižiūrintį aikštelės darbuotojui, klientai tašpina atliekas į konteinerius. Stambi buitinė technika kaupiama didžiųjų atliekų skyriuje. Priimtos atliekos registruojamos priėmimo atliekų apskaitos žurnale.

Visos pavojingų atliekų priėmimo, patikrinimo, perpakavimo operacijos vykdomos tik specialiai įrengtame hermetiškame pavojingų atliekų skyriuje-konteineryje. Hermetiškas konteineris su įrengta galima nuotėkių surinktuvu bei centralizuotine ventiliacija.

Įmonė turi parengtą ir patvirtiną Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techninį reglamentą (pridedamas *paraiškos* **14 priede**) bei Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą (pateikiamas *paraiškos* **15 priede**).

37 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms).

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju): *VšĮ „Kauno RATC" atliekų priėmimo aikštelė, Nemajūnų g. 15, Kaunas*

Atliekos			Naudojimas		
Kodas[1]	Pavadinimas	Pavojingumas[1*]	Įrenginio galimas, tip.	Naudojimo būdai[2]	Didžiausias leistinas naudoti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
08 01 23*	dažų ar lako turinčių atliekos	H5	3	R13, S1 (**)	3***
08 03 12*	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H5	3	R13, S1 (**)	3***
08 04 09*	klijų ir hermetikų, turinčios yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	H5, H3B	3	R13, S1 (**)	3***
13 02 05*	sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H3B	3	R13, S1 (**)	3***
13 02 06*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H5	3	R13, S1 (**)	3***
15 01 01, 20 01 01	popierinės ir kartoninės pakuotės, popierius ir kartonas	Nepavojingos	247	R13, S1 (**)	87
15 01 04, 20 01 02	metalinės pakuotės, metalai	Nepavojingos	247	R13, S1 (**)	17
15 01 10*	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	H5, H3A	3	R13, S1 (**)	3***
15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (tepalumas pjovenos)	H3B	3	R13, S1 (**)	3***
16 01 03	naudotos padangos	Nepavojingos	247	R13, S1 (**)	9
16 01 07*	tepalų filtrai	H14	3	R13, S1 (**)	3***
17 09 04	mišrios statybinės ir griovimo atliekos	Nepavojingos	247	R13, S1 (**)	16
20 01 23*	įrenginiai	H3A	3	R13, S1 (**)	3***
20 01 34*	skalbyklos	H8	3	R13, S1 (**)	3***
20 01 35*	šaldytuvai	H8	3	R13, S1 (**)	3***

17 VšĮ „Kauno RATC" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė' SPK sudarytas

20 01 21*	dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	H6	3	R13, S1 (**)	3***
20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H5, H14	5	R13, S1 (**)	3***
20 01 33*	baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tų baterijų	H6, H8	3	R13, S1 (**)	3***
20 01 02	stiklas	Nepavojingas	240	R13, S1 (**)	32
20 01 34	baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 20 01 33	Nepavojingas	3	R13, S1 (**)	3***
20 01 36	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	Nepavojingas	12	R13, S1 (**)	6
20 01 38	mediena	Nepavojingas	240	R13, S1 (**)	16
20 01 39	plastikas	Nepavojingas	240	R13, S1 (**)	24

Pastabos:
[1] – atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą;
[2] – pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedą;
[3] – pagal Atliekų tvarkymo taisyklės.

* Lentelėje nurodytų atliekų pavojingumą lemiančios savybės:
H3A – labai degios;
H3B – degios;
H5 – kenkiantingos: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali iš dalies pakenkti sveikatai;
H6 – toksiškos: medžiagos ir preparatai (įskaitant labai toksiškus), kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti sunkių ūmių ar chroniškų ligų ar net mirtį;
H8 – ėdžios: medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai;
H14 – pavojingos aplinkai: medžiagos ir preparatai, kurie sukelia arba gali sukelti staigų ar uždelstą pavojų vienam ar daugiau aplinkos komponentų.

** Lentelėje nurodyti atliekų tvarkymo būdai:
R13 – R1-R12 nurodytais būdais panaudoti skirtų atliekų saugojimas
S1 – surinkimas

*** Kadangi nusprendus priimti baltyje susidarančių pavojingų atliekų kiekio palyginti mažas, o patikimų duomenų apie atskirų pavojingų atliekų rūšių ilgalaikį bendrame komunalinėje atliekų srauto srovėje, nusprendus tik bendras pavojingų atliekų susidarančių atliekų kiekis.

TIKRA

27.3. Papildomi duomenys, jei reikia, nustatomos Leidimo sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), reikalavimus.

Punktas nepildomas, nes įmonė sąvartyno neeksploatuoja.

38 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos (atliekas šalinančiam įmonėms).

Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų nešalina.

Leidimo sąlygos

1. *Pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą pagal LR Aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 723 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 7 priedą (Žin., 2004, Nr. 68-2381).*
2. *Pirminės atliekų apskaitos pagrindu, kasmet iki sausio 25 d. LR AM Kauno RAAD Kauno miesto agentūrai teikti metinę pirminės atliekų apskaitos ataskaitą. Ataskaita turi būti parengiama užpildant tam tikrą formą, pagal reikalavimus, nurodytus 2003-12-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 723 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 8 priede (Žin., 2004, Nr. 68-2381).*
3. *Pradėjus eksploatuoti aikštelę bei sureguliavus priimamų atliekų srautus, pirminės atliekų apskaitos pagrindu iki 2010 m. liepos 1 d. privalote patikslinti 37 lentelę. Atsiradus būtinybei keisti duomenis turite pateikti paraišką atitinkamos Leidimo dalies koregavimui.*
4. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr.D1-443 „Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas surenkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimu" 2 punktu Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (toliau – Licenciją) privalo gauti pavojingas atliekas surenkančios, saugančios, šalinančios ir naudojančios įmonės (Žin., 2004, Nr.133-4803), VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" privalo užtikrinti, kad gauti Licenciją ir jos kopiją pateikti LR AM Kauno RAAD. Pavojingų atliekų surinkimas ir saugojimas neturint Licencijos VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų atliekų priėmimo aikštelėje yra draudžiamas.*
5. *Privalote užtikrinti, kad įmonėje laikinai saugomi atliekų kiekiai neviršytų Atliekų tvarkymo veiklos plane nurodytų atliekų kiekių. Leidžiamų surinkti atliekų kiekis nustatytas pagal VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų atliekų priėmimo aikštelė" veiklos nutraukimo ir atliekų sutvarkymo plane numatytus atliekų kiekius. Jeigu bendrovės ateityje veikloje numatomas didesnis surinkamų atliekų kiekis nei leidžiama Leidime, pateikti prašymą Leidimo koregavimui naujiems atliekų kiekiams ir naujai parengtą atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą.*
6. *Veiklos nutraukimo atveju, įmonė nustatyta tvarka privalo pranešti LR AM Kauno RAAD apie atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.*
7. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 rugsėjo mėn. 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir patvirtinimo tvarkos patvirtinimo" 16 punktu, Jūsų įmonė turi pateikti naują Garantą ar pratęstą Garantiją*

KOPIJA

59 VšĮ „Kauno RATC" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelės TIPK sprendimas

2011-08-23

(pratęsti leidavimo įtraukimo saugotį ir pagal jį Įdiegti naują leidavimo raštą), ne vėliau kaip 6 savaitės iki draudimo galios ir leidavimo raštu galiojimo pabaigos .

8. *Prižiūrėti, kad įmonės teritorijoje laikomų atliekų ir medžiagų saugėjimo vietose, transporo laikymo vietose, nebūtų prilaikymų pavojingais aplinkai skysčiais ar perbarstymų pavojingomis medžiagomis ir, kad teršalai nepatektų į aplinką ar grunčinius vandenis. Užtikrinti įmonės teritorijoje ir aplinkoje tvarką ir švarą. Įmonėje nuolat turi būti medžiagų (spec. sorbentų, pjuvenų, smėlio ir pan.), kad avarinio atveju, fyskus pavojingų skysčių išsiliejimui, būtų galima lokalizuoti jų plitimą.*
9. *Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į jiuose saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Atliekas galite priduoti utilizavimui ar išvežimui įmonėms, kurios registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre (http://193.219.59.14/atir/ATIR.py).*

TIKRA

2011-09-23

28 VšĮ „Kauno RATCO K· p rūšiavo Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė" TIPK laidimas

28. Į aplinką išmetamų (išleidžiamų) teršalų apskaita. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas.

39 lentelė. Nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planas.
Nuotekų ir paviršinio vandens laboratorinė kontrolė vykdoma pagal su LR AM Kauno RAAD Valstybinės aplinkos kontrolės skyriumi suderintą kontrolės *grafiką* (žr. *paroliukas* 39 lentelė).

40 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolės grafikas.
Lentelė nepildoma, nes įmonėje stacionarių oro taršos šaltinių nėra. Grafikas nerengiamas.

41 lentelė. Ūkio subjektų aplinkos (poveikio aplinkai) monitoringo planas.
Lentelė nepildoma, nes Poveikio aplinkai monitoringo planas nerengiamas. Poveikio aplinkos oro monitoringas nevykdomas todėl, kad įmonėje nesusidaro teršalų, kurių $TPR>10^4$. Paviršinių vandenų monitoringas nevykdomas, nes įmonė nešvaistidžia į aplinką teršalų su nuotekomis.

29. Triukšmo kontrolė.
Nuolatinio triukšmo šaltinių aikštelėje nėra. Triukšmą gali sukelti tik į aplinką priėmimo aikštelę atvažiuojantieji šiukšliavežiai ar atliekas perdirbančių įmonių sunkvežimiai bei atliekų tiekėjų, atvežusių savo atliekas, transporto priemonės. Numatoma, kad per savaitę į aikštelės teritoriją atvažiuos ne daugiau kaip 3 atliekų tvarkymo įmonių sunkvežimiai. Per dieną į aikštelę atvyks ne daugiau kaip 10 lengvųjų automobilių. Transporto priemonių keliamas triukšmas bus nežymus ir nepastovus. Aikštelė įrengta pramoniniame miesto rajone, iki artimiausio gyvenamojo namo yra 100 m atstumas, todėl nauų pasiėkiamie triukšmos neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose bei jų aplinkoje" nustatytų leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Kauno visuomenės sveikatos centro išvada pateikiama *paroliukas* 21 priede.

30. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.
Punktas nepildomas, nes įrenginio eksploatavimo laikas neribojamas.

31. Triukšmo kontrolė ir matavimai. Duomenys apie triukšmo šaltinių charakteristikas.
Punktas nepildomas, nes duomenų apie triukšmo šaltinių charakteristikas nepateikta.

42 lentelė. Triukšmo šaltinių ir parametrų suvestinė.
Lentelė nepildoma, nes nėra duomenų apie triukšmo šaltinius ir jų parametrus.

32. Kvapų kontrolė.
Įmonėje kvapų kontrolė nevykdoma.

21 VšĮ „Kauno RAEC" Kauno miesto Kemsėjimų g. atliekų priėmimo aikštelė" ŪPK leidimas

33. Avarijų ir teršalų neatitiktinių išmetimų prevencija.
Įmonėje nėra Taisyklių 1 priede nurodytų įrenginių, todėl avarijų ir teršalų neatitiktinių išmetimų prevencija nevykdoma.

34. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai.
Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai nenustatomi.

35. Apskaitos vykdymas ir ataskaitų rengimas.
Apskaitos vykdymas ir rengimas nenurodytas 11 leidimo dalyje „Leidimo sąlygos".

36. Be minėtų ataskaitų, iš veiklos vykdytojo Leidimo sąlygose nustatyta tvarka gali būti reikalaujama pateikti ataskaitas apie Leidimo sąlygų, nurodytų Aplinkosaugos veiksmų plane (Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams) bei Gamtai tausių tvarymo ir atliekų susidarymo plane (visoms veikloms), vykdymą.
Įmonėje nėra Taisyklių 1 priede nurodytų įrenginių, todėl papildomų ataskaitų apie Leidimo sąlygų vykdymą nenustatoma.

TIKRA

III. LEIDIMO PRIEDAI

37. 1 priedas. Schemos ir žemėlapiai.

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 15B, Kaunas patikties vietovėje planas (paraiškos 2 priedas)

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 15B, Kaunas pastatų ir pagalbinių patalpų išdėstymo schema (paraiškos 6 priedas)

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 15B, Kaunas suvestinės inžinerinių tinklų planas (paraiškos 12 priedas)

38. 2 priedas. Suinteresuotų institucijų išvados ir komentarai.

LR AM Kauno RAAI įvada dėl poveikio aplinkai vertinimo (paraiškos 7 priedas)

Kauno visuomenės sveikatos centro 2009-06-15 raštu Nr.2-2250-6(8.8) „Dėl paraiškos TIPK leidimui gauti" suderinimo kopija (paraiškos 21 priedas)

Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotas Statybos leidimas Nr.38-5 IT 134-10471 (paraiškos 8 priedas)

39. 3 priedas. RAAI komentarai dėl Leidimo sąlygų (kai Leidimo sąlygos neatitinka paraiškos duomenų).

Leidimo sąlygos atitinka paraiškos duomenis.

40. 4 priedas. Pateikiami dokumentai, kurie buvo naudoti sprendimams pagrįsti, bei jų sąrašas, nurodant:

40.1. UAB „Kesto projektai ir paslaugos"

40.2. Techninio projekto „Atliekų priėmimo aikštelės įrengimas Nemajūnų g. 15B, Kaunas" aplinkos apsaugos dalis

41. Pridedami dokumentai:

41.1. VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 15B, Kaunas paraiška TIPK leidimui gauti (šio leidimo sudedamoji dalis);

41.2. VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 15B, Kaunas paraiškos TIPK leidimui gauti priedai bei jų sąrašas;

42. Kiti priedai.

42.1. VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 15B, Kaunas "Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (paraiškos 145 priedas);

42.2. VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 15B, Kaunas "Atliekų tvarkymo veiklos automatikos planas (paraiškos 15 planas);

42.3. Nuotekų valymo įrenginių charakteristikos ir atitikties deklaracijų kopijos (paraiškos 19 priedas);

42.4. Vandens tiekimo sutarties su UAB „Kauno vandenys" kopija (paraiškos 18 priedas);

42.5. Sutarties su nuotekų surinkimo talpos savininkų kopija (paraiškos 20 priedas);

42.6. Sutartys su atliekas tvarkančiomis įmonėmis (paraiškos 17 priedas)

42.7. Baltskirsančių konkrečiuose nuotėkų tiekių skaičiuose vykdant teritorijos (paraiškos 13 priedas).

TIKRA

21 VšĮ „Kauno RAAC" Kauno miesto Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelė" TIPK leidimas

Priedas 2.5.4

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 3 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. 1/52

3	0	0	0	9	2	9	9	8

(Objekto kodas)

Atliekų priėmimo aikštelė,
Adresas: Raudondvario pl. 155D, Kaunas
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“,
Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124, tel. 837 311267, faksas 837 490734,
el. paštas: info@kaunorate.lt
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą sudaro 27 puslapiai.

Išduotas 2011 m. vasario 21 d.

Direktorius Antanas Petrauskas
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

Šio leidimo parengti 4 egzemplioriai.
Šio leidimo dalies „Triukšmo ir kvapų kontrolė“ 1 egz. parengtas ir pateiktas Kauno VSC.

Paraiška TIPK leidimui gauti suderinta su:
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyriumi 2011 m. sausio 27 d., TIPK leidimo projektas – 2011 m. vasario 15 d.
Kauno visuomenės sveikatos centru 2011 m. vasario 01 d., TIPK leidimo projektas – 2011 m. vasario 15 d.

(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

Pastaba: koreguojant Leidimą, kiekvieną kartą rengiamas naujas Leidimo variantas.

AUTENTIŠKA. KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Aldona Čepiejienė
2011-06-13
245

I. BENDROJI DALIS. DUOMENYS APIE ĮRENGINĮ, ŪKINĘ VEIKLĄ, VYKDOMĄ VEIKLOS APLINKOSAUGINĮ VALDYMĄ IR KONTROLĘ

1. Ūkinės veiklos objekto pavadinimas.
Kauno atliekų priėmimo aikštelė.
Atliekų priėmimo aikštelės valdytojas ir veiklos vykdytojas yra viešoji įstaiga „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras". Všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro registravimo pažymėjimo kopija pateikta **priede Nr.1**.

2. Adresas korespondencijai (jei skiriasi nuo veiklos vykdytojo adreso).
Raudondvario pl. 155 D, Kaunas, LT-47194, nuo veiklos vykdytojo adreso nesiskiria.

3. Ūkinės veiklos/įrenginio vieta, jo valdytojas ir/ar naudotojas. Nurodoma ūkinės veiklos vietos veiklos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų išdėstymu.

Kauno atliekų priėmimo aikštelė įrengta žemės sklypo, esančioje Kauno rajono Raudondvario pl. 155D, teritorija yra šešiniajame Nemuno kranto Viršuniškių seniūnijoje. Teritorija iš šiaurinės pusės riboja Prano Stankevičiaus firmos „Paksva" ir Raudondvario pl. 157 UAB „Viršuniškių geležbetonas" žemės sklypas (kadastrinis Nr. 1901/0039:04), iš vakarinės pusės riboja valstybinė žemė, iš pietinės – perėjimuotos žemės sklypas, kuris priklausys grupei paveldėtojų, iš rytinės – gretai esančioji teritorija, kurioje yra UAB „Eiera" pastatai, priešais rengti detaliojo plano. Apie 500 m į pietus nuo aikštelės yra Nemuno upė, apie 350 m į vakarus Lampėdžių ežeras ir apie 350 m nuo pietinės kelios A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai Vakarinis aplinkkelis (kategorija greito eismo A1), apie 380m į šiaurę – krašto kelias Nr. 141 Kaunas - Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda Raudondvario pl. (kategorija pagrindinė B1), į rytus iki Jovarų g. apie 400 m (kategorija apsaugantysis C2). Lampėdžių miške parkas yra nutolęs apie 750 m į vakarus nuo aikštelės. Versvų piliakalnis - apie 550 m. Versvų kapinės - apie 500 m į šiaurę nuo aikštelės

Reikalavimas „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis" (2004-08-9, Nr.V-586), standžių gabaritų atliekų priėmimo aikštelei nustatyta 30 m sanitarinės apsaugos zona. Teritorijų nepatenka į saugomas gamtines teritorijas bei nesiriboja su jomis, taip pat iš teritorijų nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas ar jų apsaugos zonas.

Atliekų priėmimo aikštelės padėties vietovėje planas pateiktas **priede Nr.2**.

4. Žemės, kurioje vykdoma ūkinė veikla, plotas (ha), teisinės registravimosi dokumento numeris, naudotojo ir/ar savininko pavadinimas, pavardė, vardas, adresas.

Bendras sklypo plotas, kuriame įrengta Kauno atliekų priėmimo aikštelė, užima sudaro 9,27 ha, jo kadastrinis Nr. 1901/0039:86. Šis sklypas pagal panaudos sutartį Nr. M19/2008-8 priklauso Všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui. Žemės ūkinės registracijos dokumentų kopijos pateiktos **priede Nr.3**. Tikslinė žemės paskirtis - atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos. Panaudos sutartis pateikta **priede Nr.4**.

5. Pastatų, pagalbinių patalpų, kuriose vykdoma ūkinė veikla, savininko ir/ar naudotojo pavadinimas, pavardė, vardas ir adresas.

Visi atliekų priėmimo aikštelės teritorijoje esantys statiniai ir patalpos nuosavybės teise priklauso VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" (toliau – Kauno RATC). Statybininkų g. 3, Kaunas, kuri šiame skyriuje vykdo ūkinę veiklą. Dokumentų kopijos pateiktos **priede Nr.5**. Pastatų ir pagalbinių patalpų išdėstymo schema pateikta **priede Nr.6**.

6. Darbuotojų skaičius.

Atliekų priėmimo aikštelėje dirba vienas darbuotojas.

7. Informacija apie ūkinę veiklą:

7.1. ūkinės veiklos rūšis;

Kauno atliekų priėmimo aikštelėje (Raudondvario pl. 155D, Kaunas) vykdomas išrūšiuotų atskirų komunalinių atliekų srautų priėmimas ir laikinas saugojimas iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Sutartys su atliekas tvarkančiomis įmonėmis pateiktos **priede Nr.10**.

Aikštelėje surenkamos ir tvarkomos nuotekos: paviršinės nuotekos vamzdynais vidiniuose valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į Kauno miesto lietaus nuotekų tinklus, buitinės nuotekos iš administracinio pastato nuvedamos į Kauno miesto buitinių nuotekų tinklus ir nukreipiamos valyti į UAB „Kauno vandenys" eksploatuojamus miesto nuotekų valymo įrenginius.

7.2. nurodomos įmonėje vykdomos veiklos, kuriems išduodamas Leidimas. Taisyklių 1 priede įrenginiams nurodoma, kuriai ūkinės veiklos rūšiai/rūšims priskiriama pareiškėjos ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie įrenginio, kuriam išduodamas Leidimas, projektinį pajėgumą;

Įmonės vykdoma veikla nepriskiriama Taisyklių 1 priedo įrenginiams.

TIPK leidimus ūkinės veiklos vykdytojui reikalingos pagal šiuos LR Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1 - 330 patvirtintą "Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir pasikeitimo taisyklių" 2-ojo priedo kriterijus:

5. punktas – atliekos apdorojamos fizikiniu įmonės, kurios gamybos vietoje nuolatos arba laikinai parvežtinų nuolat arba laikinai dėl savo ūkinės veiklos metu kuriderinamas nepavojingas atliekas, jeigu tokiems įmonėms leidimas Taisyklių 3 priede nustatyta išimtis taikyti Leidimo dalį dėl atliekų tvarkymo).

Kauno RATC (Raudondvario pl. 155 D, Kaunas) atliekų priėmimo aikštelės projektinis pajėgumas – 336 t atliekų per metus.

7.3. kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriuos eksploatuoti reikalinga gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas, atskirai nurodoma, kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie to įrenginio projektinį pajėgumą;

Įrenginys nepriskiriamas prie įrenginių, kuriam eksploatuoti reikalingas gauti leidimas išmesti šiltnamio dujas.

7.4. įrenginiams, kurių veikloje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir preparatai, pateikiama informacija, nurodyta Paraiškų 16.6 punkte.

Atliekų priėmimo aikštelės veikloje tirpiklių turinčios medžiagos ir preparatai nenaudojami.

8. Ūkinės veiklos aprašymas. Pateikiama nuoroda į paraišką, kurioje turi būti detalus ūkinės veiklos aprašymas.

Atliekų priėmimo aikštelė yra regioninės komunalinių atliekų surinkimo sistemos dalis. Aikštelė yra skirta priimti ir saugoti išrūšiuotas nepavojingas ir pavojingas buityje susidarančias Kauno miesto bei Kauno rajono gyventojų atliekas bei perduoti jas tvarkyti atitinkamiems perdirbėjams. Pagrindiniai aikštelėje vykdomi procesai yra šie:

- Nepavojingų atliekų priėmimas;
- Buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimas;
- Priimtų atliekų saugojimas ir perdavimas licencijuotiems perdirbėjams;
- Aikštelės veiklos metu susidarančių, gaisrinių nuotekų valymas.

Nepavojingas atliekas atvežusius klientus atliekų priėmėjas pasitinka atskiroje aikštelėje, kurioje išdėstyti konteineriai (konteinerių išdėstymas patvirtas Statinių bei patalpų išdėstymo schemoje **priede Nr. 6**). Atliekų priėmėjas vizualiai patikrina atvežtas atliekas, ar jose nėra mišrių buitinių atliekų, pavojingų atliekų ar kitų atliekų, kurios neįtrauktos į aikštelėje priimamų atliekų sąrašą. Aikštelėje priimamos šių rūšių atliekos, išvežinėtos 37 konteiniuose, skirtose buitinės atliekos nepriimamos. Jei atliekos tinkamos saugoti aikštelėje, priėmėjas klientą nukreipia prie atitinkamo konteinerio ir stebi, kad klientas dėtų atliekas vadovaudamasis užrašais ant konteinerių. Jei pristatomos stambiagabaritės atliekos, aikštelės darbuotojai padeda jas iškrauti. Didelių gabaritų buitinė technika krauname didžiųjų atliekų skyriuje-konteineryje, pastatytame prie administracinio pastato. Pristatytų nepavojingų atliekų registracija vykdoma administracinėme pastate, atliekų priėmimo patalpoje. Atliekos yra registruojamos pirminės atliekų apskaitos žurnale, priėmimo metu jos nėra sveriamos, kiekis nustatomas vizualiai. Perduodant surinktas atliekas perdirbėjams, atliekos yra paveriamos perdirbančios įmonės įrenga ir kiekis perkėlimas bei įvežimas į atliekų apskaitos žurnalą. Atliekų registracijos duomenys ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius yra suvedami į kompiuterinę apskaitos sistemą.

Išrūšiuotos buitinės atliekos (medžio, pašarotos atliekos, stiklas, metalai, statybos ir griovimo laužas, automobilių padangos) kaupiamos asfaltuotoje aikštelės pakraščiuose išdėstytuose plastikiniuose bei metaliniuose 5 ir 30 m^3 talpos konteineriuose (iš viso 12 konteinerių). Ant kiekvieno konteinerio dedamas užrašas, nusakantis, kokiomis atliekomis šis konteineris skirtas. Aikštelėje taip pat pastatyti 4 plastikiniai 1.1m^3 talpos konteineriai, skirti darbuotojų mišrioms buitinėms atliekoms bei artimiausios perdirbti likučiams nuo rūšiuotų atliekų miesti.

Didelių gabaritų elektros ir elektroninės atliekos saugomos pastato tipo didžiųjų atliekų skyriuje-konteineryje, kuris yra atsparus atmosferos poveikiui. Didžiųjų atliekų skyriuje-konteineryje numatyti atskiri skyriai elektros ir elektroninės atliekų srautams: didelė baterinai pritaikai saugomi pačiame konteinerio skyriuje sustatyti pusiemiais ant grindų. Taip jų turi būti palikta pakankamai vietos, kad būtų galima prieiti ir privažiuoti krautuvu. Informacinių technologijų ir ryšio prietaisai, kiti mažieji buitiniai prietaisai saugomi dėžėse-padėklinose. Iempos (išstygius dienos šviesos lempas, kurios laikomos pavojingų atliekų skyriuje) saugomos dėžėse. Visos talpos (dėžės) turi būti pažymėtos – aiškiai ir įskaitomai užrašytose laikomų atliekų pavadinimas. Šias dėžes pateikia atliekų perdirbėjai.

Visos pavojingų atliekų priėmimo procedūros vykdomos hermetiškame pavojingų [illegible] skyriuje-konteineryje, kurio grindyse įrengtas gaisrinių nuotekų surinktuvas. Pristačius pavojingas atliekas, aikštelės darbuotojas jas atveža [illegible] pavojingų atliekų skyrius. Skyrių atrakina ir

atliekas iškrauna bei patikrina skyriaus viduje. Atliekų priėmėjas patikrina, ar atvežtos atliekos atitinka priimamų atliekų sąrašo (žr. šio Reglamento 2 lentelę) eilutėje atliekas, ar tinkama jų pakuotė. Jei atliekos tinkamos priimti aikštelėje, jos yra paverčiamos pavojingųjų atliekų skyriuje esančiomis sveriamųjų įrenginių ir užregistruojamos priimamų atliekų apskaitos žurnale. Jei atliekos yra netinkamoje ar pažeistoje pakuotėje bei gali išsilieti ar išbarstyti, atliekų priėmėjas gali jas pasiųsti į skyrių laikomą tinkamą pakuotę ar tarą. Pakuotė ar tara turi būti saugoti joje laikomos atliekos fizinius ir cheminius pavojius. Arvežas kelių rūšių pavojingas atliekas, atliekų priėmėjas jas papildomai išrašinėja ir talpina į atitinkamas talpas. Kiekvieną talpą, į kurią dedą priimtas pavojingas atliekas, atliekų priėmėjas pažymi Pavojingų atliekų ženklinimo etikete pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) reikalavimus. Skirtingos atliekos negali būti dedamos į tą pačią talpą, skirtingų cheminių bei fizikinių savybių atliekos negali būti laikomos vienoje krūvoje ar rietuvėje. Atliekos turi būti krauname skyriaus patalpose taip, kad prie kiekvienos atliekų grupės būtų galima laisvai prieiti iš visų pusių bei patogiai išgabenti atliekas iš skyriaus. Visi pavojingų atliekų tvarkymo (priėmimo, perpakavimo, saugojimo) veiksmai užregistruojami pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnale.

Pavojingos atliekos saugomos pavojingų atliekų skyriuje-konteineryje pastatytos statinėse, konteineriuose bei dėžėse, priklausomai nuo atliekų savybių. Kietos pavojingos atliekos (akumuliatoriai, gyvsidabrio lempos) laikomos dviejuose metaliniuose konteineriuose. Skystos pavojingos atliekos laikomos sandariose 30 - 200 l talpos statinėse (iš viso 26 statinės), atspariose joms laikomų medžiagų fizikiniams ir cheminiams savybėms. Smulkesnės pavojingų atliekų pakuotės sudedamos į metalinę spintą su durelėmis. Šioje spintoje taip pat laikomi 6 polietileniniai bakeliai (po 15 l talpos) su užrakinamais dangčiais skystoms atliekoms. Talpos užžymėtos, kad skirtingos pavojingos medžiagos negalėtų turėti jokio kontakto. Visos atliekų saugojimo talpos konteineryje yra pažymėtos Pavojingų atliekų ženklinimo etikete pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) reikalavimus, kuriuje aiškiai nurodomas, kokia atliekų saugoma kiekvienoje talpoje.

Detalesnis šiukos veiklos aprašymas įskaitant procesus ir įrenginį pateiktas *paveikslėlyje* 8 ir 13 puslapiuose.

9. Veiklos aplinkosauginio valdymo ir kontrolės. Paraiškoje įmonėje vykdomos veiklos aplinkosauginio valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas:

9.1. veiklos valdymo struktūra įmonės valdymo organizacinė schema), aprašant, kaip bendroje veiklos valdymo sistemoje realizuojamos veiklos aplinkosauginis valdymas (tiesiogiai už aplinkosaugą įmonėje atsakingi asmenys, darbuotojų įsipareigojimai aplinkosaugos klausimais, parodyti jų pareiginėse instrukcijose, įmonės vidaus taisyklėse, kitos organizacinės priemonės);

Všį „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriaus įsakymu atliekų priėmimo aikštelės veiklos kontrolę vykdyti paskirtas Všį „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" technikos inžinierius, kuris kontroliuoja ar aikštelės veikla atsijasius techninio ir organizacinio pobūdžio klausimus, tikrina, ar tinkamai vykdoma aikštelės eksploatacija ir yra atsakingas už aplinkos apsaugą aikštelėje. Všį „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriaus įsakymas pateiktas **priede Nr.10**. Atsakingas darbuotojas prižiūri, kad aikštelę eksploatuojantis darbuotojas (atliekų priėmėjas) tinkamai vykdytų savo pareigas, užtikrintų švarą ir tvarką bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

UŽ kasdienę technologinio proceso kontrolę bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi aikštelėje atsakingas aikštelės darbuotojas. Darbuotojo įsipareigojimai aplinkosaugos klausimais nurodyti jo pareigybių aprašyme.

Atliekų priėmimo aikštelės ūkinės veiklos valdymo organizacinė schema pateikta **priede Nr.9**.

9.2. veiklos aplinkosauginio valdymo nuostatos (strategija, jei ūkinės veiklos objektas [illegible]

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" nėra įdiegusi aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001:2005 standartą, tačiau aikštelės veikla vykdoma taip, kad užtikrintų keliamus reikalavimus aplinkai bei būtų laikomasi Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos aplinkosauginių reikalavimų. Aikštelė įrengta taip, kad būtų sulaikoma visa galima tarša: pavojingų atliekų konteineris yra hermetiškas ir turi nuotėkių surinktuvą, todėl joks atliekų nuotėkis negalimas, o visos aikštelėje susidarančios nuotekos yra valomos. Gaisrinę transporto priemonių lacka automatizuojama rašos gaudyklėje. Aikštelėje susidarančios atliekos yra tvarkomos. Užtikrinama, kad aikštelės darbuotojai būtų tinkamos kvalifikacijos, jie yra supažindinamas su aplinkosauginiais bei darbų saugos reikalavimais, o jo darbo kokybė yra nuolat kontroliuojama direktoriaus įsakymu (**priedas Nr.10**) paskirto darbuotojo.

9.3. veiklos aplinkosauginės priežiūros priemonės (techninės veiklos poveikio aplinkai kontrolės priemonės);

Aikštelė įrengta taip, kad būtų sulaikoma visa galima tarša. Atliekų konteineriams skirta aikštelė yra asfaltuota. Nepavojingos atliekos kiekvieną atvyką į konteinerius tik prižiūrimi specialiai apmokyto aikštelės personalo. Aikštelėje sustatytuose nuotekos surenkamos ir tvarkomos. Buitinės nuotekos iš administracinio pastato nuvedamos į Kauno miesto buitinių nuotekų tinklus ir nukreipiamos į miesto nuotekų valymo įrenginius. Paviršinės lietaus nuotekos iš aikštelės surenkamos per naftos produktų gaudyklę ir valomos vietiniuose mechaniniuose valymo įrenginiuose (4 vnt. talpose), iš kurių išvežamos į Kauno miesto lietaus nuotekų tinklus.

Visos pavojingų atliekų tvarkymo operacijos (priėmimas, paskirstymas į atitinkamas patalpas) Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus pažeidinčias talpas, saugojimas) atliekamos tik hermetiškame pavojingų atliekų skyriuje - konteineryje, kuriame įrengtas galimų nuotėkių surinktuvas, pavojingų atliekų saugojimui pastatytos hermetiškos sostinės bei konteineriai. Pavojingos atliekos yra laikomos atskirtinės grupėmis pagal atliekų fizines ir chemines savybes, taip užtikrinama, kad jos negalėtų kontaktuoti tarpusavyje. Pavojingų atliekų konteineryje taip pat laikomos pavojingų atliekų neutralizavimo priemonės: sorbentai, kalkės, putrio šešio talpalas, kontaktuoti su gyvenosmis. Darbuotojo apsaugai dirbant su pavojingomis atliekomis naudojami specialūs darbo drabužiai, respiratoriai bei akių apsaugos priemonės, įrengtas akių dušas, yra vaistinėlė.

Užpildyti nepavojingų atliekų konteineriai iki išvežimo perdirbėjams yra uždengiamos brezentu, kad vėjas negalėtų išnešioti juose sukauptų atliekų

Aikštelėje yra įrengtas priešgaisrinis hidrantas, kiekvienoje patalpe - konteineryje yra gesintuvai, o prie administracinio pastato įėjimo įrengtas pilnai sukomplektuotas priešgaisrinis skydas

Visos atvežtinos atliekos yra registruojamos Priimtiname atliekų apskaitos žurnale, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" kasmet teiks atliekų apskaitos ataskaitas Kauno RAAD Kauno miesto agentūrai. Pavojingų atliekų priėmimas papildomai registruojamas pavojingų atliekų nuėjimo ar išleidimo įmonės darbo žurnale.

Aikštelės darbuotojų darbą ir aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi periodiškai kontroliuoja direktoriaus įsakymu (**priedas Nr.10**) paskirtas darbuotojas (techninis inžinierius).

9.4. užduotinai siekiai ir planuojami veiksmai jiems įgyvendinti (nuorodos į Gamtos išteklių taupymo ir atliekų naudojimo ar kitus su aplinkosaugos veiksmingumo gerinimu susijusius planus);

Numatomi veiksmai ir techninės priemonės aprašyti „Gamtos išteklių taupymo ir atliekų naudojimo programoje" (paraiškos priedo **Nr.15**).

9.5. pažymima, ar įmonėje naudojamos vadybos sistemos leidžia laikytis Leidime nustatytų reikalavimų. Jeigu įmonėje naudojama vadybos sistema yra nepakankama, Leidime, kaip sąlyga, nurodomos papildomos priemonės, kurias įgyvendinimas leistų laikytis Leidime nustatytų reikalavimų, bei nurodomas šių priemonių įgyvendinimo terminas.

Įmonėje nėra įdiegtas LST EN ISO 14001:2005 standartas, tikimės veikloje nuosekliai taikyti bendruosius aplinkosauginius reikalavimus. Papildomi reikalavimai nustatyti II leidimo dalyje „Leidimo sąlygos".

10. Leidimo išdavimo, jo nuostatų ir sąlygų apskundimo tvarka.

Veiklos vykdytojas gali apskųsti RAAD veiksmus ar neveikimą, susijusius su Leidimo išdavimu, atnaujinimu, koregavimu arba panaikinimu, teisės įstatymų nustatyta tvarka.

11. Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai.

Paraiškos nagrinėjimo ir leidimo išdavimo metu pastabų ir pasiūlymų negauta. Paraiška TIPK leidimui gauti ir TIPK leidimo projektas suderinti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyriumi. Paraiškos TIPK leidimui gauti XI dalis „Triukšmo skleidimas ir kvapų kontrolė" ir TIPK leidimo projektas suderinti su Kauno visuomenės sveikatos centru.

UAB „Krašto projektai ir partneriai" parengė projekto „Kauno regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" techninio projekto „Atliekų priėmimo aikštelė: Raudondvario pl. 155D, Kaunas" dalį "Aplinkos apsauga". Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno RAAD, 2010-09-16 projekto sprendiniams pritarė.

2011-08-23

II. LEIDIMO SĄLYGOS

12. Šioje Leidimo dalyje pateikiamos Leidimo sąlygos. Ūkinė veikla turi būti vykdoma ir kontroliuojama laikantis šiame Leidime nustatytų sąlygų.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. *Įmonė gali vykdyti savo veiklą, įvykdžiusi keliamus aplinkosauginius reikalavimus bei vykdydama reikalaujamas kontrolės sąlygas.*
2. *Prunėšė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau KRAAD) apie planuojamas įrenginio eksploatavimo arba vykdomos ūkinės veiklos esminius pakeitimus (esminio ūkinės veiklos pakeitimo sąvoka apibrėžta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės teisėtų išdavimo, atnaujinimo ir pranešimo taisyklių (toliau Taisyklių) II skyriaus 5.3p. (Žin., 2005, Nr.103-3829; Žin., 2006, Nr.120-4571).*
3. *Planuojant esminius ūkinės veiklos pakeitimus, Taisyklėse nustatyta tvarka (Taisyklių X skyriaus 56 p.) pateikti paraišką TIPK leidimo atnaujinimui.*
4. *Planuojant ūkinės veiklos pasikeitimus, neprieštaraujančius prie esminių, Taisyklėse nustatyta tvarka (Taisyklių II skyriaus 5.3 p.; X skyriaus 60 p.) pateikti paraišką TIPK leidimo koregavimui.*
5. *Vykdyti Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane numatytas priemones bei laikytis kitų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.*

ŽALIAVŲ NAUDOJIMAS

1. *Siekiant užtikrinti racionalų išteklių naudojimą nuolat vesti jų apskaitą, vykdant registraciją perkamo vandens. Šiuo metu vandens registraciją vykdyti skaitikliu, kuris atitinka metrologinius reikalavimus, patvirtinta. (Žin. 2001 Nr. 29 –941;Žin., 2005, Nr. 24-785).*
2. *Vadovaujantis Taisyklių 20.5 punktu, prie paraiškos privalo būti pridedami vandens tiekimo ir nuotekų priėmimo sutarčių originalai ir jų patvirtinti nuorašai. Iki 2011 m. kovo 21 d. pateikti vandens tiekimo ir nuotekų priėmimo sutartį su UAB „Kauno vandenys".*
3. *Žaliavų, pagalbinių medžiagų, kuro ir energijos naudojimas turi atitikti 5. 6, 11 lentelėse nurodytus dydžius.*
4. *Planuojant didinti žaliavų ir pagalbinių medžiagų suvartojimą, dėl ko didėtų susidarančių atliekų kiekiai, Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti paraiškų leidimui koreguoti.*

KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

TIKRA

2011-08-23

TERŠALŲ IŠLEIDIMAS Į NUOTEKOMIS

1. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-815 „Dėl nuotekų reglamento patvirtinimo" bei 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyma Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų reglamento patvirtinimo" laikytis aplinkosauginių reikalavimų nuotekoms tvarkyti. (Žin., 2007, Nr. 110 – 4522; Žin. 2007, Nr. 42 – 1594).*
2. *Užtikrinti efektyvią paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos veiklą, vykdant tinkamą eksploatacijos kontrolę. Į valymo įrenginius gali būti išleidžiamos tik tokios nuotekos, kurios netrikdo nuotekų tinklo bei valymo įrenginių darbo bei gali būti išvalytos iki teisės aktuose nustatytų ribinių dydžių. Nuolat pildyti paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo žurnalą, pažymint valymo įrenginių remonto ir valymo atliktimo laiką.*
3. *Nuotekų valymo įrenginiuose susikaupęs dumblas turi būti valomas periodiškai ir perduodamas atliekų tvarkytojui kaip pavojinga atlieka.*

ATLIEKŲ TVARKYMAS

1. *Pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą pagal LR Aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 7 priedą (Žin., 2004, Nr. 68-2381).*
2. *Pirminės atliekų apskaitos pagrindu, kasmet iki sausio 25 d. LR AM Kauno RAAD Kauno miesto agentūrai teikti metinę pirminės atliekų apskaitos ataskaitą. Ataskaita turi būti parengtama atsižvelgiant tam tikrų formų, pagal reikalavimus, nurodytus 2003-12-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 8 priede (Žin., 2004, Nr. 68-2381).*
3. *Pradėjus eksploatuoti alkūšelį bei surenginėvus prišiamų atliekų sravius, pirminės atliekų apskaitos pagrindu iki 2012 m. sausio 1 d. privalote pastikslinti 37 lentelę. Atsiradus būtinybei keisti duomenis, turite pateikti pareiškų atitinkamos Leidimo dalies koregavimui.*
5. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. D1-443 „Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 584 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams keliamų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" 2 punktu Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (toliau – Licenciją) privalo gauti pavojingas atliekas surenkančios, sandėliuojančios, apdorojančios ir naudojančios įmonės (Žin., 2004, Nr.137 – 4923). VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" įpareigoja artimiausiu metu gauti Licenciją ir jos kopiją pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno RAAD. Pavojingų atliekų surinkimas ir saugojimas neturint Licencijos VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Raudondvario atliekų priėmimo aikštelėje yra draudžiamas.*
6. *Privalote užtikrinti, kad įmonėje leidžiamų saugoti atliekų kiekiai nevirštų Atliekų tvarkymo veiklos plane nurodytų atliekų kiekių. Leidžiamų surinkti atliekų kiekis nustatytas pagal VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Raudondvario atliekų priėmimo aikštelės veiklos nutraukimo ir atliekų sutvarkymo plane numatytus atliekų kiekius. Jeigu bendrovės ūkinėje veikloje numatomas didesnis susidarančių atliekų kiekis nei leidžiama Leidime, pateikti prašymą Leidimo koregavimui naujiems atliekų kiekiams ir naujai parengtą Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą.*
7. *Veiklos nutraukimo atveju, įmonė nustatyta tvarka privalo pranešti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno RAAD apie atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią*

TIKRA
2011-08-23

8. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 rugsėjo mėn. 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl atliekų tvarkymo veiklos netraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo" 16 punktu, Jūsų įmonė turi pateikti naują Garantą ar protestą Garantijų įpareigoti laidavimo draudimo sutartį ir pagal ją išduotą naują laidavimo raštį, ne vėliau kaip 6 savaitės iki draudimo pulso ir laidavimo rašto galiojimo pabaigos (Žin., 2003, Nr.99 - 4466).*
9. *Prižiūrėti, kad įmonės teritorijoje laikomų atliekų ir medžiagų sandėliavimo vietose, transporto laikymo vietose, nebūtų pralaistymų pavojingais aplinkai skysčiais ar pribarstymų pavojingomis medžiagomis ir, kad teršalai nepatektų į aplinką ar gruntinius vandenis. Užtikrinti įmonės teritorijoje ir aplinkoje tvarką ir švarą. Įmonėje nuolat turi būti medžiagų (pvz. sorbentų, plovenų, smėlio ir pan.), kad avarinių atvejų, įvykus pavojingų skysčių išsiliejimui, būtų galima lokalizuoti jų plitimą.*
10. *Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į jiems saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Atliekas galite priduoti utilizavimui ar išvežimui įmonėms, kurios registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre (http://193.219.55.14/atir/ATIR.py).*

TRIUKŠMO IR KVAPŲ KONTROLĖ

1. *Laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2007 m. liepos 3 d. Nr. V-555 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33 : 2007. „Akustinės triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" reikalavimų.*

TIKRA

13. Gaminama produkcija ir naudojamos transporto priemonės.
Įmonė produkcijos negamina. Atliekų priėmimo aikštelėje vykdomas išrūšiuotų atskirų komunalinių atliekų srautų priėmimas ir laikinas saugojimas iki perdavimo atliekų tvarkytojams.

1 lentelė. Gaminama produkcija.
Lentelė nepildoma, nes atliekų priėmimo aikštelėje gamyba nevykdoma.

2 lentelė. Naudojamos transporto priemonės.
Lentelė nepildoma, nes įmonė nuosavo transporto neturi. Numatoma, kad atliekos bus atvežamos klientų transportu, o išvežamos kitų atliekų tvarkytojų transportu.

14. Tuo atveju, jeigu Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane arba aplinkosaugos priemonių, papildomi reikalavimai įrašomi kaip atitinkama Leidimo sąlyga.
Papildomos Leidimo sąlygos nenustatomos.

15. Veiklos vykdymas turi įgyvendinti paraiškos Leidimui gauti 14 ir 15.4 punktuose nurodytą Aplinkosaugos veiksmų planą. Ši Leidimo sąlyga taikoma tik Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams.
Punktas nepildomas, nes įmonėje nėra Taisyklių 1 priede išvardintų įrenginių.

3 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas.
Lentelė nepildoma, nes įmonėje nėra įrenginių, atitinkančių Taisyklių 1 priede keliamus reikalavimus.

4 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas.
Lentelė nepildoma, nes įmonėje nėra įrenginių, atitinkančių Taisyklių 1 priede keliamus reikalavimus.

16. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas ir saugojimas.
Gamtos ištekliai ir žaliavos turi būti naudojamos pagal šiame Leidime pateikte nustatytas Leidimo sąlygas.

TIKRA

5 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimo planuojami kiekiai.

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Vnt.	Dabar naudojama per 2020 metus	Leidžiami naudoti kiekiai
				nuo 2021 m. kovo mėn.
1	2	3	4	5
1.	Sorbentai	kg	Objektyvus nuojas, žaliavos ir papildomos medžiagos apskaičiuoti nebuvo	10

Pastaba. Lentelė gali būti pratęsiama, kompiuteriu rašoma

6 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų saugojimas

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas [1]	Transportavimo būdas	Kiekis, saugomas vietoje, kg	Saugojimo būdas [2]
1	2	3	4	5
1.	Sorbentai	Tiekėjo transporte priimamė	10	Dėžėse, metalinėje spintoje

Pastabos:
1 – Informacija apie naudojamą kurą ir degalus pateikiama 11 lentelėje.
2 – gaisrinius saugos, elektros, šviesos, perspėjimo apšvietimo nuo elektrostatinės krovos dengti kuro saugojimo ginklų ir pan.

7 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir preparatų naudojimas ir saugojimas.
Lentelė nepildoma, nes įmonėje nėra įrenginių, naudojančių tirpiklių turinčias medžiagas ir preparatus.

8 lentelė. Kietųjų nuodingųjų išmetamų garybo ir pažeistų žemių rekultivavimas.
Lentelė nepildoma, nes nuodingųjų iškasenų įmonė neišgauna ir pažeistų žemių nerekultivuoja

9 lentelė. Naftos telkinių šteklini ir eksploatacinių gręžinių sąrašas[5].
Lentelė nepildoma, nes įmonė neeksploatuoja naftos telkinių ir gręžinių.

10 lentelė. Leidžiamas išgauti naftos.
Lentelė nepildoma, nes įmonė naftos neišgauna.

TIKRA

17. Kuro ir energijos vartojimas. Energijos gamyba.

Atliekų priėmimo aikštelėje technologiniame procese kuras ir energija nenaudojami. Per metus aikštelėje sunaudojama 19×10^3 kWh elektros energijos administracinio pastato šildymui, apšvietimui bei įrašinėse reikmėms. Elektros energija atliekų priėmimo aikštelėje negeneruojama.

Energetiniai ištekliai turi būti naudojami 11 lentelėje nustatytų dydžių ribose.

11 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas[1]

Energetiniai ir technologiniai ištekliai	Matavimo vnt., t, m³, KWh ir kt.	Sunaudojimas[2] 2013 m.	Sunaudojimas[2] Nuo 2013 m., kiekvienų	Apskaitos priemonės	Išteklių gavimo šaltinis
1	2	3	4	6	7
a) elektros energija	KWh	Veikla nebuvo vykdoma.	39 000	Elektros skaitikliai	UAB „Lesto“
b) šiluminė energija	-	-	-	-	-
c) gamtinės dujos	-	-	-	-	-
d) susikvėlintos dujos	-	-	-	-	-
e) mazutas	-	-	-	-	-
f) krosninis kuras	-	-	-	-	-
g) dyzelinas	-	-	-	-	-
h) akmens anglis	-	-	-	-	-
i) benzinas	-	-	-	-	-
j) biokuras:	-	-	-	-	-
1)	-	-	-	-	-
2)	-	-	-	-	-
k) ir kiti	-	-	-	-	-

Pastabos:

[1] – lentelėje nurodomi pagrindiniai metinio naudojamų išteklių kiekiai ir naudojimą kiekiai atitinkančiais matavimo vienetais;

[2] – nurodyti, kas sunaudojami lentelėje nurodomi ištekliai, pvz., gamybai, eksploatacijai, kokiems gamybiniams procesams, pastatų ar vandens šildymui, paprastiems darbams ir kt. Jei lentelės ne visiškai atitinka esamą situaciją, reikėtų jas papildyti arba tokią pat lentelę sudaryti lentelėje pateiktų duomenų paaiškinimui.

12 lentelė. Energijos gamyba

Lentelė nepildoma, nes Atliekų priėmimo aikštelė neatlieka veiklų energijos gamybos.

18. Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas.

Leidimo dalis neužpildoma, nes įmonės vykdomos ūkinė veikla neatitinka Tarybos Integruotos prevencijos ir kontrolės taisyklių 2 priedo 3 punkto reikalavimų – „iš paviršinių ar požeminių vandens telkinių paimamo ar platinojamo per parą ir dangiau vandens".

Vandens atliekų priėmimo aikštelei tiekiamas iš Kauno miesto centralizuoto vandentiekio tinklų.

Vandens įmonėje naudojamas tik buitiniams reikalams. Technologiniam procesui vanduo nėra naudojamas. Vandens atliekų priėmimo aikštelei tiekiamas iš Kauno miesto viešojo vandens tiekimo sistemos, geležinkelio pėsčiomis 0,010 km vandentiekio linijos. Inžinerinių tinklų planas pateikias **priede Nr.11.** Suvartoto vandens kiekis objekte nustatomas techniniu veiksmingu vandens skaitikliu. Detalesnė informacija apie vandens suvartojimą pateikta paraiškos TIPK leidimui gauti V dalyje „Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas".

13 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio imamas vanduo, vandens šaltinio vietą bei įrenginį.

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidime dalis "Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas" neišbraižoma.

14 lentelė. Duomenys apie naudojamus požeminio vandens vandenvietes.

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas" neišbraižoma.

15 lentelė. Vandens paėmimas ir vartojimas.

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas" neišbraižoma.

16 lentelė. Paimamo vandens apskaitos prietaisas.

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas" neišbraižoma.

17 lentelė. Numatomos technologinės vandens vartojimo ir išteklių apsaugos priemonės.

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas" neišbraižoma.

18 lentelė. Vandens naudotojų ūkvenių vartojamo vandens kiekiai.

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas" neišbraižoma.

KAUNO APSK. VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS

T I K R A

2015 -06- 23

19. Oro tarša.

Leidimo dalis neišduodama, nes įmonės vykdoma ūkinė veikla neatitinka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės taisyklių 2 priedo reikalavimų:
4 punkto – „išmetantis į aplinkos orą 10 tonų per metus ar daugiau teršalų";
5 punkto – „naudojantis bent vienas kietojo kuro kūrenimo katilas, kurio šilumingis galingis yra 0,5 MW ar daugiau";
6 punkto – „naudojantis stacionarus degimo įrenginys, kurio šilumėnis galingis yra 1,0MW ar daugiau".

Detalesnė informacija apie oro taršą pateikta poveikio TIPK leidimui gauti VI dalyje „Į aplinkos orą išmetami teršalai".

20. Teršalų išmetimo į orą kontrolė ir matavimai.

Punktas nepildomas, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

21. Aplinkos oro monitoringas.

Punktas nepildomas, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

19 lentelė. Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai.

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

19 (1) lentelė. Leidžiamos iš įrenginio _____(1) išmesti šiltnamio dujos.

Lentelė nepildoma, nes įrenginiui leidimas išmesti šiltnamio dujas neteikiamas.

20 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys[1].

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

21 lentelė. Tarša į aplinkos orą[1].

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

22 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir kitos taršos prevencijos priemonės.

Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

23 lentelė. Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės.
Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

24 lentelė. Neorganizuoti teršalų išmetimai į aplinkos orą.
Lentelė nepildoma, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

20. Teršalų išmetimo į orą kontrolė ir matavimai.
Punktas nepildomas, nes leidimo dalis „Oro tarša" neišduodama.

21. Aplinkos oro monitoringas.
Punktas nepildomas, nes TIPK leidimo dalis "Oro tarša" neišduodama.

TIKRA

Punktas nepildomas, nes įmonė ŽŪL neturi.

24. Pridedami dokumentų, įrodančių Leidimo turėtojo teisę naudoti laukus nuotekų/išcsytų atliekų laistymui (nuosavybės dokumentų arba atitinkamų sutarčių), originalai ar jų patvirtinti nuorašai. Pasibaigus nuotėkų dokumentų galiojimo laikui, Leidimas nuotekų/išcsytų atliekų laistymui turės būti koreguojamas/atnaujinamas.
Punktas nepildomas, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama.

27 lentelė. Informacija apie žemdirbystės dreknimo laukus (ŽDL), kuriuose leidžiama išlaistyti (utilizuoti) nuotekas (mėšlo filtratą, skystą mėšlą, srutas, skystas atliekas, žiangtus ar pan.).
Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama.

25. Prie Leidimo turi būti pridėta schemas su pažymėtomis nuotekų išleistuvų ir/arba nuotekų šaltinių vietomis ir numeriais.
Informacija tokių planų su pažymėtais šaltinių ir paviršinių nuotekų tinklais, paviršinių nuotekų valymo įrenginiais bei nuotekų išleistuvais pateikta **priede Nr.11.**

28 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus.
Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama.

29 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.
Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama.

30 lentelė. Objekte/įrenginyje esančios (taikomos) nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės.
Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama
Šiuo metu įdiegtos nuotekų taršos mažinimo priemonės. Nuotekų valymo įrenginių aprašymai bei atitikties deklaracijos pateiktos **priede Nr.19.**

31 lentelė. Privalomos įdiegti nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės.
Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama.

32 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių priimamos nuotekos (ne paviršinės), sąrašas ir priimamų nuotekų savybės.
Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama.

33 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių priimamos paviršinės nuotekos, sąrašas ir priimamų nuotekų savybės.
Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama.

34 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai.
Lentelė nepildoma, nes Leidimo dalis TIPK leidimo dalis " Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus" neišnaudojama.

26. Dirvožemio apsauga.

Dirvožemio bei gruntinio vandens užterštumo tyrimai atlikti nebuvo.

Remiantis UAB "Sweco hidrogeologija" atliktais inžineriniais – geologiniais tyrimais atkastelės paviršiuje iki 1,5-2,0 m gylio slūgso pilio grunto sluoksnis, sudarytas iš žvyro, stambaus smėlio su riedulių priemaiša. Po pilu gruntu slūgso aliuvinės nuogulos, kurias iki 5 m gylio sudaro žvyras ir šlk ties gręžiniu Nr.1 nuo 4,0 m gylio žvyrą keičia smulkus smėlis, į kurį įsigilinta iki 0,7 m. Gruntinis vanduo 5,0 m gylio gręžiniais nepasiektas. Pagal atliktų tyrimų duomenis aikštelės pagrindo gali sudaryti pilnas gruntas (žvyras, stambus smėlis) ir po jos slūgsantis aliuvinis žvyras. Pagal 1% tikimybę Nemuno pavasarinio potvynio vandens gali siekti 23,6 m altitudę, ko pasiekoje aikštelė gali būti apsemta vandenin.

Atliekų priėmimo aikštelė įrengta taip, kad užterštas nuo produktinio lietaus vanduo yra surenkamas paviršinių nuotekų tinklais, iš jų patenka į volyme įrengtinius, iš kurių išleidžiamas į miesto nuotekų tinklus. Sukurptas duomenis iš paviršinių nuotekų valymo įrenginių perduodamas jų vartotojui įmonei. Buitinės nuotekos iš administracinio pastato nukreipiamos į Kauno miesto nuotekų tinklus, kurkas patenka į miesto nuotekų valymo įrenginius. Todėl nuotekų į dirvožemį bei gruntinį vandenį nepatenka. Inžinerinių tinklų planas pateikiasi **priede Nr.11**.

27. Atliekų susidarymas, naudojimas ir/ar šalinimas:

27.1. Atliekų susidarymas.

Atliekų priėmimo aikštelėje susidarys mišrios buitinės atliekos.

Numatoma, kad šiose atliekose susidarys iš dviejų pagrindinių šaltinių:

1) aikštelės darbuotojų suformuotos buitinės atliekos: maisto pakuotės atliekos, netinkamos perdirbti kanceliarinės atliekos ir pan.;

2) nepavojingų nepersidirbami likučiai nuo atliekų: pvz., netinkamai išrūšiuotos, užterštos riebalais ir pan. atliekos, jei aikštelės darbuotojas tokią atliekų aptinka tarp klientų pristatytų rūšiuotų atliekų, taip pat nepersidirbantys klientų atvežtų atliekų pakuotės atliekos.

Numatoma, kad per metus susidarys 3 t smėlio buitinių atliekų.

Likviduojant galimos pavojingų atliekų išsiliejimas ar išsibarstymas susidarys pavojingomis atliekomis užterštas sorbentas.

Pavėžinių nuotekų gaudyklėje susidarys naftos produktų dumblas.

35 lentelė. Leidžiamos pagaminti atliekos.

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) *VšĮ „Kauno BATC“ atliekų priėmimo aikštelė, Raudondvario pl. 155d, Kaunas*

Atliekos			Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Susidarymas	
Kodas[1]	Pavadinimas	Pavojingumas[2]		Projektinis kiekis[3], t/m.	Didžiausias leidžiamas pagaminti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
13 05 02*	Naftos produktų/vandens separatorių dumblas (dumblas iš naftos gaudyklės)	H14, pavojingos aplinkai	Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (dumblas iš naftos gaudyklės)	0,5	0,5
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip nenurodytus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	H3B	Išsiliejusių ar išsibarstiusių pavojingų atliekų likvidavimas	0,05	0,05
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojingos	Darbuotojų buitinės atliekos bei perdirbti netinkami likučiai iš atliekų tarotojų atvežtų atliekų	3	3

Pastabos.

[1] – atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (žin., 1999, Nr. 63-2059; 2004, Nr. 66-2351) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 2 priedą;

[1] savybė, kuria pasižymėdamas atliekas yra pavojingas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 5 priedą.
[2] – per metus susidarančio atitinkamos atliekų rūšies, kai įrenginys ar technologinis procesas veikia visu pajėgumu (projektinis kiekis).

36 lentelė. Atliekos, leidžiamos perduoti atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginiui.
Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju): *VšĮ „Kauno KATC“ atliekų priėmimo aikštelė, Raudondvario pl. 153d. Kaunas*

Atliekos	
Kodas[1]	Pavadinimas
1	2
13 05 02*	Naftos produktų/ vandens separatorių dumblas (dumblas iš anūlos gaudyklės)
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis
20 03 01	Mišrios buitinės atliekos

Pastaba. [1] – atliekų kodai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą.

27.2. Atliekų naudojimas ir/ar šalinimas.

Nepavojingų atliekų priėmimas vykdomas atskiroje aikštelėje, kurioje išdėstyti konteineriai (konteinerių išdėstymas pateiktas Statinių bei patalpų išdėstymo schemoje **priedė Nr. 6**). Priimamos tik išrūšiuotos atliekos, įrašytos į sąskaitoje savininkui atliekų siuntą (žr. 37 lentelė), jose negali būti kitų atliekų priemaišų ar pavojingų atliekų. Po patikrinimo, prižiūrinti aikštelės darbuotojai, klientai supila atliekas į konteinerius. Priimtos atliekos registruojamos pasirašytame atliekų apskaitos žurnale.

Visos pavojingų atliekų priėmimo, patikrinimo, perpakavimo operacijos vykdomos tik specialiai įrengtame hermetiškame pavojingų atliekų sandėlyje-konteineryje. Hermetiškas konteineris su įrengta galima naudotis surinktuvu bei neutralizavimo priemonėmis.

Įmonė turi parengą ir patvirtintą Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo reikalų reglamentą (pateiktas **priedu Nr. 13**) bei Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą (pateiktas **priedu Nr. 14**).

37 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms).

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio arvejis) *Všį „Kauno RATC" atliekų priėmimo aikštelė, Raudondvario pl. 153d, Kaunas*

Atliekos			Naudojimas		
Kodas [1]	Pavadinimas	Pavojingumas [2]	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo būdas [3]	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
15 01 01	Popierinės ir kartoninės pakuotės	Nepavojinga		R13	
20 01 01	Popierius ir kartonas	Nepavojinga	5	R13	1
20 01 39	Plastikai	Nepavojinga	20	R23	1
15 01 02	Plastikinės pakuotės	Nepavojinga	5	R23	0,5
20 01 02	Stiklas	Nepavojinga	30	R13	5
15 01 07	Stiklinės pakuotės	Nepavojinga	5	R13	1
20 01 40	Metalas	Nepavojinga		R13	
15 01 04	Metalinės pakuotės	Nepavojinga	20	R13	5
20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	Nepavojinga		R13	
16 06 05	Kitos baterijos ir akumuliatoriai	Nepavojinga		R13	
16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, kurios nepaminėtos 16 02 15	Nepavojinga		R13	
20 01 34	Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33	Nepavojinga	30	R13	5
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	Nepavojinga		R13	
17 01 01	Betonas	Nepavojinga		R13	
17 01 02	Plytos	Nepavojinga	60	R13	16
16 01 03	Naudotos padangos	Nepavojinga	44	R13	4
20 01 38	Medinės atbrailos	Nepavojinga	10	R13	2
20 01 10	Drabužiai	Nepavojinga	5	R13	1
20 02 01	Biologiškai suyrančios atliekos (žolė, lapai)	Nepavojinga	20	R13	4
20 03 07	Didžiosios atliekos (baldai; vežės)	Nepavojinga	20	R13	5

08 01 11*	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	H5	8	R13	3
08 01 21*	Dažų ar lako nuėmimų atliekos	H5		R13	
08 04 09*	Klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	H5, H10B		R13	
13 02 06*	Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H10B		R13	
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H5		R13	
13 05 07*	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluojas vanduo	H5		R13	
15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	H5, H5A		R13	
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip nepriklausytus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosios cheminiosios medžiagomis (tepalinuotos ziurkės; skudurai)	H10B		R13	
16 01 07*	Tepalų filtrai	H14		R13	
16 03 13*	Stabilūs skystis	H3A		R13	
16 03 14*	Automatinių skysčių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3A		R13	
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (pvz., oro filtrai, amortizatoriai)	H14		R13	
16 02 15*	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	H14		R13	
16 05 06*	Laboratoriniai cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytus iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų mišinius	H5, H6, H14		R13	
17 06 05*	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto (išskyrus lakštai)	H5, H6, H14		R13	
16 05 01*	Svinu užsmulkinantis	H6, H8		R13	
16 06 02*	Nikelio - kadmio akumuliatoriai	H6, H8		R13	
16 06 03 *	Gyvsidabrio baterijos	H6		R13	
20 01 15*	Tirpikliai	H3A		R13	
20 01 14*	Rūgštys	H8		R13	
20 01 15*	Šarmai	H8		R13	
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	H6		R13	
20 01 23*	nebenaudojama įranga, turinti chloro fluoro vandenilių (šaldytuvai)			R13	
20 01 27*	Dažai, rašalas, klijai ir dervos, turinčios pavojingų medžiagų				

20 01 29*	Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HS, HI4		R13	
20 01 33*	Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos	H5, H8		R13	
20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	HI4		R13	
20 01 37*	medienа, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	H5, HI4		R13	

Pastabos:
1 – atliekų kodas pagal Atliekų sąrašo aprašo 1 priedą;
2 – pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą;
3 – pagal Atliekų tvarkymo taisykles.

* Lentelėje nurodytų atliekų pavojingumą lemiančios savybės:
HBA – labai degios;
HB – degios;
H5 – kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali iš dalies pakenkti sveikatai;
H6 – toksiškos: medžiagos ir preparatai (įskaitant labai toksiškus), kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti sunkią žalą ar chronišką ligą ar net mirtį;
H8 – ėdžios: medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai;
HI4 – pavojingos aplinkai: medžiagos ir preparatai, kurie sukelia arba gali sukelti staigų ar užtęstą pavojų vienam ar daugiau aplinkos komponentų.

** Lentelėje nurodyti atliekų tvarkymo būdai:
R13 – R1-R12 nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų saugojimas

*** Kadangi numatomas pėsčiųjų takytojo suvidaunčių pavojingų atliekų kiekis palyginti mažas, o patikimų duomenų apie atskirų pavojingų atliekų rūšių dalį bendrame komunalinių atliekų sraute nėra, nurodomas tik bendras pavojingų atliekų saugykloje numatomas saugoti atliekų kiekis.

27.3. **Pateikiami papildomi duomenys, jei reikia, nustatomos Leidimo sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), reikalavimus.**

Punktas nepildomas, nes įmonė sąvartyno neeksploatuoja.

38 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos (atliekos šalinamiems įmonės).

Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų nešalina.

28. Į aplinką išmetamų (išleidžiamų) teršalų apskaita. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas.

39 lentelė. Nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planas.
Lentelė nepildoma, nes nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planas neorganizuotas.

40 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolės grafikas.
Lentelė nepildoma, nes įmonėje stacionarių oro taršos šaltinių nėra. Grafikas neorganizuotas.

41 lentelė. Ūkio subjektų aplinkos (poveikio aplinkai) monitoringo planas.
Lentelė nepildoma, nes Poveikio aplinkai monitoringo planas neorganizuotas. Poveikio aplinkos oro monitoringas nevykdomas todėl, kad įmonėje nesusidaro teršalų, kurių TPK>1/3. Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas nevykdomas, nes įmonė nesišleidžia į aplinką teršalų su nuotekomis.

29. Triukšmo kontrolė.
Nuolatinio triukšmo šaltinių aikštelėje nėra. Triukšmą gali sukelti tik į aikštę privežimo aikštelę atvažiuojančios šiukšliavežės ar atliekas perdirbančių įmonių sunkvežimiai bei atliekų tiekėjų, atvežusių savo atliekas, transporto priemonės. Numatoma, kad per savaitę į aikštelės teritoriją atvažiuos ne daugiau kaip 1 atliekų tvarkymo įmonių sunkvežimis darbo valandomis (8-17 val.). Per dieną į aikštelę atvyks ne daugiau kaip 10 lengvųjų automobilių. Transporto priemonių keliamas triukšmas bus nedidelis ir nepastovus. Aikštelė įrengta pramoniniame miesto rajone. Juos pasiekiančio triukšmas neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose bei jų aplinkoje" nustatyto leidžiamo 55 dBA triukšmo ribinio dydžio.
Kauno visuomenės sveikatos centro (Kauno skyrius) išvadą pateikta **priede Nr.19**.

30. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.
Punktas nepildomas, nes įrenginio eksploatavimo laikas neribojamas.

31. Triukšmo kontrolė ir matavimai. Duomenys apie triukšmo šaltinių charakteristikas.
Punktas nepildomas, nes duomenys apie triukšmo šaltinių charakteristikas nepateikti.

42 lentelė. Triukšmo šaltinių ir parametrų suvestinė.
Lentelė nepildoma, nes nėra duomenų apie triukšmo šaltinius ir jų parametrus.

32. Kvapų kontrolė.
Įmonėje kvapų kontrolė nevykdoma.

33. Avarijų ir terminių nenumatytų išmetimų prevencija.
Įmonėje nėra Taisyklių 1 priede nurodytų įrenginių, todėl avarijų ir terminių nenumatytų išmetimų prevencija nevykdoma.

34. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai.
Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai nenustatomi.

35. Apskaitos vykdymas ir ataskaitų rengimas.
Apskaitos vykdymas ir rengimas nenustatytas (Į šį punktą dalyje „Leidimo sąlygos".

36. Be minėtų ataskaitų, iš veiklos vykdytojo Leidime sąlygose nustatyta tvarka gali būti reikalaujama pateikti ataskaitas apie Leidime sąlygų nurodytų Aplinkosaugos veiklanų plane (Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams) bei Gamtos išteklių taupymo ir atliekų tvarkymo plane (visoms veikloms), vykdymą.
Įmonėje nėra Taisyklių 1 priede nurodytų įrenginių, todėl pateikiamų ataskaitų apie Leidime sąlygų vykdymą nenustatoma.

III. LEIDIMO PRIEDAI

37. 1 priedas. Schemos ir žemėlapiai.
2 priedas - VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Raudondvario pl. atliekų priėmimo aikštelė Raudondvario pl. 155d. Kaunas padėties vietovėje planas.
6 priedas - VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Raudondvario pl. atliekų priėmimo aikštelė Raudondvario pl. 155d. Kaunas pastatų ir pagalbinių patalpų išdėstymo schema.
11 priedas - VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Raudondvario pl. atliekų priėmimo aikštelė Raudondvario pl. 155d, Kaunas inžinerinių tinklų planas.
38. 2 priedas. Suinteresuotų institucijų išvados ir komentarai
7 priedas - LR AM Kauno RAAD išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo.
19 priedas - Kauno visuomenės sveikatos centro 2011-02-15 rašto Nr.2-635-(6.8.8) „Dėl paraiškos TIPK leidimui gauti" suderinimo kopija.
Kauno visuomenės sveikatos centro TIPK paraiškos ir leidimo projekto derinimo raštai.
Kauno miesto savivaldybės administracijos TIPK paraiškos ir leidimo projekto derinimo raštai.
8 priedas - Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotas Statybos leidimas Nr.38-5 IF 240-226.
39. 3 priedas. RAAD komentarai dėl Leidimo sąlygų (kai Leidimo sąlygos neatitinka paraiškos duomenų).
Leidimo sąlygos atitinka paraiškos duomenis.
40. 4 priedas. Pateikiami dokumentai, kurie buvo naudoti sprendimams pagrįsti, bei jų sąrašas, nurodant:
UAB „Krašto projektai ir partneriai" Techninio projekto „Atliekų priėmimo aikštelės įrengimas Raudondvario pl. 155d, Kaunas" aplinkos apsaugos dalis

41. Pridedami dokumentai:
VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Raudondvario pl. atliekų priėmimo aikštelė Raudondvario pl. 155d, Kaunas paraiška TIPK leidimui gauti (šio leidimo sudedamoji dalis).
VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Raudondvario pl. atliekų priėmimo aikštelė Raudondvario pl. 155d, Kaunas paraiškos TIPK leidimui gauti priedai bei jų sąrašas:
1 priedas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro registravimo pažymėjimo kopija;
2 priedas – Atliekų priėmimo aikštelės padėties vietovėje planas;
3 priedas – Žemės teisinės registracijos dokumentų kopijos;
4 priedas – Žemės sklypo panaudos sutartis;
5 priedas – Statinių ir patalpų teisinės registracijos dokumentų kopijos;
6 priedas – Pastatų ir pagalbinių patalpų išdėstymo schema;
7 priedas – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo;
8 priedas – Statybos leidimas;
9 priedas – Atliekų priėmimo aikštelės darbinės veiklos valdymo organizacinė schema;
10 priedas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymas dėl [illegible], atsakingų už aplinkos apsaugą bei kontrolę.

Įsakymas:

11 priedas – Suvestinis inžinerinių tinklų planas;
12 priedas – Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimai;
13 priedas – Atliekų saugojimo ar šalinimo suvestinis registravimas;
14 priedas – Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas;
15 priedas – Garažo išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planas;
16 priedas – Sutartys su atliekas tvarkančiomis įmonėmis;
17 priedas – Sutartis dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo;
18 priedas – Lietaus nuotekų valymo įrenginių charakteristikos ir atitikties deklaracijos;
19 priedas – Kauno visuomenės sveikatos centro (Kauno skyrius) išvada;
20 priedas – Statinio tinkamo naudoti priėmimo aktas;
21 priedas – Paraiška registruoti Atliekų sąvartyne;
22 priedas – AB Šiaulių bankas. Mokėjimo garantija Nr. 230083 I 170047;
23 priedas – VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno miesto Raudondvario pl. atliekų priėmimo aikštelė Raudondvario pl. 155C, Kaunas, Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano derinimo raštas.

42. Kiti priedai.

Nėra.

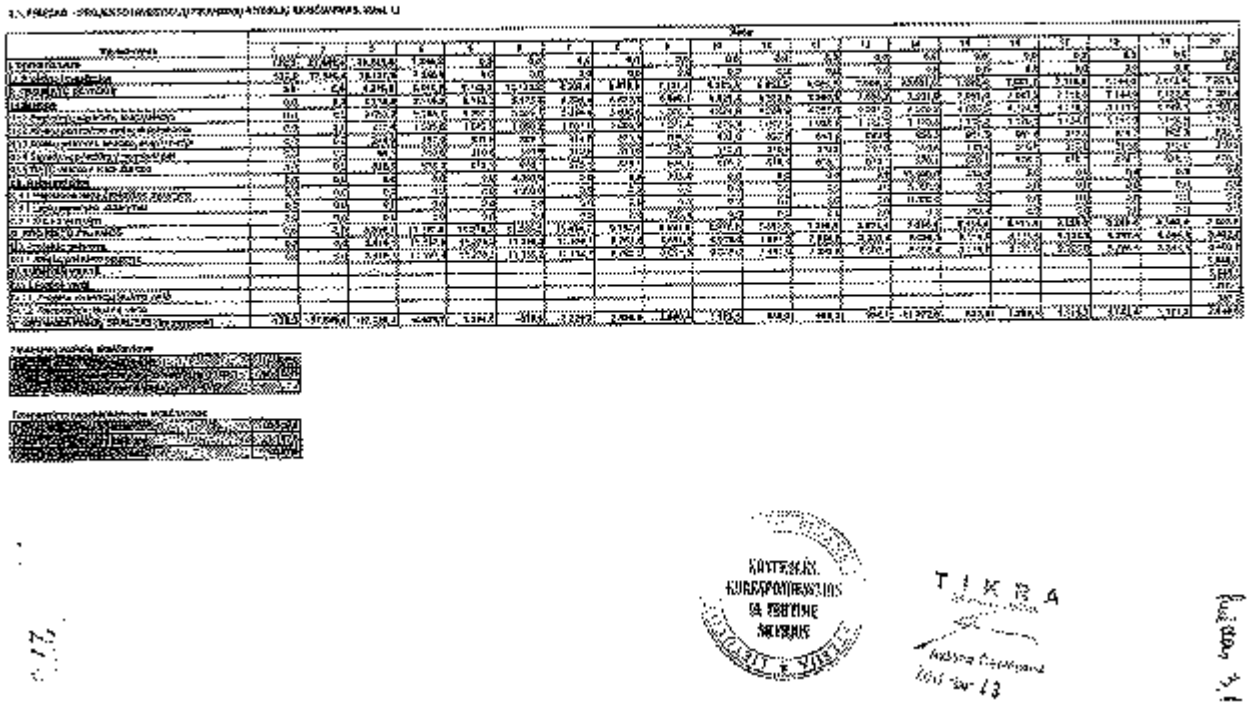

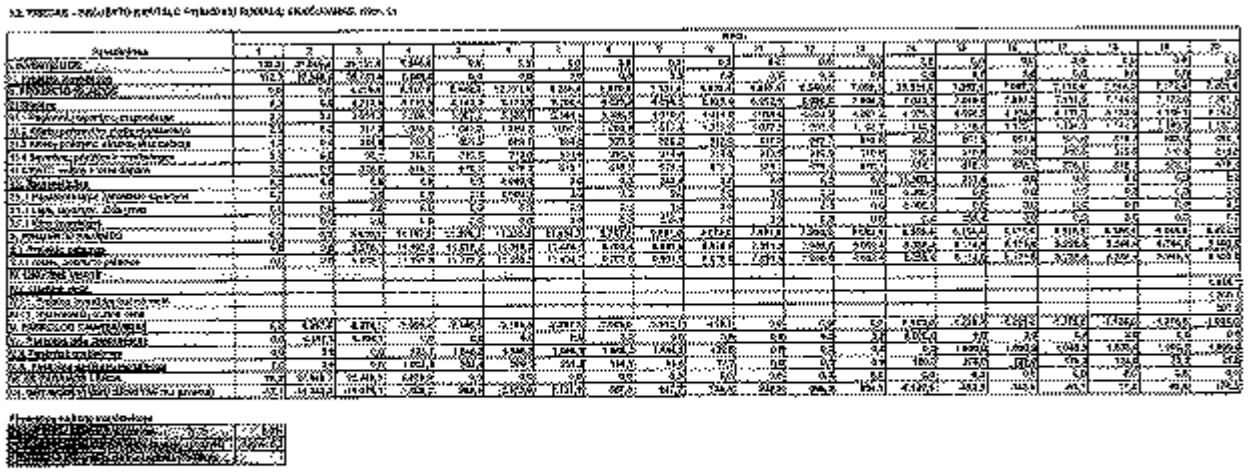

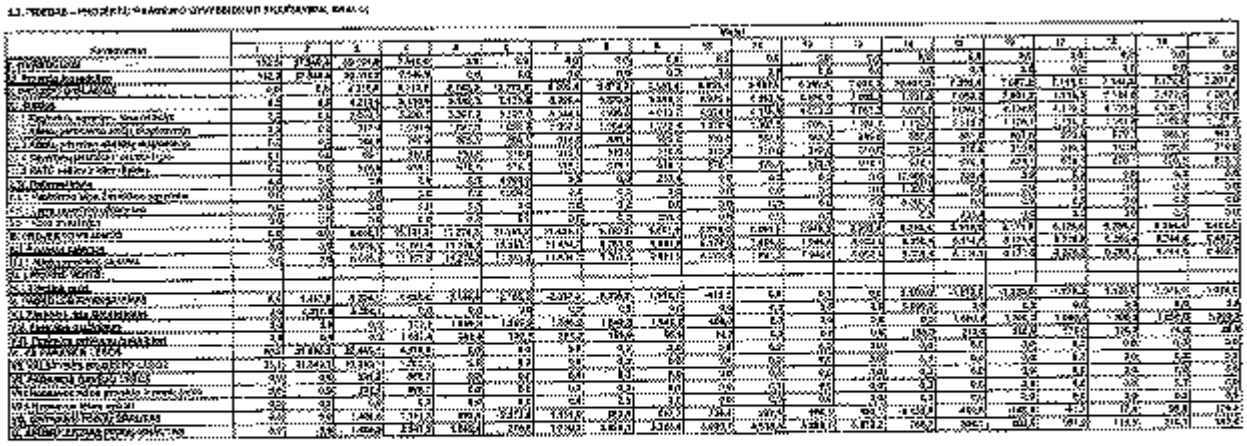

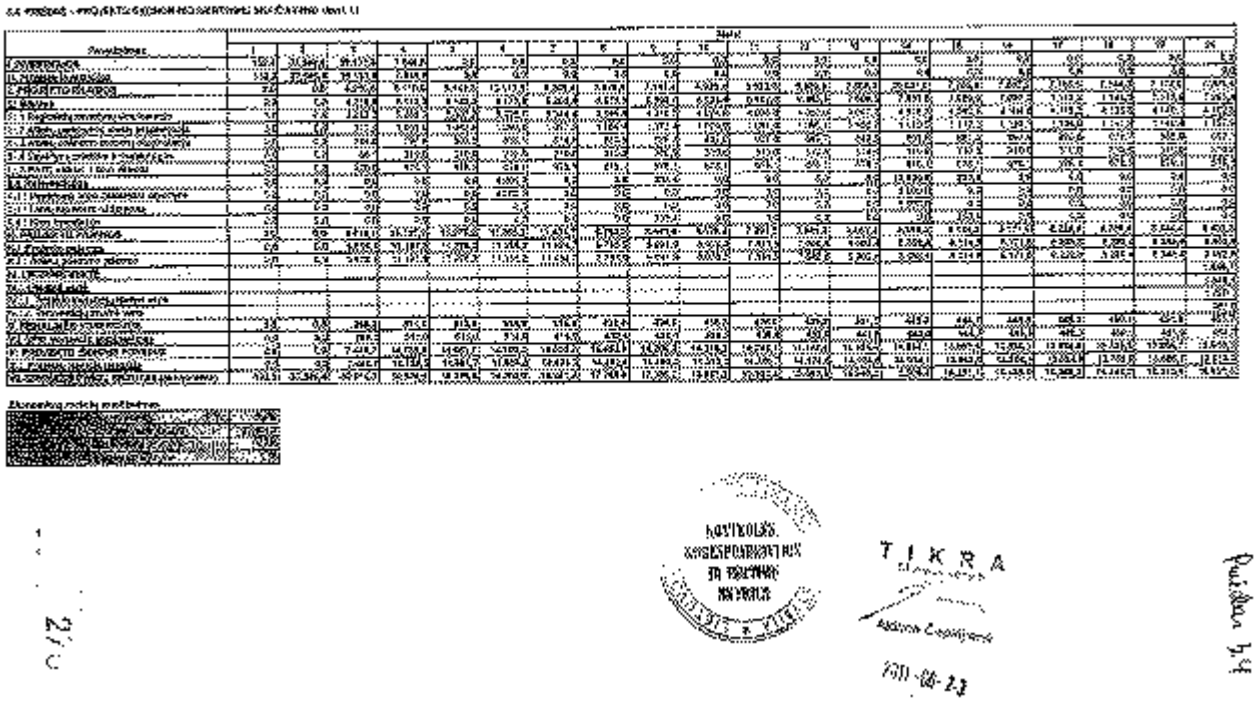

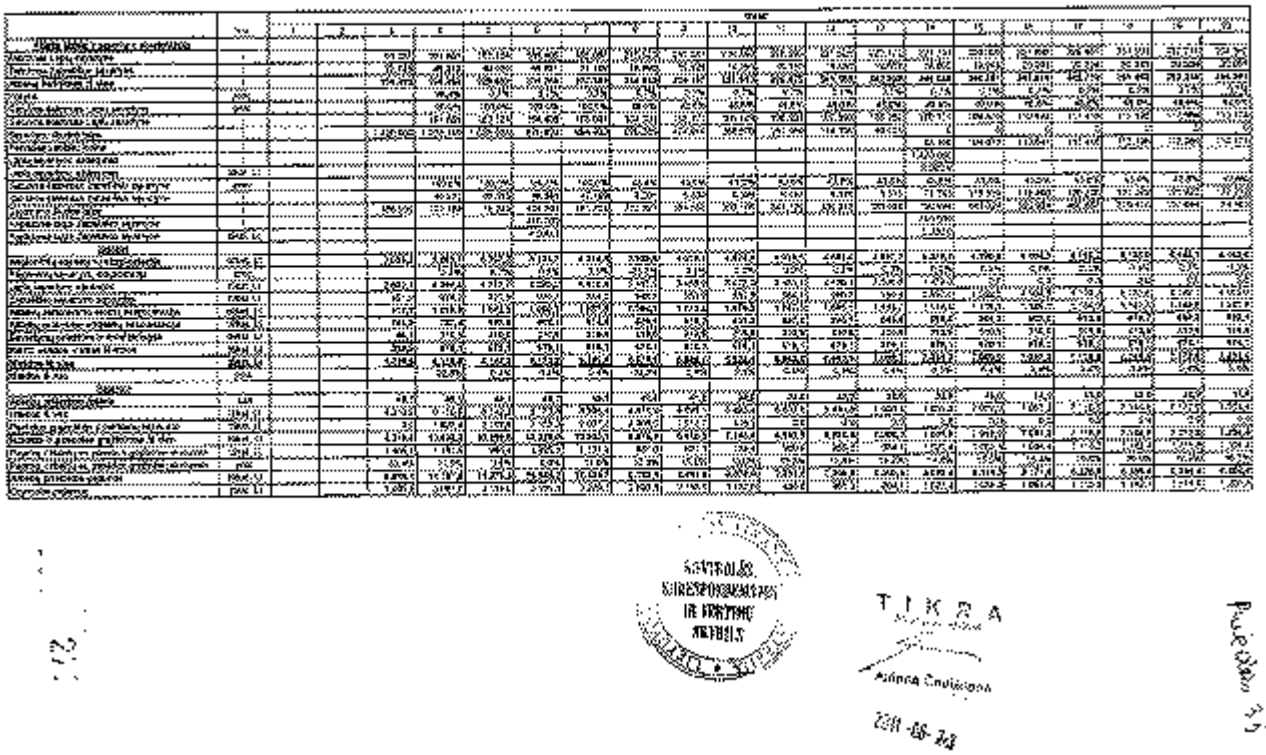

3.6 PRIEDAS. ATLIEKŲ KODAI IR TVARKYMO KAINOS KAUNO RAJ.IR OBJEKTUOSE

Nr.	Atliekos				
	Pavadinimas	Sąrašo kodas	Statistinis kodas	Tvarkymo būdas kodas	Kaina Lt/t be PVM
ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETA:					
LAPIŲ REGIONINIS SAVARTYNAS :					
ŽALIŲJŲ REGIONINIS SAVARTYNAS, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖ, STATYBINIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖ					
1.	mišrių statybos atliekos, kuriose yra metalo	01 03 91	12.31	D1	49,10
2.	mišrių kasybos atliekų, kuriose yra metalų	01 03 92	12.31	D1	49,10
3.	šlakuos, nenurodytus 01 03 05 ir 01 03 06	01 03 96	12.31	D1	49,10
4.	dažiklių ir miltelių gamybos atliekos, nenurodytos 01 03 07	01 03 98	12.31	D1	49,10
5.	švyno ir jo lydinių atliekos, nenurodytos , nenurodytos 01 04 07	01 04 98	12.13	R13 R13	49,10
6.	smėlio ir molio atliekos	01 04 99	12.31	R13 R13	49,10
7.	silikatinės vidinio glaistymo cheminiais dumblais, atliekos, nenurodytos 01 05 07	01 05 99	12.31	D1	49,10
8.	dažiklių ir miltelių gamybos atliekos, nenurodytos 01 04 07	01 04 30	12.31	D1	49,10
9.	popsalų ir akmens druskos gavybinio atliekos, nenurodytos 01 04 07	01 04 13	12.31	D1	49,10
10.	mišrių plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11	01 04 12	12.31	D1	49,10
11.	skiriamų akėčiavus ir frezuojamo atliekos, nenurodytos 01 03 07	01 04 13	12.31	D1	49,10
12.	vario vardens grąžtų dumblas ir atliekos	01 05 04	12.33	D1	49,10
13.	grąžtų, dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodytų 01 05 05 ir 01 05 06	01 05 07	12.33	D1	49,10
14.	augalų audinių atliekos	02 01 03	09.12	D1	49,10
15.	plastiko atliekos (išskyrus pakuotes)	02 01 04	07.42	D1	49,10
16.	agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	02 01 08	02.12	D1	49,10
17.	plovimo, valymo, šepimo, nuriebalinimo ir separavimo dumblas	02 02 01	09.12	D1	49,10
18.	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	02 02 03	09.13	D1	49,10
19.	kitaip nesuderėtos atliekos	02 02 99	09.12	D1	49,10
20.	plovimo, šlapio nuvalymo ir separavimo medžiagos	02 03 01	12.31	D1	49,10
21.	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	02 03 03	09.13	D1	49,10
22.	mechaniškai suderinto popieriaus ir kartono atliekų vandeninė frakcija	03 03 07	10.32	D1	49,10
23.	medžio dirvožė ir kamštienos atliekos	03 01 05	07.31	R3	49,10
24.	pjuvenos, drožlės, skiedros, medžiora, medienos dirbinių pjaustymo ir faneravimo, nenurodytos 03 01 04	03 01 01	07.32	R3	49,10
25.	medžio dirvožė ir medienos atliekos	03 01 05	07.31	R3	49,10
26.	sunkiųjų medžiagų (metalų, akmenukų, smėlio, akmenų, uolienų) atliekos	17 05 04	07.62	D1	49,10
27.	asfalto atliekos, nenurodytos 06 02 14	17 03 02	07.34	D1	49,10
28.	neperdirbtos kreidinės gipsinio pobūdžio atliekos	06 02 23	07.51	D1	49,10

29.	cerdavimo iškastiles pirmojo kilimo	04 02 22	07.02	D1	49,10
30.	šlapiųjų atliekos	07 02 13	07.42	D1	49,10
31.	polietileninės atliekos, susidarančios 07 02 13	07 02 13	02.14	D1	49,10
32.	kitaip neapibrėžtos atliekos (pirmojo atliekos)	07 02 99	01.17	D1	49,10
33.	dažų ir lakų atliekos, nenurodytos 08 01 11	08 01 12	02.13	D1	49,10
34.	dangos mišinių atliekos	08 02 01	02.13	D1	49,10
35.	spausdinimo dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	08 03 18	02.13	D1	49,10
36.	klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	08 04 10	02.13	D1	49,10
37.	dugno pelenai, šlakas ir garų katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 19 01 04	10 01 01	07.42	D1	49,10
38.	šlako agliorajimo atliekos	10 02 01	02.42	D1	49,10
39.	nagrinėrotas šlakas	10 02 02	07.42	D1	49,10
40.	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	10 05 01	12.42	D1	49,10
41.	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	10 06 01	12.42	D1	49,10
42.	lydymo šlakas	10 09 01	12.42	D1	49,10
43.	strypai ir šabloną, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	10 09 08	12.52	D1	49,10
44.	lydymo šlakas	10 10 01	12.42	D1	49,10
45.	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 06	10 10 08	12.52	D1	49,10
46.	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	10 10 09	12.52	D1	49,10
47.	įrankių šablonai	10 12 06	06.11	D1	49,10
48.	keramikos, plytų, čerpių ir statybinių keramikinių gaminių atliekos (po terminio apdorojimo)	10 12 08	13.11	D1	49,10
49.	glaistiko dribsliai ir dulkės	12 01 05	07.42	D1	49,10
50.	suvirinimo atliekos	12 01 13	10.22	D1	49,10
51.	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	12 01 21	12.51	D1	49,10
52.	kitaip neapibrėžtos atliekos	12 01 99	06.32	D1	49,10
53.	absorbentai, filtrų medžiagos, gadinamosios ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	15 02 03	03.14	D1	49,10
54.	plastikas	16 01 19	07.31	D1	49,10
55.	stiklas (vertikalus pardavimas)	16 01 20	07.32	D1	49,10
56.	betonas	17 01 01	02.51	R30, R13	49,10 Nemokamai (gyventojams)
57.	plytos	17 01 02	12.11	R30, R13	49,10 Nemokamai (gyventojams)
58.	čerpės ir keramika	17 01 03	12.11	R10 R13	49,10 Nemokamai (gyventojams)
59	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	17 01 07	12.11	R10 R13	49,10 Nemokamai

					(gyventojams)
50.	medis	17 02 01	07.33	R13	49,10
51.	stiklas	17 02 02	07.12	R13	49,10
52.	plastikas	17 02 03	07.42	R13	49,10
53.	mišrūs statiniai	17 09 04	06.26	R13	49,10
54.	kabeliai, nenurodyti 17 04 10	17 04 11	06.32	D5	49,10
55.	grunsas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	17 05 04	12.07	R10, R13	49,10
56.	išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	17 05 06	11.31	D1	49,10
57.	kelio skalda, nenurodyta 17 05 07	17 05 08	12.31	R10 R13	49,10
58.	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	17 06 01	12.21	D1 D5	49,10
59.	izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	17 06 04	12.13	R10 R13	49,10
70.	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	17 06 05	12.21	D1 D5	49,10
71.	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	17 08 02	12.11	R10 R13	49,10
72.	mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	17 09 04	12.13	R10 R13	49,10
73.	atliekos, surinktos kilimui ir šaliminui apsaikeisi specialiai reikalingiems, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsčiai, gipso atvaizdai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)	18 01 04	05.21	D1	49,10
74.	iš ligonio pašalintos medžiagos, kuriose yra gelezies	18 01 06	06.11	D1	49,10
75.	ligonio palaikai ir dalekas, nenurodyti 18 01 03	18 01 12	12.02	D1	49,10
76	iš ankstyo surinktyos atliekos, susietos tik iš nepavojingos atliekų	18 02 02	09.22	D1	49,10
77.	sudėtinės atliekos, nenurodytos 19 01 04	19 01 05	13.11	D1	49,10
78.	sudėtintos atliekos, nenurodytos 19 05 06	19 01 07	13.11	D1	49,10
79.	sustiklinos atliekos	19 04 03	13.21	D1	49,10
80.	nekompostuojos komunalinių ar panašių atliekų frakcijos	19 05 03	09.34	D1	49,10
81.	netinkamos naudoti koncepsinio	19 05 03	09.21	D1	49,10
82.	rūšiavimo atliekos	19 08 05	09.12	D1	49,10
83.	smėlio gaudyklių atliekos	19 08 02	09.13	D1	49,10
84.	plastikai ir guma	19 12 04	12.34	D1	49,10
85.	stiklas	20 01 02	07.12	D1	49,10
86.	drabužiai	20 01 10	07.53	D1	49,10
87.	tekstilės gaminiai	20 01 11	07.52	D1	49,10
88.	medienų, nenurodytai 20 01 37	20 01 38	07.53	D1	49,10
89.	plastikai	20 01 39	07.42	D1	49,10
90.	kanalizacijos atliekos	20 03 04	03.11	D1	49,10
91.	biologiškai suyrančios atliekos (žolėpjūvių, parkų tvarkymo atliekos)	20 02 01	09.21	R3	49,10 Neprieinama

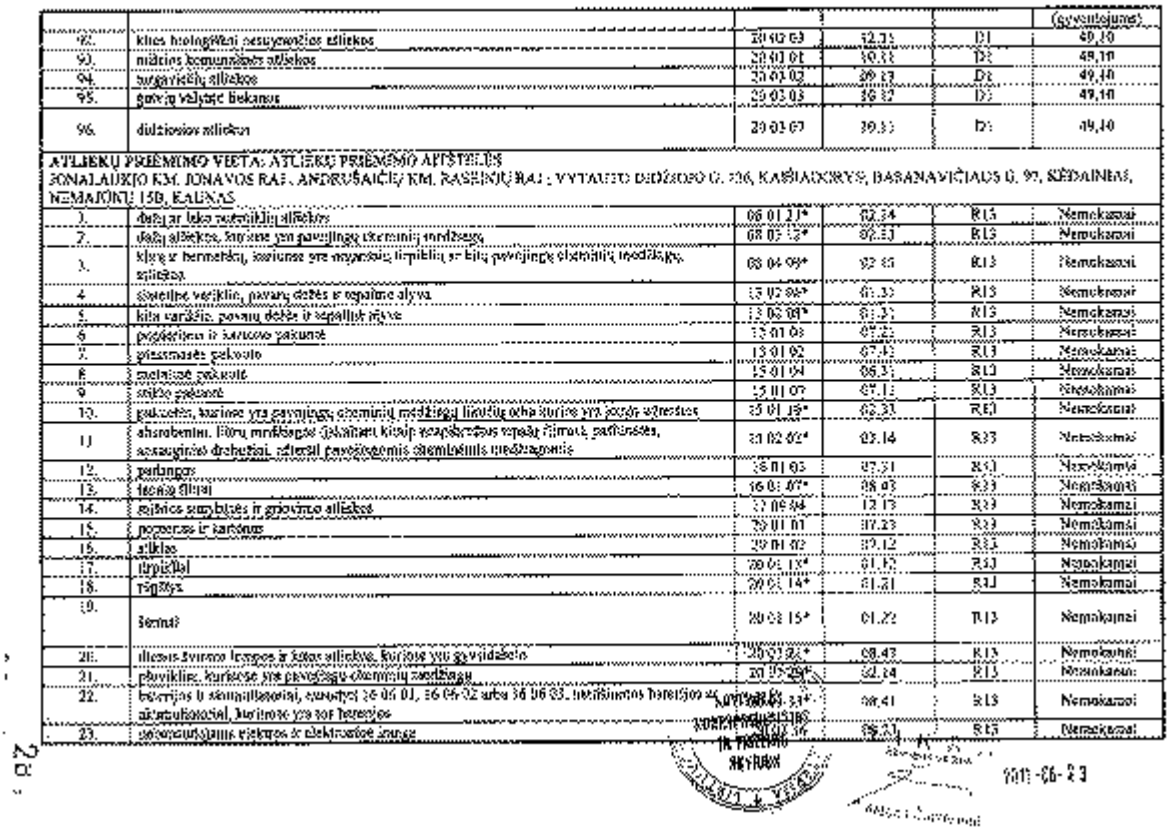

					(gyventojams)
92.	kitos buitinėmis sąlygomis susidarančios atliekos	20 03 99	02.31	D1	49,10
93.	miškų komunalinės atliekos	20 02 01	02.31	D1	49,10
94.	turgavietių atliekos	20 03 02	39.13	D1	49,10
95.	gatvių valymo liekanos	20 03 03	39.12	D1	49,10
96.	didžiosios atliekos	20 03 07	39.11	D1	49,10
ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETA: ATLIEKŲ PRIĖMIMO APŠTELĖS JONALAUKIO KM. JONAVOS RAJ., ANDRUŠAIČIŲ KM. RASEINIŲ RAJ.; VYTAUTO DIDŽIOJO G. 226, KAŠIADORYS, BABANAVIČIAUS G. 97, ŠĖDAINIAI, NEMAJŪNŲ 15B, KAUNAS					
1.	dažai ar lakai, turintys atliekos	08 01 21*	02.34	R13	Nemokamai
2.	dažų atliekos, turinčios ar gaminėjusios chemiškai modifikuoto	08 03 13*	02.33	R13	Nemokamai
3.	klijų ir hermetikų, turinčių ar gaminėjusių tirpiklių ar kitų pavojingų chemiškai modifikuotų	08 04 09*	02.35	R13	Nemokamai
4	skystoji vaizdinio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	13 02 05*	01.33	R13	Nemokamai
5	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	13 02 08*	01.32	R13	Nemokamai
6	pagrindinio ir kuro bakų	13 07 03	07.22	R13	Nemokamai
7	pirmosios pakopos	13 07 02	07.12	R13	Nemokamai
8	antrinės pakopos	13 07 04	08.31	R13	Nemokamai
9	skirtos pakopos	13 07 07	07.13	R13	Nemokamai
10.	pakuotės, kuriose yra pavojingų chemiškai modifikuotų likučių arba kuriose yra jų	15 01 10*	02.33	R13	Nemokamai
11	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtas vandens filtrus), pašluostės,	15 02 02*	03.16	R33	Nemokamai
12.	padangos	16 01 03	07.31	R13	Nemokamai
13.	šaldymo įtaisai	16 02 11*	08.43	R13	Nemokamai
14.	asfalčio susidėvėjimo ir griovimo atliekos	17 03 04	12.13	R13	Nemokamai
15.	popierius ir kartonas	20 01 01	07.23	R13	Nemokamai
16.	stiklas	20 01 02	39.12	R13	Nemokamai
17.	tirpikliai	20 01 13*	01.15	R13	Nemokamai
18.	rūgštys	20 01 14*	01.21	R13	Nemokamai
19.	šarmai	20 01 15*	01.22	R13	Nemokamai
20.	alyvos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	20 01 21*	08.43	R13	Nemokamai
21.	dažiklius, kuriuose yra pavojingų chemiškai medžiagų	20 01 27*	02.34	R13	Nemokamai
22.	baterijos ir akumuliatoriai, išvardyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, neišrūšiuotos baterijos ir	20 01 33*	08.41	R13	Nemokamai
23.	nebenaudojami elektros ir elektroninė įranga	20 01 36	08.21	R13	Nemokamai

24.	medienа, kuriniо nėra pavojingų dalelių įrenginyje	20 01 38	07 03	R13	Nemokamai
25.	plastikas	20 01 39	07 02	R13	Nemokamai
26.	tekstilė	20 01 10	04 02	R13	Nemokamai
ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETA: ATLIEKŲ PERKROVIMO STOTIS KM, JONAVOS R.AJ., ANDRIUŠAIČIŲ KM. RASEINIŲ R.AJ., VYTAUTO DŽIOJO G. 116, ŽAIŠIADORYS:					
1.	mišrios komunalinės atliekos	20 03 01	19 12	82	49,30

5

Atliekas moderniai tvarkys nauja įstaiga

Kauno miesto savivaldybės įsteigtą įmonę Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą.

Taip pat kuriamas Europos Sąjungos (ES) direktyvas atitinkantis regioninės atliekų tvarkymo sistemos, pagal kurią visi miestai ir rajonai turės atskirai rinkti

Šiuo metu sąlginio atliekų tvarkymo centras, kur iš pusės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir atliekų srautus nuolat stebėtų ir apskaitytų

Kauno miesto savivaldybės įsteigtą įmonę Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą.

Taip pat kuriamas Europos Sąjungos (ES) direktyvas atitinkantis regioninės atliekų tvarkymo sistemą, pagal kurią visi miestai ir rajonai turės atskirai rinkti

Šiuo metu sąlginio atliekų tvarkymo centras, kur iš pusės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir atliekų srautus nuolat stebėtų ir apskaitytų

Atliekų verslas laukia milijoninių investicijų

Viešąją įstaigą įsteigusios šešios Kauno regiono savivaldybės tikisi sulaukti Europos Sąjungos paramos

Arūnas ANDRIUŠKEVIČIUS

Kauna siūlo steigti viešąją įstaigą "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras". Savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Sulnevičius įsteigtoje įstaigoje matytų regiono savivaldybių, viešosios įstaigos steigėjų, taip ir bendrovė "Kauno švara", valdomai Lapėse veikiantį sąvartyną.

Pasak G.Sulnevičiaus, nuostatų 3 balsus, o Kėdainių, Kauno, Jonavos, Prienų, Raseinių, Rietavo ir Šilalės rajonų savivaldybės - po vieną.

"Pakeitėsi ir teisinė vizo situacija", - sakė direktorius. Seimui dar šiais metais nebeliko laiko priimti visų savivaldybių prašymų. Šiuos dalykus pasitikrinome su šios srities nuolatiniais ginčo dalyviais. Patylėjus su Kauno žiedu, kitų savivaldybių atstovai nepajėgė dėmesio savo sąlygas. G.Sulnevičius neslė-

Įsteigtasi "Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą" savivaldybės ketina pasinaudoti siekiant Europos Sąjungos fondo lėšų. 2003-2006-iųjų laikotarpiu investuoti apie 16,5 milijono eurų. 85 procentus šios sumos tenkėtų Aplinkos fondui, 10 procentų - šiuvinėjybė, o 5 procentus - savivaldybės.

Taip pat planuojama

G.Sulnevičius aiškindamas

kad jos dabar

Priedas Nr. 3

2006 gruodžio 3, trečiadienis Kauno diena 15

Atliekas tvarkys bendrai

Iki 2013 m. Kauno rajone savivaldybės ribose planuojama modernizuoti visą atliekų tvarkymo sistemą. Atliekų tvarkymo projektą nuo 2005 iki 2024 metų šiuo įgyvendinamą viziją šiandien Seimūnų rūmuose pristatė aplinkos ministrė Kauno rajono atliekų tvarkymo sistemą. Projektą jis įvardijo kaip vieną didžiausių Kauno rajono istorijoje. Jo vertė – 82,95 mln. eurų.

Nuosekli galimybių studijos ir ilgos derybos

Jau nuo 2005 m. vadovaujantis Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros gairėmis, šiame rajone, Kaune, Jonavoje, Raseiniuose, Kėdainiuose, Prienuose ir Birštone veikiančių savivaldybių vadovai derėjosi su aplinkos ministerija, kaip racionaliai Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemą plėtoti. Tuomet buvo kvestionuojamas 10 kilometrinio spindulio reikalavimas - Lapių ir Zasčiūkų (Kėdainių r.).

Investicijų į projektą, kuriam buvo pritarė Ginčiūnuose kovo 30 dieną. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ES SPA įgyvendinimo agentūra organizavo specialios galimybių studijos parengimą. Pagrindinis jos tikslas buvo išmagistruoti atliekų tvarkymo sistemą, kuriai atliekų srautai nuo 2014 m., jų kiekiams ir sudėčiai gerėjant.

Nuo tada Kauno rajono savivaldybės ekspertų darbas kiekvieną naujiems šių atliekų srautų ir gamybos tvarkymo sprendimams. Vienas iš jų – Kauno regiono atliekų tvarkymo centro įrenginių modernizavimas. Kauno regione atliekos nuo 1994 m. deponuojamos Lapių sąvartyne. Jis yra vienas iš 10 Lietuvoje, kuriuose deponuojamos atliekos atitinka ES reikalavimus reikalavimus", - teigė darbo grupės narė Jolanta, Tarybos narys Gediminas Stanguška.

Tarybos pirmininko pavaduotojo Gediminas Stanguška. Pasak jo, Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros galimybės buvo nuolat diskutuojamos. Tačiau tik šiandien yra aiškus sprendimas, kuri modernizuoti eksploatuoti dar 20 metų, tarp kokių regiono gyventojų turi atsirasti darbo ir kam dar reikalingi.

"Kauno regiono atstovas, Aplinkos apsaugos departamento rekomendacija, buvo nuolat atsiginantis su - Lapių ir Zasčiūkų - savivaldybės, ir sąvartynus pakeisiantį jų teritorijoje esantį regiono atliekų tvarkymo centrą. O Lapių gyventojams tai suteiktų vietą gyventi išvengti nuolatinių problemų aplinkos pažeidimo rizikos įsteigiamas, esančiam 82 metrų nuo kelio. Kalbėjo aplinkos ministrė Kauno rajono atliekų tvarkymo sistemą. Kauno ir Kėdainių rajoną. Taip pat šios vietos Čiamiai kelio Kaunas-Lapės ruožo. Atsižvelgiant į tai, kad

Daugiafunkcis metų planas

Tad, pasibaigus derybomis ir Savivaldybių narybinės grupės Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos projektui, buvo pradėta įgyvendinti Kauno regiono atliekų tvarkymo strategija. Šiuo metu yra parengti techniniai ir galiojantis veiksmų planai. Tvarkymo plano tikslai iki 2006 m. 2009 m., o iki 2009 m. 2024 m. Šiame planuose yra numatyta viemetka atliekų kaupimo priemonių, iš - komunalinių atliekų tvarkymo mokesčių išplėtimas, regiono atliekų šalinimo įrenginių ir ES reikalavimų užtikrinimas, atskirų rūšių atliekų surinkimo, pradžia ir tolesnis komunalinių atliekų sistemos.

"Pirmąjame tvarkymo etapemose, bokės kaip komunalinių atliekų tvarkymo centrą, išplėtimą, visos šiukšlių savivaldybės įgyvendins atskirai. O antros priemonės, kaip sąvartyno uždarymas, jo rekultivavimas ir palaikinimas bus vykdomos savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu.

Verta pastebėti, kad kiekvienos atliekų rūšies tvarkymas turi užtikrinti šiuo metu galiojančius reikalavimus, kurių yra 38. O tokio tvarkymo vykdyti ir atskirų šių reikalavimų laipsnį turi įsteigiamas Zasčiūkų įgyvendinimo. Šiuos reikalavimus nemažinimas, jie nuolat ir gyventojams padidėjus tokie Kauno regiono atliekų tvarkymo centras,

Šio projekto kaina siekia per 82,95 mln. eurų. Tačiau suvokiama, kad 85 proc. šios sumos dar Sąjungos bendrojo fondo. 10 proc. - iš valstybės biudžeto ir 5 proc. pačių atliekų turėtojų savivaldybių lėšos.

Tačiau visos atsiųsti rūšinės, kai tai, kad šis projektas finansuojamas iš nuolatinio fondo pabaigoje nuo to, kuo jis įgyvendinamas nuo ES reikalavimus. Šiuo metu jis yra tvirtas vienas regiono savivaldybės tai sutvarkyti vienas įvairiausių – Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, valdysena visų savivaldybių, sąvartynai bei kapi naujai įkisto atliekų centro antro ir atliekų tvarkymo aikštės nuo lapių šiemet 2004 m. spalio - lapkričio mėnesiais.

Žengtas pirmas žingsnis

Simonaitė išaiškino šiuos klausimus, Aplinkos palimi tarybos nuolatinė narybinė darbo grupė parengė naujai kuriamos įstaigos - Kauno regiono atliekų tvarkymo centro - steigimo nuostatų projektus. Taip Kauno regione atliekų tvarkymo projektas jau praktiškai įgyvendintas. Kauno rajono savivaldybės tarybos narkas ir pavaduotojas jau pradėjo

Praėjusiame etape šiame centre buvo nieko neįsivaizduojama, kuris bendrovės-atstovų su - aplinkos projektų vadybos specialistų projektų įvykdymo užduotis. O sąvartynui ir tokiems darbus šiandien - tai tikrai labai daug žinančių žmonių.

Tad jau šiandien pirmas žingsnis. Ir greitai šiame centre pradės bendrauti Kauno rajono gyventojai, kuriuos rajono atliekų tvarkymo sistema. Ji apima ne vieną ir visame šiame nuolatinės savivaldybėms priimtos atliekų tvarkymo sprendimų, gal ir bus turėtų vilkaliui, gyventojams pilnai - tinkamai pasirengti tarifus už komunalines paslaugas.

dp.lt.com

VALSTYBĖS KONTROLĖS IR VERTINIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

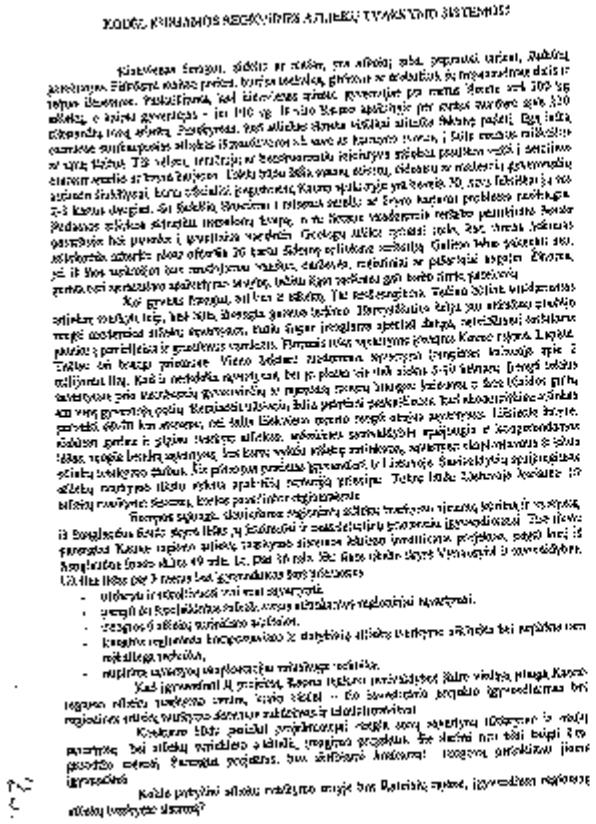

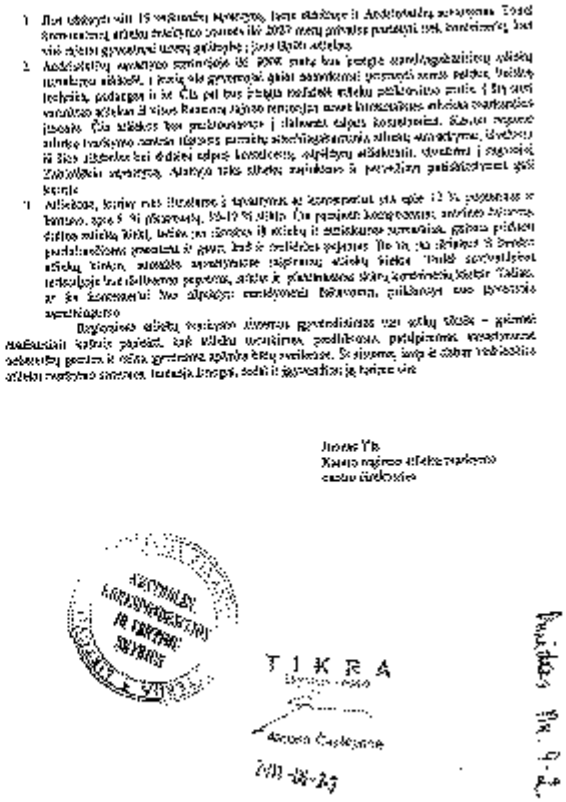

6 Kaunas

NELAIMĖS

Vienname pastate – dvi vagystės

Kaimo gyventojų atsiminimus apie tarybinius laikus Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentė Ieva Kuzmickaitė.

Knygė monitorių

Ugniagesiai gelbėtojai vakar Kaune apskrito ligoninės Pelėsinio skyriaus sprukusį vagį išvedė koridoriumi ir atidarė...

Ketina pertvarkyti miesto sąvartynus

Dėl kitų objektų miesto tvirtovės laikais Kauno miesto valdžia kol kas nesiryžta.

Aplinkosaugininkai nustatė, kad Lapės ir Zabelkiškių sąvartynų šlaitus galima pertvarkyti.

Anot Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus Juozo Vito, jos bendrovės užsakymu specialistai taip pat nustatė, kad po pertvarkymo sąvartynai galėtų veikti dar penkerius metus.

Kaip paskaičiavo Vito, šiems darbams būtų reikalingi kai kuriems gana dideli pinigai – 05 mln. litų, bet vėliau sutaupytume. Kol neskaičiuojame kur šie dideli skaičiai – apie 50 mln. litų.

Didžiąją dalį lėšų galėtume gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, likusias sąskaitas apmokėtų Lietuvos valstybės biudžetas, mūsų sąvartynų uždarymo programą vykdantis Aplinkos ministerijos padalinys.

Vilniaus universiteto kauniečiai gyvena palaukėmai egzaminuoti ir suprantu aplinkosaugininkų nuomonę, tačiau šiuo metu Kauno miesto valdžia tokių darbų nenumato, nes yra kitų prioritetinių projektų, kuriuos reikėtų įgyvendinti anksčiau.

Tarp tokių projektų Juozo Vito įvardijo naujo regioninio sąvartyno Kauno regione bei Kauno apskrities gyventojų atsiminimus.

Pinigų gavo daugiau, paslaugų teikė mažiau

Vakar Kaune vykusioje konferencijoje mokesčių mokėtojai buvo informuoti apie tai, kaip valstybės institucijos dirbo praėjusiais metais.

Praėjusiais metais atsivyskupijo daugumos 14 mln. 694 tūkst. litų. Apie 3 mln. litų gavo iš...

Pirmadienį laidynėse mirusiai "Nuvalyk" dalininkei pagerbti 8 minutės tylos akimirką skiria visi šalies.

Šiandien mokslo metus pradeda ir Kauno miesto mokyklų moksleiviai. Tiesa, šiuolaikinis gyvenimo ir darbo ritmas...

naujos

Skaitykite

2

3

Tėviškės žinios

Nr. 104 (3788) 2007 m. birželio 7 d., ketvirtadienis Kaina 1 Lt

Policija gelbėjo mergaites

Nebijokite kompiuterio

Konkursas

Šiukšlių kalnai

Tvarka pagerės

Akcijos partneriai – Kauno miesto ir rajono savivaldybės

Akcijos organizatorė Aktorių gegužinė

Lwidas Nr. 7

5 psl.

2007 m. birželio 13 d.

Mūsų kraštas

TĖVYNĖS ŽINIOS

Mūsų laukia katastrofa?

Dažnas, atsikratęs buitinių atliekų, vaizduoja, kad jos tolesnis kelias baigtas. O juk garantuoja nedingsta niekur – net plastikinių butelių, net konservų skardinių. Kur dėsis visa ši šiukšlių kalnai, kuriuos jau dabar matome aplink miestus ir miestelius, kaimus ir sodybas? Ar neužkrės jie mūsų gyvenamosios aplinkos, ar neužnuodys gruntinio vandens? Ar neišsiskirs į orą pavojingos medžiagos? Ar neužteršime mes savo vaikams ir anūkams gimtosios žemės?

Šiuos klausimus Lietuvos gyventojai pradėjo sau kelti tik tada, kai jų kiemuose ir laukuose ėmė atsirasti milžiniški sąvartynai. Tačiau tai – tik viršūnė ledkalnio, kuris vadinasi atliekų problema. Ir ji mūsų laukia ateityje.

LAIMA RAZGAUSKIENĖ

Iš dešrų dirmo...

...apie tai, kaip mes šiukšlinamės ir kaip tai reikėtų keisti. Tačiau iš pat pirmo pasivaikščiojimo Kauno gyvenamuosiuose rajonuose aišku, kad šiukšlių problema – viena opiausių. Kiekvienas daugiabučio kiemas, kiekvienas miškelis, kiekvienas laukas – tai milžiniškas sąvartynas, kuriame kasdien atsiranda vis naujų ir naujų atliekų kalnų. Ir nors kiekvienas daugiabutis turi savo konteinerių aikštelę, kur galima išmesti šiukšles, tačiau dauguma gyventojų tuo nesinaudoja. Jiems lengviau išmesti atliekas pro langą ar palikti jas kur nors netoli namų.

Kodėl taip yra? Ar tikrai mes tokie nesąmoningi? Ar tikrai mums nerūpi, kokioje aplinkoje gyvename? Ar tikrai mes nesuvokiame, kad šiukšlės – tai ne tik bjaurus vaizdas, bet ir rimta grėsmė mūsų sveikatai?

Kaip tik apie tai kalbėjomės su Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Inga Vaičekauskiene.

– Pirmiausia, manau, reikia pradėti nuo švietimo. Mes turime gana gerą atliekų rūšiavimo sistemą, tačiau ji neveikia, nes gyventojai nežino, kaip ja naudotis. Pavyzdžiui, daugelis mano, kad stiklinių butelių ir stiklainių konteineriai skirti tik tam stiklui, kuris susidaro virtuvėje, o ne tam, kuris patenka į šiukšlių dėžę iš kitų kambarių. Arba kad plastikinių butelių konteineriai skirti tik plastikiniams gėrimų buteliams, o ne visiems plastikiniams indams. Tokių pavyzdžių galėčiau pateikti labai daug. Todėl pirmiausia reikia švietimo, informacijos, kaip teisingai rūšiuoti atliekas.

– Ar tikrai tai taip svarbu? Juk vis tiek viską sumaišo į vieną vietą sąvartyne...

– Taip, bet tai yra ne tas pats. Kai atliekos rūšiuojamos, jos yra tvarkingai sudedamos į atskirus konteinerius, o vėliau išvežamos į atskirus perdirbimo cechus. Tuomet iš jų gaminamos naujos medžiagos, naudojamos pakartotinai. Tuo tarpu atliekos, išmestos į bendrą konteinerį, sumaišomos su kitomis atliekomis, ir jau niekada nebebus galima jų atskirti. Tokios atliekos tiesiog išvežamos į sąvartyną ir ten palaidojamos.

– Tačiau kodėl gyventojų atliekas tiesiog nevežioja į sąvartyną? Juk tam ir sudaromos sutartys su atliekų vežėjais?

– Taip, tai yra viena iš problemų. Mes turime sudarę sutartis su atliekų vežėjais, kad jie vežtų atliekas iš konteinerių aikštelių. Tačiau kartais vežėjai tiesiog nevažiuoja pro tam tikrą aikštelę, nes ten per daug automobilių stovi ir jiems sunku manevruoti. Kartais vežėjai tiesiog nepastebi, kad aikštelė pilna, ir nevažiuoja pro ją kelis mėnesius. Tada gyventojai pradeda šiukšles mesti šalia konteinerių, ir susidaro tikras šiukšlynas. Tokiais atvejais mes turime kreiptis į vežėjus, kad jie atvažiuotų ir išvežtų atliekas.

– Ar tikrai gyventojai nežino, kad šiukšlės turi būti išvežamos? Ar tikrai jie nesupranta, kad šiukšlės kenkia aplinkai?

– Manau, kad ne visi tai supranta. Todėl ir sakau, kad pirmiausia reikia švietimo. Reikia, kad gyventojai žinotų, kaip teisingai rūšiuoti atliekas, kur jas išmesti, kad jos nebūtų sąvartyne. Tik tada galėsime tikėtis, kad situacija pagerės.

– Ar tikrai Kaune yra daug šiukšlių?

– Taip, Kaune yra daug šiukšlių. Kasmet Kaune susidaro apie 200 tūkstančių tonų atliekų, todėl svarbu, kad visi gyventojai rūšiuotų atliekas.

– Ar tikrai Kauno miesto sąvartynas yra pilnas?

– Taip, Kauno miesto sąvartynas yra pilnas. Todėl ir sakau, kad reikia švietimo, informacijos, kaip teisingai rūšiuoti atliekas.

– Ar tikrai Kaune yra daug konteinerių aikštelių?

– Taip, Kaune yra daug konteinerių aikštelių. Todėl ir sakau, kad reikia švietimo, informacijos, kaip teisingai rūšiuoti atliekas.

– Ar tikrai Kaune yra daug šiukšlių?

– Taip, Kaune yra daug šiukšlių

Lapės pasmerktos naujam sąvartynui

Prezidento Apšipiro mėnesiui jau esančio šiukšlyno vietoje neplaukiojant kapų sąvartynui įrengti negaunama leidimų.

Kiekvieną kartą užuodęs šią dvokų vietą, Šilutės rajone, „Lapės" kompostavimo aikštelėje dirbantis Algimantas Kaminskas pasijunta lyg Dievo apdovanotas.

Jis tikina, „Lapės" (kaimo vardu) aikštelę su kvapą žlugdančiu šiukšlynu paskelbus privalomu gyventojų atliekų vietą.

Pasirodžius, kad šiukšlę reikia rūšiuoti, šeimos ūkiai pradėjo atsisakyti nuo paslaugų. Šeša gi tvarka: kiti pastatys savo atliekų aikštelę, ir apšipiro gyventojai pasmerkti sąvartynui.

Dėl to, kodėl nuo gyventojų reikia tokio dalykėlio, nebuvo nė vieno prieštaraujančio.

Tačiau Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Jakubauskas tikino, kad dar nėra galutinai nuspręsta, kur bus įrengta atliekų aikštelė.

„Jokiame" yra keli kaimai, kuriuose tradiciškai gyventojai „šiukšlių neužsiima". Kodėl, nežinia, tačiau vietinių atsakymas vienodas.

„Jokiame" – yra žiedadarinė gyvenvietė, užkirsdama kelią tolesniam plėtimuisi, nenumatyta darbų, kaip per keliolika metų apšipiro šiukšlyno apsaugos zona.

Kaimo vyriausiasis seniūnas Petras Pocius pripažįsta, kad aikštelė Nida Europos Sąjungos Šengeno erdvėje pakenkė. Bendra šių gyventojo vardu sudaro ne tik 1,5 milijono litų. Dalis šios sumos atsiperkama iš Lietuvos biudžeto.

Už šias lėšas bus įrengta ir žaidimų aikštelė, tačiau kol sąvartynas neužkimšamas, nebus galima pradėti jokių statybų.

Vm, Vlnsa

Pabaigoje kvapą užnuodijęs šiukšlynas bus uždarytas ir rekultivuotas.

Šiukšlių aikštelės vaizdo sąvartynai

Po Šengeno erdvę – vėžlio žingsniu

Algirdas Jakubauskas: „Kartojau" valdomai tikiu, kad Šengeno erdvės privalumai jaučiami dvigubai už nuostolius pamatuoja.

Kristina Paškevičienė nuotr.

Gintautas Steponkus

Lietuvai įsijungus į Šengeno erdvę, keleiviams nebereikia galėti laiko valstybių pasienyje. Tačiau ne visos tarptautinių maršrutų kelyje esančios komandos planuoja sutrumpinti kelionių grafikus.

Petrovo-Kaliningrad kelyje

Nors pasienio viršininkai teigia, kad laukimo laikas pasienyje sutrumpės iki 5–10 minučių, vairuotojai tikisi, kad kelionės laikas sutrumpės bent valandą.

Šengeno viršininkai teigia, kad laukimo laikas pasienyje sutrumpės iki 5–10 minučių, vairuotojai tikisi, kad kelionės laikas sutrumpės bent valandą.

Uždaro kelių transporto įmonės direktorius Algirdas Jakubauskas tikino, kad dar nėra galutinai nuspręsta, kur bus įrengta atliekų aikštelė.

„Kartojau" valdomai tikiu, kad Šengeno erdvės privalumai jaučiami dvigubai už nuostolius pamatuoja.

Kristina Paškevičienė nuotr.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽINIOS

Kauno miesto savivaldai – 600 metų

Vytauto Didžiojo privilegijos Kauno miestui

Vytautas Didysis privilegijavo Kauno miestą

PRIEDAS

Nereikalingos aistros dėl aikštelės

Mokesčių nuolaidos įmonėms

8 EUROPOS DIENA

Kauno regione – naujos aikštelės atliekoms kompostuoti



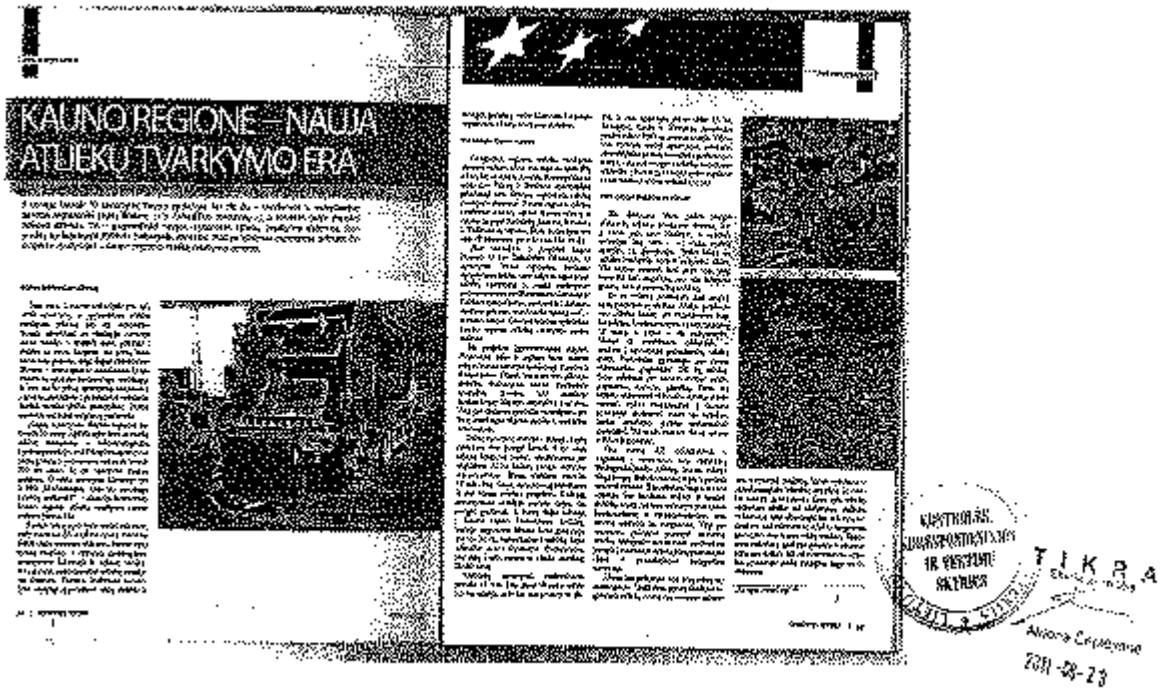

KAUNO REGIONE – NAUJA ATLIEKŲ TVARKYMO ERA

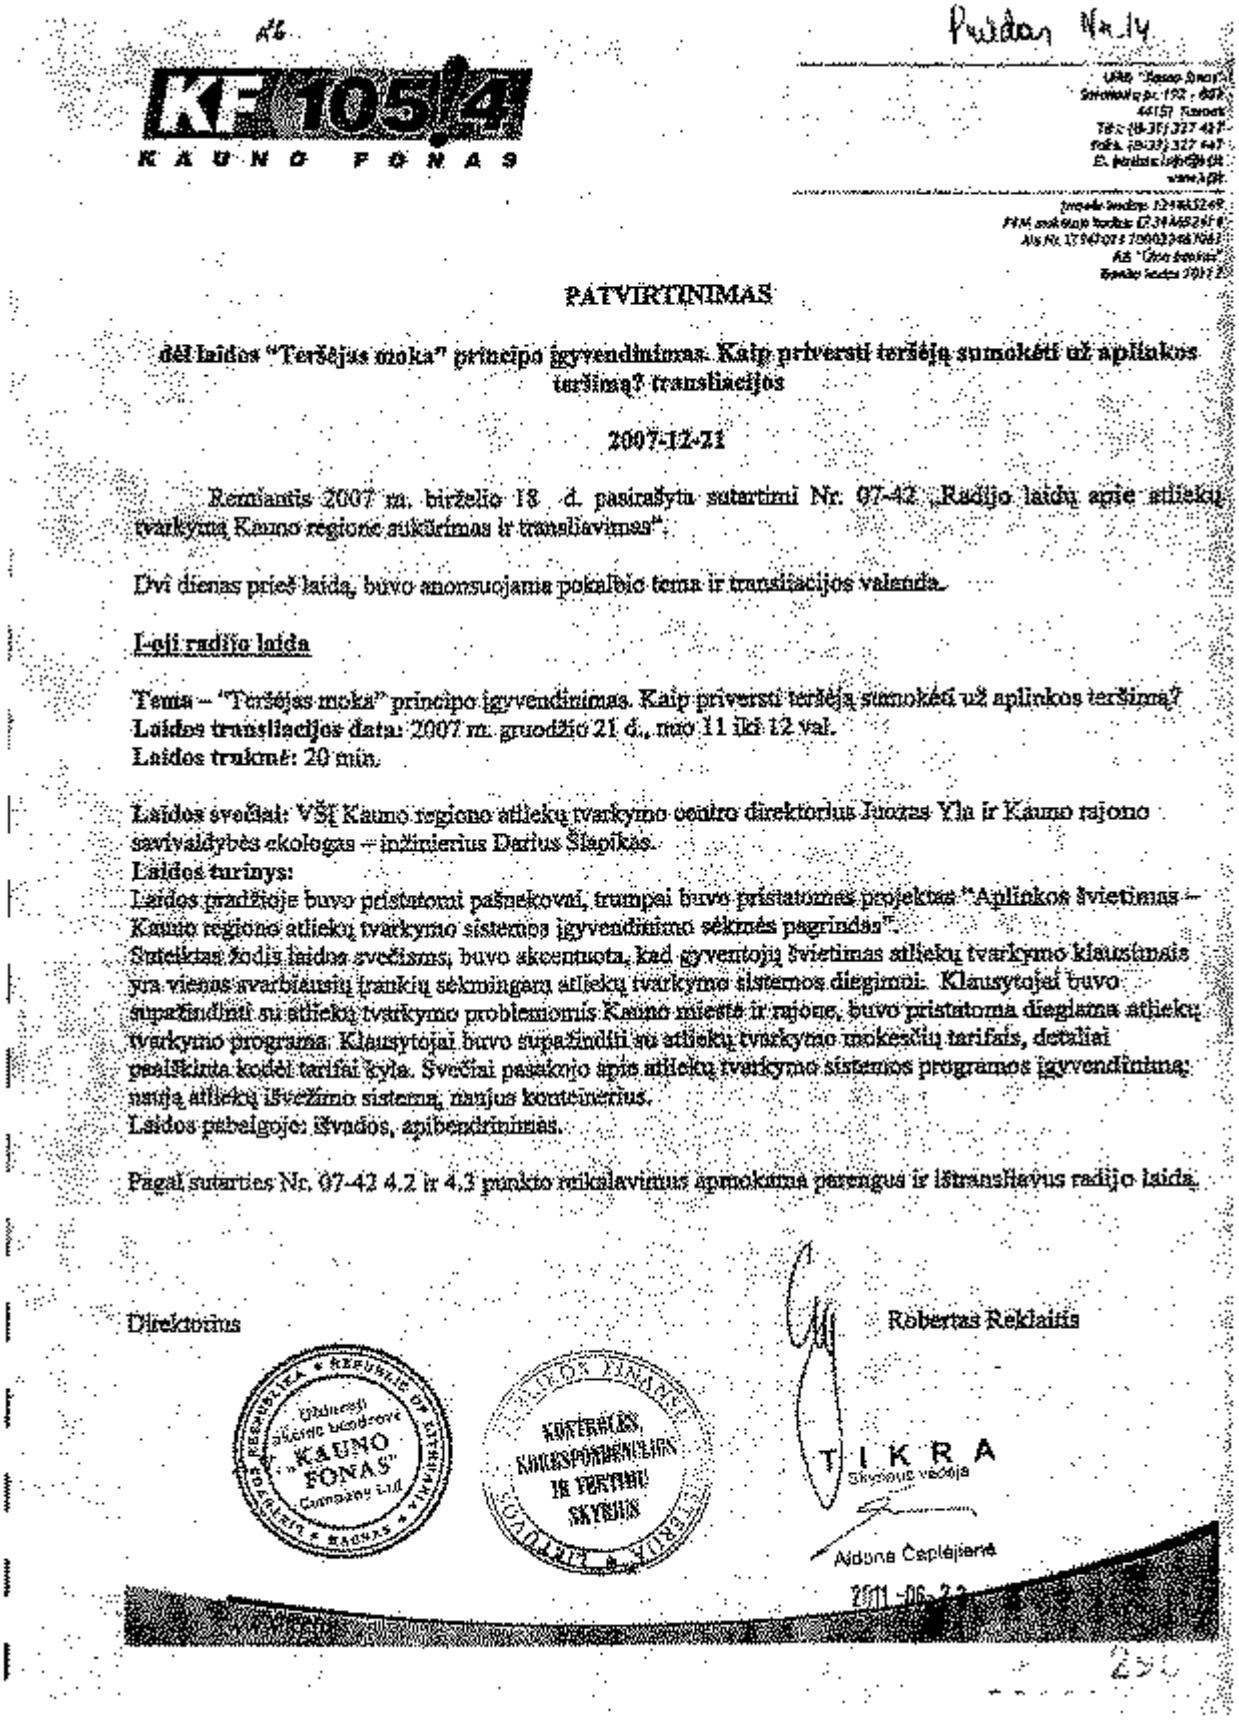

KF 105,4
KAUNO FONAS

Priedas Nr. 14

UAB "Kauno fonas"
Savanorių pr. 192, 4415[7] Kaunas
Tel.: (8-37) 327 427
faks. (8-37) 327 447
El. paštas info@kf104.lt
www.kf104.lt

Įmonės kodas 125483269
PVM mokėtojo kodas LT254865216
Ats.sk. LT947044060003483061
AB "Ūkio bankas"
Banko kodas 70440

PATVIRTINIMAS

dėl laidos "Teršėjas moka" principo įgyvendinimas. Kaip priversti teršėją sumokėti už aplinkos teršimą? transliacijos

2007-12-21

Remiantis 2007 m. birželio 18 d. pasirašyta sutartimi Nr. 07-42 „Radijo laidų apie atliekų tvarkymą Kauno regione sukūrimas ir transliavimas".

Dvi dienas prieš laidą, buvo anonsuojama pokalbio tema ir transliacijos valanda.

I-oji radijo laida

Tema – "Teršėjas moka" principo įgyvendinimas. Kaip priversti teršėją sumokėti už aplinkos teršimą?
Laidos transliacijos data: 2007 m. gruodžio 21 d., nuo 11 iki 12 val.
Laidos trukmė: 20 min.

Laidos svečiai: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Juozas Yla ir Kauno rajono savivaldybės ekologas – inžinierius Darius Šlapikas.
Laidos turinys:
Laidos pradžioje buvo pristatomi pašnekovai, trumpai buvo pristatomas projektas "Aplinkos švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas".
Suteiktas žodis laidos svečiams, buvo akcentuota, kad gyventojų švietimas atliekų tvarkymo klausimais yra vienas svarbiausių įrankių sėkmingam atliekų tvarkymo sistemos diegimui. Klausytojai buvo supažindinti su atliekų tvarkymo problemomis Kauno mieste ir rajone, buvo pristatoma diegiama atliekų tvarkymo programa. Klausytojai buvo supažindinti su atliekų tvarkymo mokesčių tarifais, detaliai paaiškinta kodėl tarifai kyla. Svečiai pasakojo apie atliekų tvarkymo sistemos programos įgyvendinimą; naują atliekų išvežimo sistemą, naujus konteinerius.
Laidos pabaigoje: išvados, apibendrinimas.

Pagal sutarties Nr. 07-42 4.2 ir 4.3 punkto reikalavimus apmokama perengus ir išransliavus radijo laidą.

Direktorius Robertas Reklaitis

KAUNO FONAS" Uždaroji akcinė bendrovė Company Ltd

KONTROLĖS, ATITIKTIES IR VERTINIMO SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Ceplėjienė
2011-06-22

Priedas Nr. 18

Rengiamas Kauno regiono atliekų tvarkymo planas

Atliekų tvarkymo plane numatyti atliekų tvarkymo uždaviniai, principai, tikslai, įgyvendinimo priemonės, užtikrinančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą ir prieinamumą, žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atskirų atliekų srautų tvarkymą.

Gyventojai, norintįs susipažinti su planu gali tai padaryti paspadę žemiau esančią nuorodą.

Kauno regiono atliekų tvarkymo planas. Projektas

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti el.paštu info@kaunoratc.lt, arba telefonu nr. 837 311 267

sanglaudos fondas

< atgal

TIKRA
Aldona Čepelienė
2011-06-23

Kauno diena

OMNI CONNECT OMNITEL

2007 m. birželio 07 d., ketvirtadienis Nr. 128 (18131)

Šiandien
Lietuva
Aktualijos
Reporterio užrašytoje
Įvairioji kronika
Sportas
Situacijos
Iš arčiau
Priedai
Argumentai
Tema straipsniui
Kviečiame pasiūlyti temą straipsniui. Redakcijai svarbi Jūsų nuomonė.
Siūlyti
Laikraščiui
Horoskopai
Orai
Šiandien +23 +26
Naktį +10 +15
Pasiūlyti
Vardadienį švenčia
Lukrecija, Lukrecijus, Rilda, Rytilas, Rataukas, Ratautė, Robertė, Robertas, Švaja, Švyturė, Švytėtas, Švytėtė

Nuo šiukšlių ginamasi tik švietimu

Saulius TVIRBUTAS

Komentuoti (1)
Komentuoti
Siųsti el. paštu
Spausdinti

Rūšiuojant buitines atliekas komunalininkams tenka pasikliauti gyventojų sąžine, nes kitokių poveikio priemonių kol kas nėra

Kaune daugelyje vietų jau stovi konteineriai stiklui, plastikui ir popieriui. Tačiau pakuočių iš gyventojų surenkama labai mažai, be to, daugelį jų reikia dar kartą perrinkti, nes į specialiuosius konteinerius metamos bet kokios šiukšlės.

Komunalininkai kol kas apeliuoja tik į gyventojų sąžinę ir bando šviesti gyventojus, nes skatinančios atliekų rūšiavimą sistemos dar nėra. Tuo tarpu Europos Sąjungos direktyvos kiekvienais metais griežtėja - jau dabar turime perdirbti daugiau kaip pusę produktų pakuočių.

Tenka perrinkti

"Ne pirmus metus perrinkinėju iš rūšiavimui skirtų konteinerių atvežtas šiukšles ir darbo nemažėja, nes žmonės visiškai nepaiso tvarkos", - sakė įmonės "Kauno švara" antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo aikštelės darbininkas Vytautas Stakvilevičius.

Kai kurie gyventojai į popieriui skirtą konteinerį meta sutčių pakuotes, nors jų vidinė pusė dengta plastiku.

Kaune rūšiavimui skirti konteineriai pastatyti vieni pirmųjų šalyje - dar 1993 metais. "Kauno švaros" duomenimis, per metus mieste surenkama iki 1,5 tūkst. tonų stiklo, 3 tūkst. tonų popieriaus, 600 tonų plastiko atliekų.

Įmonės generalinio direktoriaus patarėjo Zenono Vainoro teigimu, rūšiuojančių atliekas gyventojų pastaruoju metu daugėja. "Daugiabučių bendrijoms siūlome pasirašyti atskiras sutartis, kai mokėti reikia pagal išvežamų šiukšlių kiekį, o ne fiksuotą mokestį. Kuo daugiau atliekų išrūšiuojama, tuo ilgiau neprisipildomas buitinių atliekų konteineris. Išrūšiuotos atliekos išvežamos nemokamai", - aiškino Z.Vainoras. Tačiau jis pripažino, kad tokių bendrijų nedaug.

Daugiau perdirbimui tinkamų atliekų siekiama surinkti išvežant nereikalingus stambių gabaritų daiktus. "Kauno švara" nuo šio mėnesio reguliariai išveš prie konteinerių paliktus baldus, šaldytuvus, kitus stambius daiktus. Dėl padidėjusių gyventojų atliekų normų Kauno tarybos įmonė prašys [illegible] proc. padidinti gyventojams taikomą šiukšlių išvežimo mokestį.

Gelbsti pramoninkai

Šiais metais ES direktyvos įpareigoja surinkti 60 proc. plastiko,

ATITIKTIES ŽYMUO
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

Straipsnis

Page 2 of 2

popieriaus, stiklo, metalo ir medienos atliekų. Iš jų 55 proc. būtina perdirbti. Pakuočių surinkimu besiverčiančios bendrovės "Eko Group" direktorius Vidas Panka sakė, kad reikiamas pakuočių atliekų kiekis gaunamas iš prekybininkų ir gamybos įmonių. "Kol kas beveik nieko nesurenkame iš gyventojų", - teigė jis.

Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Juozas Yla sakė, kad kol kas teliteka gyventojus šviesti. "Vykdome projektą "Aplinkosauginis švietimas - Kauno regiono atliekų sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas", tačiau tai ilgas procesas, - nesėkmė jis. - Manau, reikėtų perimti Vakarų Europos patirtį. Ten, pavyzdžiui, popieriaus konteineryje radus stiklo ar metalo atliekas, kitą mėnesį komunalininkai gali bausti gyventojus iki trijų kartų padidindami mokestį, todėl žmonės patys kontroliuoja vieni kitus, - kalbėjo J.Yla. - Bet tam reikia specialių įstatymų".

Modernus sąvartynas - neligam

Iki 2009 metų Lapėse už 95 mln. litų planuojama įrengti naują sąvartyną. "Šalia senųjų kaupų naujajam sąvartynui bus skirti 8 ha. Ten bus paklota specialų gruntą sauganti danga, aptverta nauja tvora, įrengtas apšvietimas", - kalbėjo J.Yla.

Per dvejus metus Kauno apskrityje turės būti uždaryti 65 sąvartynai ir visos atliekos keliaus į Lapių ir Kėdainių rajone esantį Žaibeliškio sąvartynus.

Dabar per metus į Lapes atgabenama 200 tūkst. tonų šlukšlių. Prognozuojama, kad jų per artimiausius metus gali padaugėti iki 250 - 300 tūkst. tonų. "Jei veiktų efektyvi atliekų rūšiavimo sistema, patenkančių į sąvartyną šlukšlių kiekis būtų mažesnis, - sakė direktorius. - Gali būti, kad Vyriausybė pastatys atliekų deginimo įmonių, tada į šlukšlynus patektų tik 30 proc. atliekų, o Lapių sąvartynas galėtų veikti iki 20 metų."

↑ į viršų
< Atgal

Nemokami skelbimai	UAB statinys	Greita paskola internetu	Vasaros stovy
Nebrangi reklama naujoje nemokamų skelbimų svetainėje	Kvalifikuota telkinė pagelbės statant uždarąją aikštę benzinui - VAKO	350 Lt, 700 Lt, 1200 Lt į Jūsų sąskaitą per 15 min.	Vasaros stovyk įsijunkit! Lietu
nemokamiskelbimai.lt	www.vako.lt	www.credit24.lt	www.jsurfimas

© 2002-2007 "Kauno diena"

VALSTYBĖS KONTROLĖ
APYGARDOS APLINKOSAUGINIO AUDITO IR VERTINIMO SKYRIUS
KAUNAS

TIKRA
Aldona Čepėlienė

2011-06-23

Priedas Nr.20

Informacinis pranešimas

Įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinį projektą š.m. lapkričio mėnesio 13 dieną pasirašyta sutartis su UAB „Kamesta" dėl Zabieliškio regioninio sąvartyno privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statybos. Šių metų gruodžio 4 dieną įvyko įvadinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Aplinkos projektų valdymo agentūros, UAB „SWECO BKG LSPI" (vykdo statybos darbų priežiūrą), rangovo ir užsakovo atstovai. Šiame susirinkime aptarti techniniai ir organizaciniai klausimai. Ši data (2007-12-04) yra faktinė statybos darbų pradžia. Viso objekto statybos darbų trukmė 18 mėnesių.

Daugiau informacijos: J. Vin, Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius tel. 8-37 311267, el. paštas direktorius@kaunoratc.lt, internete http://www.kaunoratc.lt/ .

sanglaudos fondas

< atgal

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR PRETENZIJŲ SKYRIUS

TIKRA
Aldona Čepėlienė
2011-06-23

2010.11.26

http://www.kaunoratc.lt/print.html

BNS Spaudos centras : Pranešimai: Pranešimai spaudai

Priedas Nr. 21 Page 1 of

Spaudos centras
Teisė informuoti. Teisė būti informuotam.
2007 gruodžio 14 d., penktadienis

FIRSTWORTH
Sveiki atvykę į pasaulį, atveriantį naujas galimybes augančioms bendrovėms

Prisijungti • Pagalba

Zabieliškio regioninio sąvartyno statybos darbų pradžia

ieškoti...
pasirinkite jus dominančią sritį

fotobankas
Kita
Kultūra
Politika
Sportas
www.fotobankas.lt

Sritys: ES, Regionai
2007-12-14 15:38

Įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinį projektą 8.m. lapkričio mėnesio 13 dieną pasirašyta sutartis su UAB "Kamesta" dėl Zabieliškio regioninio sąvartyno privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir gruvimo atliekų perdirbimo aikštelių statybos. Šių metų gruodžio 4 dieną įvyko įvadinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Aplinkos projektų valdymo agentūros, UAB "SWECO ŠKG LSPI" (vykdo statybos darbų priežiūrą), rangovo ir užsakovo atstovai. Šiame susirinkime aptarti techniniai ir organizaciniai klausimai. Ši data (2007-12-04) yra faktinė statybos darbų pradžia. Viso objekto statybos darbų trukmė 18 mėnesių.

Daugiau informacijos: J. Yla, Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius tel. 8-37 311267, el. paštas direktorius@kaunoratc.lt, internete www.kaunoratc.lt .

Kontaktinis asmuo:
Jurgita Blažytė
Administratorė
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Tel.: (8-37)499735
info@kaunoratc.lt

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ JURGITA BLAŽYTĖ, VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

-- GRĮŽTI ↑ Į VIRŠŲ

"BNS Spaudos centre" skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

Apie "BNS Spaudos centrą" | Kontaktai | "BNS Spaudos centro" naudojimo sąlygos ir atsakomybė | Populiariausi

© 2005 UAB "BNS"

FINANSŲ KONTROLĖS, KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS AUDITO SKYRIUS
TIKRA
Alvina Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 22

Pasirašyta 110 KV elektros linijos iškėlimo sutartis

Įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinį projektą, 2007-12-17 Aplinkos projektų valdymo agentūra, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras su AB „Lietuvos energija" pasirašė sutartį „110 kV įtampos elektros oro linijos perkėlimo paslaugų pirkimas", vertė 4 224 172 Lt be PVM. Sutarties įvykdymo laikotarpis 8 mėnesiai.

sanglaudos fondas

≤ atgal

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VIDAUS REIKALŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Alvina Čepėjienė
2011-08-23

Puslapis Nr. 23

Pasirašyta atliekų priėmimo aikštelių statybos sutartis

Įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinį projektą, 2007-12-27 Aplinkos projektų valdymo agentūra, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras su UAB „Raseinių melioracija" ir UAB „Langina jungtinės veiklos pagrindu pasirašė rangos sutartį Nr. A/2007/K38 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: atliekų priėmimo aikštelių statyba", vertė 11 469 768 Lt be PVM. Sutarties įgyvendinimo laikotarpis 9 mėnesiai.

sanglaudos fondas

Satgal

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR PERSONALO SKYRIUS

TIKRA
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 27

Pasirašyta Lapių regioninio sąvartyno statybos sutartis

Įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinį projektą, 2007-12-27 Aplinkos projektų valdymo agentūra, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras su UAB „Sienojus" ir AUB „Laugina" jungtinės veiklos sutarties pagrindu pasirašė rangos sutartį Nr. A/2007/K/37 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba", vertė 35 246 495 Lt be PVM. Sutarties įgyvendinimo laikotarpis 22 mėnesiai.

sanglaudos fondas [redacted]

Į atgal

TIKRA
Aldona Čepliejienė
2011-06-23

2010.11.26

Priedas Nr. 25-1

Naujienos, skelbimai

2008-09-19 11:32:14 Savartynų uždarymas

Š.m. rugsėjo 18 d. pasirašyta rangos sutartis su UAB "Luidas" dėl savartynų uždarymo Kauno rajone. Sutarties kaina 19,4 mln. (be PVM). Darbų trukmė 15 mėn. plačiau...

2008-09-11 14:50:00 Naujo lauko eksploatavimas

Lapių savartyne nuo 2008 m. rugsėjo 11 dienos atliekas pradėta pilti į naujai įrengtą sekciją. plačiau...

2008-08-22 13:58:02 Civilinės saugos pratybos

2008 m. rugpjūčio 21 dieną UAB „Kauno švara" Lapių savartyne vyko civilinės saugos pratybos savartyno darbuotojams. plačiau...

2008-05-28 15:45:43 Aplinkosauginio švietimo projektas

Gegužės mėnesį baigiamas vykdyti pusantrų metų trukęs projektas "Aplinkosauginis švietimas - Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas" plačiau...

2008-04-15 13:21:34 Projekto pristatymo baigiamasis renginys

Kauno regione nuo 2007 metų sausio mėnesio vykdomas projektas „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas". Vykdant šį projektą buvo organizuoti susitikimai savivaldybių seniūnijose, mokyklose, fotonuotraukų ir piešinių konkursas ir paroda, išleisti lankstinukai bei plakatai. Siekiant aptarti aplinkosauginio švietimo tikslus bei šio projekto rezultatus, organizuojamas šio projekto pristatymo baigiamasis renginys. Kviečiame Kauno regiono savivaldybių specialistus, dirbančius aplinkosaugos srityje, žurnalistus į projekto „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas" baigiamąjį renginį, kuris vyks š.m. balandžio 25 dieną Kauno miesto savivaldybės Kolegijų salėje. Renginio pradžia 10 val. plačiau...

2008-03-27 08:49:56 Darželinukų švietimas

Darželinukai mokosi rūšiuoti atliekas. Kauno m. lopšelis-darželis „Pasaka" įgyvendina projektą „Aš noriu švarios Lietuvėlės" plačiau...

2008-02-28 16:30:59 Atliekų priėmimo aikštelių statyba

Atliekų priėmimo aikštelės statyba Kauno mieste Raudondvario pl. plačiau...

2008-02-13 13:05:05 Jaunimo darbų paroda

Geriausių jaunimo piešinių ir fotonuotraukų konkurso darbų paroda keliauja per Kauno regiono mokyklas ir savivaldybes. plačiau...

2007 2008 2009 2010

http://www.kauporatc.lt/print.html 2010.11.29

Priedas Nr. 15-2

Atliekų priėmimo aikštelių statyba

Atliekų priėmimo aikštelės statyba Kauno mieste Raudondvario pl.

Išsamesnė informacija apie aikšteles ir dokumentų rengimą aikštelės Kauno mieste Raudondvario pl. statybai pateikiama pristatyme. Parsisiųsti

< atgal

http://www.kaunorate.lt/print.html

2010.11.29

Priedas Nr. 25-(3,4,5)

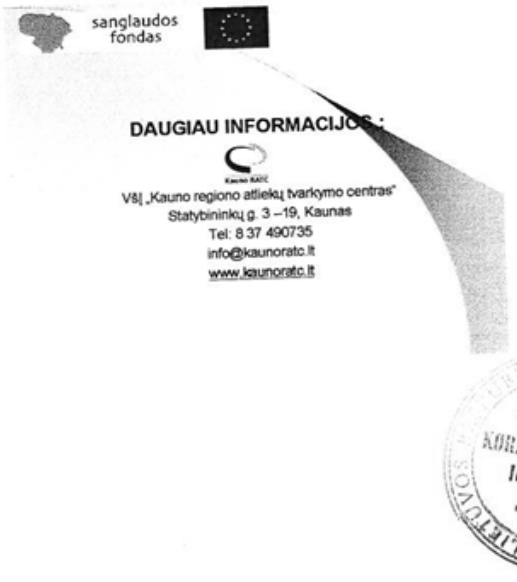

fondas
INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELES
Gintaras Motiejaitis
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas

Priedas Nr. 25-(7,8,9)

sanglaudos fondas
Atliekų priėmimo aikštelės Danijoje

sanglaudos fondas
Atliekų priėmimo aikštelės Lietuvoje

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

..aunas

Priedas Nr. 26 Page 1 of

Trukdoma įsisavinti Europos Sąjungos lėšas Versija spausdinimui
2008-07-16
Pagal Atliekų tvarkymo strateginį planą, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, Kauno mieste turi būti 7 stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės, t. y. 50 tūkst. gyventojų turi būti įrengta 1 aikštelė, kurią pasiekti gyventojams būtų patogu - ji turi būti ne tollau kaip už 5 km. Šiuo metu aikštelės veikia Ašigalio ir Julijanavos gatvėse. Įrengus aikšteles Nemajūnų gatvėje ir Raudondvario plente, dar reikės trijų aikštelių. Joms vietų dar teks ieškoti Šilainiuose ir Šančiuose.

Aikštelės bus įrengtos pagal Europos Sąjungos reikalavimus, jose bus ir vandentiekis, ir kanalizacija, buitinės atliekos bus talpinamos konteineriuose, jos neterš aplinkos, nebjauros vaizdo. Projektui įgyvendinti 75 proc. lėšų skirs Europos Sąjunga, 20 proc. - Vyriausybė ir 5 proc. - savivaldybė. Iš viso reikės 1 mln. 28 tūkst. Lt.

Šiuo metu projekto įgyvendinimas stringa dėl Kauno apskrities viršininko administracijos nuomonės pasikeitimo, dėl galimų žemės grąžinimo teisėtiems savininkams procedūrų. Šiuo atveju ginamas žemės savininkų interesas.

2005 m. kovo 3 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-108 „Dėl pritarimo stambiųjų atliekų surinkimo aikštelių įrengimui prie Nemajūnų ir Brastos gatvių ir šių aikštelių detaliųjų planų rengimo organizavimo.
Tais pačiais metais, kai miesto Tarybai buvo teikiamas sprendimas dėl antrinių žaliavų surinkimo aikštelės Raudondvario plente 107B įrengimo, buvo teigiama, kad vieta visais aspektais yra tinkama, nes aikštelė bus įsteigta būsimo Kėdainių tilto prietilčio zonoje. Miesto Taryba priėmė sprendimą aikštelę steigti būtent čia. Už tokį sprendimą balsavo ir tuo metu Tarybos nare buvusi šiandien Kauno apskrities viršininko pavaduotoja Adelė Majauskienė.

Pa[illegible]šant finansavimo memorandumą su Europos komisija, buvo pridėtas miesto Tarybos sprendimas, kuriame nurodyta, kur ir kaip bus pa[illegible]dotos Sanglaudos fondo lėšos. Parenkant šią vietą, buvo atliktos visos procedūros, kurias būtina atlikti įgyvendinant projektą. 2005 m. birželio 6 d. buvo gautas Kauno apskrities viršininko sutikimas Nr. 24-362 rengti detaliųjį planą. Sutikimą pasirašė Viršininko pavaduotojas Valdemaras Šerkšnys. Už Paramos fondo lėšas praėjusiais metais buvo atliktas ir detalusis planas. 2006 m. birželio 30 d. įvyko detaliojo plano viešas svarstymas su visuomene. Dėl projekto įgyvendinimo nebuvo iškilę jokių problemų ar abejotinų veiksmų, kurie netikėtai atsirado paskutiniame etape.

Ar Vilijampolės gyventojai turės stambiųjų atliekų surinkimo aikštelę, priklausys nuo politikų valios rūpintis daugumos žmonių gerove ar pasirodymu artėjančiuose rinkimuose į Seimą.

Tarybos sekretoriato informacija

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

ttp://www.kaunas.lt/190?sid=3313 2008.07.22

Priedas Nr. 27

Naujo lauko eksploatavimas

"Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Lapių regioninio sąvartyno statyba" rangos sutartis Nr. A/2007/K/37

sanglaucos fondas

Kauno apskrities viršininko administracijos paskirta komisija 2008 m. rugsėjo 11 dienos aktu Lapių sąvartyno III kaupimo lauko sekciją 3B pripažino tinkama naudoti. Ir nuo šios dienos atliekos pilamos į naujai įrengtą sekciją.

< atgal

LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23
305

Priedas Nr. 28

Sąvartynų uždarymas

Įgyvendinant investicinį projektą "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", š.m. rugsėjo 18 d. pasirašyta rangos sutartis su UAB "Luidas" dėl sąvartynų uždarymo Kauno rajone. Sutarties kaina 19,4 mln. (be PVM). Darbų trukmė 15 mėn.

sanglaucos fondas

< atgal

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 29

Kauno diena

Miesto naujienos

2008-11-26, 17:12 *Ingrida Žirlienė*

Slidinėjimo trasų sąvartyne teks palaukti

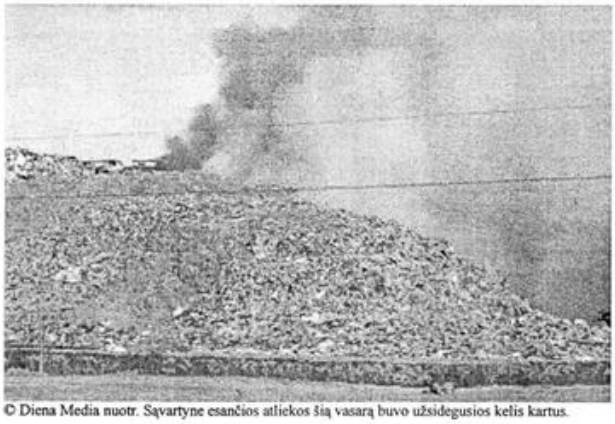

© Diena Media nuotr. Sąvartyne esančios atliekos šią vasarą buvo užsidegusios kelis kartus.

Lapių miestelio ir apylinkėse esančių sodų bendrijų gyventojai jau kuris laikas pusiau juokais kalba apie slidinėjimo trasas, kurias esą rengiamasi įrengti Lapių sąvartyno teritorijoje.

Juokas juokais, tačiau kažkada Kaune besilankiusių danų delegacijos pasiūlyta idėja, atrodo, gali virsti realybe. Kaip portalui pasakojo Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Juozas Yla, jau pavasarį Lapių sąvartyną juosiantis 12 hektarų laukas bus nusėtas žole. Iki šiol čia 30 metų buvo vežamos kauniečių buitinės atliekos.

Šių metų pradžioje pradėtas įgyventi Lapių regioninio sąvartyno projektas jau įpusėjo. Jam įgyvendinti skirta daugiau kaip 35 mln. litų: ES parama sudaro 75 procentus šios sumos, kita dalis skirta iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Projektą numatyta užbaigti iki kitų metų gruodžio mėnesio.

„Bus sutvarkytas taip vadinamas pirmasis sąvartyno laukas, užimantis apie 12 hektarų teritoriją. Visą vasarą ir rudenį čia buvo pilamas keturių sluoksnių „užklotas": iš pradžių smėlis, molis, paskui dirvožemis ir juodžemis. Iš viso storis siekia 1,5 metro. Pavasarį šį lauką užsėsim žole", - aiškino J.Yla.

Dar 8 hektaruose - tarp pirmo ir antro lauko - bus įrengti atliekų kaupimo laukai. Taip pat sąvartyne bus nutiesti keliai, visa teritorija aptverta tvora. Viso Lapių sąvartyno plotas siekia 37 hektarus, kitąmet plotas, kuriame bus pilamos šiukšlės, sumažės iki 26 hektarų.

„Įgyvendinus projektą sąvartynas nebeterš gruntinių vandenų. Bus įrengtos apsauginės plėvelės, kad nešvarus vanduo nesisunktų į gruntą, o surinktas filtratas bus išvežamas į valymo įrenginius. Ateityje planuojama pačiame sąvartyne pastatyti valymo įrenginius. Tai kainuotų apie 3 mln. litų", - pasakojo J.Yla.

Pasak jo, idėjos apie slidinėjimo trasas Lapių sąvartyne sklando bene 15 metų. „Tuose 12 hektarų bus galima drąsiai ir slidinėti, ir su rodutėmis važinėti. Tereikia šiek tiek luktelėti, kol viską sutvarkysim ir užsėsim žolyte, o kitą žiemą, žiūrėk, gal kas įsidrąsinęs su slidėmis ir nučiuoš", - šypsodamasis tikino J.Yla.

Manote, kad straipsnyje yra netikslumų?
Susisiekite su www.kaunodiena.lt redakcija

- Skaityti komentarus
- Rašyti komentarą

nepolitikas

2008 11 27 09:25

rukui,
kiek žinau domeikavoje yra katilinė naudojanti lapiu sąvartyno dujas,
projektas finansuotas norvegų

Informuoti apie netinkamą komentarą

rukas

VALSTYBĖS KONTROLĖS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO IR VERTINIMO SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKA

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23

Lietuvos Žinios

Priedas Nr. 30-1

LIETUVOS ŽINIOS
TAI, KAS RŪPI LIETUVAI

Šiukšlės palaidos net sąvartynus

Kristina KUČINSKAITĖ

Šalies sąvartynų vadovai sunerimę - atliekoms kaupti skirti plotai užsipildo triskart greičiau, nei buvo numatyta. Dėl to, dar nebaigus įrengti visų regioninių sąvartynų, jau tenka galvoti apie jų uždarymą. Kur tada kauptume atliekas?

Vartotojų visuomenė turi vieną esminį bruožą: kuo daugiau ji vartoja, tuo sparčiau gausėja atliekų. To pasekmės - gresiantis masinis šiukšlinimas.

Vietos mažėja

Kauno regioninis atliekų tvarkymo centras, prižiūrintis Lapių sąvartyną, šiuo metu rūpinasi vieno iš šiukšlių kaupimo laukų įrengimu. Iš viso pagrindiniame Kauno apskrities sąvartyne yra trys tokie laukai. Vienas jau uždarytas, antras baigiamas užversti atliekomis, trečias tik rengiamas naudoti.

Už Europos Sąjungos (ES), Lietuvos Vyriausybės ir banko paskolos lėšas trečiąjį Lapių sąvartyno atliekų lauką įrengia UAB "Senojus". Iš viso jo paruošimo eksploatacijai darbai kainuos 45 mln. litų.

Anot Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro direktoriaus Juozo Ylos, planuota, kad išplėstas sąvartynas visuomenei tarnaus iki 2025 metų. Vėliau atliekas ketinama vežti į sąvartyną, kuriamą prie Kėdainių. Kauno apskritis - bene vienintelė Lietuvoje, kurioje bus įrengtas ne vienas, o du regioniniai sąvartynai.

"Tačiau jau dabar matome, kad Lapėse šiukšles kaupti galėsime kur kas trumpiau nei numatyta", - pabrėžė J.Yla. Centro direktoriaus teigimu, jei kauniečiai toliau šiukšlins taip, kaip iki šiol, visi trys pagrindinio Kauno apskrities sąvartyno laukai bus užpildyti iki 2015 metų. "Sparčiai daugėja polietileninių atliekų. Kartu su kitomis šiukšlėmis išmetamas įspūdingas pakuočių, kurias būtų galima perdirbti, kiekis", - tvirtino J.Yla.

Pasak centro direktoriaus, visuomenė turėtų pradėti kur kas aktyviau rūšiuoti atliekas, o šalies valdžia - riboti besaikį prekių pakavimą. Panaši padėtis susiklostė ir kituose Lietuvos regioniniuose sąvartynuose. Jų vadovai sutartinai LŽ tvirtino, kad gyventojai į konteinerius išmeta neįtikimą kiekį atliekų. Maždaug trečdalis jų gali būti perdirbama.

Įstatyme paliktos spragos

Lietuvos pakuotojų asociacijos prezidentas Faustas Keršys LŽ patvirtino, kad pakuočių atliekų sparčiai daugėja. "Nors nesame institucija, kuri daro įtaką pakuočių gamintojų sprendimams, ką ir kaip pakuoti, asociacijoje apie šią problemą kalbame", - sakė jis. Anot F.Keršio, su gamintojais šnekėta apie aiškaus pakuočių ženklinimo, padėsiančio atskirti, iš kokios medžiagos jos pagamintos, įvedimą.

"Žmonės kartais nežino, kokia medžiagos sudėtis, todėl meta pakuotę į buitinių atliekų konteinerį. Rūšiuoti nenorima ir dėl nepatogių sąlygų - konteineriai yra toli nuo laiptinės, atliekas reikia nešti atskiruose krepšeliuose", - kalbėjo asociacijos prezidentas.

Jo tvirtinimu, gamintojai mąsto ir apie ekologiškų pakuočių gamybą.

Į kiekvienos prekės ar produkto kainą yra įskaičiuotas pakuotės tvarkymo mokestis. Jį gamintojai moka juos vienijančiai organizacijai, perduodančiai lėšas atliekų tvarkytojams. Tačiau kol kas tai daro ne visi gamintojai, nes įstatyme palikta spragų ir galimybė jį apeiti.

"Dėl pakuočių patekimo į sąvartynus būta daug diskusijų. Ūkio ir Aplinkos ministerijos padėtį žino. Atliekų gausėjimas yra globali problema, kuri reikalauja atsakingo sprendimo", - įsitikinęs F.Keršys.

Anot jo, gaminio pakuotė dažnai yra brangesnė už patį gaminį. Tačiau gamintojai nenoriai atsisako galimybės pakuoti savo produkciją, lig šiol išorinis blizgesys yra svarbesnis nei ekologija. "Pirkėjai neretai įsigyja daiktų ne dėl to, kad jų reikia, o todėl, kad jie patraukliai atrodo. Tai lemia gamintojų sprendimus produktą įdėti į kuo gražesnę, išvaizdesnę pakuotę", - sakė F.Keršys.

ES valstybės, susirūpinusios nevaldomu vartojimu, ėmėsi priemonių bent iš dalies stabdyti masinę pakuočių gamybą. Pirmiausia įvestas didžiausias galimas pakuotės svoris. Tai užkerta kelią gamintojams

FINANSŲ MINISTERIJOS IR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR VIRTIMŲ SKYRIUS
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė

Priedas Nr. 30-2

naudoti ne vieną, o kelias pakuotes iš karto. Pavyzdžiui, mobilusis telefonas įdedamas į polietileno maišelį ir į putplasčio pripildytą kartoninę dėžutę.

"Kaip žmogus, žinoma, norėčiau, kad atliekų į sąvartynus patektų kuo mažiau. Bet šis noras turi būti vykdomas įstatymais", - pažymėjo F.Keršys.

Turi pasiūlymų

Aplinkos ministerija teisę organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą yra suteikusi organizacijai "Žaliasis taškas". Ji iš savo narių - pakuočių gamintojų ir importuotojų - gauna mokesčius ir juos skiria atliekoms tvarkyti - perdirbamoms šiukšlėms surinkti iš specializuotų konteinerių bei pristatyti į perdirbimo įmones.

"Visi produktai supakuoti. Todėl pakuočių atliekų kiekis iš tiesų didelis", - sakė organizacijos "Žaliasis taškas" vadovas Arūnas Makauskas. Jo tvirtinimu, pernai į Lietuvos rinką pateko trečdalis milijono tonų pakuočių. Valstybė yra nustačiusi, kokį kiekį pakuočių gamintojai ir importuotojai turi nuvežti perdirbti. Už tai pastarieji sumoka patys iš lėšų, gautų į produkto kainą įskaičiavus pakuotės tvarkymo mokestį. Iš perdirbimo įmonių gamintojai ir importuotojai gauna pažymėjimus, patvirtinančius, kada ir koks kiekis pakuočių buvo pristatytas. Tie, kurie neįvykdo įstatymų nustatytų normatyvų, moka baudas.

A.Makauskas išskyrė kelis tokios situacijos aspektus. Pirma, gamintojai ir importuotojai nenoriai vykdo pakuočių tvarkymo įstatymą, nes tai nuostolinga. Atliekų surinkėjai taip pat linkę kalbėti apie šią šalutinę veiklą kaip nepelningą - esą iš mokesčių surinktų lėšų nepakanka darbams atlikti.

Pakuočių gamintojai ir importuotojai turi teisę spręsti, kaip jie mokės pakuotės tvarkymo mokestį - įsitraukę į analogišką veiklą vykdančias įmones vienijančią organizaciją ar veikdami savarankiškai. Tai suteikia galimybę mokėti ne visą nustatytą mokestį. "Žaliasis taškas" iš 10 tūkst. verslo objektų, turinčių mokėti pakuotės surinkimo mokesčius, vienija tik 650.

"Mūsų organizacijos narių nuomone, tam, kad pakuotės būtų tvarkomos iš tikrųjų, visiems gamintojams ir importuotojams būtina kooperuoti lėšas per vieną ar kelias organizacijas", - sakė A.Makauskas.

"Žaliojo taško" vadovo teigimu, būtina tobulinti perdirbamų atliekų surinkimo sistemą taip, kad ji taptų pelninga verslo šaka, nes šiuo metu verslininkai jos nenori plėtoti dėl patiriamų nuostolių.

"Niekada nepriversi verslininko imtis nepelningos veiklos. Komunalinių atliekų surinkimo įmonės uždirba iš mišrių atliekų, o į išrūšiuotąsias žiūri kaip pamotė į podukrą", - aiškino A.Makauskas.

Anot jo, apie 30-40 proc. atliekų sudaro pakuotės. Jau kalbama apie tai, kad gyventojai, įsigydami prekes ar produktus, kurių pakuotes galima perdirbti, prekybos vietoje mokėtų užstatą, kurį atgautų grąžinę pakuotę. A.Makausko teigimu, tai būtų itin brangi sistema, nes prekybos centruose reikėtų specialių konteinerių, kasos aparatų, darbuotojų. Be to, dalis gyventojų, tingėdami vykti iki prekybos vietos, perdirbamas atliekas toliau mestų į bendrus konteinerius.

"Aplinkos ministerijai esame parengę siūlymus dėl įstatymų keitimo. Tikimės, kad į juos bus atsižvelgta", - sakė "Žaliojo taško" vadovas.

Reikia skubių sprendimų

Nuo šių metų vidurio Lietuvoje turėtų būti naudojami mažieji sąvartynai. Dabar jų yra apie 300. Kiekviename regione planuojama įrengti po vieną sąvartyną, priimsiantį atliekas iš visos apskrities.

"Numatyta, kad sąvartynai bus eksploatuojami 20-25 metus", - aiškino Aplinkos ministerijos Atliekų tvarkymo paslaugų skyriaus vedėja Raminta Radavičienė. Pasak jos, atliekų perdirbimas vyksta vangiai. Apskaičiuota, kad antrą kartą panaudojama tik 15 proc. tam tinkamų atliekų. R.Radavičienės nuomone, Aplinkos ministerija skatina gyventojus rūšiuoti atliekas. Iš viso už valstybės lėšas įsigyta ir savivaldybėms išdalyta 18 600 specialių konteinerių. Vienas komplektas konteinerių turėtų tekti 400 gyventojų.

"Ne visada iš gamintojų ir importuotojų renkamos lėšos pasiekia tikslą. Rūšiavimo problema aktuali. Jeigu jos artimiausiu metu neišspręsime, sąvartynai bus perpildyti jau 2015-aisiais", - pabrėžė R.Radavičienė.

© Visos teisės priklauso UAB "Lietuvos žinios"

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 31-1

Naujienos, skelbimai

2009-12-24 15:56:00 Lapių regioninio sąvartyno pridavimas

2009 m. gruodžio 24 dieną Valstybinė komisija pripažino tinkamu naudoti naujai rekonstruotą Lapių regioninį sąvartyną, esantį Kauno raj. Lapių sen.. Sąvartynas, rekonstruotas, laikantis ES ir Lietuvos sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimų. plačiau...

2009-10-08 09:59:20 Pasirašyta sutartis

Pasirašyta Raseinių, Kaišiadorių ir Jonavos komunalinių atliekų perkrovimo stočių ir APA eksploatavimo ir komunalinių atliekų pervežimo į regioninius sąvartynus paslaugų teikimo sutartis plačiau...

2009-10-08 09:43:00 Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis

Pasirašyta Zabieliškio sąvartyno, kompostavimo ir statybos ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelių eksploatacijos sutartis plačiau...

2009-08-25 09:24:15 APA Kaune

Įgyvendinant Sanglaudos fondo investicinį projektą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, šių metų liepos 20 d. Kaune adresu Nemajūnų g. 15B pradėjo veikti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojama atliekų priėmimo aikštelė, į kurią gyventojai nemokamai gali pristatyti stambias, specifines ir pavojingas atliekas, susidarančias buityje. Kauno miesto gyventojams liepos mėnesį buvo išplatinti lankstinukai su informacija apie Kaune veikiančias atliekų priėmimo aikšteles. plačiau...

2009-08-18 16:44:18 Zabieliškio sąvartyno pridavimas

Š.m. rugpjūčio 14 dieną regioniniame Zabieliškio sąvartyne, esančiame Kėdainių rajone Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija leido eksploatuoti naują 2,57 ha sekciją. Nuo šios dienos atliekos pilamos į naujai įrengtą, sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimus atitinkančią sekciją. plačiau...

2009-08-17 11:11:15 APA Kėdainiuose

Įgyvendinant Sanglaudos fondo investicinį projektą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, šių metų liepos 16 d. Kėdainiuose adresu J. Basanavičiaus g. 97A pradėjo veikti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojama atliekų priėmimo aikštelė, į kurią gyventojai nemokamai gali pristatyti stambias, specifines ir pavojingas atliekas, susidarančias buityje. plačiau...

2009-04-20 12:40:27 "Darom 2009"

Balandžio 18 dieną vykusioje švarinimosi akcijoje "Darom'09" aktyviai dalyvavo ir Kauno RATC kolektyvas. Akcijos dalyvių nuoširdus darbas neliko nepastebėtas. Aplinkinių namų gyventojai noriai prisijungė prie akcijos. plačiau...

2007 2008 2009 2010 2011

Priedas Nr. 31-2

APA Kėdainiuose

Įgyvendinant Sanglaudos fondo investicinį projektą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, šių metų liepos 16 d. Kėdainiuose adresu J. Basanavičiaus g. 97A pradėjo veikti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojama atliekų priėmimo aikštelė, į kurią gyventojai nemokamai gali pristatyti stambius, specifinės ir pavojingas atliekas, susidarančias buityje.

Pirmąjį aikštelės veikimo mėnesį į aikštelę atvežta apie 6,7 tonų atliekų bei antrinių žaliavų. Iš kurių:

200 kg medienos

3000 kg statybinių atliekų akmens pagrindu

200 kg nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos

2700 kg didžiųjų atliekų (sofos, kt. baldai)

100 kg stiklo

45 kg kitų antrinių žaliavų

45 vnt. padangų

15 vnt. pavojingomis atliekomis užterštų pakuočių

Į Kėdainių atliekų priėmimo aikštelę gyventojai gali atvežti:

Medieną:

Senus baldus, įvairius medinius daiktus ir kitas medines atliekas.

Stiklą:

Skaidrų ir spalvotą, įvairią stiklo tarą, stiklo duženas ir atliekas.

Popierių:

Laikraščius, žurnalus ir kitus spaudinius, pakuotes, kartoną, atraižas.

Plastmasę:

Plėveles, indus, žaislus, vamzdžius, įvairią tarą bei plastikines pakuotes.

Metalą:

Metalinius namų ūkio daiktus, įrankius, įrenginius ir jų dalis.

Buitinius prietaisus ir įrenginius:

Šaldytuvus, televizorius, viryklės, žaislus, elektros prietaisus ir kitus įrenginius.

Padangas:

Lengvųjų automobilių, dviračių bei kitų transporto priemonių, ne daugiau nei 5 vnt.

Pavojingas buitines atliekas:

Liuminescencines lempas, akumuliatorius ir galvaninius elementus, senus tepalus, transporto priemonių ore ir tepalo filtrus bei kitas pavojingas buityje susidarančias atliekas.

Buityje susidarančias statybines atliekas

Betoną, plytas, izoliacines medžiagas, mišrias statybines ir griovimo atliekas.

Rūšiuodami atliekas nutaupysime Lietuvos gamtinius ir energijos išteklius, pratęsime sąvartyno eksploatacijos laiką, sumažinsime atliekų tvarkymo kaštus.

Atliekų priėmimo aikštelė dirba nuo antradienio iki penktadienio nuo 10 iki 19 valandos (pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.), šeštadienį - nuo 9 iki 16 val. Sekmadienį ir pirmadienį poilsio dienos. Esame pasirengę Jums suteikti kokybišką paslaugą. Telefonai pasiteiravimui 8 37 311 267, mob. 8682 55 780.

< atgal

VALSTYBĖS FINANSINĖS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-21
2011-06-22
2011-06-22

Priedas Nr. 32

Zabieliškio sąvartyno pridavimas

Šių metų rugpjūčio 14 dieną regioniniame Zabieliškio sąvartyne, esančiame Kėdainių rajone Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija leido eksploatuoti naują 2,57 ha sekciją. Nuo šios dienos atliekos pilamos į naująjį įrenginį, sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimus atitinkančią sekciją.

Įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinį projektą su UAB „Kamesta" buvo pasirašyta rangos sutartis Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba. Bendra darbų, kurie buvo pradėti vykdyti 2007-12-04 dieną, vertė 17,4 mln. Lt, projektas finansuojamas ES ir Valstybės fondo lėšomis.

Zabieliškio sąvartynas pradėtas eksploatuoti 2003 m. Iki projekto įgyvendinimo pradžios Zabieliškio sąvartyne atliekos buvo pilamos pirmoje kaupimo lauko sekcijoje (2,12 ha). Įgyvendinant investicinį projektą I-ajame etape, įrengta antra atliekų kaupimo sekcija, sudaryta iš dviejų dalių, kurių bendras užimamas plotas 2,57 ha. Bendras visų kaupimo sekcijų pajėgumas sudarys apie 610 tūkst. m^3, t.y. bus galima šalinti apie 495 tūkst. tonų atliekų. Teks pajėgumas užtikrins atliekų priėmimą į sąvartyną apie 15 m.

Sąvartyne taip pat įrengta atliekų kompostavimo aikštelė, kurios paskirtis atskirai surinkti sodo (žalia masė) atliekas. Bendras aikštelės pajėgumas - 1000 t/metus. Pagamintas kompostas bus naudojamas sąvartyno poreikiams arba miesto žaliųjų plotų priežiūrai. Prie įvažiavimo į sąvartyną, vakariniame teritorijos krašte 2065 m^2 plote įrengta statybos ir griovimo atliekų aikštelė. Atnaujintas administracinis pastatas, sumontuota aptarnaujančio transporto stogine. Naujasis privažiavimo kelias suprojektuotas ir nutiestas nuo esamų Kėdainių miesto pramonės rajono privažiavimo kelių, todėl autotransportas, vežantis atliekas, nevažiuoja per Zabieliškio gyvenvietę.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 33

APA Kaune

Įgyvendinant Sanglaudos fondo investicinį projektą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, šių metų liepos 20 d. Kaune adresu Nemujūnų g. 15B pradėjo veikti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojama atliekų priėmimo aikštelė, į kurią gyventojai nemokamai gali pristatyti stambias, specifines ir pavojingas atliekas, susidarančias buityje.

Kauno miesto gyventojams liepos mėnesį buvo išplatinti lankstinukai su informacija apie Kaune veikiančias atliekų priėmimo aikšteles.

Pirmąjį aikštelės veikimo mėnesį į aikštelę atvežta beveik 3 tonos didžiųjų atliekų bei antrinių žaliavų. Iš kurių:

1500 kg statybinių atliekų akmens pagrindu

100 kg medienos

300 kg nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos

300 kg didžiųjų atliekų (sofos, kt. baldai)

100 kg popieriaus ir kartono

40 kg kitų antrinių žaliavų

54 vnt. padangų

2 vnt. akumuliatorių

20 vnt. pavojingomis atliekomis užterštų pakuočių

Į Kauno atliekų priėmimo aikštelę gyventojai gali atvežti:

Medieną:

Senus baldus, įvairius medinius daiktus ir kitas medines atliekas.

Stiklą:

Skaidrų ir spalvotą, įvairią stiklo tarą, stiklo duženas ir atliekas.

Popierių:

Laikraščius, žurnalus ir kitus spaudinius, pakuotes, kartoną, atraižas.

Plastmasę:

Plovales, indus, žaislus, vamzdžius, įvairią tarą bei plastikines pakuotes.

Metalą:

Metalinius namų ūkio daiktus, įrankius, įrenginius ir jų dalis.

Buitinius prietaisus ir įrenginius:

Šaldytuvus, televizorius, virykles, žaislus, elektros prietaisus ir kitus įrenginius.

Padangas:

Lengvųjų automobilių, dviračių bei kitų transporto priemonių, ne daugiau nei 5 vnt.

Pavojingas buitines atliekas:

Liuminescencines lempas, akumuliatorius ir galvaninius elementus, senus tepalus, transporto priemonių oro ir tepalo filtrus bei kitas pavojingas buityje susidarančias atliekas.

Buityje susidarančias statybines atliekas

Betoną, plytas, izoliacines medžiagas, mišinius statybinės ir griovimo atliekas.

Rūšiuoduni atliekas nutaupysime Lietuvos gamtinius ir energijos išteklius, pratęsime sąvartyno eksploatacijos laiką, sumažinsime atliekų tvarkymo kaštus.

Atliekų priėmimo aikštelė dirba nuo antradienio iki penktadienio nuo 10 iki 19 valandos (pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.), šeštadienį - nuo 9 iki 16 val. Sekmadienį ir pirmadienį podiso dienos. Esame pasirengę Jums suteikti kokybišką paslaugą. Telefonai pasiteiravimui 8 37 311 267, mob. 8682 55 780.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 34

Lapių regioninio sąvartyno pridavimas

2009 m. gruodžio 24 dieną Valstybinė komisija pripažino tinkamu naudoti naujai rekonstruotą Lapių regioninį sąvartyną, esantį Kauno raj. Lapių sen.. Sąvartynas, rekonstruotas, laikantis ES ir Lietuvos sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimų.

Įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinį projektą 2007-12-27 dieną su UAB „Sienojus" ir UAB „Laugina", veikiančiomis jungtinės veiklos pagrindu, buvo pasirašyta rangos sutartis Lapių regioninio sąvartyno statybai. Bendra projekto vertė 41,6 mln. Lt, kuris finansuojamas ES ir Valstybės fondo lėšomis.

Įgyvendinant projektą atlikti šie darbai:

Įrengtas buitinių atliekų sąvartyno 2-asis kaupimo laukas apie 8,8 ha;

Rekultivuotas 1-asis kaupimo laukas;

3-iajame lauke užbaigti dalies sekcijos statybos darbai;

Pastatyti administracinis bei buitinis pastatai;

Perkelta aptarnaujančio transporto stoginė;

Sumontuotos naujos automobilinės svarstyklės bei pastatyta automobilių ratų plovykla;

Įrengti priešgaisriniai rezervuarai, gruntinio vandens pažeminimo sistema;

Pastatytos naftos gaudyklės; inžineriniai tinklai (elektros ir apšvietimo tinklai, video stebėjimas, lietaus ir buitinių nuotekų, vandentiekio tinklai);

Įrengti sąvartyno vidiniai keliai ir aikštelės, apželdinta bei aptverta sąvartyno teritorija;

Parengtas monitorinio sistemos projektas;

Įrengtas artezinis gręžinys.

Projekto įgyvendinimui prieš statant 2-ojo lauko A, B ir C sekcijas buvo iškeltos elektros 110 kV ir 10 kV orinės linijos.

Statybos laikotarpiu Lapių sąvartyno veikla nebuvo nutraukta, atliekos nuolatos buvo talpinamos sąvartyne.

sanglaucos fondas

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23

< atgal

http://www.kaunoratc.lt/print.html 2011.04.19

3 iš

Priedas Nr. 35-1

Naujienos, skelbimai

2010-11-26 08:33:59 Panaikintas sprendimas dėl atliekų deginimo stoties Kaune statybos

Š. m. lapkričio 25 d. Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendė pripažinti netekusiu galios 2008 - aisiais Tarybos priimtą sprendimą „Dėl Kauno regiono komunalinių atliekų deginimo stoties statybos". plačiau...

2010-10-18 16:17:26 Jonavos moksleiviai lanko atliekų tvarkymo įrenginius

Šių metų spalio 13 dieną Jonavos miesto „Lietavos" pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai lankėsi Jonavos dižiųjų atliekų surinkimo aikštejėje su atliekų perkrovimo stotimi bei regioniniame Zabieliškio sąvartyne. plačiau...

2010-10-08 10:50:00 Gauta ES Sanglaudos fondo parama

2010 m. rugsėjo mėnesį LR Aplinkos ministerija skyrė finansavimą ES reikalavimų neatitinkančių sąvartynų sutvarkymo, naujų didelių gabaritų atliekų aikštelių ir kompostavimo aikštelių statybos projektams. Pagal priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" projektui „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas" įgyvendinti skirta beveik 9,4mln. litų iš 2007-2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšų. plačiau...

2010-09-20 14:50:00 Patcikta paraiška biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir apdorojimo įrenginių statybai

2010 m. rugsėjo 15 d. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras pateikė paraišką dėl projektų planuojamų finansuoti pagal priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus". Pagal šią ppeimonę paraiškas pateikė 10 Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų. Numatomų vykdyti projektų bendra vertė beveik 565 mln. litų iš kurių Sanglaudos fondo lėšomis būtų finansuojama 454 mln. litų. plačiau...

2010-06-23 15:54:41 Sąvartynų uždarymo darbai

Š.m. birželio mėn. baigta vykdyti sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas". plačiau...

2010-06-14 13:29:25 Išvyka į Zabieliškio sąvartyną

Minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, š.m. birželio 9 dieną Kėdainių rajono savivaldybė gyventojams organizavo švietėjišką išvyką į regioninį Zabieliškio sąvartyną bei atliekų priėmimo aikštelę. Išvykos tikslas – supažindinti gyventojus kaip šiuolaikiškai regioniniame Zabieliškio sąvartyne tvarkomos įvairios medžiagos, kokie yra įrengti atskiri buitinių atliekų, asbesto šalinimo, statybų ir griovimo atliekų tvarkymo, kompostavimo bei kiti specialūs laukai. plačiau...

2010-05-28 15:13:44 Moksleivių ekskursija į sąvartyną

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2010 m. gegužės 27 dieną dalyvavo Kauno rajono savivaldybės organizuojamame aplinkosaugos konkurso „Moksleiviai - bendruomenei" įvykdytų projektų pristatymo renginyje Lapių pagrindinėje mokykloje. Viena iš dažnesnių moksleivių projektų temų yra atliekų rūšiavimas ir jų sutvarkymas, todėl renginio dalyviams buvo suorganizuota išvyka į regioninį Lapių sąvartyną. plačiau...

2010-04-30 12:40:33 Formuojamas žemės sklypas komunaliniu atliekų tvarkymo įmonei

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė teritorijos prie Ateities pl. 49A detaliajam planavimui, kurio tikslas yra suformuoti žemės sklypą, skirtą komunalinių atliekų tvarkymo įmonės statybai. plačiau...

2007 2008 2009 2010

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23

http://www.kaunoratc.lt/print.html 2010.11.29

Priedas Nr. 35-2

Moksleivių ekskursija į sąvartyną

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2010 m. gegužės 27 dieną dalyvavo Kauno rajono savivaldybės organizuojamame aplinkosaugos konkurso „Moksleiviai - bendruomenei" įvykdytų projektų pristatymo renginyje Lapių pagrindinėje mokykloje. Viena iš dažnesnių moksleivių projektų temų yra atliekų rūšiavimas ir jų sutvarkymas, todėl renginio dalyviams buvo suorganizuota išvyka į regioninį Lapių sąvartyną.

Lapių sąvartyne moksleiviams ir mokytojams buvo pristatytas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas, kurį įgyvendinant regioninio Lapių sąvartyno naujos sekcijos įrengtos, laikantis ES ir LR aplinkosauginių reikalavimų, taip pat rekultivuotas pirmasis atliekų kaupimo laukas.

Apžiūrėjus sąvartyno užimamą teritoriją, įvertinus kasdien patenkančių atliekų kiekius ir sudėtį, moksleiviams pristatyta atliekų rūšiavimo svarba. Nemažą procentą bendrame komunalinių atliekų sraute vis tik sudaro antrinės žaliavos, kurios sąvartyne išlieka nesuirusios daug metų. Rūšiuojant atliekas, atskiriant antrines žaliavas iš bendro komunalinių atliekų srauto, į sąvartyną patenka mažiau atliekų, vadinasi, didėja sąvartyno talpa ir jį naudoti galėsime ilgiau. Rūšiuodami atliekas taupome žemės naudingas iškasenas, taip pat išsaugome švaresnę ir sveikesnę aplinką.



≤ atgal

LIETUVOS FINANSŲ INSPEKCIJA
KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

http://www.kaunoratc.lt/print.html 2010.11.29

Priedas Nr. 36-1

Išvyka į Zabieliškio sąvartyną

sanglaudos fondas

Minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, š.m. birželio 9 dieną Kėdainių rajono savivaldybė gyventojams organizavo švietėjišką išvyką į regioninį Zabieliškio sąvartyną bei atliekų priėmimo aikštelę. Išvykos tikslas - supažindinti gyventojus kaip šiuolaikiškai regioniniame Zabieliškio sąvartyne tvarkomos įvairios medžiagos, kokie yra įrengti atskiri buitinių atliekų, asbesto šalinimo, statybų ir griovimo atliekų tvarkymo, kompostavimo bei kiti specialūs laukai.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro bei operatoriaus UAB „Skongalis" darbuotojai supažindino su šiuo metu Kauno regione veikiančia atliekų tvarkymo sistema. Gyventojai turėjo galimybę pamatyti, kaip įgyvendinant Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą finansuojamą ES lėšomis buvo atnaujintas sąvartynas. Sąvartynas rekonstruotas ir dabar eksploatuojamas laikantis ES ir LR Aplinkosauginių reikalavimų. 0
Išvykos metu gyventojams pristatyta Atliekų priėmimo aikštelė esanti Kėdainių mieste adresu J. Basanavičiaus g. 95B, jie supažindinti su atliekų priėmimo tvarka, akcentuota atliekų rūšiavimo svarba. Atliekų rūšiavimas namuose, pristatymas į atliekų priėmimo aikštelės, mažina patenkančių į sąvartyną atliekų kiekį, ilgina jo eksploatavimo laiką.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2010.11.26

http://www.kaunoratc.lt/print.html

2011-06-23

Priedas Nr. 36-2

< atgal

LIETUVOS FINANSŲ KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

http://www.kaunoratc.lt/print.html 2010.11.26

Luidas Nr. 37

Sąvartynų uždarymo darbai

Š.m. birželio mėn. baigta vykdyti sutartis "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas".

Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo mėn. UAB „Luidas" vykdė sąvartynų uždarymo darbus Kauno regione. Sutvarkytos 58 sąvartynų teritorijos Kauno, Kėdainių, Jonavos, Raseinių ir Kaišiadorių rajonuose.

Jau nuo 2009 m liepos 16 dienos Kauno regiono atliekos talpinamos dviejuose regioniniuose Lapių (Kauno raj.) ir Zabieliškio (Kėdainių raj.) sąvartynuose.

Buvusių sąvartynų teritorijos sutvarkytos, atliekų kaupai sutankinti ir uždengti storu grunto sluoksniu, įrengtos dujų oksidavimo sistemos. Naujai suformuoti ir gruntu uždengti kaupai apsėti žole.

Atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus užterštų teritorijų priežiūrai, 13 buvusių sąvartynų privaloma vykdyti kompleksinį aplinkos monitoringą. Parengtos monitoringo programos pagal kurias bus stebima aplinkos būklė: dujų, paviršinio, požeminio vandens rodikliai.

Buvusiuose sąvartynuose monitoringas bei teritorijos priežiūra bus atliekama dar 5 metus.

sanglaucos fondas

≤ atgal

VIEŠOSIOS FINANSINĖS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr.3P
Page 1 of 1

Dviratininkų klubo ekskursija į Lapių sąvartyną

Sanglaudos fondas

Š.m. lapkričio 20 d. ekskursijoje į regioninį Lapių sąvartyną bendrijos „Atgaja" iniciatyva dalyvavo Kauno "Velomanų" dviratininkų klubo nariai.

Lapių sąvartyne klubo nariams buvo pristatytas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas, kurį įgyvendinant regioninio Lapių sąvartyno naujos sekcijos įrengtos, laikantis ES ir LR aplinkosauginių reikalavimų, taip pat rekultivuotas pirmasis atliekų kaupimo laukas.

Apžiūrėjus sąvartyno užimamą teritoriją, įvertinus kasdien patenkančių atliekų kiekius ir sudėtį, klubo nariams pristatyta atliekų rūšiavimo svarba. Nemažą procentą bendrame komunalinių atliekų sraute vis tik sudaro antrinės žaliavos, kurios sąvartyne išlieka nesuirusios daug metų. Rūšiuojant atliekas, atskiriant antrines žaliavas iš bendro komunalinių atliekų srauto, į sąvartyną patenka mažiau atliekų, vadinasi, didėja sąvartyno talpa ir jį naudoti galėsime ilgiau. Rūšiuodami atliekas taupome žemės naudingas iškasenas, taip pat išsaugome švaresnę ir sveikesnę aplinką.

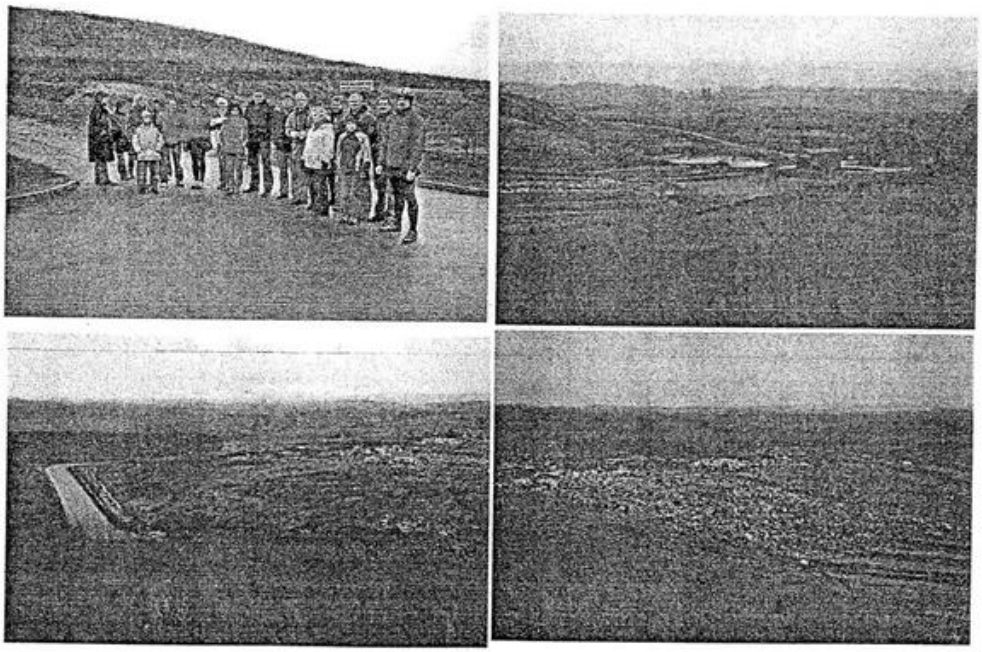

Nuotraukos Gedimino Labučio

< atgal

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr.40 40

Nauja Atliekų priėmimo aikštelė Kaune

sanglaudos fondas

Įgyvendinant investicinį Sanglaudos fondo ir Valstybinėmis lėšomis finansuojamą projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Kauno regione buvo numatyta pastatyti 6 Atliekų priėmimo aikšteles. 5 aikštelės, po vieną Kauno mieste, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių ir Raseinių rajonuose buvo pastatytos ir pradėtos eksploatuoti 2009 metais. Dar vienos aikštelės statyba Kauno mieste užtruko dėl vietos parinkimo jai. Išsprendus vietos parinkimo klausimus, adresu Raudondvario pl. 155 D, Kaunas, 2010 metais vyko aikštelės statybos ir metų pabaigoje Valstybinė komisija pripažino ją tinkama naudoti. Artimiausiu metu ji bus atverta gyventojams.

Į atliekų priėmimo aikšteles gyventojai gali pristatyti:

Medieną:

Senus baldus, įvairius medinius daiktus ir kitas medines atliekas.

Stiklą:

Skaidrų ir spalvotą, įvairią stiklo tarą, stiklo duženas ir atliekas.

Popierių:

Laikraščius, žurnalus ir kitus spaudinius, pakuotes, kartoną, atraižas.

Plastmasę:

Plėveles, indus, žaislus, vamzdžius, įvairią tarą bei plastikines pakuotes.

Metalą:

Metalinius namų ūkio daiktus, įrankius, įrengimus ir jų dalis.

Buitinius prietaisus ir įrengimus:

Šaldytuvus, televizorius, virykles, žaislus, elektros prietaisus ir kitus įrenginius.

Padangas:

Lengvųjų automobilių, dviračių.

Pavojingas buitines atliekas:

Liuminescencines lempas, akumuliatorius ir galvaninius elementus, senus tepalus, transporto priemonių oro ir tepalo filtrus bei kitas pavojingas buityje susidarančias atliekas.

Buityje susidarančias statybines atliekas

Betoną, plytas, izoliacines medžiagas, mišrias statybines ir griovimo atliekas.

< atgal

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011 -06- 23

http://www.kaunoratc.lt/print.html 2011.03.04 3 2 0

Priedas N4. 41-1

sanglaudos fondas

Projekto pavadinimas **Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas**
Projekto Nr. **2004/LT/16/C/PE/001**

2005 m. gegužės 24 d. Europos Komisijai pritarus projektui „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ pasirašytas Europos Komisijos sprendimas, o 2010 m. birželio 2 d. jo pakeitimas, kuriame numatytos projekto išlaidos (be PVM):

- Bendra projekto vertė – 25.388.987,00 EUR, iš jų:
- Bendrosios tinkamos išlaidos 18.432.000,00 EUR;
- Parama iš Sanglaudos fondo 75 % - 13.824.000,00 EUR.

Kiti finansavimo šaltiniai:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė finansuoja 20% bendrų tinkamų išlaidų – 3.686.400,00 EUR;
- VšĮ Kauno RATC finansuoja 5% bendrų tinkamų išlaidų – 921.600,00 EUR;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybė finansuoja 60% projekto vertės dalį, viršijančią tinkamas išlaidas -4.174.192,20 EUR;
- VšĮ Kauno RATC finansuoja 40% projekto vertės dalį, viršijančią tinkamas išlaidas – 2.782.794,80 EUR.

Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas - sukurti aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu darnią Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus. Ypač padėti įgyvendinti šių direktyvų reikalavimus:

- Atliekų direktyva Nr. 2006/12/EB;
- Sąvartynų direktyva Nr. 1999/31/EB;
- Pavojingų atliekų direktyva Nr. 91/689/EEB, kurią pakeitė direktyva Nr. 94/31/EB;
- Reglamentas Nr. EEB/259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijoje, į ir iš jos;
- Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva Nr. 2004/12/EB iš dalies keičianti direktyvą Nr. 94/62/EB;
- Direktyva Nr. 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;
- Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra tam tikrų pavojingų medžiagų, direktyva Nr. 91/157/EEB;
- Nuotekų dumblo direktyva Nr. 86/278/EEB, skirta apsaugoti aplinką, o ypač dirvožemį, kai nuotekų dumblas naudojamas žemės ūkyje;
- Direktyva Nr. 2000/53/EB dėl netinkamų naudoti automobilių.

Kauno regionas yra centrinėje Lietuvos dalyje, atliekų tvarkymo regioną sudaro 6 savivaldybės: Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Raseinių rajono, Kauno miesto.

Iki projekto įgyvendinimo pagal 2003 m. savivaldybių ir LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pateiką informaciją Kauno regione buvo apie 67 sąvartynus, iš kurių Kauno rajone yra 6 sąvartynai (įskaitant Kauno m. Lapių sąvartyną) Kaišiadorių – 11, Kėdainių – 21, Jonavos – 10, Raseinių – 19 sąvartynų.

Visiems sąvartynams būdingos problemos:

- sąvartynai neaptverti, nenužymėtos jų ribos;
- apsauginiai pylimai yra tik nedaugelyje sąvartynų;
- nėra filtrato surinkimo bei valymo sistemų, išskyrus kai kuriuos didžiuosius rajoninius sąvartynus;
- į sąvartynus patenkančių atliekų kontrolė bei registracija vykdoma labai apytiksliai;
- sąvartynuose trūksta eksploatacinės technikos ir įrenginių.
- atvežtų atliekų sustumdymas ir sutankinimas vykdomas epizodiškai.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr.41-2

sanglaudos fondas

- netvarkingas atvežamų atliekų išpylimas
- atliekos dažniausiai retai tankinamos ir visai neperdengiamos gruntu;
- patenkančios į sąvartynus atliekos nėra rūšiuojamos
- sąvartynuose neįrengtos aplinkos monitoringo sistemos;
- nevykdomi aplinkos būklės stebėjimai.

Prieš projekto įgyvendinimą atlikta regiono atliekų tvarkymo būklės apžvalga rodė:

- Regione buvo 68 eksploatuoti netinkami sąvartynai, kurie neatitinka ES ir atliekų šalinimo valstybinių reikalavimų. Techninių projektų rengimo metu atlikus detalius tyrinėjimus tvarkomų sąvartynų skaičius patikslintas – 58 sąvartynai.
- Regione nebuvo aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančių įrenginių atliekoms šalinti, kuriuose būtų įrengta šiuolaikiška, dugną izoliuojanti danga. Dalinai reikalavimus atitiko Lapių sąvartyno III laukas ir Zabieliškio sąvartyno eksploatuojama sekcija.
- Nepakankami statybos ir griovimo atliekų srautai buvo nukreipiama nuo sąvartyno, trūko tam tinkamų aikštelių ir įrangos.
- Gana daug biodegraduojamų atliekų patekdavo į sąvartynus, nors sąvartynų eksploatacijos instrukcijose draudžiama priimti šalinti jas į sąvartyną, trūko kompostavimui tinkamų aikštelių bei technikos.
- Komunalinių atliekų sraute daug antrinių žaliavų, kurias reikia atskirai surinkti. Regione nebuvo organizacijos, kuri atstovautų savivaldybes regiono lygyje ir taptų projekto savininke bei prisiimtų atsakomybę už investicinio plano įgyvendinimą.

Baigto įgyvendinti projekto "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" rezultatai:

- Įrengtos reikalavimus atitinkančios sąvartynų Lapėse ir Zabieliškyje sekcijos su filtrato surinkimo ir valymo įrenginiais ir, uždarius bei sutvarkius 58 veikiančius sąvartynus ir šiukšlynus, sumažinta požeminio ir paviršinio vandens tarša;
- Uždaryta Lapių sąvartyno I sekcija;
- Viešosios atliekų surinkimo paslaugas teikiamos 619 tūkst. regione gyvenančių žmonių ir 2010 m. pagerintas vidutinis surinkimo procentas iki 99 %;
- Taikomi tarifai, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir regione įtvirtintas „teršėjas moka" principas;
- Pastačius 6 atliekų priėmimo aikšteles padidintas komunalinių atliekų atskyrimas. Per 2009 m. aikštelėse surinkta 548 t atliekų;
- Įrengus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, sumažintas į sąvartyną patenkančių biodegraduojančių atliekų kiekis;
- Siekiama užtikrinti biologiškai skaidžių, statybos ir griovimo atliekų bei pavojingų atliekų nepatekimą į sąvartyną;
- Sumažintas reikalavimų neatitinkančių sąvartynų skaičius regione. Vietoj veikusių 59 liko 2 ES reikalavimus atitinkantys regioniniai sąvartynai;
- Užtikrinta, kad VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras generuos pakankamas pajamas padengti eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudas;
- Atliekos tvarkomos remiantis geriausiomis techninėmis žiniomis ir atitinka Sąvartynų direktyvos Nr. 199/31/EB reikalavimais.

Projekto nauda gyventojams, labiausiai pasireikš tuo, kad įgyvendinus projektą sumažėjo aplinkos tarša, kadangi pagerėjo atliekų surinkimas ir tvarkymas.

VšĮ Kauno regono atliekų tvarkymo centro informacija
2010-12-31

LIETUVOS FINANSŲ KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

priedas Nr. 42

VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Įstaigos kodas 300092998, PVM kodas LT 10000791219, Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas
Atsisk.sąsk. Nr.LT134010042500319096, AB bankas „NORD/LB Lietuva"
Tel. 837 311267, Fax.8 37 490734, el.p. juozvla@kaunas.aps.lt

Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo
ir viešųjų ryšių departamentas
direktoriui Romui Jankauskui

2006-04-05 Nr. 53

DĖL VISUOMENĖS ŠVIETIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KLAUSIMAIS

Atsižvelgdami į Aplinkos Ministerijos sekretoriaus p. Aleksandro Spruogio 2006 -02-02 raštą Nr. (16-2) D8-1001, pateikiame informaciją apie vykdytas priemones šviečiant ir informuojant visuomenę komunalinių atliekų tvarkymo klausimais:

1. 2006 m. sausio mėn.27d. susitikimas su Kėdainių raj. Zabieliškų gyventojais. Susitikimas vyko Pelėdnagių seniūnijoje, dalyvavo 35 Zabieliškių sen. gyventojai, Kėdainių raj. merė, administracijos direktorius. Kauno RATC atstovavo direktorius J.Yla. Pateikta informacija apie Zabieliškio sąvartyno perspektyvas, svarstytos problemos rengiant projektą.

2. 2006 m. sausio mėn. 09 d. susitikimas su Kauno raj. Lapių gyventojais . Susitikimas vyko Lapių seniūnijoje . Dalyvavo 27 Lapių bendruomenės atstovai, Kauno raj. vicemeras, UAB "Kauno švara „ Lapių sąvartyno. viršininkas. Kauno RATC atstovavo direktorius J.Yla. Buvo nagrinėtos problemos dėl transporto judėjimo į sąvartyną per Lapių gyvenvietę, informuota apie lapių sąvartyno perspektyvą įgyvendinant regioninę atliekų tvarkymo sistemą.

3. 2006 m. vasario mėn. 03 d. pokalbis su Kauno regiono televizijos korespondentais. Pokalbis apie regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą. Pokalbis transliuotas per regioninę televiziją 2006m. kovo 2 ir 3 dienomis.

4. 2006 kovo mėn. 01d. pokalbis su Pūko TV korespondentais. Pokalbis apie atliekų tvarkymo sistemas, atliekų mažinimo bei panaudojimo kurui galimybes.

5. 2006 kovo mėn. 08 d. susitikimas su Kauno raj. Lapių sen. gyventojais. Susitikimas vyko Lapių seniūnijoje, dalyvavo 18 lapių sen. gyventojų, Lapių sen. seniūnas. Kauno RATC atstovavo direktorius Juozas Yla ir direktoriaus pavaduotojas Gintaras Motiejaitis. Svarstytos galimos kompensacinės priemonės gyventojams dėl neigiamo poveikio aplinkai susijusio su lapių sąvartyno eksploatacija Pateikta informacija apie Lapių sąvartyno veiklą.

Direktoriaus pavaduotojas Gintaras Motiejaitis

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čepėlienė
2011 -05- 23

Priedas Nr. 43-1
PROJEKTO VYKDYMUI

Pakvietimas
Jonavos rajono švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojams

Į seminarą
„Jonavos rajono atliekų srautai, rūšiavimo reikalavimai ir teisingo rūšiavo principai"

Seminarą organizuoja:
Jonavos rajono savivaldybė, VšĮ „Plėtros konsultacijos"

Seminaras vyks:
2007 m. spalio 26 d.
Jonavos suaugusiųjų švietimo centre, J.Basanavičiaus g. 7, Jonava

Programa

10.00 Dalyvių registracija

10.30 Sveikinimo žodis, R.Ilonienė, Jonavos rajono savivaldybė

10.45 Projekto "Jonavos gyventojų švietimas atliekų tvarkymo srityje" pristatymas, R.Ilonienė, Jonavos rajono savivaldybė

11.00 "Atliekų srautai, rūšiavimo reikalavimai ir teisingo rūšiavo principai", R.Palanienė, LR Aplinkos ministerija

11.30 Pranešimas "Dabartinė ir naujoji atliekų tvarkymo sistema Kauno regione", J. Yla, Regioninis atliekų tvarkymo centras (RATC)

12.00 Klausimai, pasiūlymai, diskusijos

12.30 Kavos pertrauka

13.00 Projekto "Jonavos gyventojų švietimas atliekų tvarkymo srityje" rezultatų aptarimas, L.Blažytė, VšĮ "Plėtros konsultacijos

13.30 Klausimai, pasiūlymai, diskusijos

14.00 Jonavos rajono mokyklose skelbtų konkursų nugalėtojų apdovanojimas, meras B.Liutkus

Seminare turi dalyvauti 2-5 pedagogai iš kiekvienos Jonavos r. švietimo ir ugdymo įstaigų.
Registruotis: Lina Gedrimaitė, mob.tel.: 8 687 84266, el. paštas: lina.g@consultancy.lt

BPD

VIEŠOSIOS FINANSINĖS KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR [illegible] SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-08-23.

KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

2007-10-26
Kaunas

Juozas Tis
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

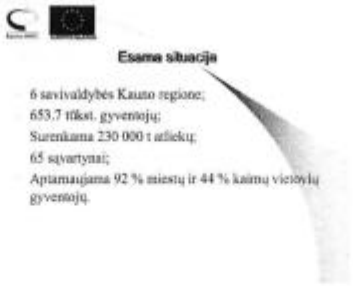
Esama situacija

6 savivaldybės Kauno regione;
653,7 tūkst. gyventojų;
Surenkama 230 000 t atliekų;
65 sąvartynai;
Aptarnaujama 92 % miestų ir 44 % kaimų vietovių gyventojų.

Problema

Nepakankama atliekų surinkimo paslauga;
Gyventojai neaktyvūs antrinių žaliavų rūšiavimo sistemoje;
Prasta antrinių žaliavų kokybė;
Surinktos antrinės žaliavos nėra tinkamos perdirbimui;
Nepakankamai dėmesio skiriama visuomenės aplinkosauginiam švietimui;
Neefektyvi kontrolė.

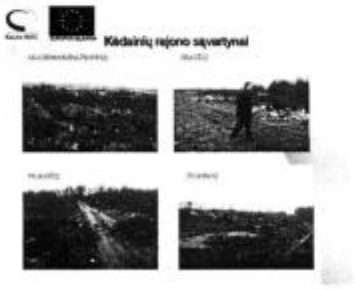
Kėdainių rajono sąvartynai

Kėdainių rajono sąvartynai

Raseinių rajono sąvartynai

KONTROLĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS DE VIEŠOJO SKYRIUS

TIKRA
2011-05-23
Aldona Čaplėjienė

Priedas Nr. 43-2

Kauno rajono sąvartynai

Netinkamas konteinerių naudojimas

Netinkamas konteinerių naudojimas

Lapių sąvartyno hidromonitoringo postai ir užterštumo zonos

Esami Kauno regiono buitinių atliekų sąvartynai

Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinimas
TIKRA
2011-10-23

Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas šiuo metu susietas su šiais trimis projektais:

1. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinis projektas (sutartis pasirašyta 2005-10-04).

2. Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui (sutartis pasirašyta 2006-12-22).

3. Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas (sutartis pasirašyta 2007-03-29).

Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinis projektas

Projekto rangovas UAB „Kreiso projektai ir partneriai" projektavimo darbus, inžinerus ir subtiekus nuo šių projektų turėjo baigti 2007 metų birželio mėn. Tačiau atsižvelgiant į dalį šių...

Šio projekto įgyvendinimo eiga:

1. Parengtas Zabieliškio aquaparko techninio projektas ir 2007-04-26 paskelbtas konkursas rangovų pasirinkimui. Techninio projektavimo atlikėjo, tačiau nuolatinio su rangovu nepasirašyta, nes praeitieji laukimai ginčo.

2. Parengtas Lapių aquaparko techninio projektas ir 2007-08-27 paskelbtas konkursas rangovų pasirinkimui.

3. Rangovo ir atliekų priėmimo aikštelių, 3 perkrovimo stočių ir 65 aquariumų užtikrinimo techninio projektai. Rangovų pasirinkimui planuojamo viešojo šių konkursus. Parengtame rafinuotai spalio mėnesį. Viešųjų konkursų ir jo metu pateiktos paraiškų rangovai.

Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui

Projektas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto rangovas (tiekėjas) UAB „COWI Baltic"
Projekto tikslas – parengti dokumentus, leidžiančius įgyvendinti regioninę atliekų tvarkymo sistemą:
- atliekų tvarkymo taisyklių parengimas;
- atliekų tvarkymo planų parengimas;
- KRATC verslo plano parengimas;
- atliekų tvarkymo technologinių reglamentų parengimas;
- visuomenės informavimo ir švietimo programos parengimas ir kt.
Projekto trukmė – 2 metai.

Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Paraišką parengė ir įgyvendina mūsų centras.
Šiuo projektu siekiame
- didinti Kauno regiono gyventojų supratimą apie atliekų tvarkymą,
- plėtoti visuomenės aplinkosauginę kultūrą,
- skatinti atliekų rūšiavimą ir kt.

Projekte numatyta įgyvendinti 42 aplinkosauginio švietimo priemones, tarp kurių lankstinukų apie atliekų rūšiavimą dalinimas, informacinių renginių mokyklose ir savivaldybėse organizavimas, TV ir radijo laidų parengimas ir kt.
Projekto trukmė 18 mėn.

DAUGIAU INFORMACIJOS:

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras"
Statybininkų g. 3 – 19, Kaunas
Tel: 8 37 490736
info@kaunoratc.lt
www.kaunoratc.lt

KOMISIJOS KORESPONDENTŲ IR VIRTUOS SKYRIUS

TIKRA
Aldona Čepėlienė
2011-10-23

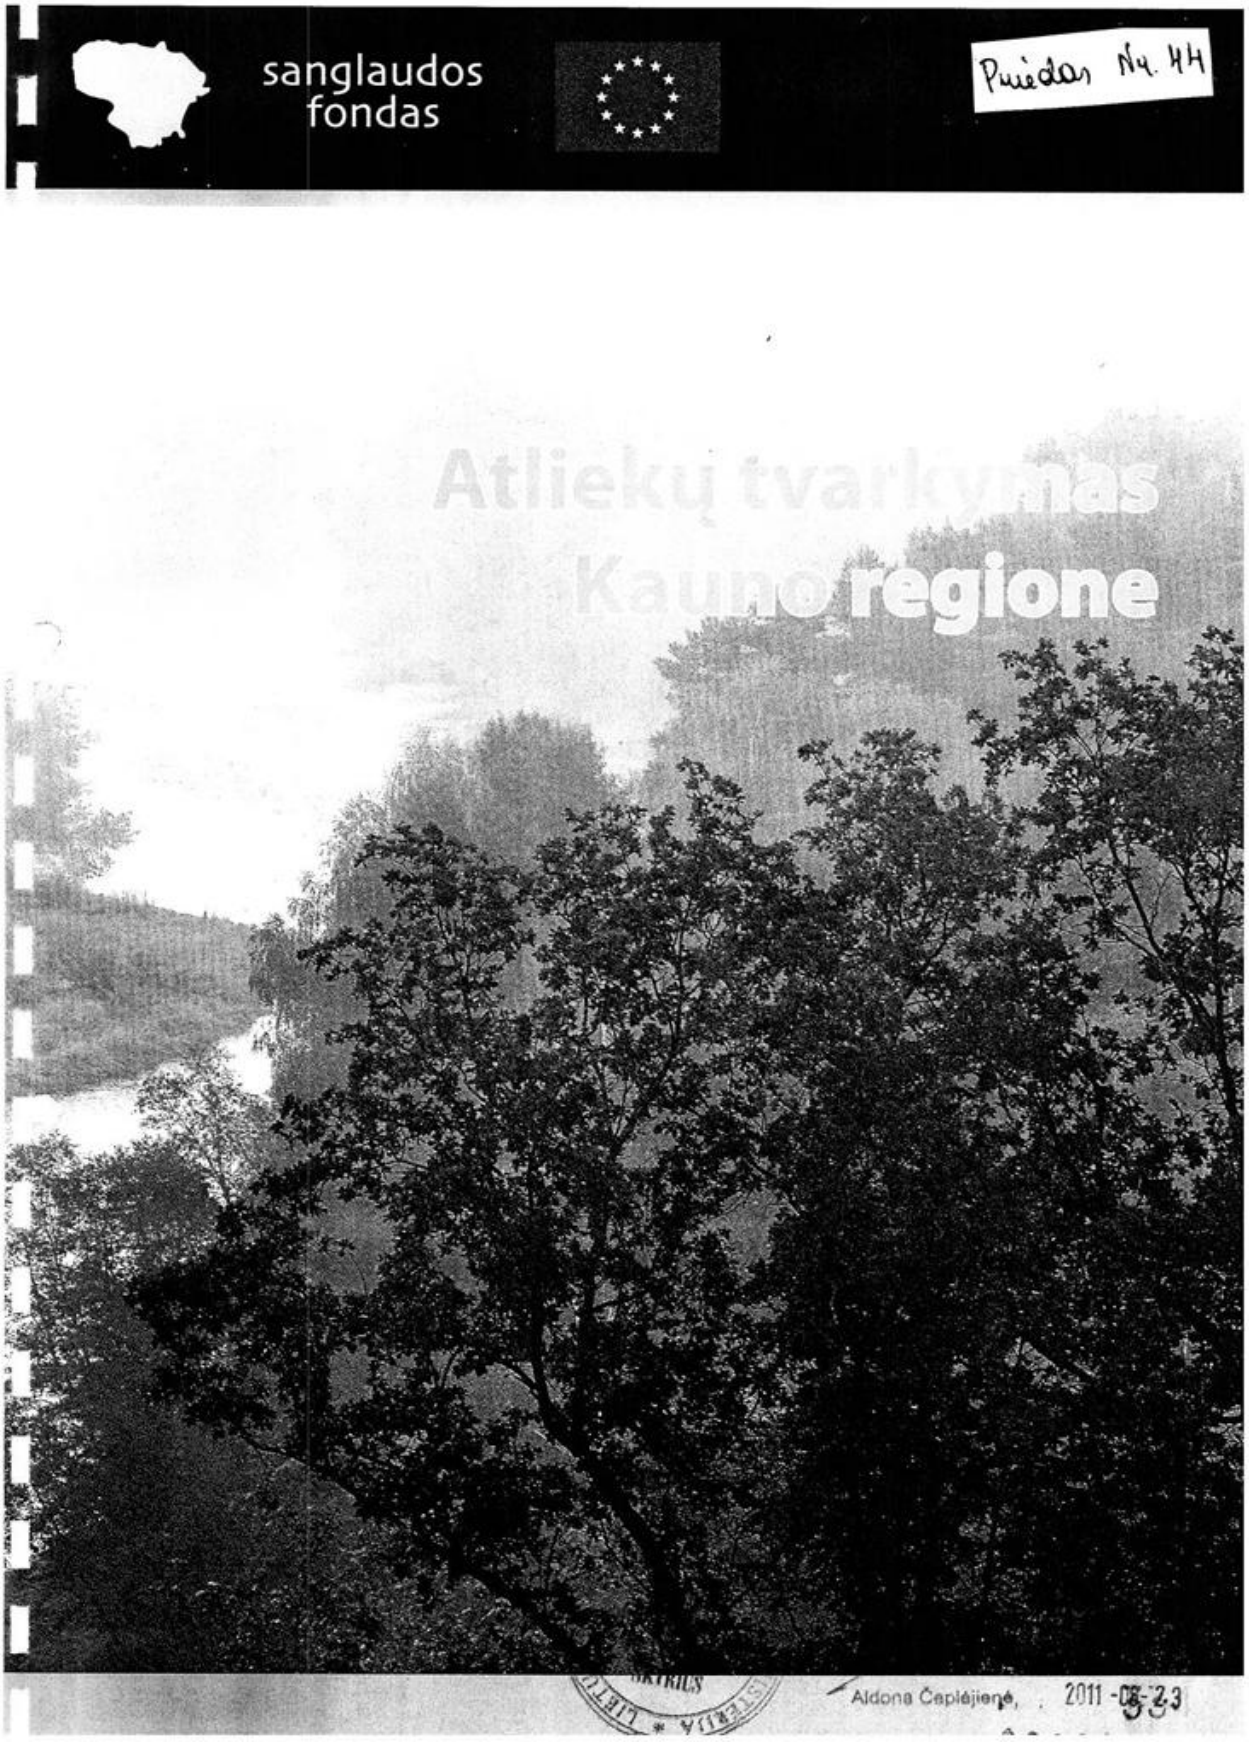
sanglaudos
fondas
Priedas Nr. 44
Atliekų tvarkymas
Kauno regione
Aldona Čepėjienė, 2011 -

sanglaudos fondas

...os Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę

ĮVADAS

...iekiant įdiegti ES direktyvose ir Lietuvos ...tatymuose numatytus atliekų tvarkymo ...ikalavimus, kuriamos regioninės atliekų ...kymo sistemos. Tuo tikslu nuo 2001 m. ...i 2005 metų Lietuvoje įkurta 10 regioninių ...tliekų tvarkymo centrų. Europos Sąjunga ir Lietuva skyrė lėšas regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo studijoms parengti. Taip pat finansuojami investiciniai projektai, kurie skirti sukurti regioninę atliekų tvarkymo infrastruktūrą.

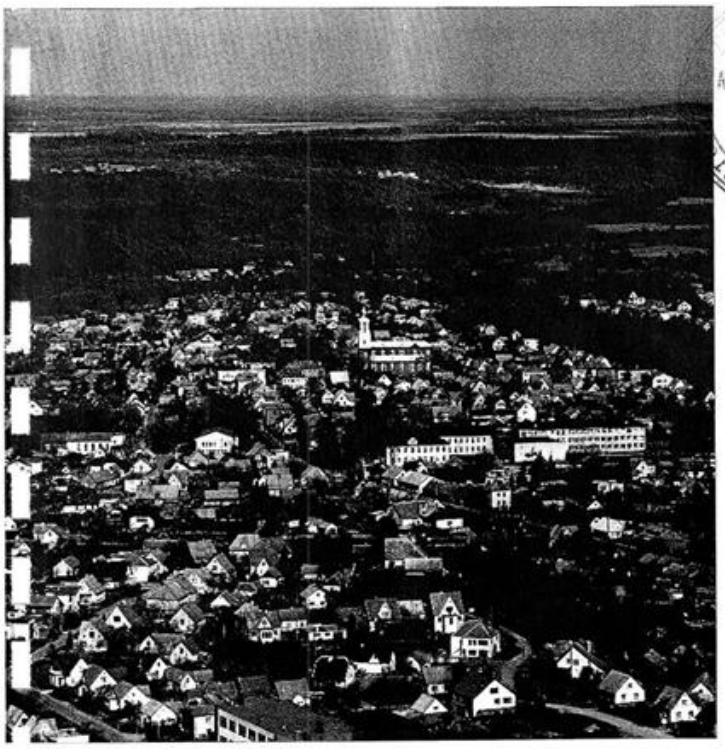



KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Atliekų tvarkymas Kauno regione

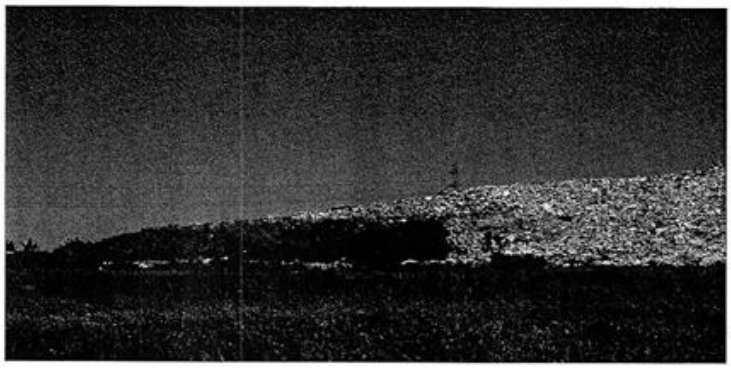

2. ATLIEKŲ TVARKYMAS LIETUVOJE

Augant ekonomikai ir vartojimui, bendras komunalinių atliekų kiekis Lietuvoje didėja. 2005 metais susidarė apie 1,3 mln. tonų komunalinių atliekų arba 389 kg vienam gyventojui. Komunalinėms atliekoms priskiriamos ne tik buityje susidarančios atliekos, bet ir į jas savo sudėtimi panašios atliekos, susidarančios institucijose, komercinėse įstaigose, biuruose ir pan. Sąvartynuose 2005 metais pašalinta 86 proc. surinktų komunalinių atliekų.

Atliekų apskaitos duomenimis, 2005 m. susidarė 801 tūkst. tonų statybinių atliekų (perdirbta – 40 proc.), 270 tūkst. tonų pakuočių atliekų (perdirbta – 33 proc.), 600 tonų nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų, 10 tūkst. tonų automobiliams skirtų pramoninių baterijų bei akumuliatorių atliekų, 1,3 tūkst. tonų medicininių atliekų (iš jų 62 tonos farmacinių atliekų). Ekspertų vertinimais Lietuvoje per metus susidaro apie 22 tūkst. tonų elektros ir elektroninės įrangos, 20 tūkst. tonų padangų, apie 12 tūkst. tonų alyvų atliekų.

Šiuo metu Lietuvoje eksploatuojama apie 300 sąvartynų, kurie neatitinka aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų. Visi šie sąvartynai privalės būti uždaryti taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Siekiant sukurti efektyviai veikiančią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, Lietuvoje kuriama 10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų. Šių sistemų diegimas ir plėtojimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto bei savivaldybių lėšomis. Šiuo metu įgyvendinami Alytaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės, Telšių ir Utenos regionų atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo investiciniai projektai, kurie dalinai finansuojami ES Sanglaudos/ISPA fondų lėšomis. Šių regioninių projektų vertė, ES paramos dalis ir projekto trukmė pateikta žemiau esančioje lentelėje.

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011 -06- 23
Aldona Čepėlienė

ES Sanglaudos/ISPA fondų parama regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimui.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vertė (tūkst. Lt be PVM)	ES paramos dalis (proc.)	Projekto įgyvendinimo trukmė (m.)
1.	Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	20 470,4	66	2001-2008
2.	Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	22 891,3	70	2001-2009
3.	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	32 463,2	56	2001-2008
4.	Klaipėdos regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	40570,4	50	2002-2009
5.	Marijampolės apskrities buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	44 917,5	72	2002-2009
6.	Vilniaus apskrities buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	72 267,1	50	2002-2008
7.	Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	30 736,8	71	2003-2008
8.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	63 642,0	75	2004-2009
9.	Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	44 698,8	75	2004-2009
10.	Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	67 284,7	85	2005-2010

J..IPA INFORMACIJA APIE KAUNO REGIONĄ

g nos regioninių atliekų tvarkymo r veiklos ribos sutampa su apskričių inistracinėmis ribomis. Kadangi Kauno a es Prienų ir Birštono savivaldybės ji gė prie Alytaus regioninės atliekų kymo sistemos, šiuo atveju įvardijamas n regionas sudaro dalį (86%) Kauno k es administracinės teritorijos ir ap- Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybių teritorijas. Šių šešių savivaldybių teritorijos užima 6934 km2 (10,6% Lietuvos teritorijos), jose, Valstybinio statistikos departamento 2007 m. sausio 1 d. duomenimis, gyvena 638 tūkst. gyventojų. Gyventojų skaičius atskirose savivaldybėse pateikiamas diagramoje.

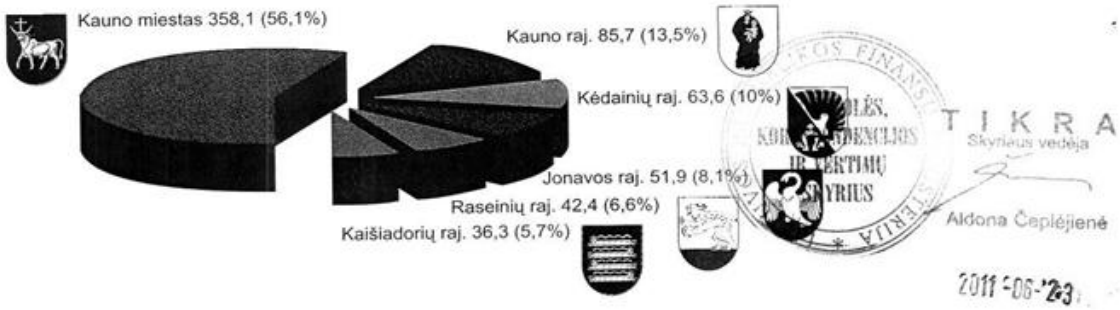

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Atliekų tvarkymas Kauno regione

Atliekų kiekis kaip ir kitur, taip ir Kauno regione sparčiai didėja. Paskaičiuota, kad kiekvienas miesto gyventojas per metus išmeta 300 – 350 kg atliekų, o kaimo gyventojas – iki 100 kg. Iš viso Kauno regione per metus susidaro apie 260 tūkst. tonų komunalinių atliekų.

Diagramoje pateikiami 2006 m. Kauno regiono savivaldybių teritorijose surinkti komunalinių atliekų kiekiai:

Remiantis Kauno technologijos universiteto 2006 metais atlikta „Komunalinių atliekų deginimo galimybių studija", prognozuojama, kad iki 2020 metų komunalinių atliekų kiekis regione padidės nuo 1,4 karto (pesimistinis variantas) iki 1,7 karto (optimistinis variantas).

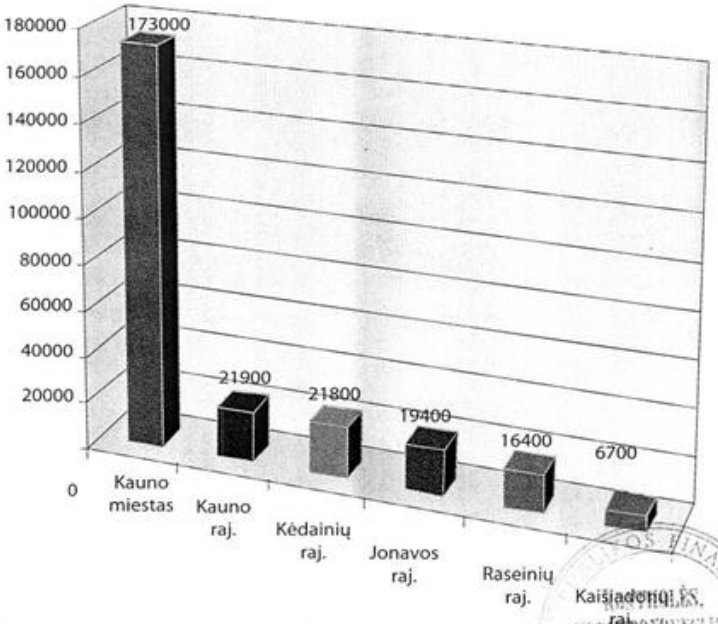

Kauno regiono komunalinių atliekų kiekiai (tonomis) 2006 m.

TIKRA
2011 -08- 23
Aldona Čaplėjienė

sanglaudos fondas

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę

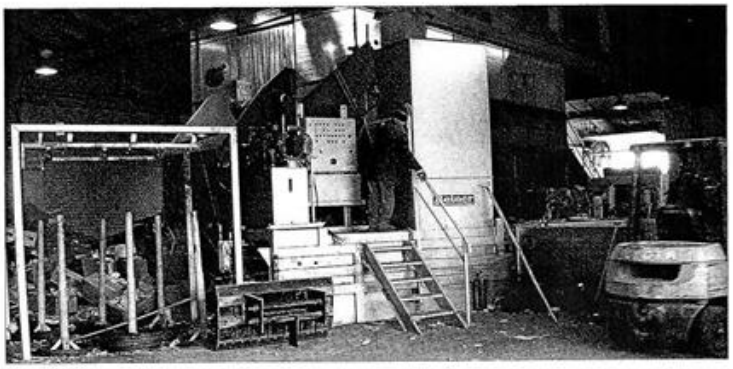

Kauno regiono komunalinėse atliekose yra apie: 9% - plastmasės, 14% - popieriaus ir kartono, 9% - stiklo, 3% - metalo, 42% - biodegraduojamų atliekų. Pastebimas popieriaus ir kartono bei plastmasės atliekų didėjimas komunalinėse atliekose. Prognozuojama, kad mišrių komunalinių atliekų sudėtis keisis nežymiai.

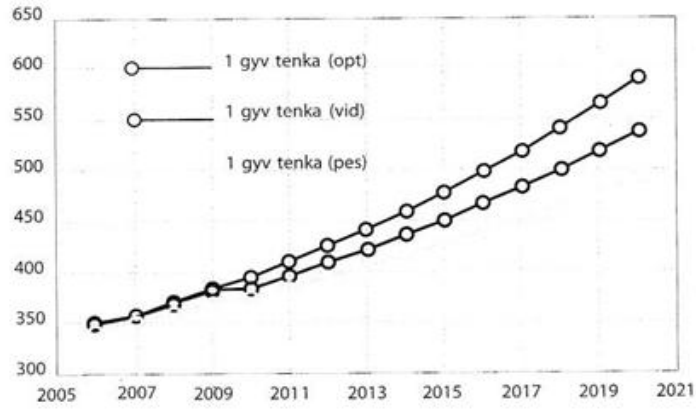

Komunalinių atliekų kiekių prognozės vienam gyventojui per metus 2006-2020 m. Kauno regione

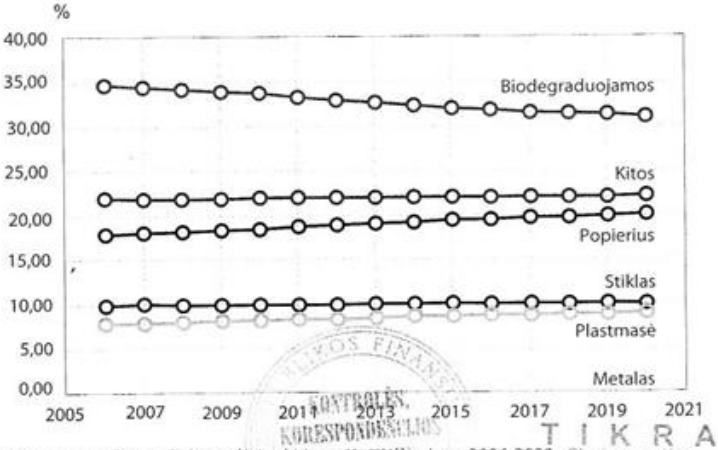

Mišrių komunalinių atliekų sudėties kitimas Kauno regione 2006-2020 m.

TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čeplėjienė

Atliekų tvarkymas Kauno regione

Esami komunalinių atliekų sąvartynai.

4. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Esama padėtis

Už savivaldybių teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų surinkimą, rūšiavimą, perdirbimą, patalpinimą sąvartynuose bei sąvartynų priežiūrą atsakingos savivaldybės.

Atliekų tvarkymas Kauno regiono savivaldybėse

Savivaldybė	Atliekas tvarkančių įmonių skaičius	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių skaičius	Esami sąvartynai
Kauno miestas	1	708	-
Kauno raj.	2	142	8
Kėdainių raj.	1	50	18
Jonavos raj.	2	11	10
Raseinių raj.	5	0	18
Kaišiadorių raj.	1	97	11

Pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, iki 2009 metų vidurio būtina užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą, kokybę ir prieinamumą visiems šalies gyventojams. Šios paslaugos įdiegimas Kauno regione parodytas lentelėje.

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos įdiegimas Kauno regione

Savivaldybė	Paslaugos įdiegimas gyventojams % (2006 m.)				
	Miestuose	Gyvenvietėse, kur gyvena daugiau nei 500 gyv.	Gyvenvietėse, kur gyvena daugiau nei 200 gyv.	Gyvenvietėse, kur gyvena mažiau nei 200 gyv.	Visoje savivaldybės teritorijoje
Kauno miestas	99	-	-	-	99
Kauno raj.	89	83	76	61	77
Kėdainių raj.	100	100	100	100	100
Jonavos raj.	98,6	71,6	66,5	22,2	85,2
Raseinių raj.	63	47	46	23	45
Kaišiadorių raj.	76	57	42	25	56

VALSTYBĖS FINANSŲ KONTROLĖS KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-03-23
Aldona Čeplėjienė

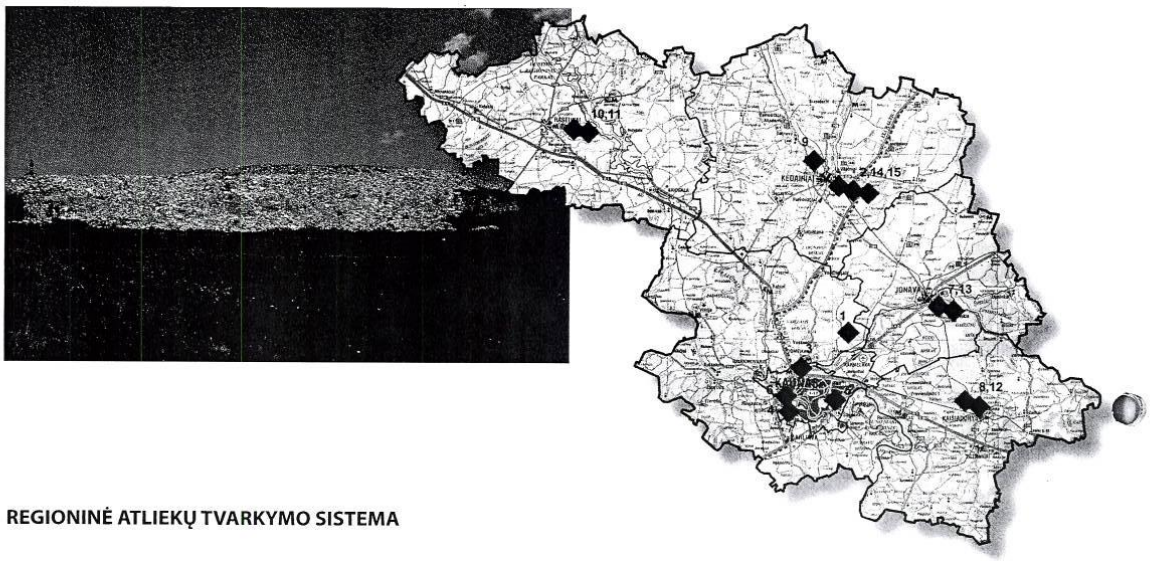

4.2 REGIONINĖ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

Įgyvendinant ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą bus:

- modernizuoti ir išplėsti Lapių ir Zabieliškio regioniniai sąvartynai;
- uždaryti 65 esami sąvartynai;
- įrengtos 6 atliekų priėmimo aikštelės;
- įrengtos atliekų perkrovimo stotys;
- įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė;
- įrengta statybinių atliekų perdirbimo aikštelė.

Visos šios priemonės bus įgyvendintos iki 2009 metų pabaigos. Jos sudarys regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros pagrindą. Numatoma, kad už regioninės infrastruktūros tinkamą funkcionavimą bus atsakingas Kauno RATC, o už atliekų surinkimą bei rūšiavimą savivaldybių teritorijoje – savivaldybės.

Siekiant efektyvesnio kuriamos atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimo, rengiamos naujos atliekų tvarkymo taisyklės bei atliekų tvarkymo planai, kurie 2008 metais bus patvirtinti savivaldybių tarybose.

Tikimasi, kad ši atliekų tvarkymo sistema padės įgyvendinti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nurodytus tikslus ir užduotis ir galutinai bus įgyvendintas principas „teršėjas moka".

Atliekų tvarkymo įrenginiai Kauno regione

	Įrenginiai	Pavadinimas	Adresas	Įrengimo data	Pastabos
1.	Regioniniai sąvartynai	Lapių	Kauno raj., Lapių sen., Lepšiškių km.	2008	Sąvartynas eksploatuojamas nuo 1970 m. Iš Sanglaudos fondo lėšų vykdomas jo išplėtimas
2.		Zabieliškio	Kėdainių raj. Pelėdnagių sen., Zabieliškio km.	2008	Sąvartynas eksploatuojamas nuo 2001 m. Iš Sanglaudos fondo lėšų vykdomas jo modernizavimas.
3.	Atliekų priėmimo aikštelės (APA)	Kauno	Kaunas, Ašigalio g. 20	1995	Įrengta savivaldybės lėšomis, priklauso UAB „Kauno švara"
4.		Kauno	Kaunas, Julijanavos g.1A	2000	Įrengta savivaldybės lėšomis, priklauso UAB „Kauno švara"
5.		Kauno	Kauno, Nemajūnų g.15A	2008	
6.		Kauno	Kauno, Raudondvario pl.107B	2008	
7.		Jonavos	Jonavos raj., Ruklos sen., Jonalaukio km.	2008	Bus įrengta rekultivuoto Jonalaukio sąvartyno teritorijoje.
8.		Kaišiadorių	Kaišiadorys, Vytauto Didžiojo g. 136	2008	
9.		Kėdainių	Kėdainiai, J.Basanavičiaus g.	2008	
10.		Raseinių	Raseinių raj., Raseinių sen., Andriušaičių km.	2008	Bus įrengta rekultivuoto Andriušaičių sąvartyno teritorijoje.
11.	Atliekų perkrovimo stotys (APS)	Raseinių	Raseinių raj., Raseinių sen., Andriušaičių km.	2008	Šalia APA
12.		Kaišiadorių	Kaišiadorys, Vytauto Didžiojo g. 136	2008	Šalia APA
13.		Jonavos	Jonavos raj., Ruklos sen., Jonalaukio km.	2008	Šalia APA
14.	Kompostavimo aikštelės	Kėdainių	Kėdainių raj. Pelėdnagių sen., Zabieliškio km.	2008	Zabieliškio sąvartyno teritorijoje
15.	Statybos ir griovimo atliekų aikštelė	Kėdainių	Kėdainių raj. Pelėdnagių sen., Zabieliškio km.	2008	Zabieliškio sąvartyno teritorijoje

KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
T I K R A
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čeplėjienė

Atliekų tvarkymas Kauno regione

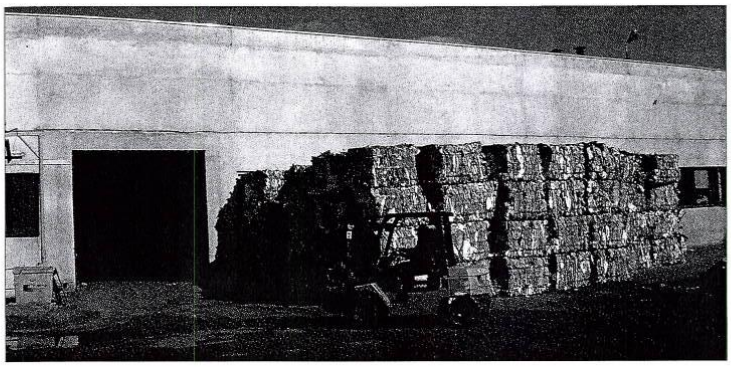

KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Siekiant optimaliai valdyti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymą bei efektyviai panaudoti gaunamas ES Sanglaudos fondo lėšas, Kauno regione kuriama regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Regionui priklausančių savivaldybių bendru sutarimu įsteigtas juridinis asmuo – Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC).

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras Valstybės įmonių Registrų centre įregistruota 2005 metų kovo 2 dieną. Įstaigos steigėjai Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Raseinių rajonų savivaldybės ir UAB „Kauno švara".

Įstaigos veiklos sritys:

- regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas;
- komunalinių atliekų sąvartynų rekultivavimo, modernizavimo bei saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;
- Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto, finansuojamo iš ES Sanglaudos fondo, įgyvendinimas;
- Projekto vykdymo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas;
- Steigėjų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas.

Šios funkcijos ateityje gali keistis.

Visuotinis dalininkų susirinkimas – aukščiausias VšĮ Kauno RATC valdymo organas. Jam atstovauja savivaldybių paskirti atstovai. VšĮ Kauno RATC valdyba renkama iš 10 narių: 4 valdybos nariai iš Kauno miesto savivaldybės, vienas valdybos narys iš UAB „Kauno švara" ir po vieną iš Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno ir Raseinių rajonų savivaldybių pasiūlytų kandidatų.

VšĮ Kauno RATC valdymo schema

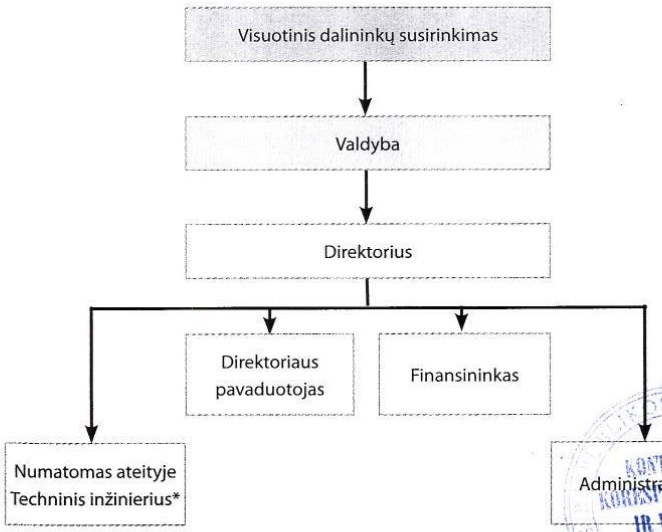

KONTROLĖS, KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR TYRIMŲ SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
2011-06-23
Aldona Čepelienė

sanglaudos fondas

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę

Lapių regioninis sąvartynas Lepšiškių kaime, Lapių sen., Kauno raj.

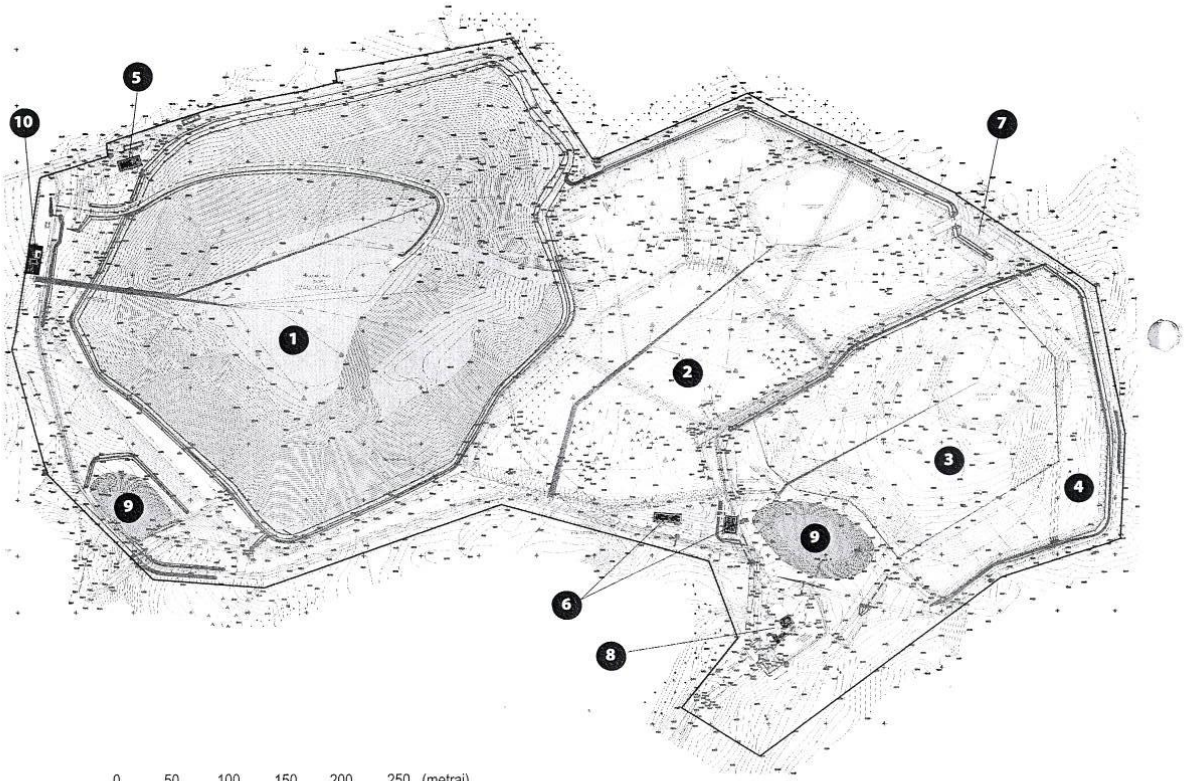

0 50 100 150 200 250 (metrai)

Pagrindinių statinių eksplikacija

1. Laukas 1 (rekultivuojamas)
2. Laukas 2 (naujai įrengiamas)
3. Laukas 3 (eksploatuojamas)
4. Laukas 3 (papildomos naujos sekcijos)
5. Administracinis pastatas ir svarstyklių zona
6. Buitinis pastatas ir tankintuvo garažas
7. Konteinerių nukrovimo-sandėliavimo aikštelė
8. Filtrato siurblinė ir valymo įrenginiai
9. Filtrato rezervuarai
10. Sąvartyno dujų kompresorinė

KONTROLĖS, KORESPONDENCIJOS IR VERTIMŲ SKYRIUS
2011 -08- 23
Aldona Čeplėjienė

10

Atliekų tvarkymas Kauno regione

Zabieliškio regioninis sąvartynas Zabieliškio kaime, Kėdainių raj.

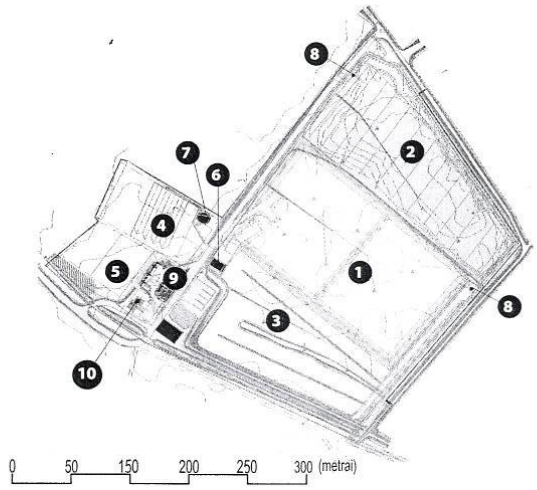

Pagrindinių statinių eksplikacija

1. Laukas 01-1
2. Laukas 01-2 (laikinai uždengiamas)
3. Laukas 01-3 (perspektyvinis)
4. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė
5. Statybų ir griovimo atliekų aikštelė
6. Aptarnaujančio transporto stoginė
7. Filtrato rezervuaras ir siurblinė
8. Filtrato siurblinės
9. Dujų kompresorinės ir filtrato VĮ įrengimo zona (perspektyva)
10. Administracinis pastatas

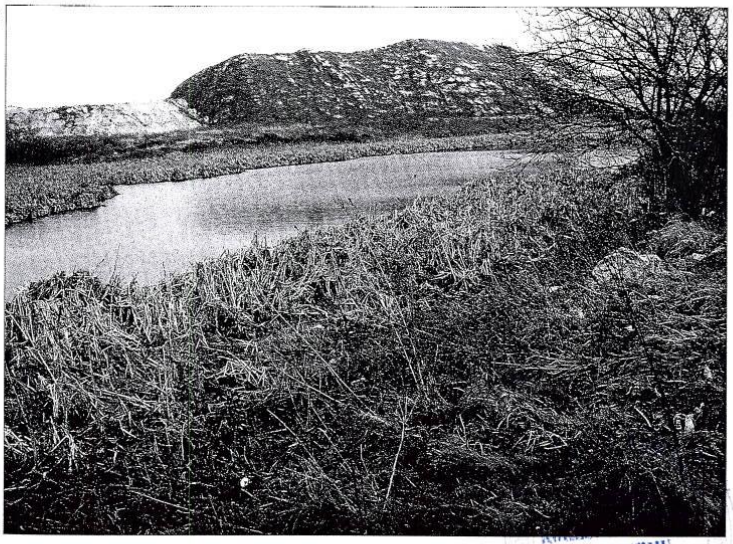

IR VERTIMŲ SKYRIUS

2011-06-23

Aldona Čeplėjienė

11

sanglaudos fondas

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę

Kauno RATC







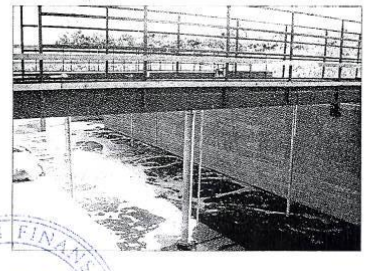

KONTAKTAI

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Statybininkų g. 3-19
LT-50124, Kaunas
Tel.: 370 37311267
370 37490735
Faks.: 370 37490734
El. paštas: info@kaunoratc.lt
www.kaunoratc.lt

NAUDINGOS NUORODOS

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) www.apva.lt
Aplinkos ministerija (AM) www.am.lt

Kauno regiono savivaldybės

Kauno apskrities viršininko administracija www.kava.lt
Kauno miesto savivaldybė www.kaunas.lt
Kauno rajono savivaldybė www.krs.lt
Jonavos savivaldybė www.jonava.lt
Kaišiadorių savivaldybė www.kaisiadorys.lt
Kėdainių savivaldybė www.kedainiai.lt
Raseinių miesto savivaldybė www.raseiniai.lt

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) www.vaatc.lt
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC) www.pratc.lt
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) www.kratc.lt
Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) www.uratc.lt
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (SRATC) www.sratc.lt
Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) www.tratc.lt
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) www.aratc.lt
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

Leidinio užsakovas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Išleista 2007 m. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, vykdant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui".

Leidinį parengė COWI BALTIC, Lukiškių g. 3, 01108 Vilnius. Spausdino „Pozicija", S. Žukausko g. 49, 09131 Vilnius

LIETUVOS FINANSŲ KONTROLĖS, KOMPETENCIJOS IR VERTINIMO SKYRIUS
PIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr.VI-1

Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" vykdomo projekto „Aš noriu švarios Lietuvėlės" vaikų pažintinių išvykų į UAB „Kauno švara" ir VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą ataskaita

2008 m. kovo 18 d. – balandžio 28 d. Kauno lopšelių darželių vaikai lankėsi UAB „Kauno švara" įmonėje. Čia vaikai susipažino su UAB „Kauno švara" ir Kauno RATC darbuotojais, klausėsi paskaitėlių apie įstaigų veiklą. Kauno RATC pristatė vykdomą investicinį Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą. Buvo akcentuojama atliekų tvarkymo tema, jų surinkimas ir rūšiavimas. Rūšiavimo įgūdžiams sutvirtinti, žaidimo forma vaikai patys rūšiavo atliekas.

Po paskaitos ekskursija buvo vedama į įmonės kiemą, į rūšiavimo liniją. Vaikai pamatė antrinių žaliavų paruošimo perdirbimui procesą.

Išvykos pabaigoje, vaikai patys rūšiavo ir metė į konteinerius jietms paruoštas atliekas.

Vaikams įteikti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro informaciniai bukletai (Rūšiuokime atliekas! Kompostuokime organines atliekas!) bei informacinis leidinys apie Centrą „Atliekų tvarkymas Kauno regione".

Įgytomis žiniomis bei patirtimi vaikai dalinsis su tėveliais, namuose mokysis kartu rūšiuoti.

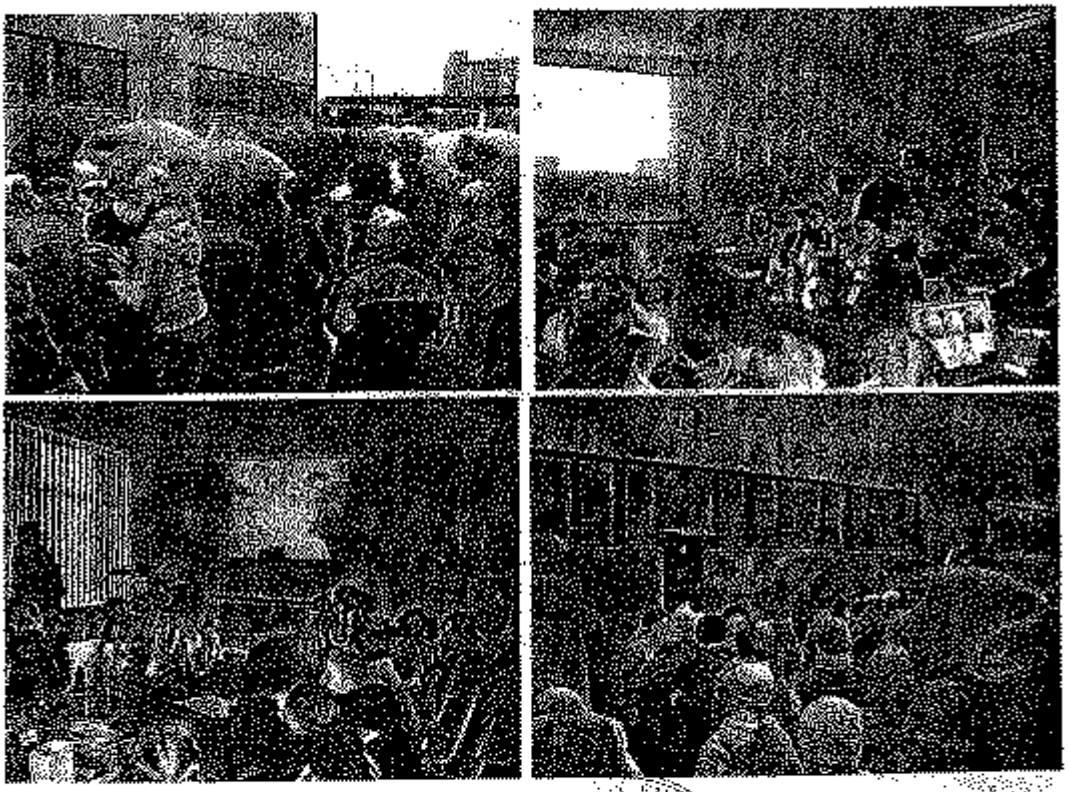

Parengė

Jurgita Blažytė
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro administratorė
2008-04-29

TIKRA
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 45-2

ĮSTAIGŲ, VYKSTANČIŲ Į ĮMONĘ „KAUNO ŠVARA“, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įstaiga	Vaikų skaičius	Išvykos data	Val.
1	L.d. "Spindulys"	20	Kovo 18 d.	10
2	L.d. "Bitutė"	25	Kovo 19 d.	10
3	L.d. "Rasytė"	20	Kovo 20 d.	10
4	L.d. "Mažylis"	34	Kovo 21 d.	10
5	L.d. "Drevinukas"	15	Kovo 26 d.	10
6	L.d. "Girstutis"	38	Kovo 27 d.	10
7	L.d. "Pagrandukas"	30	Kovo 28 d.	10
8	L.d. "Pasaka"	50	Kovo 31 d.	10
9	L.d. "Kūlverstukas"	40	Balandžio 1 d.	10
10	D.m. "Šviesa"	42	Balandžio 2 d.	10
11	L.d. "Želmenėlis"	30	Balandžio 3 d.	10
12	L.d. "Žilvitis"	40	Balandžio 4 d.	10
13	75 l.d.	20	Balandžio 7 d.	10
14	Šančių l.d.	30	Balandžio 8 d.	10
15	L.d. "Vaivorykštė"	39	Balandžio 9 d.	10
16	L.d. "Židinėlis"	10	Balandžio 10 d.	10
17	L.d. "Žiedelis"	25	Balandžio 11 d.	10
18	L.d. "Malūnėlis"	33	Balandžio 14 d.	10
19	L.d. "Daigelis"	28	Balandžio 15 d.	10
20	L.d. "Dobilėlis"	34	Balandžio 16 d.	10
21	Karmėlavos l.d. "Žilvitis"	20	Balandžio 17 d.	10
22	L.d. „Vaivorykštė“	43	Balandžio 18 d.	10
23	L.d. „Pagrandukas“	30	Balandžio 21 d.	10
24	L.d. „Malūnėlis“	33	Balandžio 22 d.	10

Projekto rengėjai:
Lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė, pavaduotoja ugdymui bei pedagogės Vilma Kuzminskienė ir Sandra Mulkuolienė

TIKRA
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 45-5





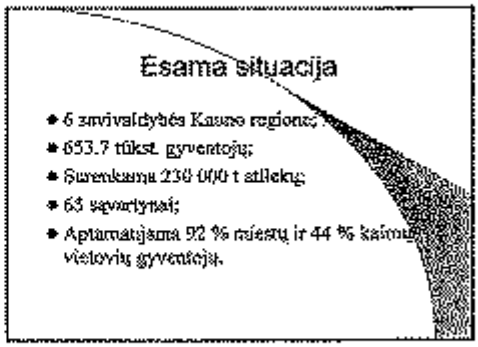





Priedas Nr. 45

Aplinkosauginio švietimo tikslas

Didinti Kauno regiono gyventojų supratimą apie atliekų tvarkymą, plėtoti visuomenės aplinkosauginę kultūrą, skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant aplinkosaugos ir darnaus vystymosi uždavinius.

Istorija

- 3000 p. K. – pirmieji sąvartynai. Kretoje;
- 2000 p. K. – kompostavimas, perdirbimas. Kinija;
- Prieš 2500 m. – pirmieji sąvartynai. Atėnai;
- 1388 m. – pirmieji reglamentai. Anglija;
- 1848 m. – visuomenės sveikatos įstatymas. Britanija;
- 1975 m. – Bendroji atliekų tvarkymo direktyva;
- 1999 m. – Sąvartynų atliekų tvarkymo strategija.

Kas yra atliekos?

- Tai bet kokios medžiagos ir daiktai, kurie tampa nereikalingi, ir asmuo ar valdytojas jais atsikratyti.

Atliekų problema

- Didelis vartojimas – atliekų kalnai.
- Susikaupę atliekos – oro ir vandens taršos, rūgštūs lietūs.
- Atliekų susidaro daugiau, nei įmanoma jas sutvarkyti.

Atliekų tvarkymo sistemos principai

Atliekų susidarymas Lietuvoje

- 1,3 mln. komunalinių atliekų kasmet
- Komunalinių atliekų kiekis vienam gyventojui ~480 kg

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA
APLINKOS APSAUGOS IR TEISINIO SKYRIUS

TIKRA
Dokumento vedėja
Aldona Čepėlienė
2011-05-23

priedas Nr. 45-3







TIKRA
Aldona Čepėlienė
2011-05-23

Priedas Nr. 45-6









TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldonia Čepiėjienė
2011-06-23 345

Priedas Nr. 46-1

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

E C A T

APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

"ŠIANDIENINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO AKTUALIJOS"

SEMINARAS

2008 m. spalio 21 d., Kauno rajono savivaldybės Didžioji salė

Programa

12:45 Dalyvių registracija

13:00 Seminaro atidarymas

13:05 Pasveikinimo žodis
Kauno rajono savivaldybės atstovas

13:10 Šiandieninė atliekų tvarkymo politika – ką numato naujoji ES direktyva dėl atliekų?
Lina Gelažienė, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras

13:30 Kas naujo atliekų tvarkyme Lietuvoje?
Lina Gelažienė, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras

13:50 Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema
Juozas Yla, Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

14:10 *Klausimai ir diskusija*

14:30 Kavos pertrauka

14:50 Atliekų tvarkymo principai – kam skirti pirmenybę?
Lina Gelažienė, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras

15:10 Visuomenės informavimas ir švietimas – neatsiejama sėkmingo atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo dalis
Audronė Alijošiutė, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras

15:20 Kokiais metodais informuoti visuomenę? Apklausos rezultatų pristatymas
Vaiva Ramanauskienė, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras

15:40 *Klausimai ir diskusija*

16:00 Renginio uždarymas

IR VERTIMŲ AKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Caplėjienė

346

2011-08-23

KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS
SUKŪRIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS
2006 m. gr.
Kaunas



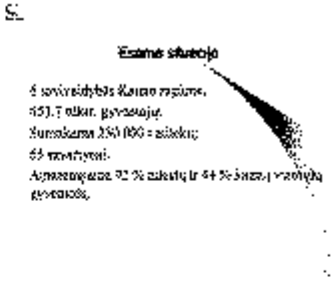
Esama situacija


Projektas

TIKRA
KOPIJA

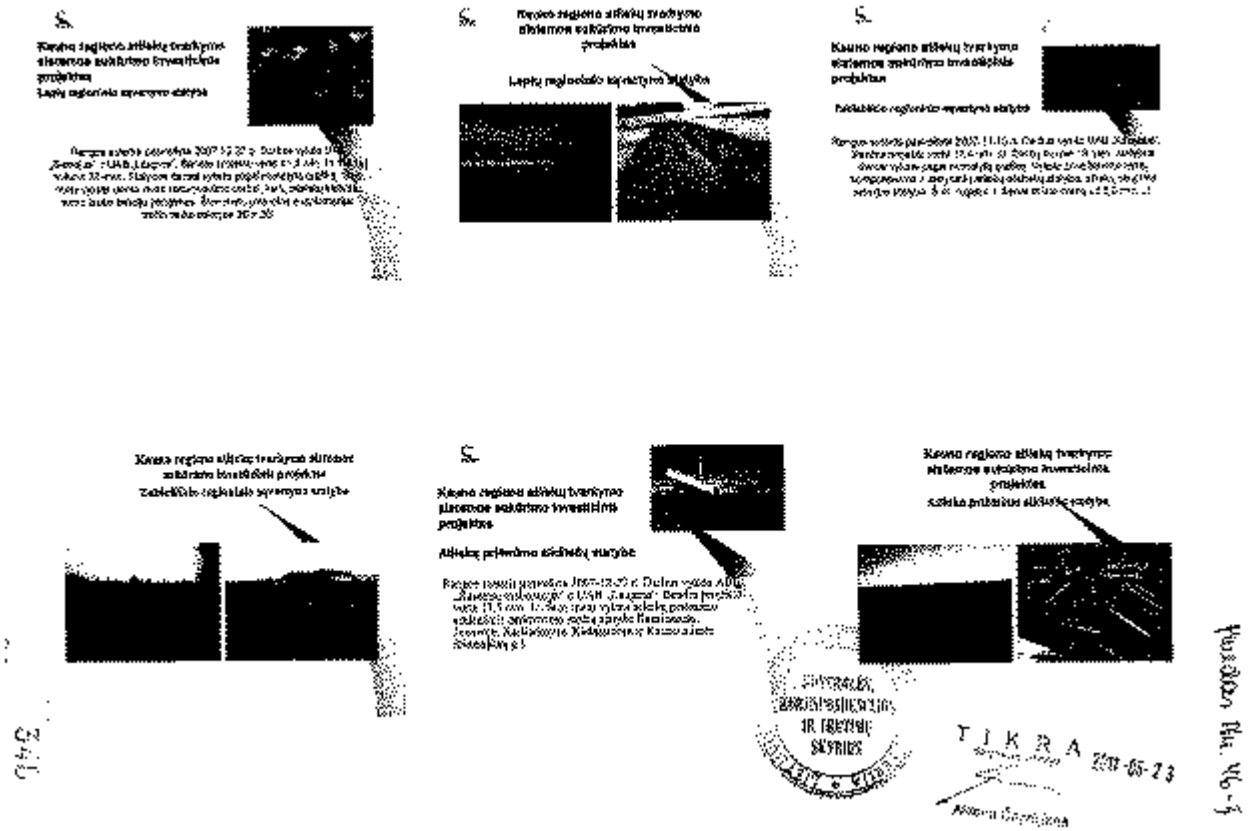

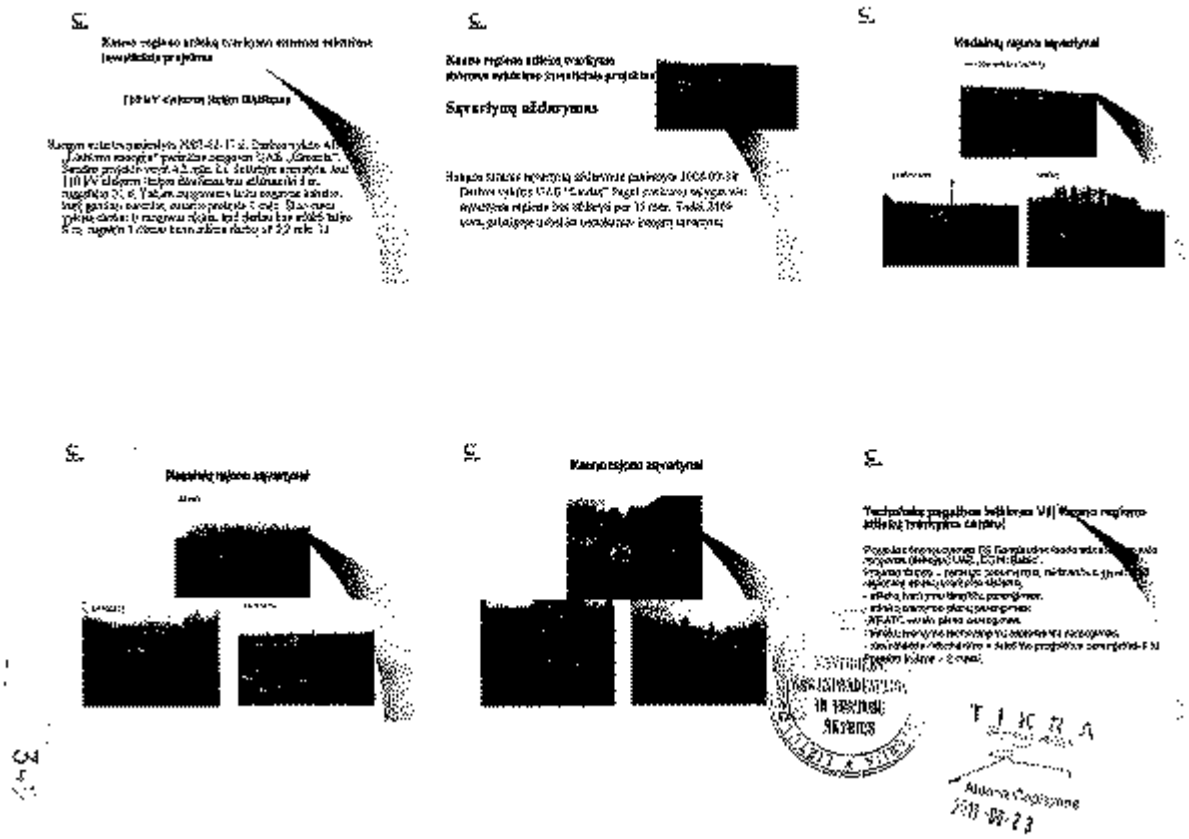


2007-2013 m. struktūrinės paramos programų
įgyvendinimas

DAUGIAU INFORMACIJOS

Priedas Nr. 47-1

Paskaita Lietuvos Žemės Ūkio universiteto IV kurso studentams.
2008-11-28 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

TIKRA
Arūnas Čaplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 47-2

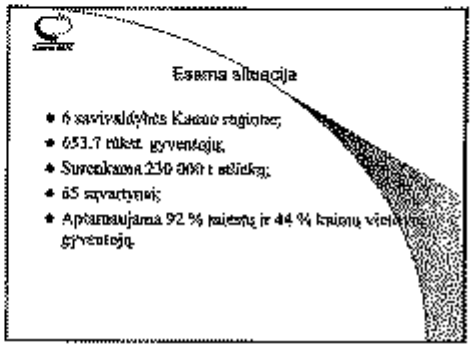

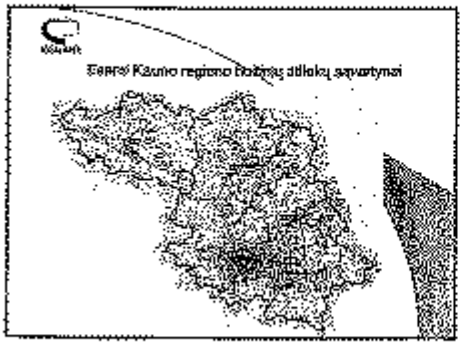



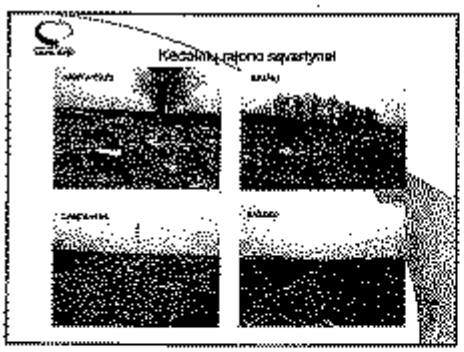

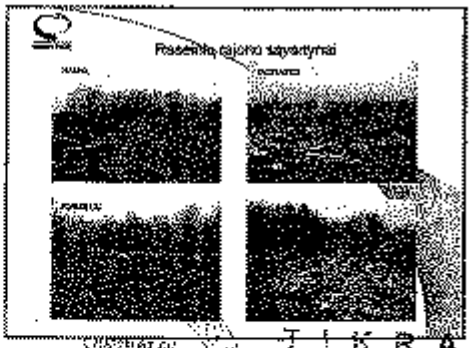

KOPIJA TIKRA

Direktorės vedėja

Aldona Čepėlienė

2011-06-23

Priedas Nr. 47-3





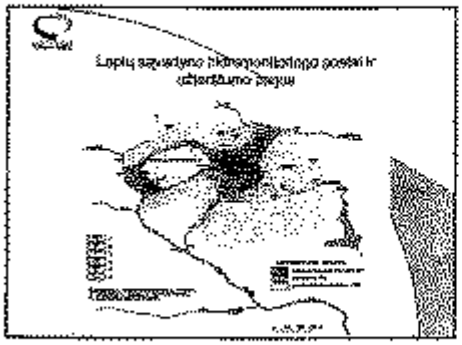

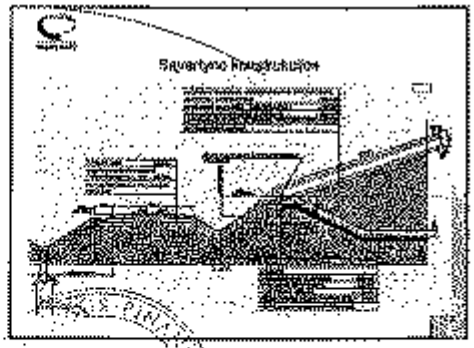

TIKRA
kopija
Aldona Čepiėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 47-4

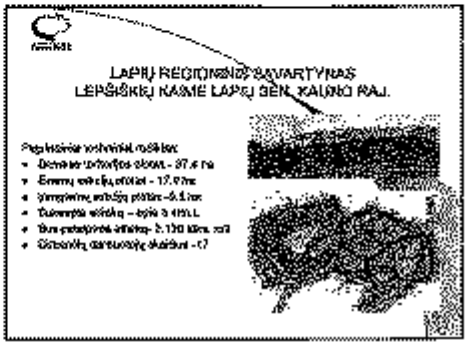





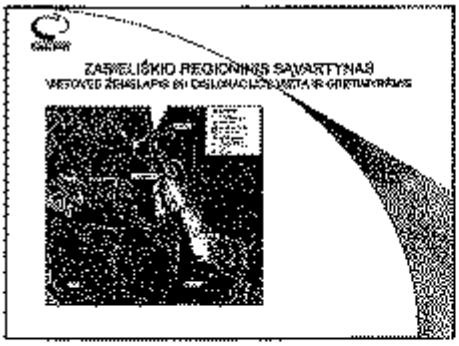

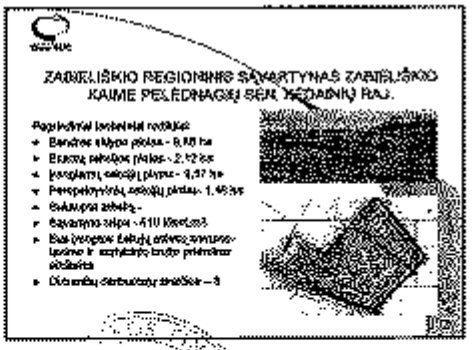

AUDITUOJAMO SUBJEKTO VADOVO ARBA JO ĮGALIOTO ASMENS PATVIRTINIMAS APIE DOKUMENTŲ KOPIJŲ ATITIKIMĄ ORIGINALAMS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čeplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr.47-5







ANTRUOJŲ, KORESPONDENCIJOS IR PRIETEKIŲ SKYRIUS

TIKRA
Akdona Čepiėjienė

2011-06-23

Raida Nr. 48-1

KAUNO RAJONO
MASTAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui 2009 m. sausio 21 d. Nr. V8 – 84a

DĖL PRANEŠIMO

Kauno rajono Mastaičių pagrindinės mokyklos aplinkotyros ir kraštotyros klubas „Ainiai" prašo Jūsų 2009 m. sausio 23 dieną paskaityti pranešimą apie atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje ir Kauno regione.

Direktorė Vaiė Urbelienė

ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS IR ŪKINĖS DALIES SKYRIUS

TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Caplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 48-2





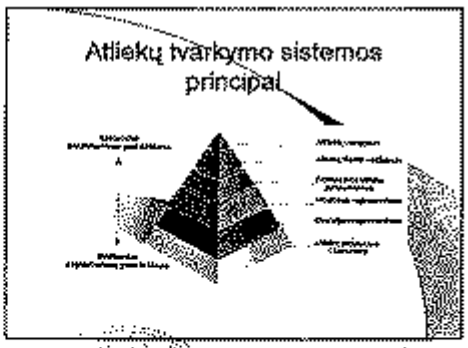

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA IR VERTINIMO SKYRIUS
TIKRA
Skyriaus vedėja
Aldona Čaplėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 49-3

Atliekų tvarkymas Lietuvoje

- Principų hierarchija (atliekų vengimas, naudojimas ir saugus jų šalinimas).
- Gamintojo atsakomybė už gaminio [illegible] aplinkai.
- Principas "Teršėjas moka".
- Artimumas ir pakankamumas.

Atliekų susidarymas Lietuvoje

- 1,3 mln. komunalinių atliekų kasmet
- Komunalinių atliekų kiekis vienam gyventojui ~400 kg

Atliekų tvarkymo būdai

- Šalinimas sąvartynuose
- Deginimas
- Perdirbimas

Sąvartynai

- Prieauus atliekos (buitinės atliekos, statybos atliekos, atsargos dujos, atsargi teršalai);
- Kelia grėsmę gyventojų sveikatai (pavojingos cheminės medžiagos, teršalai, kenksmingi dūmai, dulkės, kvapai, pavojai)

Sąvartynai teršia

Orą	Išskiria CO_2 (anglies dioksidas) ir CH_4 (metanas), nemalonius kvapus.
Vandenį	Pratekėdami, organinių junginių, [illegible] nitratų ir sunkiųjų metalų jonai užteršia požeminius vandenis.
Dirvožemį	Užima žemės plotą ir į dirvožemį prasiskverbia nuodingos medžiagos.

Sąvartynai Lietuvoje

- 850 – 1996 metais;
- 10 – 2009 metais.

TIKRA
Aldona Cepelienė
2011-08-23
1

Priedas Nr. 44-4





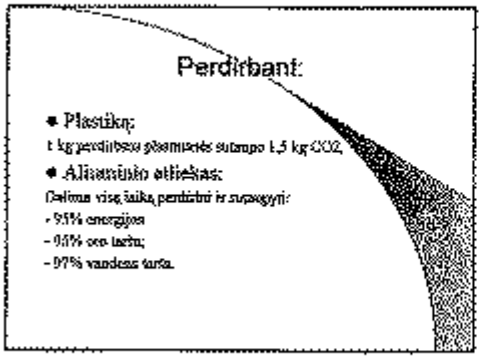



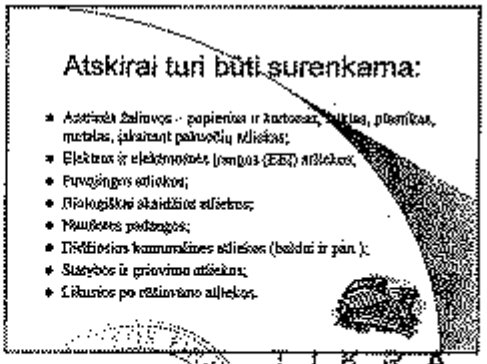

KOPIJA
Originalo teisingumą
ARTTEKLĖS, ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SKYRIUS
Aldona Čepėjienė
2011-06-23

Priedas Nr. 47-5









300
3

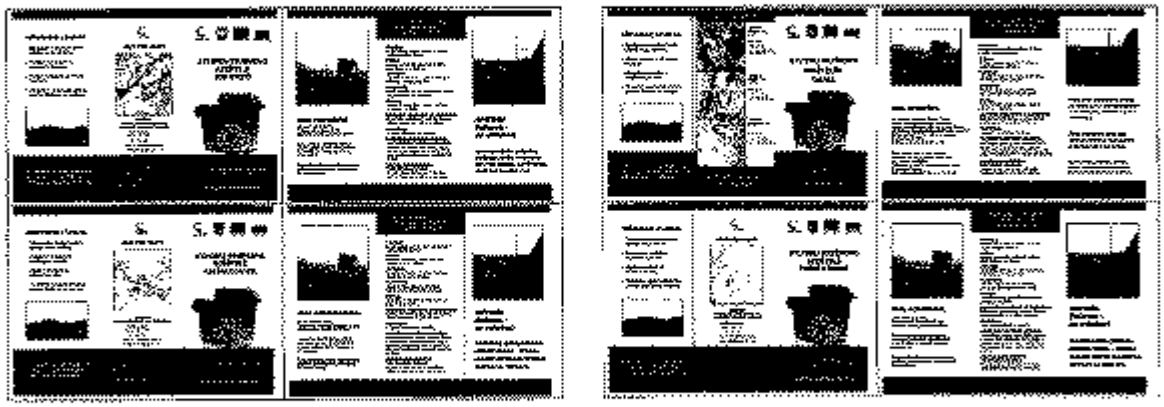

Priedas Nr. 50-1

Kauno RATC

ECAT

Mokymai savivaldybių aplinkosaugos specialistams
„Naujі iššūkiai atliekų tvarkyme“

2009-12-16
Kauno raj. Lapių sen.

PROGRAMA

9:00 - 9:30	Dalyvių registracija
9:30 – 10:00	Dabartinės aplinkosaugos politikos tendencijos, vartotojų ir visuomenės reikšmės didėjimas, darnaus vystimosi švietimas *Audronė Alijošiutė*
10:00 – 10:30	Aplinkosauginis švietimas – gyventojų elgsena ir poreikiai. Apklausų rezultatai *Vaiva Ramanauskienė*
10:30 – 10:50	Kavos pertrauka
10:50 – 12:00	Diskusija: Kauno regiono aplinkosauginio švietimo tikslai ir uždaviniai. *Trumpi dalyvaujančių savivaldybių atstovų pranešimai*
12:00 – 12:30	Finansavimo galimybės atliekų tvarkymo sektoriui *Audronė Alijošiutė*
12:30 – 13:00	Pietūs
13:00 - 14:00	Išvyka į regioninį Lapių sąvartyną
14:00 – 14:30	Būvio ciklo analizė kaip atliekų kiekio mažinimo priemonė *Audronė Alijošiutė*
14:30 – 15:15	Biologinių atliekų tvarkymo ES aktualijos – kas svarbu ES šalims narėms Lina Gelažienė
15:15 – 16:45	Diskusija apie aktualias Kauno regiono atliekų tvarkymo problemas

TIKRA
Aldona Čepliejienė

2011 -06- 23

365

1

Priedas Nr. 50-2

Kauno RATC

E C A T

Mokymai savivaldybių aplinkosaugos specialistams
„Nauji iššūkiai atliekų tvarkyme“

2009-12-16
Kauno raj. Lapių sen.

ATASKAITA

Mokymuose dalyvavo Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių rajonų savivaldybių administracijų ekologai, aplinkosaugos specialistai, Kauno RATC darbuotojai. Mokymus vedė VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro specialistės.

Buvo pristatytos aktualios darnaus vystimosi, aplinkosaugos politikos bei švietimo temos. Kalbėta apie finansavimo galimybes savivaldybėms bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui.

Diskusijos forma pasidalyta aplinkosauginio švietimo patirtimi. Aptartos efektyviausios ir nepasiteisinusios aplinkosauginio švietimo priemonės. Sutarta dalintis informacija ir Kauno regiono savivaldybių bei Kauno RATC poreikiais rengiant naujas programas.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje mažinamas sąvartynų skaičius ir Kauno regione lieka tik du regioniniai sąvartynai, kurių pajėgumo užteks pan. iki 2015 m., pristatytos alternatyvios sąvartynams atliekų tvarkymo galimybės.

Renginio dalyviai buvo supažindinti su VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro vykdomo projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, finansuojamo iš ES ir Valstybės fondo lėšų, įvykdytomis veiklomis, pasiektais rezultatais. Kadangi projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo daug bendraujama su Kauno regiono savivaldybių specialistais, išvykos į baigiamą rekonstruoti regioninį Lapių sąvartyną metu, jie turėjo progą pamatyti bei įvertinti vykdytų rekonstrukcijos darbų rezultatus bei pokyčius sąvartyne.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

TIKRA
Aldona Čepinėlienė
2011-06-23

2

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Kęstutis Balčiūnas 2010-05-11

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui Kęstučiui Balčiūnui

2010-05-19 Nr. S9-1183

Statybininkų g. 3, 50124 Kaunas

DĖL APSILANKYMO LAPIŲ SĄVARTYNE

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo, sporto ir Ekologo skyriai 2010 m. gegužės 27 d. 13 val. organizuoja rajono mokyklų aplinkosaugos „Moksleiviai – bendruomenei" konkurso veiksmo dieną (įvykdytų aplinkosaugos projektų pristatymas) Lapių pagrindinėje mokykloje. Viena iš dažnesnių moksleivių projektų temų yra atliekų rūšiavimas ir jų sutvarkymas, todėl aktualu būtų konkurso dalyviams parodyti regioninį sąvartyną.

Prašau Jus sudaryti sąlygas moksleivių grupei apie 15 val. apsilankyti šiųmų regioniniame sąvartyne ir susipažinti su sąvartyne vykdoma veikla.

Administracijos direktorius Vytas Bancevičius

TIKRA
Aldona Čepulėjienė
2011-08-23

Giedrė Juknienė, tel. (8 37) 30 55 66, el. p. ekologas@kss.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Savanorių pr. 371
49500 Kaunas

Tel. (8 37) 30 55 02
Faks. (8 37) 31 37 97
El. p. administracinis@kss.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188756386

365

Kauno regiono atliekų
tvarkymo sistema

Lapių regioninio savartyno
rekonstrukcija

Lapių regioninio savartyno
rekonstrukcija

Savartyno pjūvis


Savartyno pjūvis

Atliekų rūšiavimo svarba
Rūšiuoti reikia, nes...

Keletas faktų apie antrines žaliavas...
Stiklas:

Keletas faktų apie antrines žaliavas...
Plastikas:

Keletas faktų apie antrines žaliavas...
Popierius:

Keletas faktų apie antrines žaliavas...
Metalas:


TIKRA
2011 -06- 23

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

4.2.1. pav. Informacinis stendas prie Lapių regioninio sąvartyno.

4.2.2. pav. Atminimo lenta prie Lapių regioninio sąvartyno.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

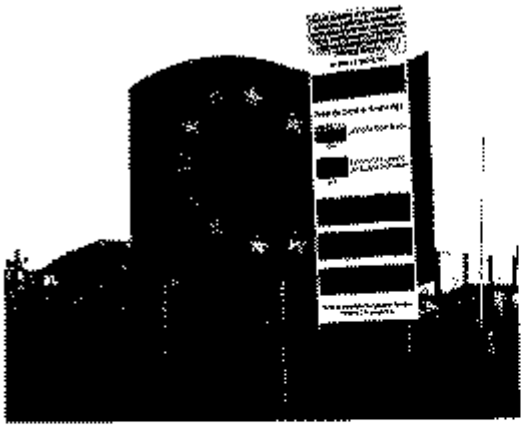

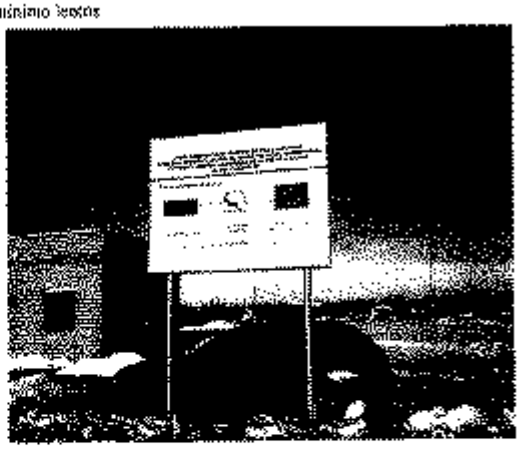

4.2.5. pav. Informacinis stendas prie Žabiškiškio regioninio sąvartyno.

4.2.6. pav. Atminimo lenta prie Žabiškiškio regioninio sąvartyno.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir aiškinimo lentos

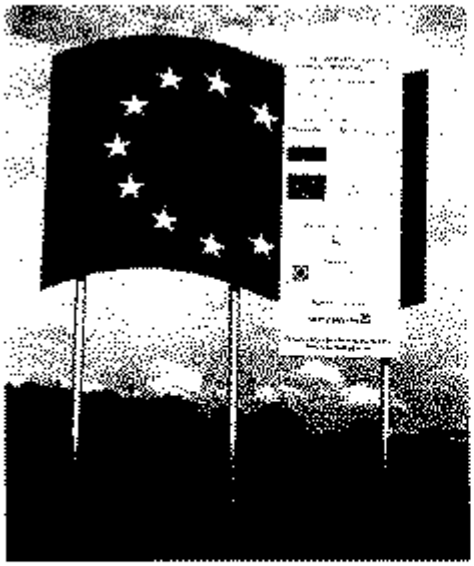

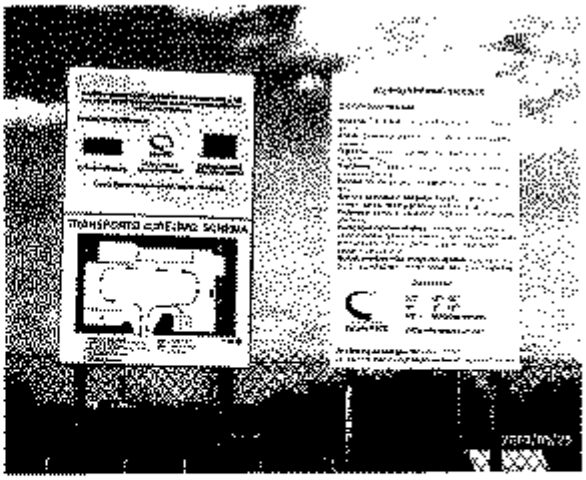

4.2.5. pav. Informacinis stendas prie atliekų priėmimo aikštelės Kaune Nemajūnų g. 15A.

4.2.6. pav. Aiškinimo lenta prie atliekų priėmimo aikštelės Kaune Nemajūnų g. 15A.

Priedas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

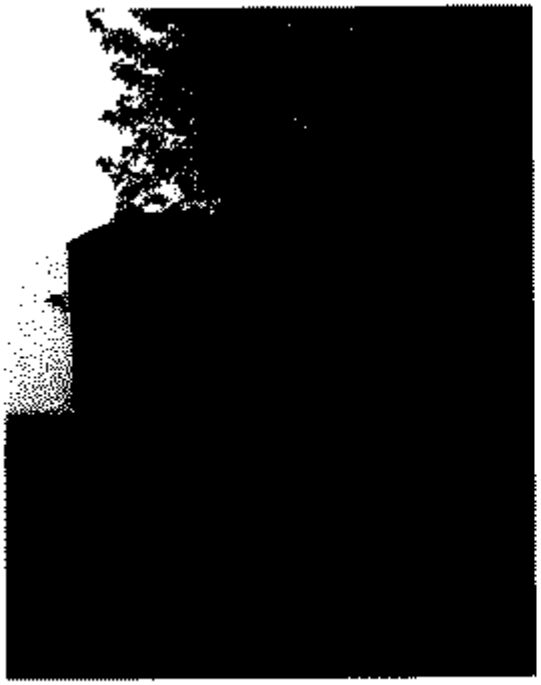

4.2.7. pav. Informacinis stendas prie atliekų priėmimo aikštelės Kaišiadorių raj. Andriušaičių km.

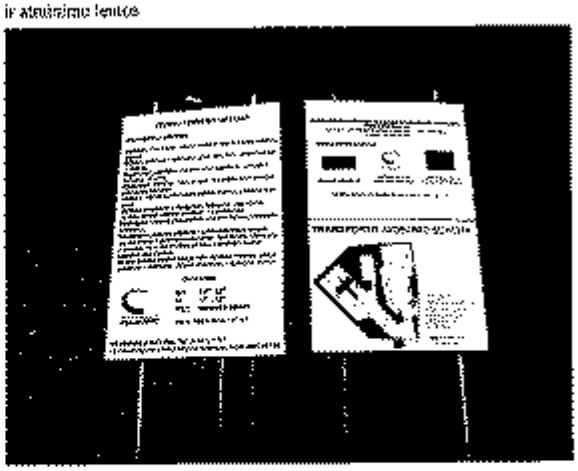



4.2.8. pav. Atminimo lenta prie atliekų priėmimo aikštelės Kaišiadorių raj. Andriušaičių km.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

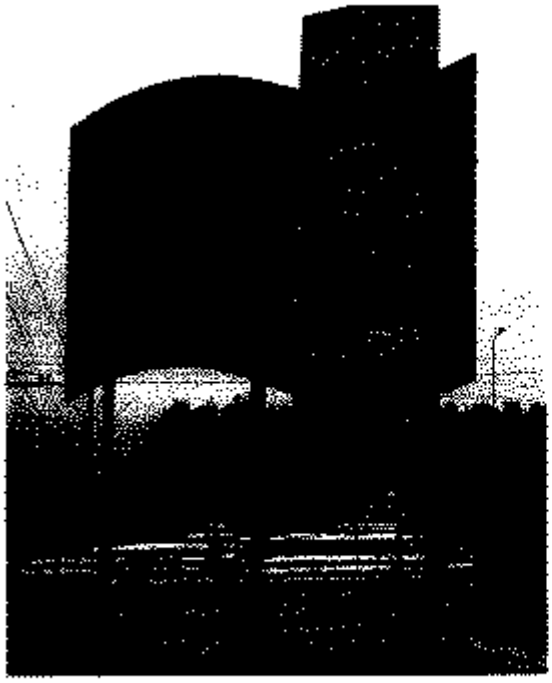

4.2.9 pav. Informacinis stendas prie atliekų priėmimo aikštelės Jonavos raj. Jonalaukio km.

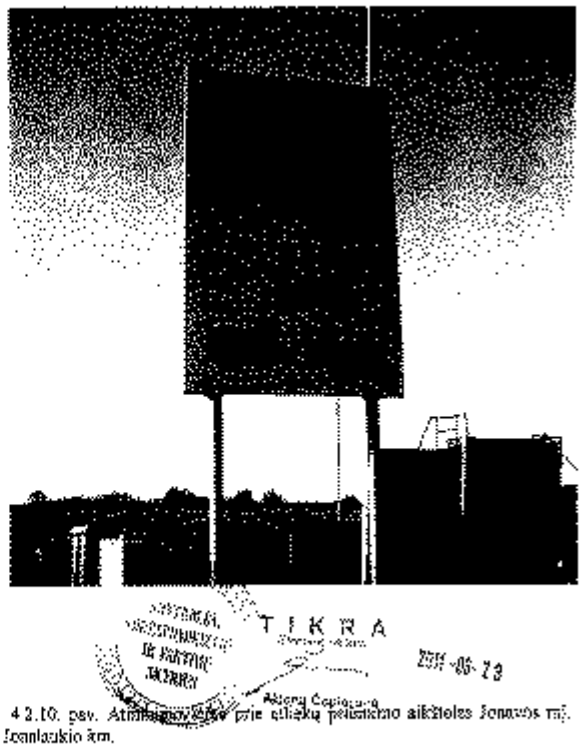

4.2.10. pav. Atminimo lenta prie atliekų priėmimo aikštelės Jonavos raj. Jonalaukio km.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

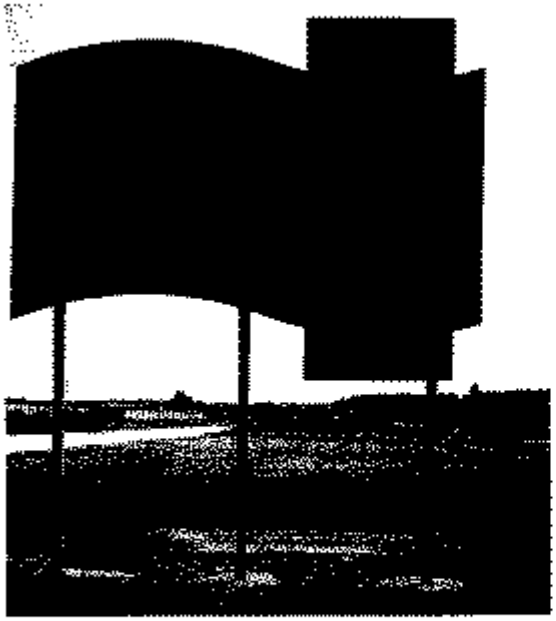

4.2.11. pav. Informacinis stendas prie atliekų priėmimo aikštelės Kėdainiuose Basanavičiaus g 97A.

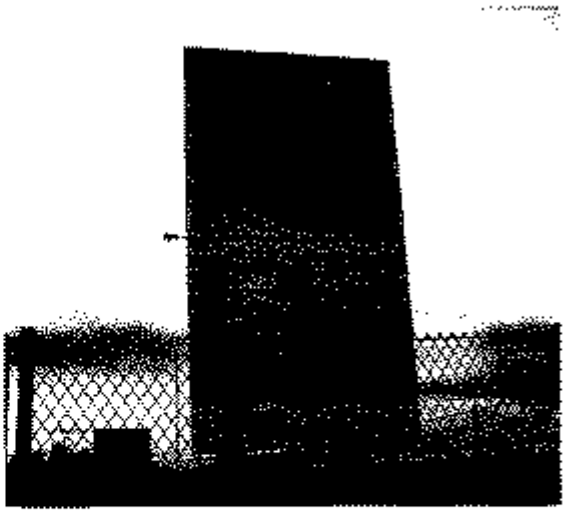

4.2.12. pav. Atminimo lenta prie atliekų priėmimo aikštelės Kėdainiuose Basanavičiaus g 97A.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

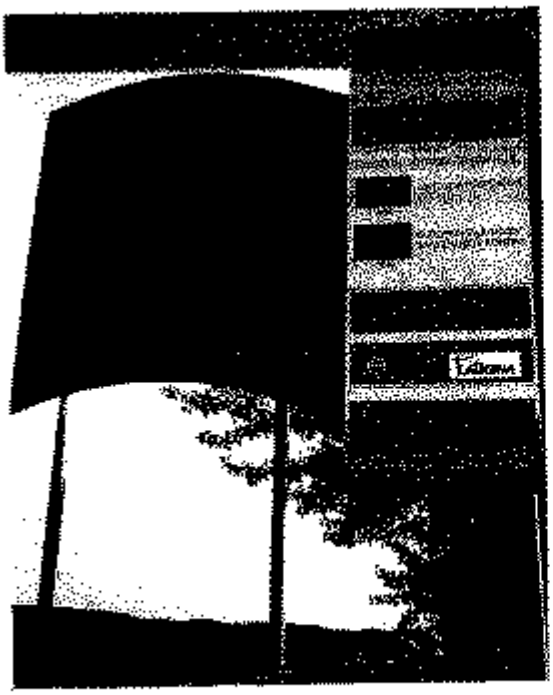

4.2.13. pav. Informacinis stendas prie atliekų priėmimo aikštelės Raseinių raj. Andriušaičių km.

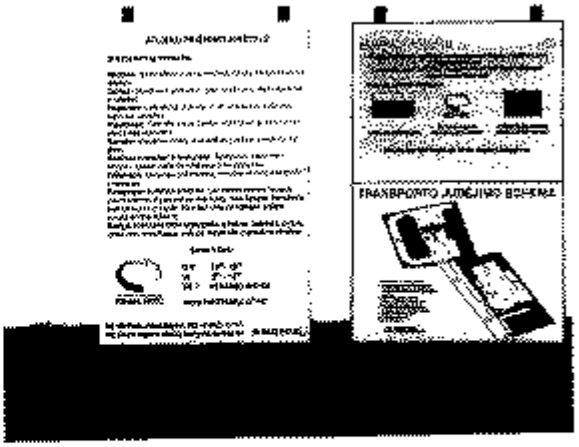

4.2.14. pav. Atminimo lenta prie atliekų priėmimo aikštelės Raseinių raj. Andriušaičių km.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos atnaujinimas"

4.2 Informaciniai stendai ir atminimo lentos

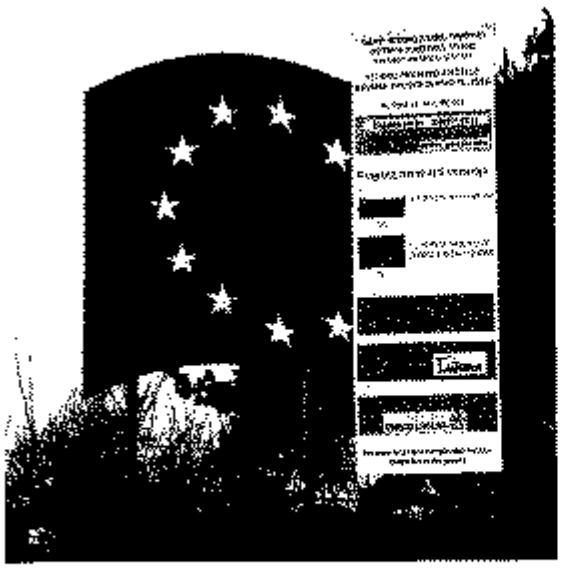

4.2.15 pav. Informacinis stendas prie atliekų priėmimo aikštelės Kauno m. Raudondvario pl. 155 D

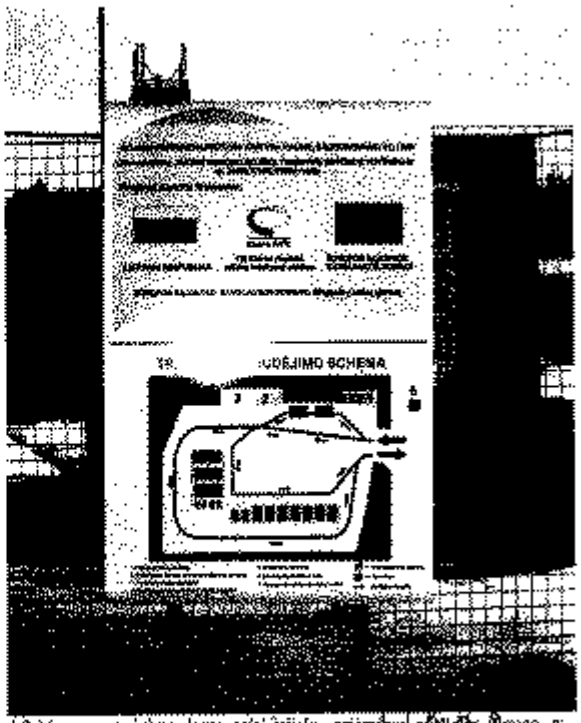

4.2.16 pav. atminimo lentos prie atliekų priėmimo aikštelės, Kauno m. Raudondvario pl. 155

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

4.2.17 pav. Informacinis stendas Kauno raj. prie užtvenio Mišėjių sąvartyno.

4.2.18. pav. Informacinis stendas Kauno raj. prie uždaromo Aukštosios Šančių sąvartyno

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2 Informaciniai stendai ir atminimo lentos

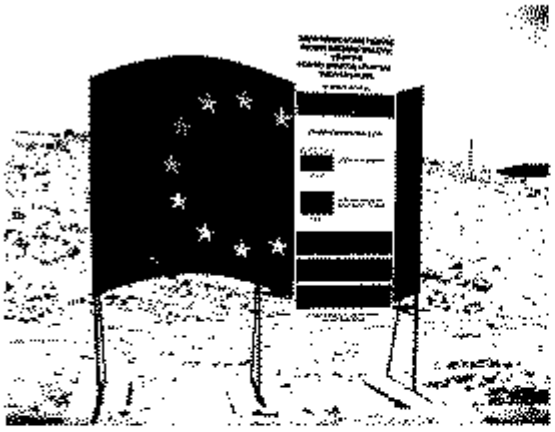

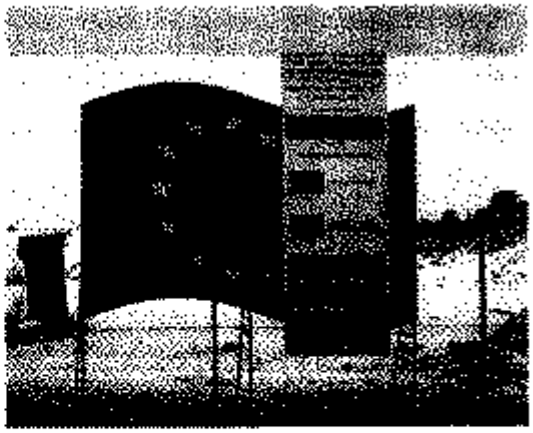

4.2.19. pav. Informacinis stendas Kaišiadorių raj. prie uždaromo Buginių savartyno

4.2.20. pav. Informacinis stendas Jonavos raj. prie uždaromo Jonalaukio savartyno.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atsisiųsimo taškas

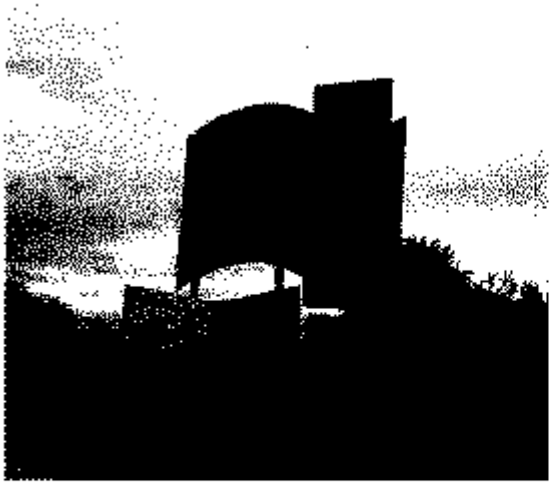

4.2.21. pav. Informacinis stendas Kėdainių m. prie užbaigtomo Bėkšių sąvartyno.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai iš atnaujinto lėmos

Kauno rajonas – savavaldybės vėdrynuose	
	
4.2.22. pav. Digrių – Digrių km. Alšėnų sen.	4.2.23. pav. Dervinių – Dervinių km. Babtų sen.

TIKRA
2011-08-23

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2 Informaciniai stendai ir atminimo lentos

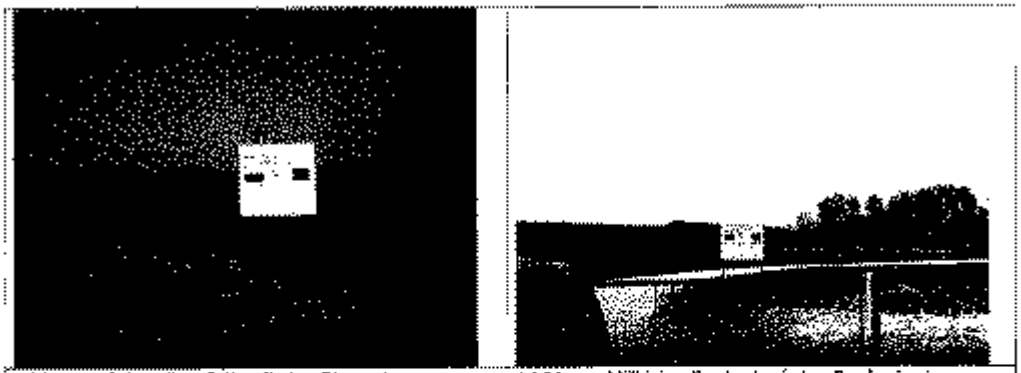

4.2.24. pav. Gaiženiškių – Gaiženiškių km. Raudondvario sen.

4.2.25. pav. Mikšinių – Raudondvario km. Raudondvario sen.

Kėdainių rajonas – saugotinų objektų žymėjimas



4.2.26. pav. Čiukiškių - Čiukiškių km. Josvainių sen.

4.2.27. pav. Cyzapolio - Cyzapolio km., Krakių sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

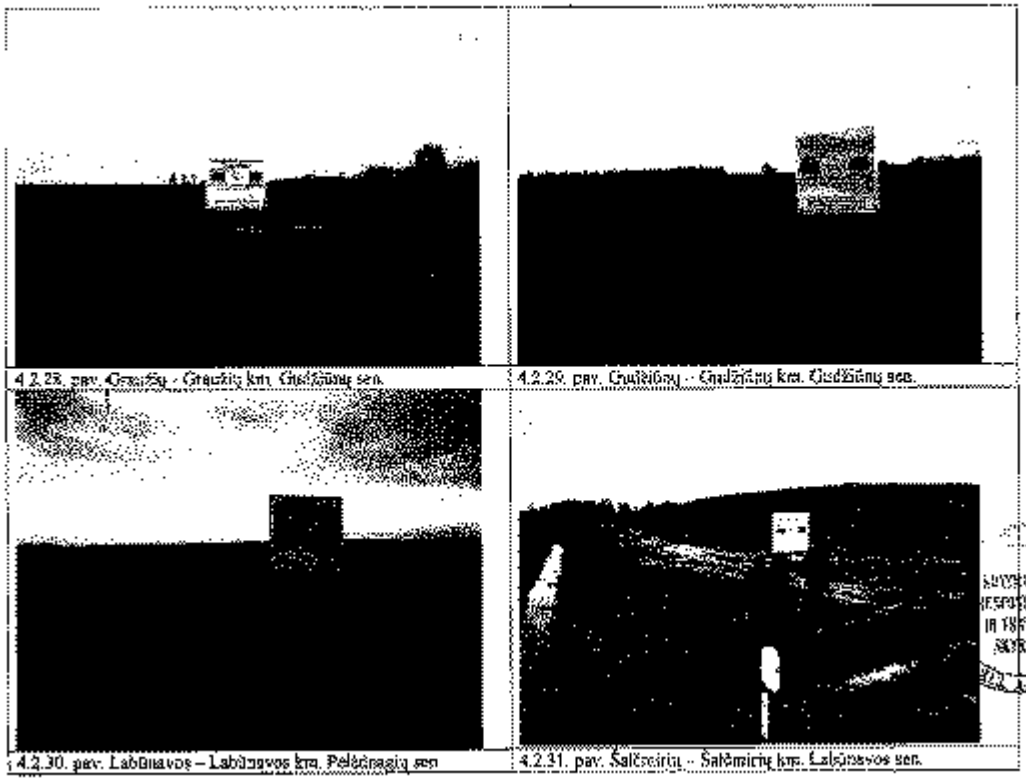

4.2.28. pav. Graužių – Graužių km. Gudžiūnų sen.

4.2.29. pav. Gudžiūnų – Gudžiūnų km. Gudžiūnų sen.

4.2.30. pav. Labūnavos – Labūnavos km. Pelėdnagių sen.

4.2.31. pav. Šalčeikių – Šalčeikių km. Lalėnavos sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai ženklai ir stendinio lentos

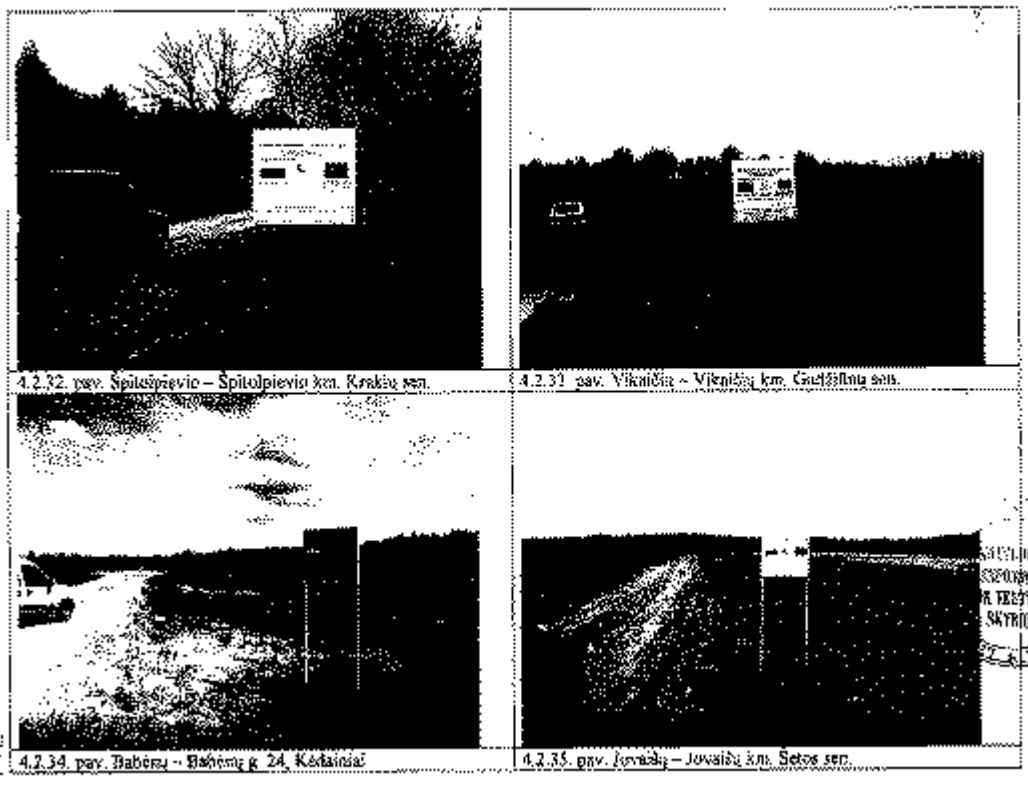

4.2.32. pav. Špitolpievio – Špitolpievio k.m. Kruokių sen.

4.2.33. pav. Vikničių – Vikničių k.m. Garliavos sen.

4.2.34. pav. Babėnų – Babėnų g. 24, Kėdainiai

4.2.35. pav. Jovaišių – Jovaišių k.m. Setos sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai saugomi iš atminimo lentos

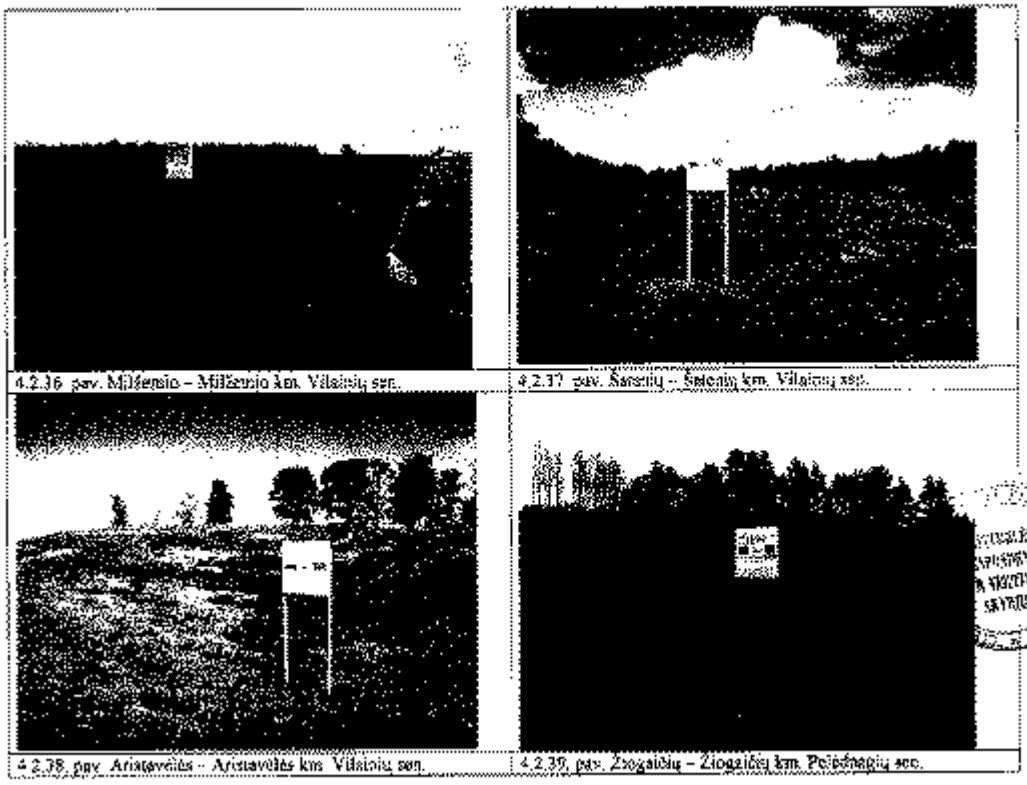

4.2.36 pav. Miliūnio – Miliūnio km. Vilainių sen.

4.2.37 pav. Šaraitų – Šaraitų km. Vilainių sen.

4.2.38 pav. Aristavelės – Aristavelės km. Vilainių sen.

4.2.39 pav. Žiogaičių – Žiogaičių km. Pelėdnagių sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

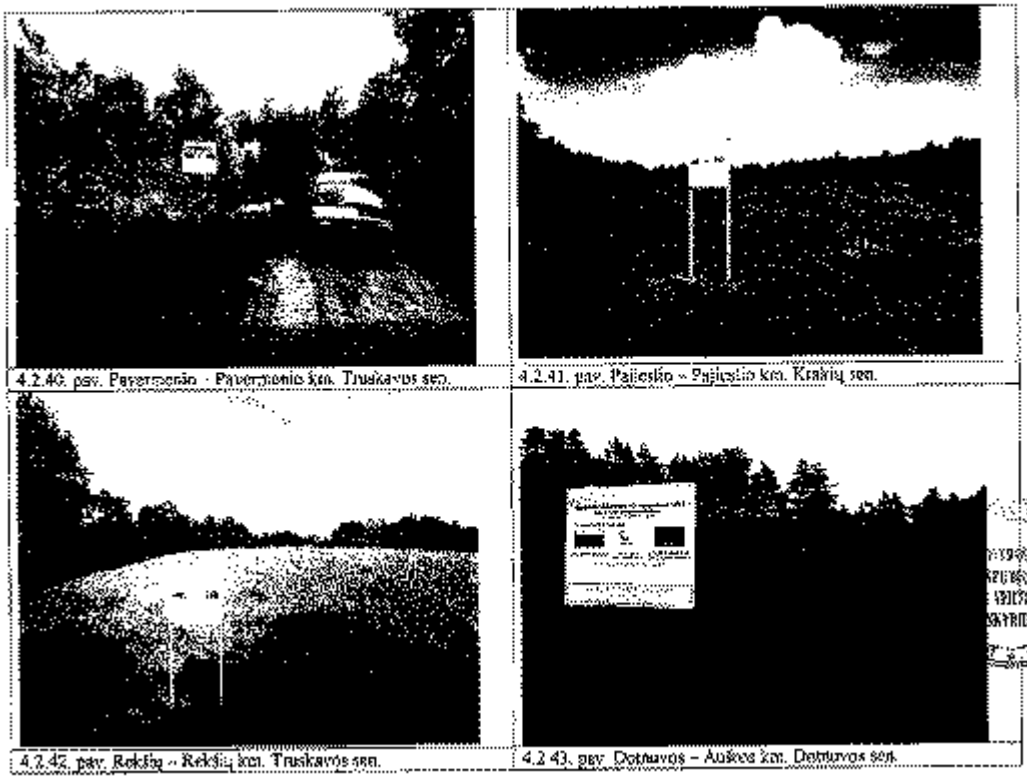

4.2.40. pav. Paversmenio - Paversmenio km. Truskavos sen.

4.2.41. pav. Paliesko – Paliesko km. Krakių sen.

4.2.42. pav. Reklių – Reklių km. Truskavos sen.

4.2.43. pav. Dotnuvos – Aušros km. Dotnuvos sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo lentos

Kaišiadorių rajonas – sąvartynų uždarymas

4.2.44. pav. Grinžių – Grinžių km. Žiežmarių sen.

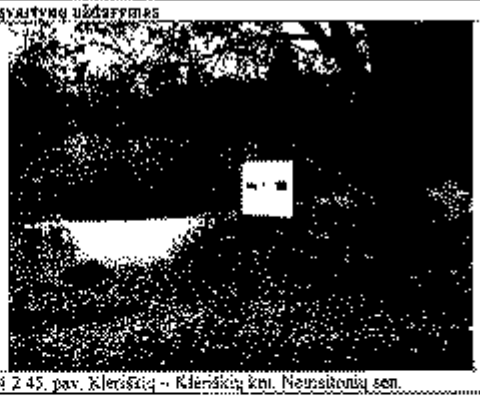

4.2.45. pav. Klerščių – Klerščių km. Neveronių sen.

4.2.46. pav. Kruonio – Kruonio mstl. Kruonis sen.



4.2.47. pav. Morkūnų – Morkūnų km. Kruonio sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo ženklai

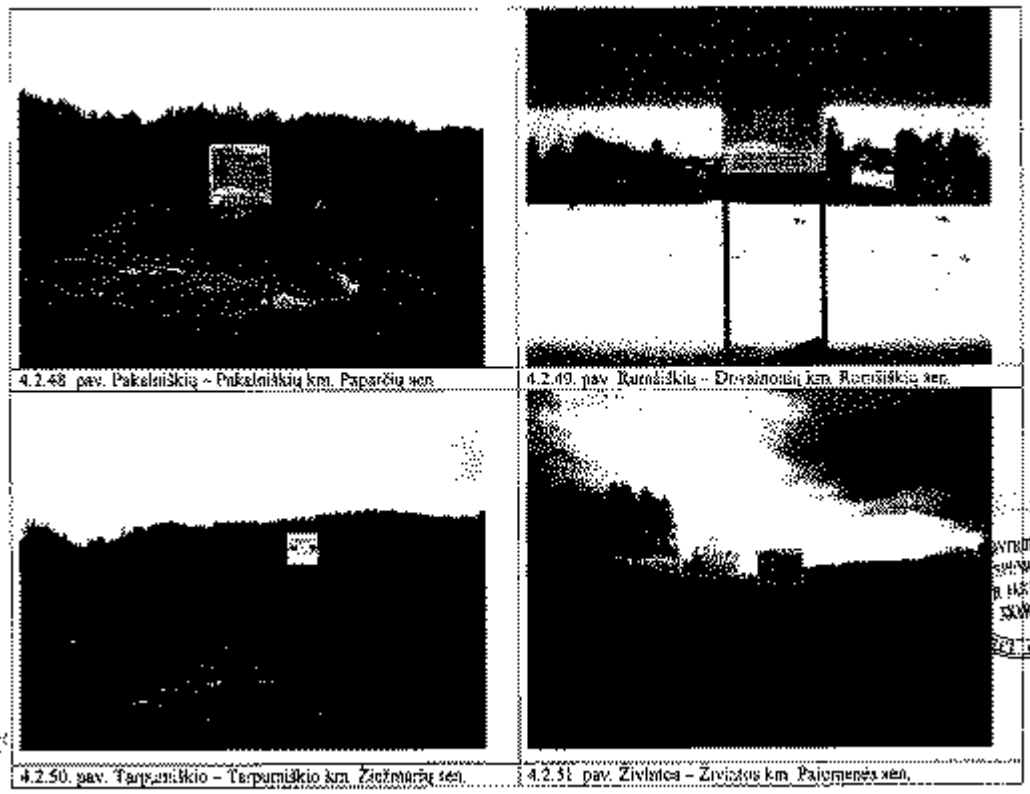

4.2.48 pav. Pakalniškių – Pakalniškių km. Paparčių ven.

4.2.49. pav. Ramiškių – Dvarainonių km. Ramiškių ven.

4.2.50. pav. Tarpumiškio – Tarpumiškio km. Žiežmarių ven.

4.2.51 pav. Zivilicos – Zivilicos km. Paįgmenės ven.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai iš atminimo lentos

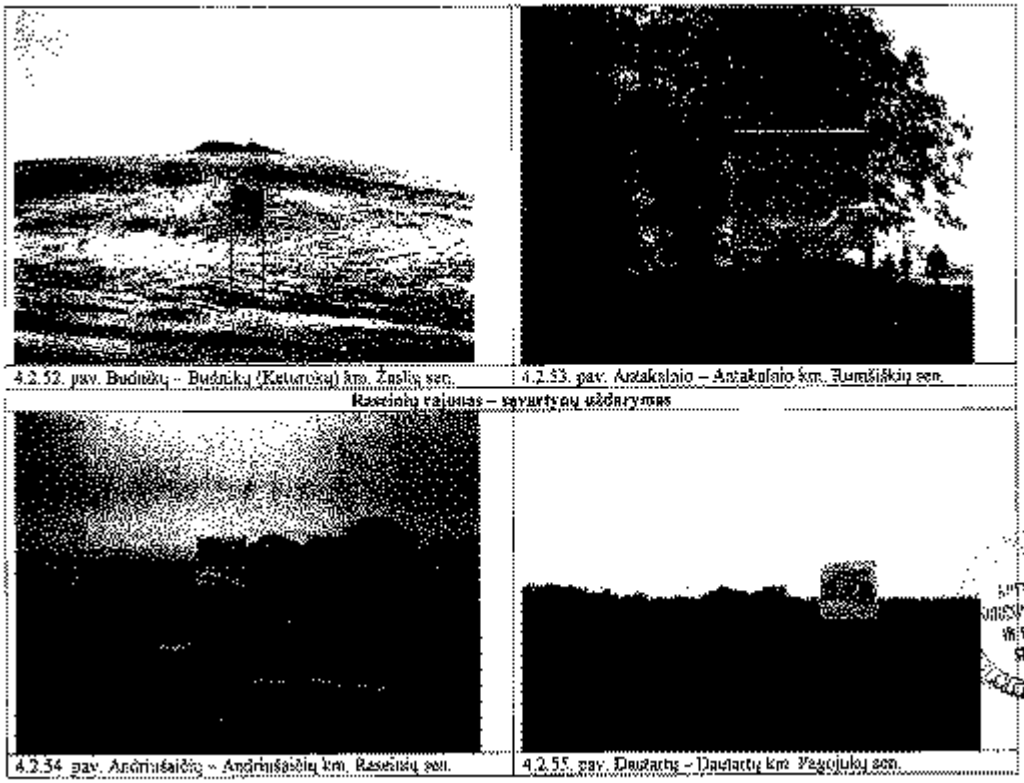

4.2.52. pav. Budnikų – Budnikų (Keturioko) km. Žaslių sen.

4.2.53. pav. Antakalnio – Antakalnio km. Rumšiškių sen.

Raseinių rajonas – sąvartynų uždarymas

4.2.54. pav. Andrimaičių – Andrimaičių km. Raseinių sen.

4.2.55. pav. Daugartų – Daugartų km. Vagojukų sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Įrengtos aikštelės ir atmosferos lentos

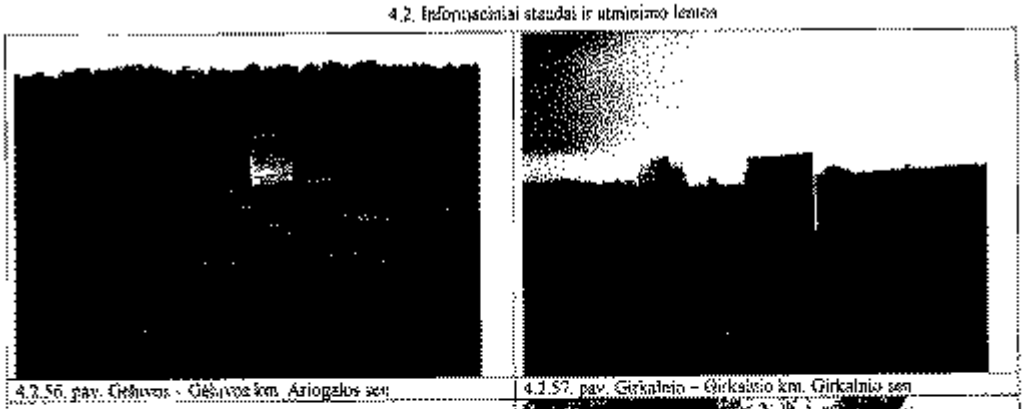

4.2.56. pav. Giršuvos – Giršuvos km. Ariogalos sen.

4.2.57. pav. Girkalnio – Girkalnio km. Girkalnio sen.

4.2.58. pav. Dirbonių – Dirbonių km. Betygalos sen.

4.2.59. pav. Jukniūnų – Rinkiškių km. Vidukiės sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2 Informaciniai stendai ir aplinkinis lomas

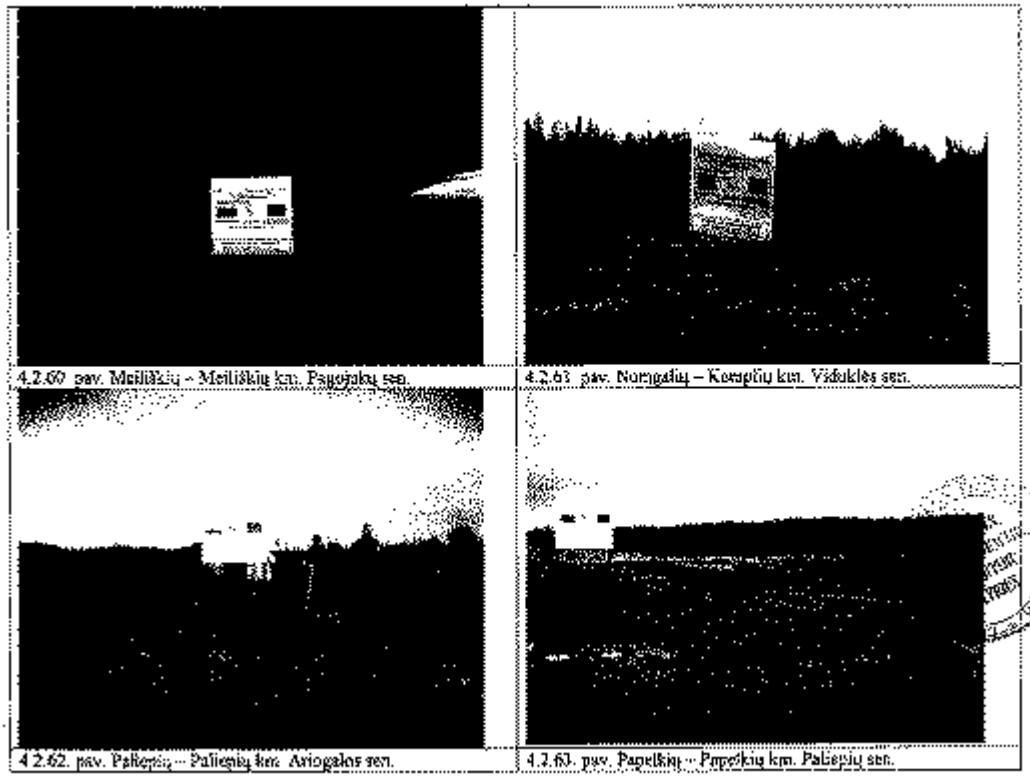

4.2.60 pav. Meiliškių – Meiliškių km. Papojakų sen.

4.2.61 pav. Norigalių – Kempių km. Vidiklės sen.

4.2.62. pav. Paliepių – Paliepių km. Ariogalos sen.

4.2.63. pav. Papelkių – Papelkių km. Paliepių sen.

KOPIJA
Atitinka originalą
2013-06-13

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2 Informaciniai stendai ir atminimo lentos

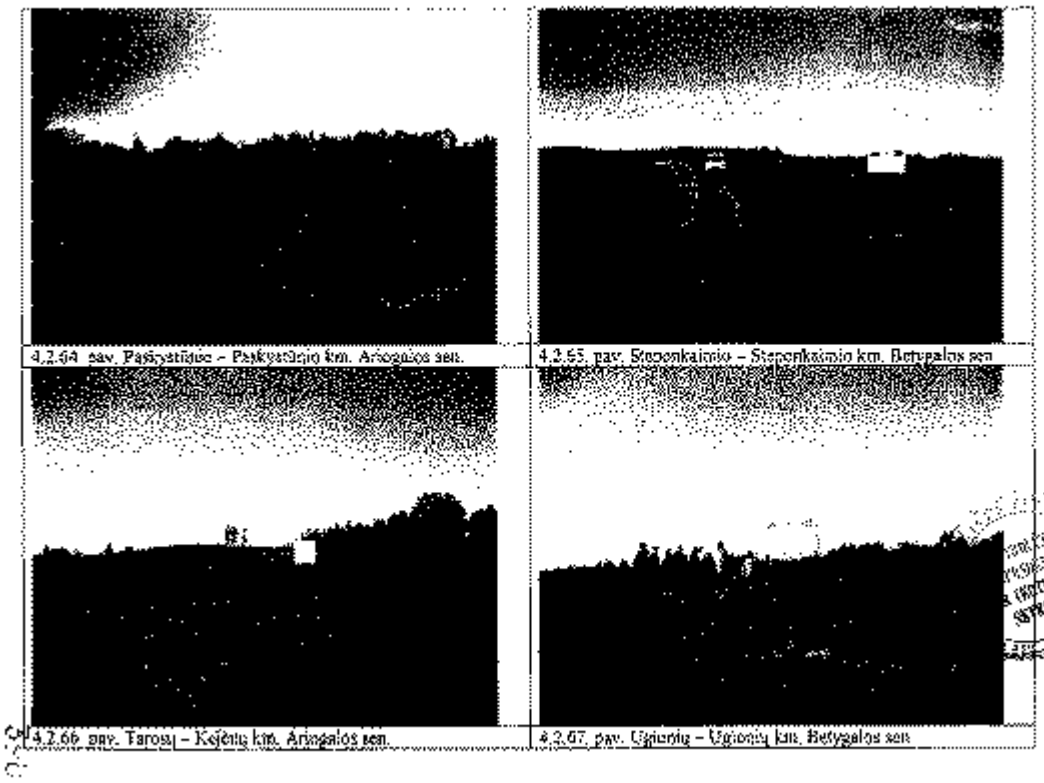

4.2.64 pav. Paškyrių kpv. – Paškyrių km. Ariogalos sen.

4.2.65 pav. Steponkalnio – Steponkalnio km. Betygalos sen.

4.2.66 pav. Tarosų – Kojėnų km. Ariogalos sen.

4.2.67 pav. Ugionių – Ugionių km. Betygalos sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2 Informaciniai stendai ir atminimo lentos

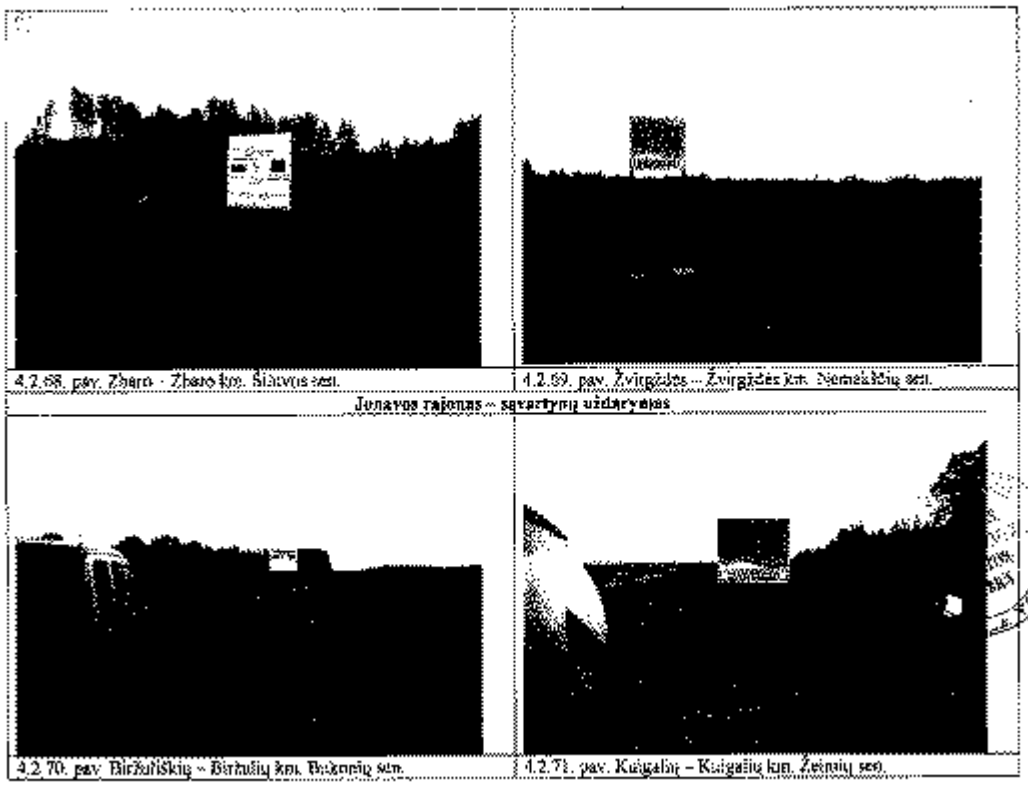

4.2.68. pav. Zbaro - Zbaro km. Šilavos sen.

4.2.69. pav. Žvirgždės – Žvirgždės km. Nemakščių sen.

Jonavos rajonas – savartynų uždarymas

4.2.70. pav. Birkuliškių – Birkulių km. Bukonių sen.

4.2.71. pav. Kulgalių – Kulgalių km. Žeimių sen.

Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informacinių stendų ir atminimo lentos

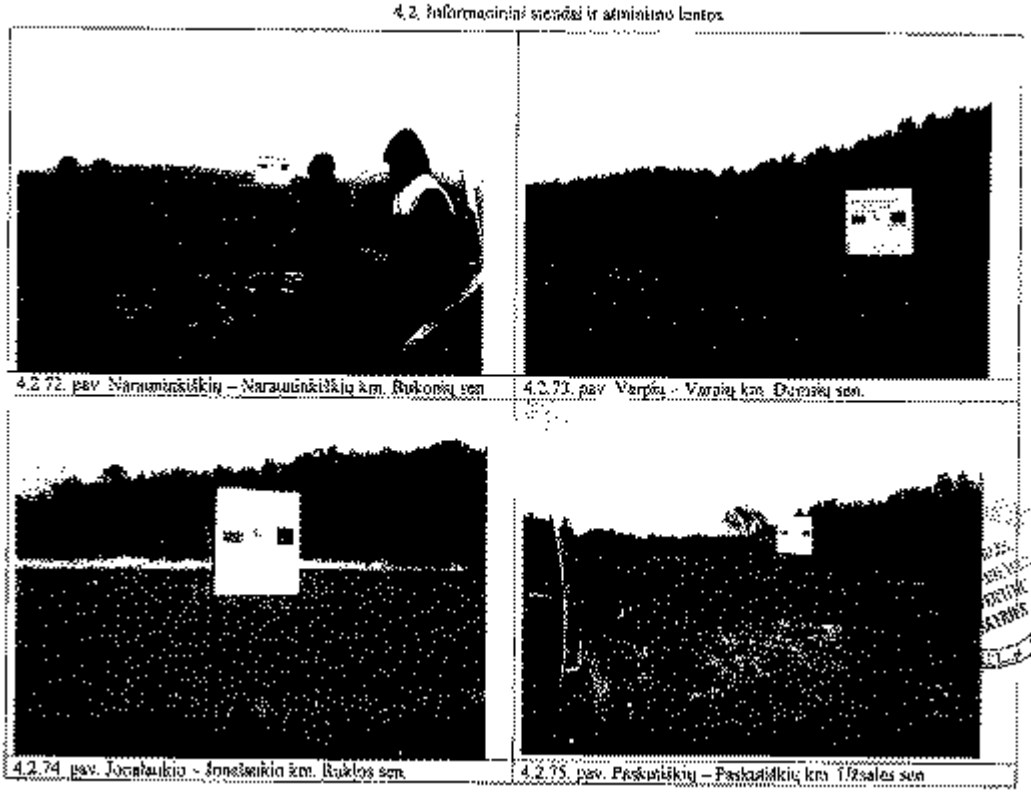

4.2.72. pav. Narmuniškių – Narmuniškių km. Rukonių sen.

4.2.73. pav. Varpių – Varpių km. Dumsių sen.

4.2.74. pav. Jonaitaikio – Jonaitaikio km. Ruklos sen.

4.2.75. pav. Paskutiškių – Paskutiškių km. Ilzsales sen.

Projektas „Kauso regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

4.2. Informaciniai stendai ir atminimo ženklai

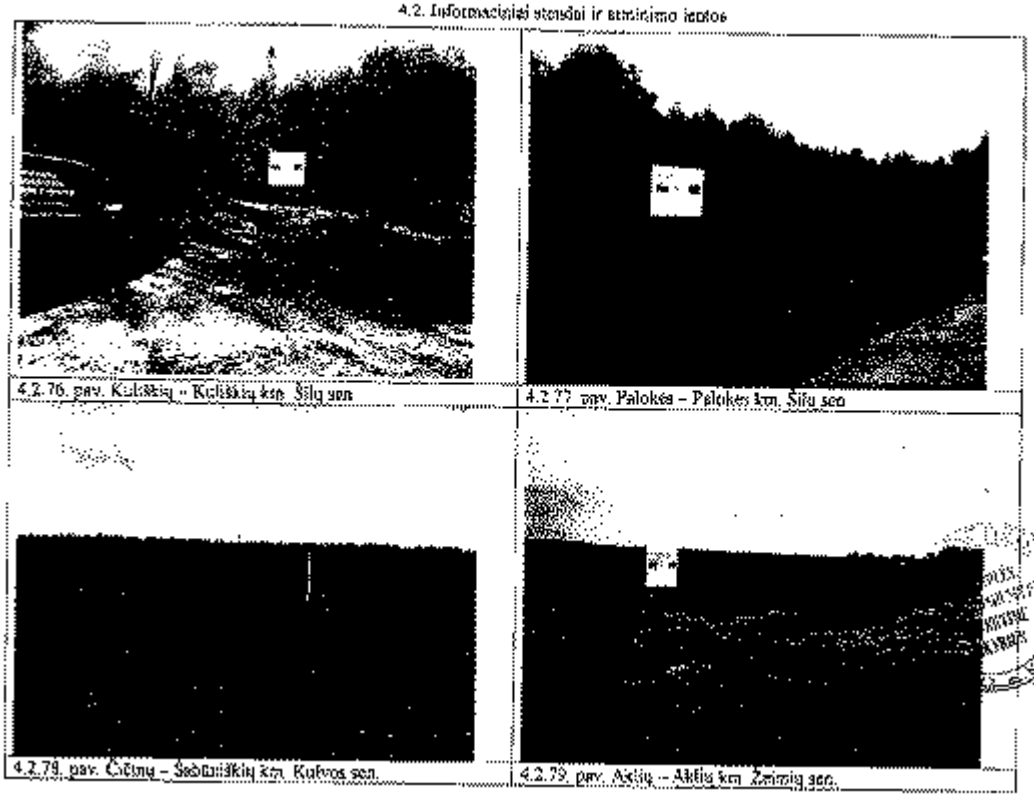

4.2.76. pav. Kuliškių – Kuliškių km. Šilų sen.

4.2.77. pav. Palokės – Palokės km. Šilų sen.

4.2.78. pav. Čičinų – Šeštuliškių km. Kulvos sen.

4.2.79. pav. Aklių – Aklių km. Žeimių sen.
