


„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9


Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Teikta




Įgyvendinta



• Laiku

Laukia įgyvendinimo

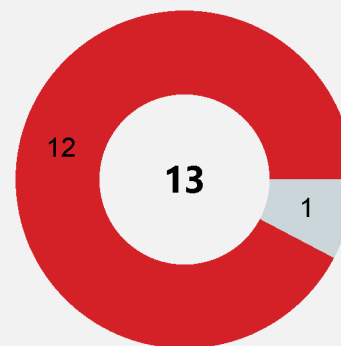

• Vėluoja
• Terminas nesibaigęs

Neįgyvendinta



„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
1 rekomendacija: Siekiant tobulinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės procesus, įtraukti centrinės valdžios įgyvendinamus šios partnerystės projektus į strateginio valdymo sistemą ir užtikrinti tinkamą atsiskaitymo už jų įgyvendinimą procesą.	2026-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Rodiklis

Projektų, kuriems įgyvendinti pasirinktas VPSP būdas ir pasiekta sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo stadija, dalis.

Pradinė reikšmė: 22 proc. (2022 m.)

Siektina reikšmė: 50 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius strateginio valdymo sistemą, Vyriausybės nustatytą viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarką ir finansų ministro nustatytą viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo ir šios partnerystės sutarčių vykdymo ataskaitų rengimo tvarką.	2024-12-31	Įgyvendinta	Laiku
--	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Rezultatas:

Įgyvendinant rekomendaciją, parengti ir patvirtinti šie teisės aktų projektai:

- Vyriausybės 2021-04-28 nutarimo Nr. 292 "Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo projektas, patvirtintas Vyriausybės 2024-08-14 nutarimu Nr. 673 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-04-28 nutarimo Nr. 292 "Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo".
- Vyriausybės 2009-11-11 nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo projektas, patvirtintas Vyriausybės 2024-12-04 nutarimu Nr. 1035 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-11 nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo".
- Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 įsakymo Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo eigą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024-12-11 įsakymu Nr. 1K-399 "Dėl finansų ministro 2009-12-24 Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo eigą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo".

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
2 rekomendacija: Siekiant tinkamai valdyti projektų rizikas – parengti viešojo subjekto rizikų valdymo planą, jį periodiškai atnaujinti ir fiksuoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės (Kauno rajono savivaldybė).	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: Kauno rajono savivaldybės administracija			
Polytis: Parengtas viešojo subjekto rizikų valdymo planas ir 2025 m. atnaujintas, fiksuotos pasireiškusios rizikos ir jų valdymo priemonės.			
Rodiklis VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Kauno rajono savivaldybė). Būsena: stebėseną baigta Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.) Faktinė reikšmė: 100 proc. (2025 m.)			
1 priemonė: Parengti ir patvirtinti VPSP projekto rizikų valdymo planą, jame nurodyti identifikuotas rizikas ir jų valdymo priemonės.	2024-12-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: Kauno rajono savivaldybės administracija			
Rezultatas: Parengtas ir patvirtintas rizikų valdymo planas, jame identifikuotos rizikos ir jų valdymo priemonės			
2 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti planą, registruoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės.	2025-12-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: Kauno rajono savivaldybės administracija			
Rezultatas: Siekiant tinkamai valdyti projektų rizikas, 2025 m. peržiūrėtas ir atnaujintas viešojo subjekto rizikų valdymo planas.			

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
3 rekomendacija: Siekiant tinkamai valdyti projektų rizikas – parengti viešojo subjekto rizikų valdymo planą, jį periodiškai atnaujinti ir fiksuoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės (Klaipėdos miesto savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Klaipėdos miesto savivaldybė).

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Parengti ir patvirtinti VPSP projekto rizikų valdymo planą, jame nurodyti identifikuotas rizikas ir jų valdymo priemonės.	2024-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
---	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rezultatas:

2 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti planą, registruoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės.	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
--	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rezultatas:

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p>4 rekomendacija: Siekiant tinkamai valdyti projektų rizikas – parengti viešojo subjekto rizikų valdymo planą, jį periodiškai atnaujinti ir fiksuoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės (Klaipėdos rajono savivaldybė).</p> <p>Atsakingas subjektas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija</p> <p>Rodiklis VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Klaipėdos rajono savivaldybė).</p> <p>Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)</p>	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<p>1 priemonė: Parengti ir patvirtinti VPSP projekto rizikų valdymo planą, jame nurodyti identifikuotas rizikas ir jų valdymo priemones.</p> <p>Atsakingas subjektas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija</p> <p>Rezultatas:</p>	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<p>2 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti planą, registruoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemones.</p> <p>Atsakingas subjektas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija</p> <p>Rezultatas:</p>	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
5 rekomendacija: Siekiant tinkamai valdyti projektų rizikas – parengti viešojo subjekto rizikų valdymo planą, jį periodiškai atnaujinti ir fiksuoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės (Palangos miesto savivaldybė).	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija

Polytis:

Palangos miesto savivaldybės administracija 2025-12-17 įsakymais Nr. A1-1668 ir Nr. A1-1669 patvirtino ir peržiūrėjo dviejų viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių 2025 metų rizikų valdymo planus:

- 2018-01-30 sutarties Nr. 9-K dėl projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje rekonstrukcija ir valdymas“;
- 2017-10-25 sutarties Nr. 282-K dėl projekto „Kempingo Nemirsetoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“.

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Palangos miesto savivaldybė).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

Faktinė reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Parengti ir patvirtinti VPSP projekto rizikų valdymo planą, jame nurodyti identifikuotas rizikas ir jų valdymo priemonės.	2024-12-31	Įgyvendinta	Laiku
---	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija

Rezultatas:

2024 m. gruodžio mėn. patvirtinti VPSP projektų (Palangos miesto koncertų salės ir kempingo) rizikų valdymo planai, kuriuose nurodytos identifikuotos rizikos ir jų valdymo priemonės.

2 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti planą, registruoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės.	2025-12-31	Įgyvendinta	Laiku
--	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p>Rezultatas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-12-17 įsakymu Nr. A1-1668 „Dėl 2025 metų viešojo ir privataus subjektų partnerystės 2018 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 9-K „Dėl projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43 rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo ir vykdymo“ rizikų valdymo plano patvirtinimo“ patvirtintas 2025 metų Viešojo ir privataus subjektų partnerystės 2018 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 9-K „Dėl projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43 rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas“ įgyvendinimo, koncesijos suteikimo ir vykdymo“ rizikų valdymo planas (pridedama) bei Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-12-17 įsakymu Nr. A1-1669 „Dėl 2025 metų viešojo ir privataus subjektų partnerystės 2017 m. spalio 25 d. sutarties Nr. 282-K „Dėl projekto „Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 331, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ įgyvendinimo, koncesijos suteikimo ir vykdymo“ rizikų valdymo plano patvirtinimo“ patvirtintas 2025 metų Viešojo ir privataus subjektų partnerystės 2017 m. spalio 25 d. sutarties Nr. 282-K „Dėl projekto „Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 331, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ įgyvendinimo, koncesijos suteikimo ir vykdymo“ rizikų valdymo planas.</p>			
<p>6 rekomendacija: Siekiant tinkamai valdyti projektų rizikas – parengti viešojo subjekto rizikų valdymo planą, jį periodiškai atnaujinti ir fiksuoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės (Zarasų rajono savivaldybė).</p>	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<p>Atsakingas subjektas: Zarasų rajono savivaldybės administracija</p>			
<p>Rodiklis VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Zarasų rajono savivaldybė). Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)</p>			
<p>1 priemonė: Parengti ir patvirtinti VPSP projekto rizikų valdymo planą, jame nurodyti identifiкуotas rizikas ir jų valdymo priemonės.</p>	2024-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<p>Atsakingas subjektas: Zarasų rajono savivaldybės administracija</p>			
<p>Rezultatas:</p>			
<p>2 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti planą, registruoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės.</p>	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<p>Atsakingas subjektas: Zarasų rajono savivaldybės administracija</p>			

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Rezultatas:

7 rekomendacija:

Siekiant tinkamai valdyti projektų rizikas – parengti viešojo subjekto rizikų valdymo planą, jį periodiškai atnaujinti ir fiksuoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba).

2026-03-31

Neįgyvendinta:
nebeaktuali
Stebėseną baigta

Netaikoma

Atsakingas subjektas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Pokytis:

Rekomendacija laikoma neaktuali, kadangi VPSP projektas nutrauktas. 2025-01-31 nutraukta sutartis tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, UAB „Picukė“, UAB „Palūšės turas“.

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė:

Parengti ir patvirtinti VPSP projekto rizikų valdymo planą, jame nurodyti identifikuotas rizikas ir jų valdymo priemonės.

2024-12-31

Neįgyvendinta:
nebeaktuali
Stebėseną baigta

Netaikoma

Atsakingas subjektas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Rezultatas:

2025-01-31 įsigaliojo 2017 m. birželio 27 d. sudarytos koncesijos sutarties tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, UAB „Picukė“, UAB „Palūšės turas“ nutraukimas.

2 priemonė:

Vykdyti projekto rizikų valdymo plano įgyvendinimą ir stebėseną: kasmet atnaujinti planą ir jame registruoti pasireiškusias rizikas bei jų valdymo priemonės.

2025-12-31

Neįgyvendinta:
nebeaktuali
Stebėseną baigta

Netaikoma

Atsakingas subjektas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p>Rezultatas: 2025-01-31 įsigaliojo 2017 m. birželio 27 d. sudarytos koncesijos sutarties tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, UAB „Picukė“, UAB „Palūšės turas“ nutraukimas.</p>			
<p>8 rekomendacija: Siekiant tinkamai valdyti projektų rizikas – parengti viešojo subjekto rizikų valdymo planą, jį periodiškai atnaujinti ir fiksuoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės (Policijos departamentas).</p>	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku
<p>Atsakingas subjektas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos</p> <p>Pokytis: 2024 m. parengtas viešojo subjekto rizikų valdymo planas ir 2025 m. atnaujintas, fiksuotos pasireiškusios rizikos ir jų valdymo priemonės.</p>			
<p>Rodiklis VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto prisiimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Policijos departamentas).</p> <p>Būsena: stebėseną baigta</p> <p>Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)</p> <p>Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)</p> <p>Faktinė reikšmė: 100 proc. (2025 m.)</p>			
<p>1 priemonė: Parengti ir patvirtinti VPSP projekto rizikų valdymo planą, jame nurodyti identifikuotas rizikas ir jų valdymo priemonės.</p>	2024-12-31	Įgyvendinta	Laiku
<p>Atsakingas subjektas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos</p> <p>Rezultatas: Policijos departamentas 2024 m. IV ketv. parengė ir patvirtino Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio vykdomų projektų rizikų valdymo planus.</p>			
<p>2 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti planą, registruoti pasireiškusias rizikas ir jų valdymo priemonės.</p>	2025-12-31	Įgyvendinta	Laiku
<p>Atsakingas subjektas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos</p>			

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p>Rezultatas: Iki 2025-12-31 buvo peržiūrėti Policijos departamento prie LR VRM įgyvendinamų visų viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų ankstesniais metais patvirtinti rizikų valdymo priemonių planai, įvertintas rizikų valdymas praėjusiais ataskaitiniais metais, taip pat nurodytos taikytos rizikų valdymo priemonės (jei buvo pasireiškusios rizikos). Visų projektų rizikų valdymo priemonių planai buvo peržiūrėti ir patvirtinti projektų priežiūros komisijų posėdžiuose ir (ar) nustatyta tvarka patvirtinti policijos įstaigos, įgaliotos įgyvendinti partnerystės projektą, viršininko įsakymu.</p>			
<p>9 rekomendacija: Siekiant užtikrinti, kad visos planuotos paslaugos būtų nuolat teikiamos ir jos atitiktų kokybės reikalavimus, – įgyvendinti rizikų valdymo plane numatytas priemonės (Kauno rajono savivaldybė).</p> <p>Atsakingas subjektas: Kauno rajono savivaldybės administracija</p> <p>Pokytis: Planuotos paslaugos atitinka kokybės reikalavimus - 2024 m. Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento, pateiktu aktu Nr.(2-12 4.80 Mr)PA-3200 patvirtino, kad nustatyti trūkumai yra pašalinti.2025 m. rizikų valdymo priemonės yra įgyvendintos.</p> <p>Rodiklis VPSP projektų dalis, kuriuose Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui atlikus patikrinimus, nenustatyta neatitiktųjų higienos normų reikalavimams (Kauno rajono savivaldybė). Būsena: stebėseną baigta Pradinė reikšmė: 100 proc. (2023 m.) Siektina reikšmė: 0 proc. (2025 m.) Faktinė reikšmė: 0 proc. (2024 m.)</p>	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku
<p>1 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos gauti informaciją iš privataus subjekto (koncesininko) apie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atliktus patikrinimus ir jų rezultatus. Esant nustatytoms neatitiktims, teikti įpareigojimą ir jo įgyvendinimo terminus dėl nustatytų neatitiktųjų pašalinimo.</p> <p>Atsakingas subjektas: Kauno rajono savivaldybės administracija</p> <p>Rezultatas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento pateiktame akte Nr.(2-12 4.80 Mr)PA-3200 patvirtinta, kad nustatyti trūkumai yra pašalinti.</p>	2024-12-31	Įgyvendinta	Laiku

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
10 rekomendacija: Siekiant užtikrinti, kad visos planuotos paslaugos būtų nuolat teikiamos ir jos atitiktų kokybės reikalavimus, – įgyvendinti rizikų valdymo plane numatytas priemones (Klaipėdos miesto savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
Atsakingas subjektas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija			
Rodiklis VPSP projektų dalis, kuriuose Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui atlikus patikrinimus, nenustatyta neatitiktųjų higienos normų reikalavimams (Klaipėdos miesto savivaldybė). Pradinė reikšmė: 100 proc. (2023 m.) Siektina reikšmė: 0 proc. (2025 m.)			
1 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos gauti informaciją iš privataus subjekto (koncesininko) apie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atliktus patikrinimus ir jų rezultatus. Esant nustatytoms neatitiktims, teikti įpareigojimą ir jo įgyvendinimo terminus dėl nustatytų neatitiktųjų pašalinimo.	2024-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
Atsakingas subjektas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija			
Rezultatas:			
11 rekomendacija: Siekiant užtikrinti, kad visos planuotos paslaugos būtų nuolat teikiamos ir jos atitiktų kokybės reikalavimus, – įgyvendinti rizikų valdymo plane numatytas priemones (Klaipėdos rajono savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
Atsakingas subjektas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			
Rodiklis VPSP projektų dalis, kuriuose Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui atlikus patikrinimus, nenustatyta neatitiktųjų higienos normų reikalavimams (Klaipėdos rajono savivaldybė). Pradinė reikšmė: 100 proc. (2024 m.) Siektina reikšmė: 0 proc. (2025 m.)			
1 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos gauti informaciją iš privataus subjekto (koncesininko) apie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atliktus patikrinimus ir jų rezultatus. Esant nustatytoms neatitiktims, teikti įpareigojimą ir jo įgyvendinimo terminus dėl nustatytų neatitiktųjų pašalinimo.	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p>Atsakingas subjektas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija</p> <p>Rezultatas:</p>			
<p>12 rekomendacija: Siekiant sudaryti sąlygas tinkamai valdyti projektų rizikas – užtikrinti infrastruktūros kūrimą laiku, periodišką turto būklės vertinimą ir kokybiškų paslaugų teikimą, parengti pavyzdinį viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų valdymo vadovą: jame nurodyti ką, kada ir kaip turi atlikti projekto vadovas.</p> <p>Atsakingas subjektas: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra</p> <p>Pokytis: 2024 m. gruodžio mėn. patvirtintos pavyzdinės viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių valdymo ir priežiūros taisyklės, kuriose nurodyta kokias funkcijas ir koku periodiškumu turi atlikti projekto vadovas.</p> <p>Rodiklis Patvirtintos pavyzdinės viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų sutarčių valdymo taisyklės.</p> <p>Būsena: stebėseną baigta</p> <p>Pradinė reikšmė: Nepatvirtintos pavyzdinės taisyklės (2023 m.)</p> <p>Siektina reikšmė: Patvirtintos pavyzdinės taisyklės (2024 m.)</p> <p>Faktinė reikšmė: Patvirtintos taisyklės. (2024 m.)</p>	2025-03-31	Įgyvendinta	Laiku
<p>1 priemonė: Patvirtintos pavyzdinės viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų sutarčių valdymo taisyklės, kuriose nurodyta, kokius veiksmus ir koku periodiškumu turi atlikti projekto vadovas (sutarties valdymo komanda).</p> <p>Atsakingas subjektas: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra</p> <p>Rezultatas: 2024 m. gruodžio mėn. patvirtintos pavyzdinės viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių valdymo ir priežiūros taisyklės, kuriose nurodyta kokias funkcijas ir koku periodiškumu turi atlikti projekto vadovas.</p>	2024-12-31	Įgyvendinta	Laiku

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
13 rekomendacija: Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Kauno rajono savivaldybė).	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Pokytis:

Parengtas ir 2024-12-12 patvirtintas VPSP projekto vidaus kontrolės ir rizikų valdymo tvarkos aprašas: numatyta, kokius veiksmus ir kokiu periodiškumu atlikti.

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Kauno rajono savivaldybė).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

Faktinė reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė:

Parengti ir patvirtinti VPSP projekto vidaus kontrolės ir rizikų valdymo tvarkos aprašą: numatyti, kokius veiksmus ir kokiu periodiškumu turi atlikti projekto vadovas (grupė/komanda).

2025-06-30

Įgyvendinta

Laiku

Atsakingas subjektas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Rezultatas:

2024-12-12 patvirtintas vidaus kontrolės ir rizikų valdymo tvarkos aprašas.

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
14 rekomendacija: Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Klaipėdos miesto savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Klaipėdos miesto savivaldybė).

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Parengti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų (koncesijos sutarčių) valdymo taisykles.	2025-09-01	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
---	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rezultatas:

15 rekomendacija: Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Klaipėdos rajono savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
--	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Klaipėdos rajono savivaldybė).

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Parengti ir patvirtinti VPSP projekto vidaus kontrolės ir rizikų valdymo tvarkos aprašą, numatant kokius veiksmus ir kokių periodiškumu turi atlikti projekto vadovas (grupė/komanda).	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
--	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Rezultatas:

16 rekomendacija:

Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Palangos miesto savivaldybė).

2026-03-31

Laukiama įgyvendinimo

Vėluoja

Atsakingas subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Palangos miesto savivaldybė).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

Faktinė reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė:

Atnaujinti Palangos miesto savivaldybės koncesijų suteikimo procedūrų organizavimo bei koncesijų sutarčių vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą; numatyti atsakingo darbuotojo (grupės/komandos) kontrolės veiksmus, jų periodiškumą.

2025-06-30

Laukiama įgyvendinimo

Vėluoja

Atsakingas subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija

Rezultatas:

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
17 rekomendacija: Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Zarasų rajono savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

Atsakingas subjektas:

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priiimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Zarasų rajono savivaldybė).

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Parengti ir patvirtinti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo tvarkos aprašą.	2025-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
--	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Rezultatas:

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
18 rekomendacija: Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba).	2026-03-31	Neįgyvendinta: nebeaktuali Stebėseną baigta	Netaikoma

Atsakingas subjektas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Polytis:

Rekomendacija laikoma neaktuali, kadangi VPSP projektas nutrauktas. 2025-01-31 nutraukta sutartis tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, UAB „Picukė“, UAB „Palūšės turas“.

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Parengti ir patvirtinti koncesijos sutarties vidaus kontrolės ir rizikų valdymo tvarkos aprašą.	2025-06-30	Neįgyvendinta: nebeaktuali Stebėseną baigta	Netaikoma
---	------------	---	-----------

Atsakingas subjektas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Rezultatas:

2025-01-31 įsigaliojo 2017 m. birželio 27 d. sudarytos koncesijos sutarties tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, UAB „Picukė“, UAB „Palūšės turas“ nutraukimas.

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
19 rekomendacija: Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Policijos departamentas).	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pokytis:

2024 m. patvirtintas aprašas, nustatantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių rizikų vertinimo, valdymo priemonių įgyvendinimo ir stebėsenos tvarką bei periodiškumą, 2025 m. patvirtintos taisyklės, apibrėžiančios projekto vadovo ir (ar) komandos veiksmus ir jų periodiškumą valdant ir prižiūrint partnerystės sutartis.

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kurių viešojo subjekto priimtoms rizikoms valdyti nustatytos jų valdymo priemonės (Policijos departamentas).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

Faktinė reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė:

Parengti ir patvirtinti VPSP projekto vidaus kontrolės ir rizikų valdymo tvarkos aprašą: numatyti, kokius veiksmus ir kokiu periodiškumu turi atlikti projekto vadovas (grupė/komanda).

2025-06-30

Įgyvendinta

Laiku

Atsakingas subjektas:

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Rezultatas:

- Lietuvos policijos generalinio komisaro 2024 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 5-V-890 patvirtintas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamų Viešojo ir privataus subjektų partnerystės sutarčių rizikų valdymo tvarkos aprašas, kuriame nustatyta, kaip ir kokiu periodiškumu turi būti vykdomas rizikų vertinimas, rizikų valdymo priemonių įgyvendinimas ir stebėseną.
- Lietuvos policijos generalinio komisaro 2025 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 5-V-647 patvirtintos Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamų Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių valdymo ir priežiūros taisyklėse, kuriose nustatyta, kokius veiksmus ir kokiu periodiškumu turi atlikti projekto vadovas ir (ar) grupė (komanda).

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
20 rekomendacija: Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Kauno miesto savivaldybė).	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Kauno miesto savivaldybės administracija

Pokytis:

2025 m. pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Kauno miesto savivaldybės koncesijų suteikimo procedūrų organizavimo bei koncesijų sutarčių vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas.

Rodiklis

Patvirtintos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų sutarčių valdymo taisyklės(aprašas) (Kauno miesto savivaldybė).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: Nepatvirtintos taisyklės (2023 m.)

Siektina reikšmė: Patvirtintos taisyklės (2025 m.)

Faktinė reikšmė: Patvirtintos taisyklės (2025 m.)

1 priemonė:

Atnaujinti Kauno m. savivaldybės koncesijų suteikimo procedūrų organizavimo bei koncesijų sutarčių vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą: numatyti atsakingo darbuotojo (grupės) kontrolės veiksmus, jų periodiškumą.

2025-06-30

Įgyvendinta

Laiku

Atsakingas subjektas:

Kauno miesto savivaldybės administracija

Rezultatas:

Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Kauno miesto savivaldybės koncesijų suteikimo procedūrų organizavimo bei koncesijų sutarčių vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas.

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
21 rekomendacija: Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus – numatyti vidaus kontrolės ir rizikų valdymo procedūras, jų periodiškumą ir atsekamumą (Sveikatos apsaugos ministerija).	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Polytis:

2025 m. liepos 4 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-618 patvirtintos 2017 m. balandžio 20 d. koncesijos sutarties Nr. S-78E "Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje" valdymo ir priežiūros taisyklės.

Rodiklis

Patvirtintos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų sutarčių valdymo taisyklės (aprašas) (Sveikatos apsaugos ministerija).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: Nepatvirtintos taisyklės (2023 m.)

Siektina reikšmė: Patvirtintos taisyklės (2025 m.)

Faktinė reikšmė: 2025 m. liepos 4 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-618 „Dėl 2017 m. balandžio 20 d. koncesijos sutarties Nr. S-78E "Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje" valdymo ir priežiūros komisijos sudarymo ir valdymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" buvo patvirtintos 2017 m. balandžio 20 d. koncesijos sutarties Nr. S-78E "Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje" valdymo ir priežiūros taisyklės. (2025 m.)

1 priemonė:

Vadovaujantis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros parengtomis pavyzdinėmis viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų sutarčių valdymo taisyklėmis, parengti koncesijos sutarties „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtros Santariškių medicinos įstaigų miestelyje viešosios darbų koncesijos suteikimo“ valdymo taisyklės.

2025-06-30

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Rezultatas:

2025 m. liepos 4 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-618 „Dėl 2017 m. balandžio 20 d. koncesijos sutarties Nr. S-78E "Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje" valdymo ir priežiūros komisijos sudarymo ir valdymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" buvo patvirtintos 2017 m. balandžio 20 d. koncesijos sutarties Nr. S-78E "Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje" valdymo ir priežiūros taisyklės.

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
22 rekomendacija: Siekiant užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės turtas būtų valdomas atsakingai ir rūpestingai – ne rečiau kaip kartą per metus atlikti turto būklės vertinimą ir užtikrinti jo rezultatų atsekamumą (Klaipėdos miesto savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kuriuos įgyvendinant ne rečiau kaip kartą per metus viešasis subjektas vertina turto būklę ir dokumentuoja vertinimo rezultatus (Klaipėdos miesto savivaldybė).

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos atlikti privačiam subjektui perduoto valdyti ir (ar) naujai sukurto turto būklės vertinimą ir fiksuoti rezultatus.	2024-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
---	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rezultatas:

23 rekomendacija: Siekiant užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės turtas būtų valdomas atsakingai ir rūpestingai – ne rečiau kaip kartą per metus atlikti turto būklės vertinimą ir užtikrinti jo rezultatų atsekamumą (Klaipėdos rajono savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
---	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kuriuos įgyvendinant ne rečiau kaip kartą per metus viešasis subjektas vertina turto būklę ir dokumentuoja vertinimo rezultatus (Klaipėdos rajono savivaldybė).

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos atlikti privačiam subjektui perduoto valdyti ir (ar) naujai sukurto turto būklės vertinimą ir fiksuoti rezultatus.	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
---	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Rezultatas:

24 rekomendacija:

Siekiant užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės turtas būtų valdomas atsakingai ir rūpestingai – ne rečiau kaip kartą per metus atlikti turto būklės vertinimą ir užtikrinti jo rezultatų atsekamumą (Palangos miesto savivaldybė).

2026-03-31

Įgyvendinta

Laiku

Atsakingas subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija

Pokytis:

Siekiant užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės turtas būtų valdomas atsakingai ir rūpestingai – ne rečiau kaip kartą per metus atliekamas turto būklės vertinimas. Už 2025 m. atlikti Palangos koncertų salės ir Kempingo turto būklės vertinimai ir fiksuoti rezultatai.

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kuriuos įgyvendinant ne rečiau kaip kartą per metus viešasis subjektas vertina turto būklę ir dokumentuoja vertinimo rezultatus (Palangos miesto savivaldybė).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

Faktinė reikšmė: 100 proc. (2026 m.)

1 priemonė:

Iki einamųjų metų pabaigos atlikti privačiam subjektui perduoto valdyti ir (ar) naujai sukurtu turto būklės vertinimą ir fiksuoti rezultatus.

2025-12-31

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija

Rezultatas:

Savivaldybė, siekdama, kad privačiam subjektui perduotas valdyti savivaldybės turtas būtų valdomas atsakingai ir rūpestingai, kasmet inicijuoja metinės inventurizacijos atlikimą, kurios metu tikrinami ne tik turto apskaitos objektai, vnt., bet vertinama ir turto būklė. Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas, savivaldybė sieks, kad periodiškai atliekamas privačiam subjektui perduoto turto vertinimas būtų ir fiksuojamas, t. y. daromos perduoto ilgalaikio turto nuotraukos, tikslu – per metų laikotarpį įvykdyti turto būklės pokyčiai atspindėtų vertinimo rezultatuose. Tai savivaldybei leistų lengviau įvertinti per metus (ar kitą laikotarpį) įvykusius turto būklės pokyčius ir vertinti ar privatus subjektas tinkamai prižiūri jam perduotą valdyti turtą ir, jei reikalinga, laiku imtis atitinkamų priemonių jam tvarkyti. Už 2025 m. atlikti Palangos koncertų salės ir Kempingo turto būklės vertinimai ir fiksuoti rezultatai.

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
25 rekomendacija: Siekiant užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės turtas būtų valdomas atsakingai ir rūpestingai – ne rečiau kaip kartą per metus atlikti turto būklės vertinimą ir užtikrinti jo rezultatų atsekamumą (Zarasų rajono savivaldybė).	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

Atsakingas subjektas:

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kuriuos įgyvendinant ne rečiau kaip kartą per metus viešasis subjektas vertina turto būklę ir dokumentuoja vertinimo rezultatus (Zarasų rajono savivaldybė).

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos atlikti privačiam subjektui perduoto valdyti ir (ar) naujai sukurto turto būklės vertinimą ir fiksuoti rezultatus.	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
---	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Rezultatas:

„VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-18 Nr. VAE-9

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 05:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
26 rekomendacija: Siekiant užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės turtas būtų valdomas atsakingai ir rūpestingai – ne rečiau kaip kartą per metus atlikti turto būklės vertinimą ir užtikrinti jo rezultatų atsekamumą (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba).	2026-03-31	Neįgyvendinta: nebeaktuali Stebėseną baigta	Netaikoma

Atsakingas subjektas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Polytis:

Rekomendacija laikoma neaktuali, kadangi VPSP projektas nutrauktas. 2025-01-31 nutraukta sutartis tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, UAB „Picukė“, UAB „Palūšės turas“.

Rodiklis

VPSP projektų dalis, kuriuos įgyvendinant ne rečiau kaip kartą per metus viešasis subjektas vertina turto būklę ir dokumentuoja vertinimo rezultatus (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba).

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2023 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Iki einamųjų metų pabaigos atlikti privačiam subjektui perduoto valdyti ir (ar) naujai sukurto turto būklės vertinimą ir fiksuoti rezultatus.	2025-12-31	Neįgyvendinta: nebeaktuali Stebėseną baigta	Netaikoma
---	------------	---	-----------

Atsakingas subjektas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Rezultatas:

2025-01-31 įsigaliojo 2017 m. birželio 27 d. sudarytos koncesijos sutarties tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, UAB „Picukė“, UAB „Palūšės turas“ nutraukimas.

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)
