


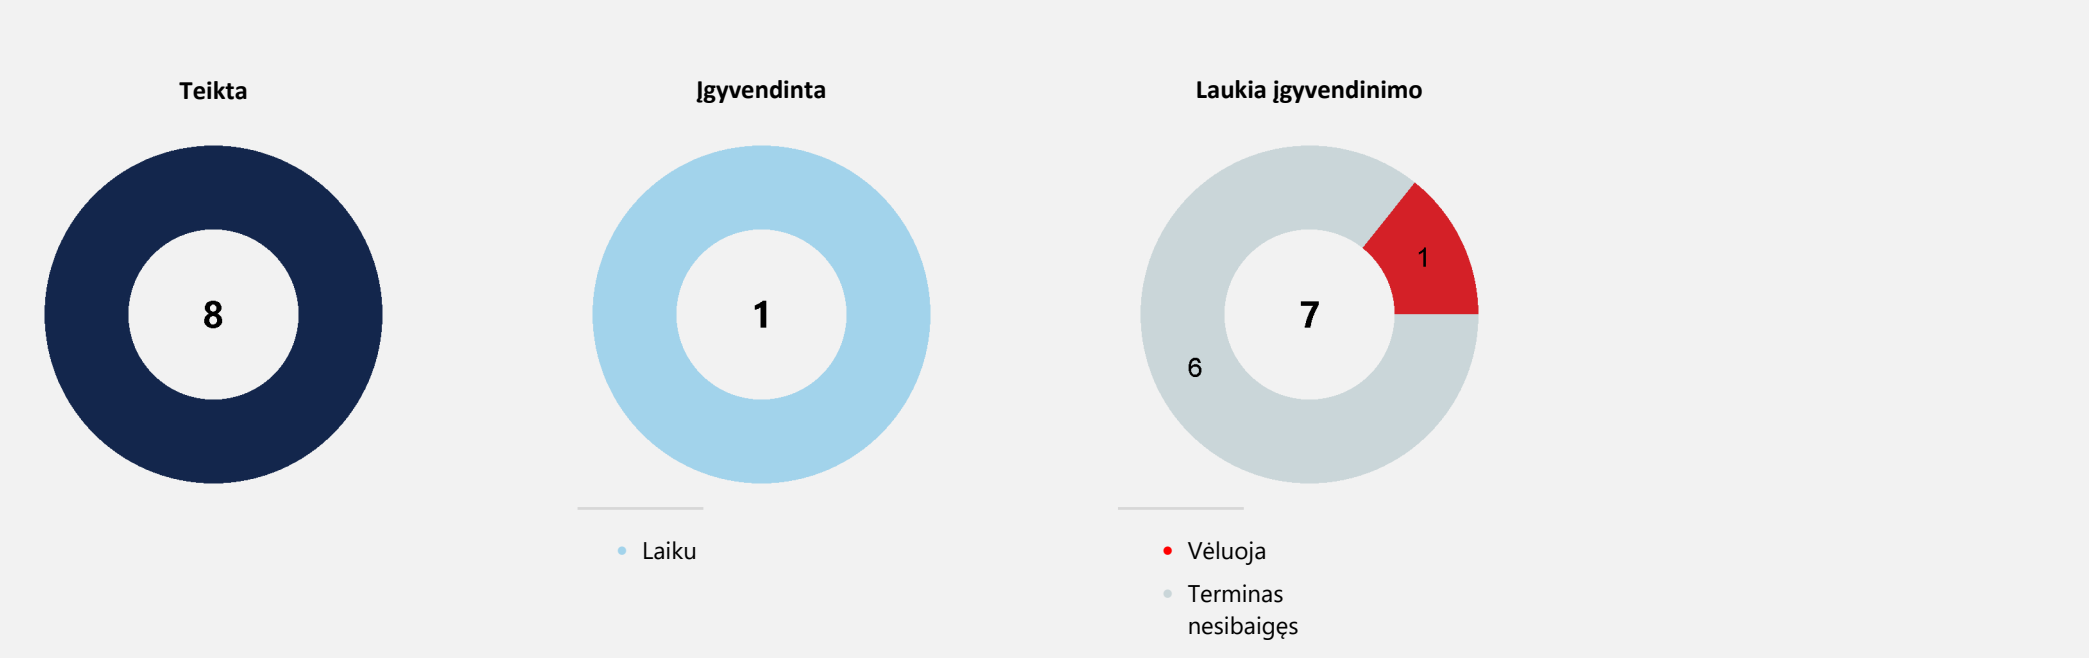

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
1 rekomendacija: Siekiant užtikrinti atsinaujinančių energetikos išteklių plėtrą, suderinti skirtinguose dokumentuose numatytus atsinaujinančių energetikos išteklių plėtros tikslus, pasirinkti ir patvirtinti priemones šiems tikslams pasiekti.	2026-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija			
Rodiklis Elektros energijos iš AEI dalis galutiniame elektros energijos suvartojime Pradinė reikšmė: 25,5 proc. (2022 m.) Siektina reikšmė: 38 proc. (2025 m.)			
1 priemonė: Atlikti visų AEI srities planavimo dokumentų tikslų peržiūrą ir suvienodinti planavimo dokumentuose ir AEI įstatyme numatytus AEI plėtros tikslus.	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-10-25 01:45
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Atsakingas subjektas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Rezultatas:

2 priemonė:
Peržiūrėti planavimo dokumentuose numatytas priemones AEI tikslams pasiekti.

Atsakingas subjektas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Rezultatas:

2025-12-31

Laukiama įgyvendinimo

Vėluoja

2 rekomendacija:
Siekiant didinti energetinį saugumą, užtikrinti visapusišką Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją su kontinentinės Europos tinklais, įgyvendinant visus sinchronizacijos veiksmų ir priemonių plane numatytus veiksmus.

2029-03-31

Laukiama įgyvendinimo

Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Rodiklis

Įgyvendintų sinchronizacijos veiksmų ir priemonių įgyvendinimo plane numatytų veiksmų dalis

Pradinė reikšmė: 47,2 proc. (2022 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2028 m.)

Faktinė reikšmė: 75,76 proc. (2025 m.)

1 priemonė:
Atnaujinti Sinchronizacijos veiksmų ir priemonių planą suskirstant veiksmus į reikalingus saugumui užtikrinti, stabilumui užtikrinti ir integracijai į ES vidaus rinką.

2024-12-31

Įgyvendinta

Laiku

Atsakingas subjektas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-10-25 01:45
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
Rezultatas: 2024 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino nutarimą Nr. 192, kuriuo pakeitė Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“. Patikslinto plano 7 punkte yra aiškiai priskirti Plano veiksmai ir priemonės pagal jų pobūdį – elektros energetikos sistemos saugumą didinantys, elektros energetikos sistemos stabilumą ir integraciją su Europos Sąjungos elektros energijos vidaus rinka užtikrinantys veiksmai ir priemonės. "7. Plano 9.1, 9.2, 9.3.2.1, 9.3.3, 9.3.9, 9.4.2, 9.4.3, 12.1.7.1 papunkčiuose yra nurodyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumą didinantys veiksmai ir priemonės, Plano 9.3.1, 9.3.2.2, 9.3.4–9.3.8, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5, 12.1.1–12.1.6, 12.1.7.2, 12.1.13 papunkčiuose – elektros energetikos sistemos stabilumą užtikrinantys veiksmai ir priemonės, Plano 9.4.6 ir 12.1.8–12.1.12 papunkčiuose – integraciją su Europos Sąjungos elektros energijos vidaus rinka užtikrinantys veiksmai ir priemonės. Plano 9.3 ir 12.1.7 papunkčiuose yra nurodyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumą didinantys ir elektros energetikos sistemos stabilumą užtikrinantys veiksmai ir priemonės, Plano 9.4 ir 12.1 papunkčiuose – ir integraciją su Europos Sąjungos elektros energijos vidaus rinka užtikrinantys veiksmai ir priemonės. Plano veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu Plane numatytu eiliškumu ir nurodytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai. "			
2 priemonė: Užtikrinti Sinchronizacijos veiksmų ir priemonių plane numatytų veiksmų įgyvendinimą nustatytais terminais.	2028-12-31	Iš dalies įgyvendinta	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija			
Rezultatas: - Nuo 2020 iki 2025 m. vasario mėn. Baltijos šalyse buvo įgyvendinti esminiai sinchronizacijos projektai, reikalingi užtikrinti sinchroninį susijungimą su kontinentinės Europos tinklais: o Valdymo sistemų parengimas: automatinio generacijos valdymo (AGV), dažnio stabilumo vertinimo valdymo sistema (FSAS) o Reikalingos infrastruktūros įrengimas: naujų jungčių statybą ir stiprinimas, skirstyklos ir TP, sinchroniniai kompensatoriai o 2023 m. atliktas Lietuvos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymas - 2024 m. liepos 16 d. Baltijos šalių operatoriai informavo BRELL sutarties šalis apie BRELL sutarties nepratęsimą ir atsijungimą nuo IPS/ UPS sinchroninės zonos 2025 m. vasario mėn. - 2024 m. lapkričio 26 d. ENTSO-E RGCE patvirtino Baltijos šalių pasirengimą susijungti sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais 2025 m. vasario mėn. - 2025 m. vasario 8 d. 09:09 val. Baltijos šalių elektros energetikos sistemos galutinai atsijungė nuo IPS/UPS sistemos ir pradėjo veikti izoliuotu režimu, kurio metu buvo atlikti izoliuoto darbo bandymai - 2025 m. vasario 9 d. 14:05 val. Baltijos šalių elektros energetikos sistemos sėkmingai pradėjo veikti nuolatinio sinchroninio režimu su kontinentinės Europos tinklais.			

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita2026-10-25 01:45

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
3 rekomendacija: Siekiant sparčiau įvykdyti elektros energijos perdavimo infrastruktūros projektus, tobulinti projektų įgyvendinimo rizikų valdymo procesą taip, kad šie projektai būtų įgyvendinami suplanuotais terminais.	2027-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:

LITGRID AB

Rodiklis

Planuotais terminais įgyvendintų elektros perdavimo infrastruktūros projektų dalis

Pradinė reikšmė: 62,5 proc. (2022 m.)

Siektina reikšmė: 75 proc. (2026 m.)

Faktinė reikšmė: 70,4 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Peržiūrėti ir atnaujinti projektų įgyvendinimo ir rizikų vertinimo procesus.	2025-12-31	Įgyvendinta	Laiku
--	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

LITGRID AB

Rezultatas:

Įgyvendindama rekomendaciją, bendrovė 2023–2024 m. atliko projektų vėlavimo priežasčių analizę, apklausdama tiek darbuotojus, tiek rangovus. Nustačiusi vėlavimo priežastis, bendrovė identifikavo tobulintinas sritis ir 2024 m. vykdė atitinkamus veiksmus jų gerinimui.

LITGRID AB per 2024-2025 m. peržiūrėjo, parengė ir atnaujino pagrindinius su projektų valdymo procesus:

- 1.VP7.01 Idėjos projektui analizė ir organizavimas
- 2. VP7.02 Portfelio valdymas
- 3. VP7.04 Projekto inicijavimas
- 4. VP7.06 Projekto planavimas
- 5. VP7.07 Projekto įgyvendinimas
- 6. VP7.08 Projekto pokyčių valdymas
- 7. VP7.09 Projekto užbaigimas
- 8. VP7.10 Projekto naudų vertinimas
- 9. VP7.11 Projekto stabdymas nutraukimas
- 10. VP7.13 Projektų įgyvendinimo kontrolė
- 11. VP7.15 Projektų dokumentacijos valdymas
- 12. VP7.17 Dalyvavimas kitų organizacijų projektuose

Rizikų vertinimo dalis apibrėžta procese VP7.07 Projekto įgyvendinimas. Taip pat projektų rizikų aptarimas yra įtrauktas į proceso VP7.02 Portfelio valdymas subprocesą „VP7.02.02 Portfelio stebėseną ir kontrolę“.

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita2026-10-25 01:45

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
4 rekomendacija: Siekiant patikimesnio elektros energijos skirstymo, operatyviau atnaujinti pagrindinius elektros energijos skirstymo infrastruktūros tinklo elementus.	2028-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Rodiklis

Pagrindinių elektros energetikos skirstymo infrastruktūros tinklo elementų turto grupių, kuriose daugiau kaip 40 proc. turto vienetų viršiją nustatytą naudingo tarnavimo laiką, dalis

Pradinė reikšmė: 50 proc. (2022 m.)

Siektina reikšmė: 42 proc. (2027 m.)

1 priemonė: Peržiūrėti tinklų investicijų reitingavimo metodikas siekiant, kad svarbiausia infrastruktūra būtų atnaujinama sparčiau.	2024-12-31	Įgyvendinta	Laiku
--	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Rezultatas:

Įgyvendinant priemonę buvo atnaujintas 0,4 – 35 KV elektros tinklo objektų reitingavimo proceso aprašas, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra „Reitingavimo metodika ir principai 0,4 – 10 KV tinklo patikimumo gerinimui“. Metodika papildyta kriterijumi, vertinančiu objekto elementų (atramos, kabelio segmentai) amžių.

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-10-25 01:45

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
5 rekomendacija: Siekiant patikimesnio elektros energijos skirstymo, mažinti ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinę trukmę ir dažnumą	2027-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Rodiklis

Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis (SAIDI)

Pradinė reikšmė: 98,5 min. (2022 m.)

Siektina reikšmė: 94,06 min. (2026 m.)

Rodiklis

Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklis (SAIFI)

Pradinė reikšmė: 1,13 kartai vienam vartotojui (2022 m.)

Siektina reikšmė: 1,06 kartai vienam vartotojui (2026 m.)

1 priemonė: Įvertinti vykdomų priemonių, užtikrinančių elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės trukmės ir dažnumo mažėjimo efektyvumą.	2027-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
--	------------	-----------------------	---------------------

Atsakingas subjektas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Rezultatas:

2 priemonė: Atlikto vertinimo pagrindu parengti programą ar numatyti veiksmus, užtikrinančius elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės trukmės ir dažnumo mažėjimą.	2027-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
--	------------	-----------------------	---------------------

Atsakingas subjektas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Rezultatas:

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-10-25 01:45
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
6 rekomendacija: Siekiant patikimesnio elektros energijos skirstymo, tobulinti infrastruktūros projektų įgyvendinimo rizikų valdymo procesą taip, kad šie projektai būtų įgyvendinami suplanuotais terminais.	2027-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Rodiklis

Planuotais terminais įgyvendintų elektros skirstymo infrastruktūros projektų dalis

Pradinė reikšmė: 38,5 proc. (2022 m.)

Siektina reikšmė: 90 proc. (2026 m.)

1 priemonė: Atnaujinti Bendrovės vidinius veiklos valdymo dokumentus, reglamentuojančius infrastruktūros projektų įgyvendinimą.	2025-03-31	Įgyvendinta	Laiku
---	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Rezultatas:

2024 m. gruodžio 5 d. Bendrovės vadovo patvirtintas naujas standartas „Investicinių objektų valdymo standartas“ (toliau – Standartas). Šis Standartas taikomas:

- įgyvendinant Bendrovės investicinius planus (Bendrovės ilgalaikė strategija, 10 m. investicinis planas (toliau – 10 MIP), objektų 3-mečiai planai, objektų 1-mečiai planai) ir neplanines investicijas laikantis visų išorės ir vidinių teisės aktų nuostatų;
- įgyvendinant Bendrovės patvirtintuose standartuose, elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros (2022 m. gruodžio 16 d.) ir gamtinių dujų infrastruktūros (tinklo) vystymo (2023 m. rugsėjo 26 d.), keliamus elektros energijos ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų patikimumo ir kokybės tikslus ekonomiškai ir technologiškai efektyviausiu būdu.

2 priemonė: Atlikti vidinių informacinių sistemų pokyčius, kurie leistų įgyvendinti infrastruktūros projektų valdymą pagal atnaujintą procesą (reglamentuojančius dokumentus).	2025-03-31	Įgyvendinta	Laiku
--	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-10-25 01:45
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
Rezultatas: Iki 2024 m. lapkričio 19 d. buvo įdiegti Tinklų investicinių objektų valdymo informacinėje sistemoje žemiau nurodyti sisteminiai pokyčiai: - Delspinių funkcionalumo atnaujinimai: rangovui grindžiantis delspinių taikymą, privalomas dokumento pateikimas, t. y. rangovas norėdamas pagrįsti jam priskaičiuotų delspinių priežastis privalo Bendrovei pateikti paaiškinimus raštu, o pastarasis privalomai Bendrovės darbuotojo turi būti įkeltas į Tinklų investicinių objektų valdymo informacinę sistemą. Taip pat sukurta nauja galimybė Tinklų investicinių objektų valdymo informacinėje sistemoje prie atitinkamo rangovo sutarties pridėti tarnybinius raštus, susijusius su delspinių išrašymu rangovui ir jų apmokėjimo administravimui. - Sutarties kortelės informacijos atnaujinimai: sukurta galimybė medžiagų ir įrenginių sutartyse, pasirašytose atitinkamo rangovo ir Bendrovės, fiksuoti informaciją apie pritaikytus delspinius; pakoreguota sutarties finansinės informacijos skaičiavimo logika; sukurti papildomi laukai bei apribojimai, kurie leidžia valdyti užsakymo įgyvendinti investicijas kūrimą bei stebėti Bendrovės su rangovais sudarytų sutarčių likučius. - Projektavimo etapų vykdymo atnaujinimai: leidžiama Bendrovės atsakingam asmeniui derinti projektą, kai yra inicijuotas jo įgyvendinimo termino pratęsimas arba pateikti nenumatyti darbai. - Integracijų atnaujinimai: papildyta integracija į geografinę informacinę sistemą (toliau – GIS), kurios metu yra perduodamos elektroninio dokumento su plėtinio „. dwg“ projekto korekcijos. - Kuriamų užduočių atnaujinimai: Investicijų projekto įgyvendinimą procesas yra išskaidytas į daugiau nei vieną užduotį, todėl sukurtas apribojimai tam tikroms užduotims - apribojimas, neleidžiantis sukurti užsakymo užduoties sutarčiai, kurios terminas yra pasibaigęs arba pratęsti užduoties vykdymo terminą ilgiau nei galioja sutartis; sukurta galimybė susieti projektavimo ir rangos užduotis.			
3 priemonė: Supažindinti ir išmokyti už projektų vykdymą atsakingus asmenis su įgyvendintais pokyčiais.	2025-06-30	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: AB "Energijos skirstymo operatorius"			
Rezultatas: Bendrovės už projektų vykdymą atsakingi asmenys buvo supažindinti 2024 m. gruodžio mėn. 12 d. su Standartu ir išmokyti naudotis Tinklų investicinių objektų valdymo informacinėje sistemoje įdiegtais funkcionalumais. Pažymėtina, kad Bendrovėje yra nuolat taikoma praktika organizuoti standartinius supažindinimo mokymus apie pasikeitusius standartus, procesus, tvarkas ar kitus dokumentus, turinčius įtakos darbų organizavimui. Informacija atsakingus asmenis pasiekia susirinkimų metu, ir/arba bendruoju elektroniniu laišku. Mokymų medžiaga ar parengtos instrukcijos talpinamos bendroje erdvėje, kad kiekvienas atsakingas darbuotojas už atitinkamą procesą galėtų pasiekti ir susipažinti.			
4 priemonė: Peržiūrėti esamus infrastruktūros projektų įgyvendinimo stebėsenos įrankius ir jų naudojamus duomenis.	2024-06-30	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: AB "Energijos skirstymo operatorius"			
Rezultatas: AB "Energijos skirstymo operatorius" informavo, kad peržiūrėti Bendrovės infrastruktūros projektų įgyvendinimo įrankiai ir jų naudojami duomenys. Identifikuotos sistemos ir jų duomenys, kurie būtini tinkamam infrastruktūros projektų įgyvendinimo sekimui. Identifikuotos tobulintinos vietos.			
5 priemonė: Papildyti projektų įgyvendinimo stebėsenas pagal poreikį.	2024-06-30	Įgyvendinta	Laiku

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-10-25 01:45
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
Atsakingas subjektas: AB "Energijos skirstymo operatorius"			
Rezultatas: Sukurta nauja Power BI sistemos stebėseną (ataskaita), kuri apima skirtingų Bendrovėje naudojamų IT sistemų informaciją ir duomenis ir leidžia sekti infrastruktūros objektų įgyvendinimą numatytais terminais.			

6 priemonė: Peržiūrėti bendrovės ir rangovų sutartis ir atlikti jų atnaujinimą, siekiant užtikrinti projektų įgyvendinimą laiku.	2026-12-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: AB "Energijos skirstymo operatorius"			
Rezultatas: Įgyvendinant priemonę atlikti kompleksiniai sutarčių pakeitimai : - Ilgalaikėse projektavimo sutartyse, sudarytose Bendrovės ir rangovų, įvesta papildoma atsakomybė projektuotojui - ne tik neatlygintinai atlikti projekto korekciją, bet ir sumokėti vienkartinę 500 Eur dydžio baudą, kai projekto vykdymo etape būtina keisti projekto sprendinius dėl to, kad paslaugų teikėjas (projektuotojas) neįvertino visų galimų projekto įgyvendinimo rizikų bei aplinkybių. Šia sąlyga siekiama įpareigoti projektuotojus kaip įmanoma tiksliau nusimatyti reikiamus projekto sprendinius. Tinkamas projekto sprendinių numatymas projektavimo etape ženkliai prisideda prie tinkamo ir savalaikio rangos darbų atlikimo. Sąlyga taikoma nuo 2024 m. gegužės mėnesio visuose naujuose projektavimo paslaugų ilgalaikių sutarčių pirkimuose. - Ilgalaikėse projektavimo sutartyse numatytas papildomas reikalavimas projektuotojams teikti kertinių projekto vietų nuotraukas projekto derinimo etape. Šia sąlyga siekiama užtikrinti, jog darbų etape projekto sprendiniai kaip įmanoma tiksliau atitiktų esamą objekto situaciją. Sąlyga taikoma nuo 2024 m. gegužės mėnesio visuose naujuose projektavimo paslaugų ilgalaikių sutarčių pirkimuose. - 2024 m. rugpjūčio mėn. atnaujintos ilgalaikių ir objektinių rangos sutarčių sąlygos ir numatytos papildomos darbų pratęsimo priežastys, kurias užsakovas (AB ESO) gali inicijuoti savo iniciatyva: 1) kai paskelbta ekstremali situacija pagal patvirtintą ekstremalių situacijų valdymo planą; 2) kai užsakovo klientas neparuošė darbų fronto; 3) kai laukiama priemoka iš užsakovo kliento; 4) kai laukiama projekto korekcija iš užsakovo kliento; 5) kai gautas užsakovo kliento prašymas nukelti darbus; 6) kai atsiranda kitos nuo užsakovo kliento priklausančios aplinkybės; 7) dėl ikiteismine ar teismine tvarka vykstančių ginčų, susijusių su užsakymo įgyvendinimu; 8) dėl pasikeitusių teisės aktų, prailginančių valstybės ar savivaldybės institucijų oficialių paslaugų vykdymo terminus.			

7 priemonė: Esant poreikiui atlikti esamų ir būsimų sutarčių sąlygų atnaujinimą.	2026-12-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: AB "Energijos skirstymo operatorius"			
Rezultatas: Įgyvendinant priemonę nuo 2024 m. lapkričio 11 d. pirkimuose pradėtos taikyti atnaujintos ilgalaikių bei objektinių rangos darbų sutarčių sąlygos. Atnaujinta nuostata dėl pašalinimo pagrindų taikymo subrangovams. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad sutarties vykdymo laikotarpiu rangovas galėtų pasitelkti tik patikimus subrangovus darbams atlikti ir užtikrinti, kad subrangovai turėtų tinkamą kvalifikaciją.			

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-10-25 01:45
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
7 rekomendacija: Siekiant užtikrinti vartotojų interesus, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų įvertinama, per kokį terminą gali būti grąžinamos vartotojų permokėtos sumos.	2025-03-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Pokytis:

2024 m. sausio 5 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E-3 pakeitė Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką. Pakeitimu metodikoje numatytos sąlygos, kurios vertinamos skaičiuojant investicijų grąžos viršijimo dydžio korekcijos dydį kiekvieniems metams ir tvirtinant preliminarų grąžinimo planą. Grąžinimo laikotarpis numatomas ne ilgesnis nei du reguliavimo periodai.

Rodiklis
Patvirtinti permokų už skirstymo paslaugas grąžinimo terminų nustatymo kriterijai
Būsena: stebėseną baigta
Pradinė reikšmė: Patvirtinti permokų už skirstymo paslaugas grąžinimo terminų nustatymo kriterijai (2024 m.)
Siektina reikšmė: Patvirtinti kriterijai (2024 m.)
Faktinė reikšmė: Patvirtinti permokų už skirstymo paslaugas grąžinimo terminų nustatymo kriterijai (2024 m.)

1 priemonė: Atlikti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos (toliau – Metodika) pakeitimą, Metodikoje apibrėžiant kriterijus pagal kuriuos būtų įvertinama, kuriam terminui gali būti išdėstytas vartotojų permokėtų sumų grąžinimas.	2024-12-31	Įgyvendinta	Laiku
---	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rezultatas:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2024 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. O3E-3 pakeitė Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“. Pakeitimu numatytos sąlygos, kurios vertinamos skaičiuojant investicijų grąžos viršijimo dydžio korekcijos dydį kiekvieniems metams ir tvirtinant preliminarų grąžinimo planą. Grąžinimo laikotarpis numatomas ne ilgesnis nei du reguliavimo periodai.

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-10-25 01:45
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
8 rekomendacija: Siekiant tikslingai naudoti valstybės biudžeto lėšas, užtikrinti, kad daliniam kompensavimui už suvartotą elektros energiją skirtų lėšų dydis būtų pagrįstas.	2026-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

Atsakingas subjektas:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rodiklis

Įvertintas daliniam kompensavimui skirtų lėšų, išmokėtų elektros energijos tiekėjams, pagrįstumas

Pradinė reikšmė: Neįvertintas daliniam kompensavimui skirtų lėšų, išmokėtų elektros energijos tiekėjams, pagrįstumas (2022 m.)

Siektina reikšmė: Įvertintas daliniam kompensavimui skirtų lėšų, išmokėtų elektros energijos tiekėjams, pagrįstumas (2026 m.)

1 priemonė: Atlikti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų, visuomeninio ir garantinio elektros energijos tiekėjų elektros energijos įsigijimo sąnaudų ir taikytų dalinio kompensavimo dydžių elektros energijos buitiniams vartotojams pagrįstumo vertinimą.	2025-12-31	Iš dalies įgyvendinta	Vėluoja
---	------------	-----------------------	---------

Atsakingas subjektas:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rezultatas:

Per 2026 m. I pusmetį buvo pabaigti 3-jų elektros energijos tiekėjų, gavusių valstybės biudžeto lėšas buitinių vartotojų elektros energijos kainoms mažinti, elektros energijos įsigijimo sąnaudų ir taikytų dalinio kompensavimo dydžių elektros energijos buitiniams vartotojams pagrįstumo vertinimai, kurie buvo atliekami per VERT įformintus elektros energijos tiekėjų patikrinimus:

1. 2026-02-19 VERT nutarimu Nr. O3-155 buvo patvirtintas elektros energijos tiekėjo MB "Birštono elektra" planinio patikrinimo aktas, kurio metu nustatyta, kad:

1.1. Bendrovė dėl mažesnių elektros energijos įsigijimo kainų ir atitinkamai mažesnių elektros energijos įsigijimo sąnaudų 2023 m. sausio–balandžio mėn. laikotarpiu nepagrįstai iš valstybės biudžeto gavo 16 696 Eur su PVM kompensavimo lėšų sumą, tokiu būdu nepagrįstai padidindama tiekimo veiklos maržą. Bendrovė VERT nutarimu Nr. O3-155 įpareigota grąžinti šią sumą į valstybės biudžetą (pridedamos VERT 2026-02-11 pažymos Nr. O 5-123 "Galutinė patikrinimo išvada" ir VERT 2026-02-19 nutarimo Nr. O3-155 2 punktas).

2. 2026-04-24 VERT nutarimu Nr. O3-432 buvo patvirtintas elektros energijos tiekėjo UAB "Darnus ūkis" planinio patikrinimo aktas, kurio metu nustatyta, kad:

2.1. Bendrovė dėl mažesnių elektros energijos įsigijimo kainų ir atitinkamai mažesnių elektros energijos įsigijimo sąnaudų 2023 m. sausio mėn. nepagrįstai iš valstybės biudžeto gavo 1 299,10 Eur su PVM kompensavimo lėšų sumą, tokiu būdu nepagrįstai padidindama tiekimo veiklos maržą.

2.2. Bendrovė nepagrįstai nebuitiniams vartotojams pritaikė 3 437, 57 Eur su PVM kompensacijų;

2.3. Bendrovė netinkamai skaičiavo ir taikė kompensacijas buitiniams vartotojams, todėl papildomai įpareigota iš savo lėšų 87-iems vartotojams išmokėti sumoje 1 668,33 Eur su PVM.

2.4. Vertinant tai, kas nurodyta, Bendrovė įpareigotą į valstybės biudžetą grąžinti 4 736,67 Eur su PVM (2.1 ir 2.2 papunkčių suma) ir buitiniams vartotojams (pagal VERT pateiktą vartotojų sąrašą) papildomai išmokėti iš savo lėšų 1 668,33 Eur su PVM (pridedamos VERT 2026-04-15 pažymos Nr. O 5-322 6 ir 7 išvados ir VERT 2026-04-24 nutarimo Nr. O3-432 2.1-2.2 papunkčiai).

3. 2026-06-05 VERT nutarimu Nr. O3-668 buvo patvirtintas elektros energijos tiekėjo UAB "EGTO energija" planinio patikrinimo aktas, kurio metu nustatyta, kad:

3.1. Bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 553 „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio

„ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2023-10-24 Nr. VAE-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-10-25 01:45

kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo “ patvirtinto Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo ir administravimo tvarkos aprašo 13 ir 14 punktus - Bendrovė už 2022 m. II pusm. buitiniams vartotojams pritaikė 3 936,73 Eur su PVM daugiau kompensacijų, nei turėjo. 2023 metais atlikus kompensacijų perskaičiavimus, šios lėšos turėjo būti grąžintos į valstybės biudžetą, tačiau Bendrovė jas panaudojo kompensacijoms už didesnę 2022 metais suvartotą elektros energijos kiekį išmokėti.

3.2. Bendrovė įpareigota 3 936,73 Eur su PVM kompensavimo lėšų sumą grąžinti į valstybės biudžetą (pridedamos VERT 2026-05-29 pažymos Nr. O 5-550 7 išvada ir VERT 2026-06-05 nutarimo Nr. O3-668 2 punktas).

4. 2026-07-11 VERT nutarimu Nr. O3-877 buvo patvirtintas elektros energijos tiekėjo AB "LTG Infra" planinio patikrinimo aktas, kurio metu nustatyta, kad:

4.1. Bendrovė dėl mažesnių elektros energijos įsigijimo sąnaudų 2023 m. I pusm. gavo nepagrįstai didesnę pelno maržą ir turi į valstybės biudžetą grąžinti 242 607,06 Eur su PVM kompensavimo lėšų.

4.2. Bendrovė turi perskaičiuoti kompensavimo lėšas, eliminuojant tuo atvejus kai kompensacijos pritaikytos elektros kiekiui suvartotam iki 2022 m. liepos mėn. ir grąžinti nepagrįstai gautas kompensavimo lėšas į valstybės biudžetą;

4.3. Bendrovė turi perskaičiuoti kompensavimo lėšas, tai atvejais, kai kompensacijos skaičiuotos nuo didesnių elektros kainų (pagal kainų protokolus), nei vartotojams faktiškai sąskaitose nurodytų kainų. ir grąžinti nepagrįstai gautas kompensavimo lėšas į valstybės biudžetą.

5. Kitų elektros energijos tiekėjų elektros įsigijimo sąnaudų ir kompensavimo dydžių taikymas buitiniams vartotojams bus užbaigtas iki 2026-12-31 (AB "Energijos skirstymo operatorius" 2026-08-20 d. posėdyje, UAB "Ignitis", UAB "Elektrum" ir UAB "Enefit", UAB "Perlas energija" bus patvirtinti iki 2026-12-31 d.), iki šio termino atitinkamai yra pratęsti VERT atliekami elektros energijos tiekėjų patikrinimai. Patikrinimai pratęsti atsižvelgiant į patikrinimams gautų duomenų apimtį, dažną elektros tiekėjų duomenų tikslinimą ir patikros kompleksumą (patikrinimų metų kompleksškai vertinama tiekėjų paslaugų kainodara, įsigijimo sąnaudų pokyčiai, jų įtaka kompensavimo lėšų apimčiai, kiti papildomi elektros tiekėjų veiklos kompensavimo laikotarpiu aspektai).

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)
